

INDICADORES DA SPRINT

		202	302			202	303	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	174h30m	176h00m	176h00m	112h00m	176h00m	176h00m	176h00m	176h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	177h17m	173h42m	185h27m	110h40m	180h47m	176h28m	180h05m	181h09m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	149h35m	151h05m	151h05m	90h25m	151h05m	151h05m	151h05m	151h25m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	147h13m	135h07m	165h06m	84h00m	152h54m	149h34m	153h27m	143h17m
05. Pontos planejados	36,5	34,5	29,5	0,0	0,0	47,5	36,5	42,0
06. Pontos entregues	52	55	54	28,5	49	48,5	37	63,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	33,50	44,50	23,00	26,00	44,00	36,50	24,00	42,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	18,50	10,50	31,00	2,50	5,00	12,00	13,00	21,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	12	9	8	6	8	11	12	15
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	12	8	4	4	11	8	11
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0,5	0,5	0	0	0,5	1	0	0,5
15. Produtividade planejada	0,245	0,229	0,196	00000	00000	0,315	0,242	0,278
16. Produtividade realizada	0,354	0,408	0,328	0,340	0,321	0,325	0,242	0,444
17. % Pontos NP / Pontos entregues	35,6	19,1	57,5	8,8	10,3	24,8	35,2	33,1

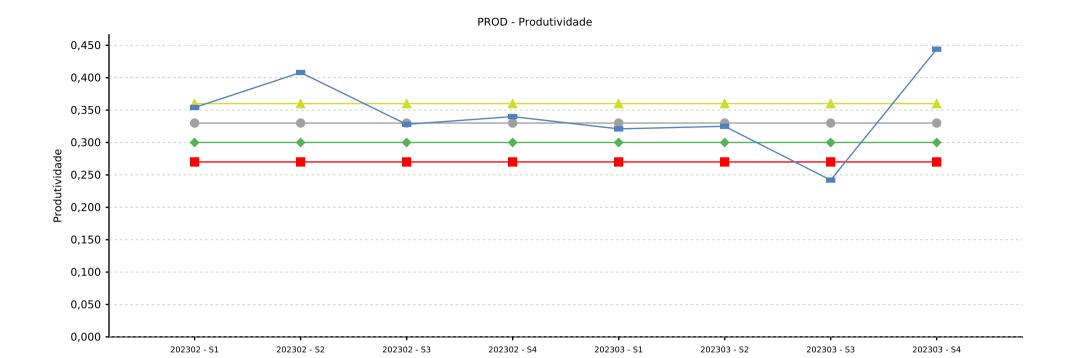


➡ LI → LS → LS2 → Meta — Realizado

		202	302		202303					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,354	0,408	0,328	0,340	0,321	0,325	0,242	0,444		
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300		
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360		
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330		
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270		

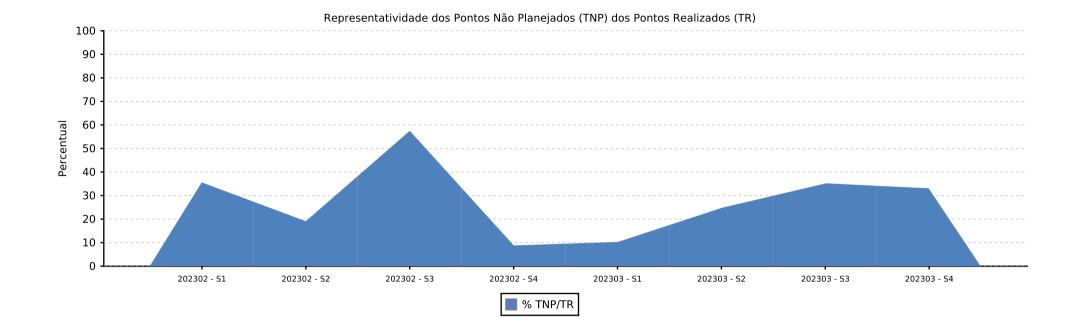


		202	302			202	303	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	52	55	54	28.5	49	48.5	37	63.5
TNP - Pontos Não Planejados	18.5	10.5	31	2.5	5	12	13	21
% TNP/TR	35,6	19,1	57,5	8,8	10,3	24,8	35,2	33,1

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

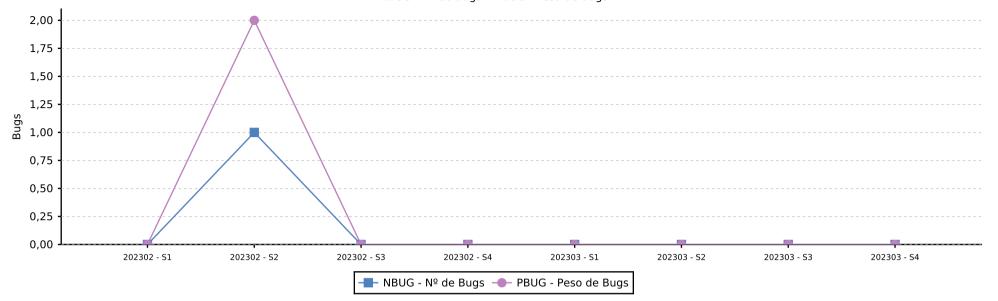

		202	302			202	303	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	1	0	0	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	2	0	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	52	55	54	28.5	49	48.5	37	63.5
% PBUG / TR	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

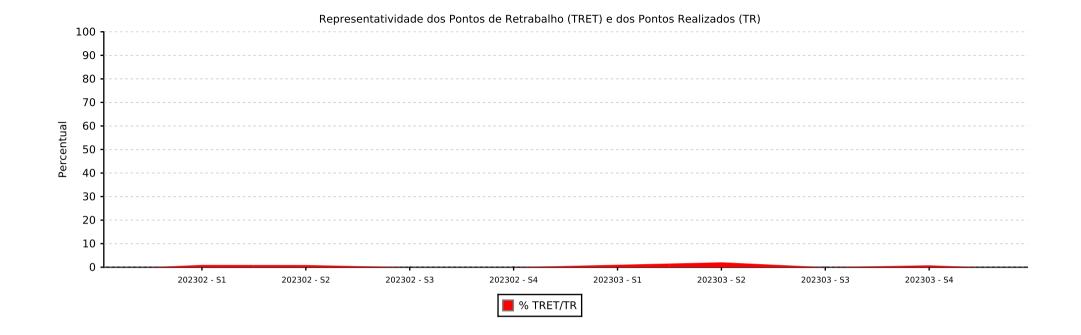


		202	302			202	303	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	52	55	54	28.5	49	48.5	37	63.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0.5	0	0	0.5	1	0	0.5
% TRET/TR	1,0	0,9	0,0	0,0	1,0	2,1	0,0	0,8

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	nt 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	129,75	133,18	129,75	132,07	129,75	131,25	128,33	121,05	517,58	517,55	100,0 %
Analise de Sistema	12	9,43	12	7,37	12	3,9	12	9,97	48	30,67	63,9 %
Ausencia	0	5,95	0	5,13	0	8,33	0	7,02	0	26,43	0,0 %
Sprint Planning 1	6	5,85	6	1,85	6	5,15	6	5,82	24	18,67	77,8 %
Treinamento	0	0,25	0	0	0	0	0	4,88	0	5,13	0,0 %
Correção de Erros Interno	1	5,28	1	4,05	1	2,7	1	4,58	4	16,61	415,2 %
Cafe	5	4,58	5	5,17	5	4,17	5	4,52	20	18,44	92,2 %
Retrospectiva	4	2,67	4	2,5	4	6,67	4	4	16	15,84	99,0 %
Code Review	1	0,4	1	0,6	1	3,02	1	3,58	4	7,6	190,0 %
Reuniao	1	1,5	1	4,67	1	3,33	1	3,17	4	12,67	316,8 %
Daily Scrum	4	3,65	4	5,55	4	5,33	4	3,02	16	17,55	109,7 %
Ginastica Laboral	2,67	2,57	2,67	1,95	2,67	2,12	2,33	2,37	10,34	9,01	87,1 %
Sprint Planning 2	4	1,67	4	0,67	4	1,33	4	2	16	5,67	35,4 %
Compilacao de sistemas	0,5	0	0,5	1,08	0,5	1	0,5	1,83	2	3,91	195,5 %
Planejamento de Projeto	0,25	0,5	0,25	0,58	0,25	0	1,5	1,28	2,25	2,36	104,9 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	0,1	0	2,3	0	0,25	0	0,95	0	3,6	0,0 %
Clean Code	1,08	0	1,08	0	1,08	0,77	1,08	0,58	4,32	1,35	31,2 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0,83	0	0	0	0	0	0,42	0	1,25	0,0 %
Outros	0,58	0	0,58	0,1	0,58	0,1	0,58	0,12	2,32	0,32	13,8 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	2,12	0	0,83	0	0,33	0	0	0	3,28	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	6	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,25	0	0	0	0,33	0	0	0	0,58	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0,0 %
Total Geral	176	180,78	176	176,47	176	180,08	175,99	181,16	703,99	718,49	102,1 %

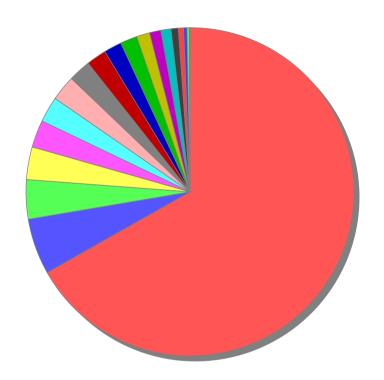

- Desenvolvimento [66.82%]
- Analise de Sistema [5.5%]
- Ausencia [3.88%]
- Sprint Planning 1 [3.21%]
- Treinamento [2.69%]
- O Correção de Erros Interno [2.53%]
- Cafe [2.5%]
- Retrospectiva [2.21%]
- Code Review [1.98%]
- Reuniao [1.75%]
- Daily Scrum [1.67%]
- Ginastica Laboral [1.31%]
- Sprint Planning 2 [1.1%]
- Compilacao de sistemas [1.01%]
- Planejamento de Projeto [0.71%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.52%]
- Clean Code [0.32%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.23%]
- Outros [0.07%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	133	139,4	133	138,42	133	134,97	131,58	127,58	530,58	540,37	101,8 %
REQM - Gestao de Requisitos		23,5	19,07	23,5	10,72	23,5	10,72	23,5	17,78	94	58,29	62,0 %
DIV - Diversos*		9,5	14,6	9,5	17,02	9,5	18,05	9,17	17,18	37,67	66,85	177,5 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	9	6,72	9	8,65	9	15,02	9	10,6	36	40,99	113,9 %
CM - Gerencia de Configuração		0,5	0	0,5	1,08	0,5	1	1	1,83	2,5	3,91	156,4 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0,5	0,25	0,58	0,25	0	1,5	1,28	2,25	2,36	104,9 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	175,75	180,29	175,75	176,47	175,75	179,76	175,75	176,25	703	712,77	101,4 %

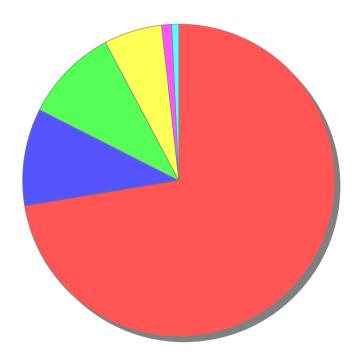


- Desenvolvimento de Requisitos [72.38%]
- Gestao de Requisitos [10.09%]
- Diversos* [9.75%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.01%]
- Gerencia de Configuracao [1.04%]
- Planejamento de Projeto [0.73%]

INDICADORES DO PROJETO


	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303
01. Horas planejadas de todas atividades	560h00m	559h24m	475h12m	423h24m	336h00m	388h00m	638h30m	704h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	485h55m	564h23m	465h13m	527h22m	459h02m	450h59m	647h06m	718h29m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	432h20m	472h44m	388h32m	344h39m	287h00m	330h35m	542h10m	604h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	263h03m	400h24m	289h30m	380h11m	315h48m	284h17m	531h26m	599h12m
05. Pontos planejados para o projeto	129,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	163,0	200,0
06. Pontos planejados	105,5	160,5	120,0	107,5	101,5	101,0	100,5	126,0
07. Pontos entregues	90,5	135	92,5	128	131,5	98,5	189,5	198
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	67,50	126,00	48,50	89,50	95,00	90,00	127,00	147,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	23,00	9,00	44,00	38,50	36,50	8,50	62,50	51,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	1	0	0	0	2	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	18	33	14	26	22	16	35	46
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	9	3	22	13	28	12	36	34
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	0	0	0	1	0
14. Horas de correção de bug	0h00m							
15. Pontos de retrabalho	0	0	1	0	1,5	0	1	2
16. Produtividade planejada	0,245	0,340	0,309	0,312	0,354	0,306	0,186	0,209
17. Produtividade realizada	0,345	0,338	0,320	0,337	0,417	0,347	0,357	0,331
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	70,2	0	72,3	0	0	0	116,3	99
19. % Pontos NP / Pontos entregues	25,5	6,7	47,6	30,1	27,8	8,7	33	25,8

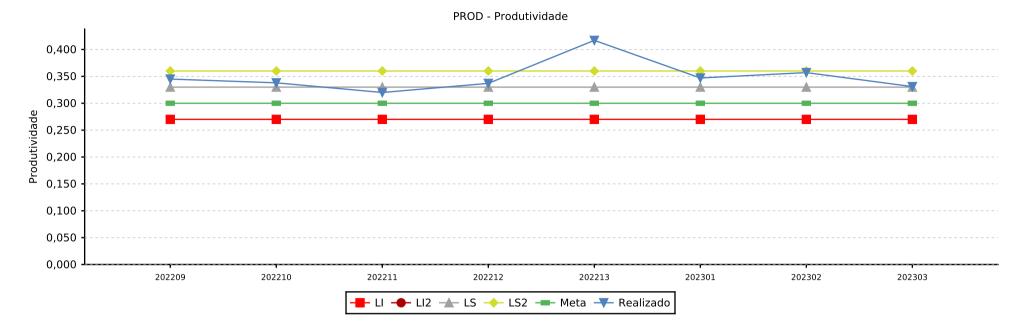


	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303
Realizado	0,345	0,338	0,320	0,337	0,417	0,347	0,357	0,331
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270

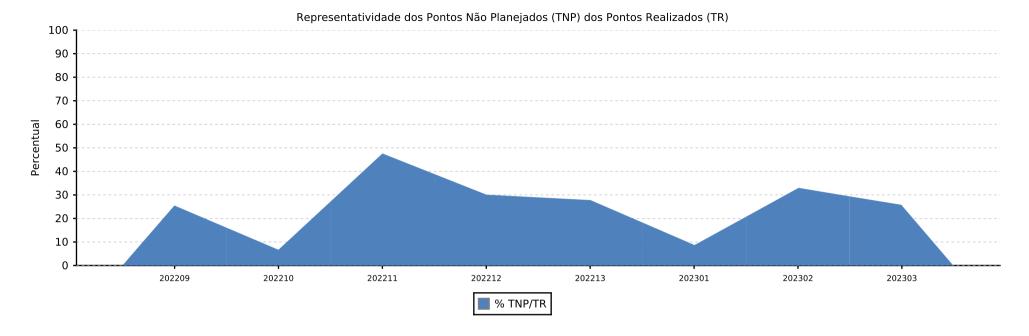


	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303
TR - Pontos Realizados	90.5	135	92.5	128	131.5	98.5	189.5	198
TNP - Pontos Não Planejados	23	9	44	38.5	36.5	8.5	62.5	51
% TNP/TR	25,5	6,7	47,6	30,1	27,8	8,7	33,0	25,8

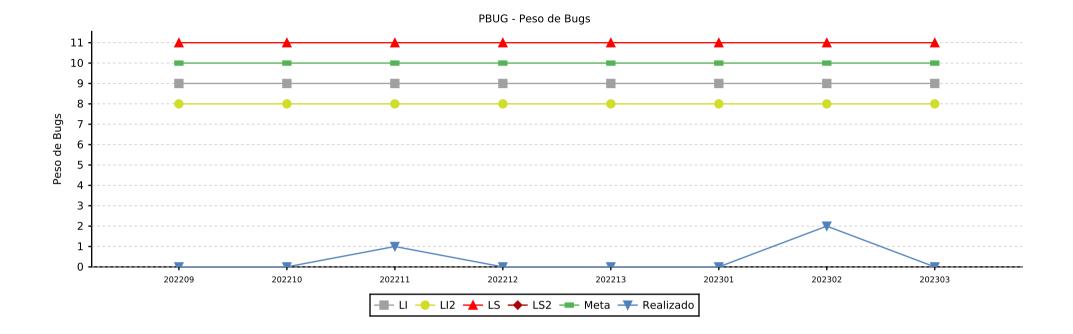


	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303
Realizado	0	0	1	0	0	0	2	0
Meta	10	10	10	10	10	10	10	10
LS2								
LS	11	11	11	11	11	11	11	11
LI2	8	8	8	8	8	8	8	8
LI	9	9	9	9	9	9	9	9
Pontos Entregues	90.5	135	92.5	128	131.5	98.5	189.5	198
% PBUG / TR	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00

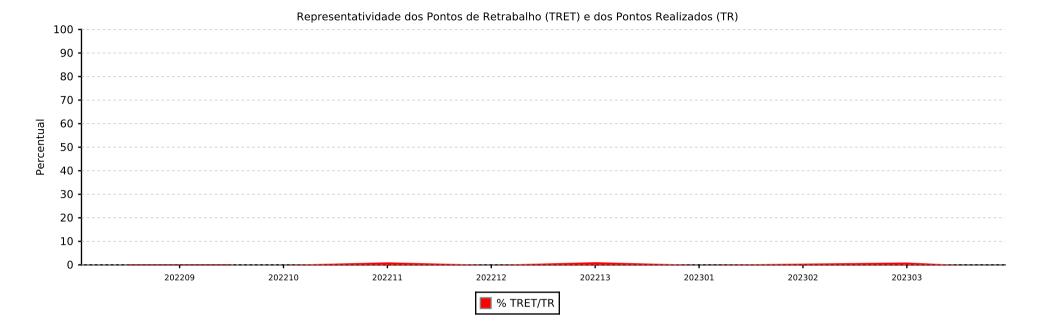


	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303
TR - Pontos Realizados	90.5	135	92.5	128	131.5	98.5	189.5	198
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	1	0	1.5	0	1	2
% TRET/TR	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,5	1,0

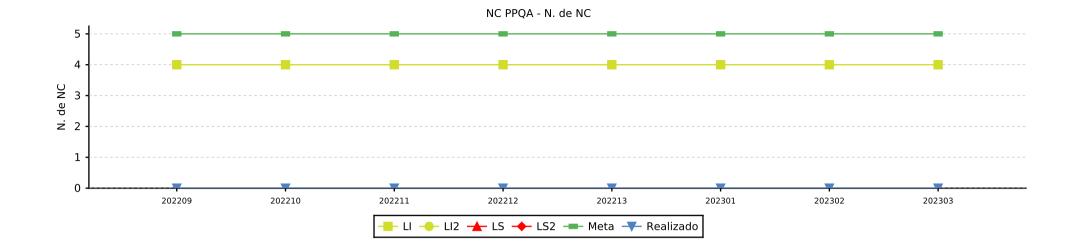


	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

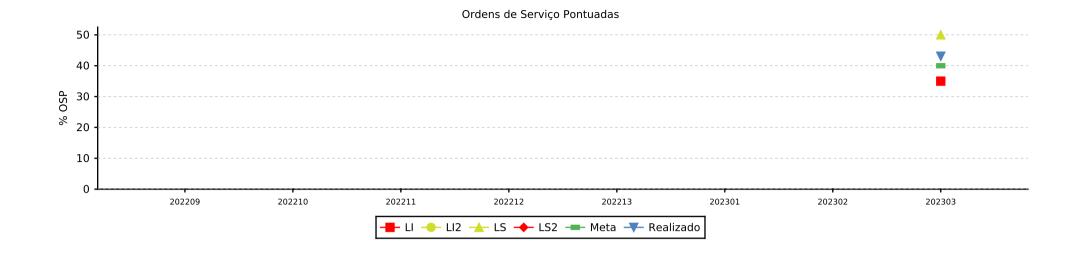

	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	43.08
Meta	0	0	0	0	0	0	0	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	0	0	0	0	0	0	0	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	0	0	0	0	0	0	0	35

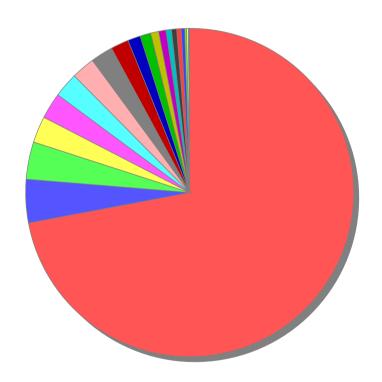

- Desenvolvimento [72.03%]
- Analise de Sistema [4.27%]
- Ausencia [3.68%]
- Sprint Planning 1 [2.6%]
- Cafe [2.57%]
- Daily Scrum [2.44%]
- Correção de Erros Interno [2.31%]
- Retrospectiva [2.2%]
- Reuniao [1.76%]
- Ginastica Laboral [1.25%]
- Code Review [1.06%]
- Sprint Planning 2 [0.79%]
- Treinamento [0.71%]
- Compilacao de sistemas [0.55%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.5%]
- Preparando ambiente [0.46%]
- Planejamento de Projeto [0.33%]
- Clean Code [0.19%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.17%]
- Atraso / Saida antecipada [0.08%]
- Outros [0.04%]

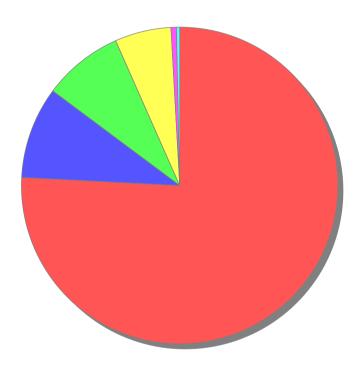

- Desenvolvimento de Requisitos [75.21%]
- Diversos* [9.3%]
- Gestao de Requisitos [8.11%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.7%]
- Gerencia de Configuracao [0.55%]
- O Planejamento de Projeto [0.33%]
