

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	303			202	304	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	176h00m	176h00m	176h00m	176h00m	176h00m	143h12m	176h00m	143h12m
02. Horas realizadas de todas atividades	180h47m	176h28m	180h05m	181h09m	178h48m	144h36m	184h46m	140h59m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	151h05m	151h05m	151h05m	151h25m	150h35m	119h02m	150h35m	119h12m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	152h54m	149h34m	153h27m	143h17m	148h01m	109h54m	143h42m	114h36m
05. Pontos planejados	0,0	47,5	36,5	42,0	42,0	33,5	43,5	33,0
06. Pontos entregues	49	48,5	37	63,5	33,5	44	49	39
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	44,00	36,50	24,00	42,50	24,00	32,50	37,00	28,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	5,00	12,00	13,00	21,00	9,50	11,50	12,00	11,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	2	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	8	11	12	15	8	12	13	8
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	4	11	8	11	5	10	3	7
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	1	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h59m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0,5	1	0	0,5	0	0,5	0,5	0,5
15. Produtividade planejada	00000	0,315	0,242	0,278	0,279	0,282	0,289	0,277
16. Produtividade realizada	0,321	0,325	0,242	0,444	0,227	0,401	0,341	0,341
17. % Pontos NP / Pontos entregues	10,3	24,8	35,2	33,1	28,4	26,2	24,5	28,3

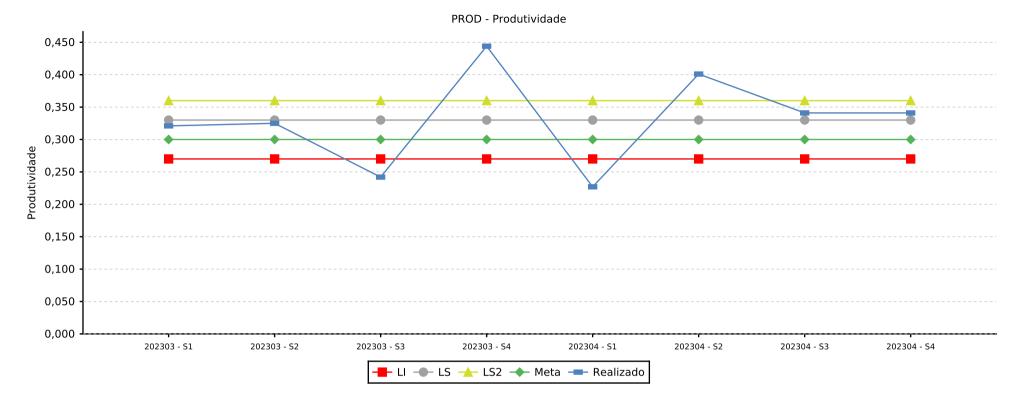


		202	303		202304					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,321	0,325	0,242	0,444	0,227	0,401	0,341	0,341		
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300		
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360		
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330		
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270		

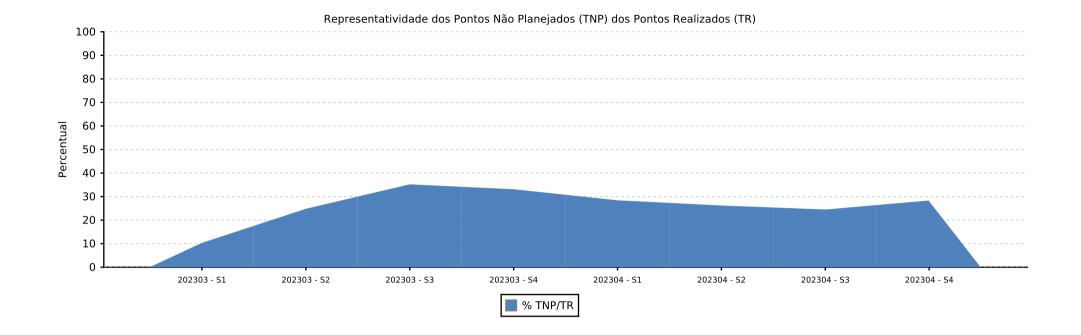


		202	303			202	304	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	49	48.5	37	63.5	33.5	44	49	39
TNP - Pontos Não Planejados	5	12	13	21	9.5	11.5	12	11
% TNP/TR	10,3	24,8	35,2	33,1	28,4	26,2	24,5	28,3

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202	303			202	304	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	0	1	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	2	0
Pontos Entregues	49	48.5	37	63.5	33.5	44	49	39
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00

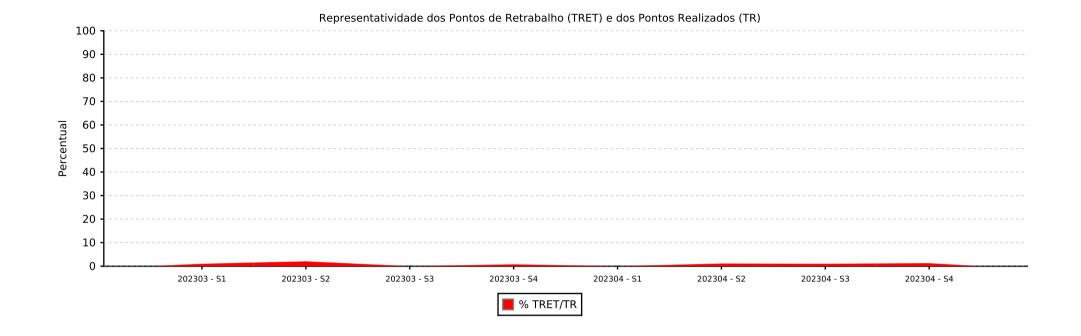


		202	303		202304				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
TR - Pontos Realizados	49	48.5	37	63.5	33.5	44	49	39	
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	1	0	0.5	0	0.5	0.5	0.5	
% TRET/TR	1,0	2,1	0,0	0,8	0,0	1,1	1,0	1,3	

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	129,33	122,55	98,53	93,77	129,33	129,12	96,95	99,23	454,14	444,67	97,9 %
Analise de Sistema	12	7,83	12	19,05	12	12,2	12	6,43	48	45,51	94,8 %
Sprint Planning 1	6	5,85	6	4,93	6	4,73	6	5,67	24	21,18	88,2 %
Cafe	5	5	4,25	3,8	5	4,75	4,25	4	18,5	17,55	94,9 %
Code Review	1	0,95	1	3,3	1	1,48	1	3,3	4	9,03	225,8 %
Reuniao	1	4,42	1	0,5	1	2,5	1	2,77	4	10,19	254,8 %
Daily Scrum	4	1,33	3,25	3,48	4	3,28	3,25	2,17	14,5	10,26	70,8 %
Sprint Planning 2	4	1,33	4	1,33	4	2	4	2	16	6,66	41,6 %
Retrospectiva	4	5,67	4	3,5	4	2,5	4	2	16	13,67	85,4 %
Preparando ambiente	0	0,25	0	0,67	0	0	0	1,88	0	2,8	0,0 %
Outros	0,58	0,22	0,58	0,17	0,58	0,43	0,58	1,67	2,32	2,49	107,3 %
Sizing	1,5	0	1,5	0	1,5	4,25	1,5	1,67	6	5,92	98,7 %
Clean Code	1	0,25	1	1,07	1	0,58	1	1,63	4	3,53	88,2 %
Ginastica Laboral	2,67	3,23	2,17	1,75	2,67	2,5	2	1,62	9,51	9,1	95,7 %
Compilacao de sistemas	1	0,47	1	2,3	1	0,28	1	1,55	4	4,6	115,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	1,5	1,53	2,25	3,03	134,7 %
Ausencia	0	6,92	0	3,17	0	6,83	0	1,43	0	18,35	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,25	0,15	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0,37	1	0,77	77,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,07	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,0 %
Correção de Erros Interno	1	10,38	1	1,07	1	0	1	0	4	11,45	286,2 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,25	0	0,25	0	0,25	0,5	0,25	0	1	0,5	50,0 %


Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento		0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0,0 %
Manutenção de Servidores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.		0	0	0	0	0	1,33	0	0	0	1,33	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		0,75	0	0,75	0	0,75	0,98	0,75	0	3	0,98	32,7 %
Particular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	176	178,8	143,2	144,61	176	184,74	143,2	140,99	638,4	649,14	101,7 %

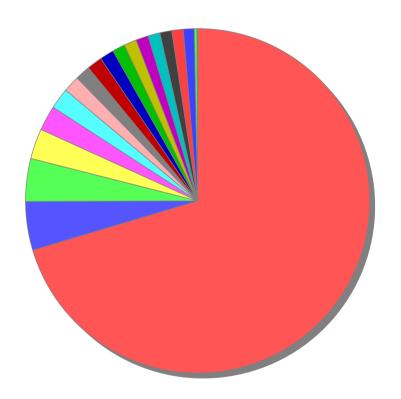

- Desenvolvimento [70.39%]
- Analise de Sistema [4.56%]
- Sprint Planning 1 [4.02%]
- Ocafe [2.84%]
- Code Review [2.34%]
- Reuniao [1.96%]
- Daily Scrum [1.54%]
- Sprint Planning 2 [1.42%]
- Retrospectiva [1.42%]
- Preparando ambiente [1.33%]
- Outros [1.18%]
- Sizing [1.18%]
- Clean Code [1.16%]
- Ginastica Laboral [1.15%]
- Compilacao de sistemas [1.1%]
- Planejamento de Projeto [1.09%]
- Ausencia [1.01%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.26%]
- Atraso / Saida antecipada [0.05%]

## HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	132,5	133,33	101,7	96,15	132,5	132,02	100,12	101,23	466,82	462,73	99,1 %
REQM - Gestao de Requisitos		23,5	15,27	23,5	25,98	23,5	23,18	23,5	17,65	94	82,08	87,3 %
DIV - Diversos*		9,5	19,78	8,25	9,38	9,5	17,52	8,08	11,48	35,33	58,16	164,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	9	7,95	8,25	10,28	9	7,27	8,25	7,47	34,5	32,97	95,6 %
CM - Gerencia de Configuração		1	0,47	1	2,3	1	0,28	1,5	1,55	4,5	4,6	102,2 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	1,5	1,53	2,25	3,03	134,7 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	175,75	177,3	142,95	144,59	175,75	180,77	142,95	140,91	637,4	643,57	101,0 %

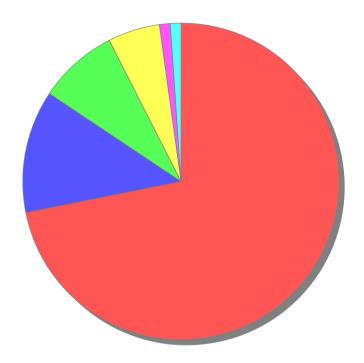


- Desenvolvimento de Requisitos [71.84%]
- Gestao de Requisitos [12.52%]
- Diversos\* [8.15%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.3%]
- Gerencia de Configuracao [1.1%]
- Planejamento de Projeto [1.09%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304
01. Horas planejadas de todas atividades	559h24m	475h12m	423h24m	336h00m	388h00m	638h30m	704h00m	638h24m
02. Horas realizadas de todas atividades	564h23m	465h13m	527h22m	459h02m	450h59m	647h06m	718h29m	649h09m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	472h44m	388h32m	344h39m	287h00m	330h35m	542h10m	604h40m	539h24m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	400h24m	289h30m	380h11m	315h48m	284h17m	531h26m	599h12m	516h13m
05. Pontos planejados para o projeto	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	163,0	200,0	177,0
06. Pontos planejados	160,5	120,0	107,5	101,5	101,0	100,5	126,0	152,0
07. Pontos entregues	135	92,5	128	131,5	98,5	189,5	198	165,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	126,00	48,50	89,50	95,00	90,00	127,00	147,00	121,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	9,00	44,00	38,50	36,50	8,50	62,50	51,00	44,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	0	2	0	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	33	14	26	22	16	35	46	41
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	3	22	13	28	12	36	34	25
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	0	1	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h59m						
15. Pontos de retrabalho	0	1	0	1,5	0	1	2	1,5
16. Produtividade planejada	0,340	0,309	0,312	0,354	0,306	0,186	0,209	0,282
17. Produtividade realizada	0,338	0,320	0,337	0,417	0,347	0,357	0,331	0,321
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	0	72,3	0	0	0	116,3	99	93,6
19. % Pontos NP / Pontos entregues	6,7	47,6	30,1	27,8	8,7	33	25,8	26,6

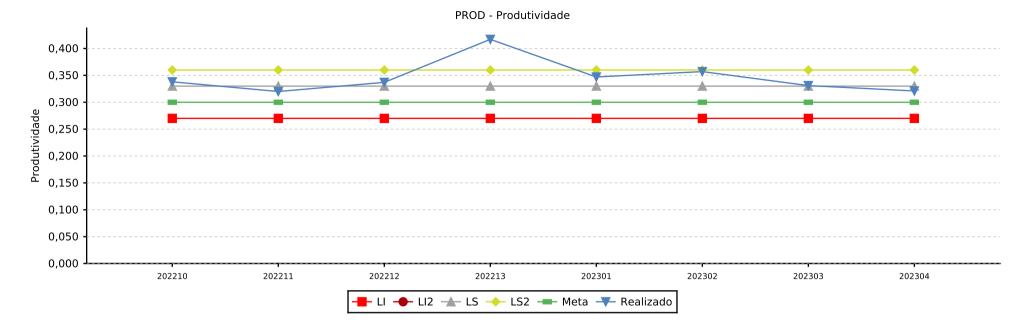


	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304
Realizado	0,338	0,320	0,337	0,417	0,347	0,357	0,331	0,321
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270

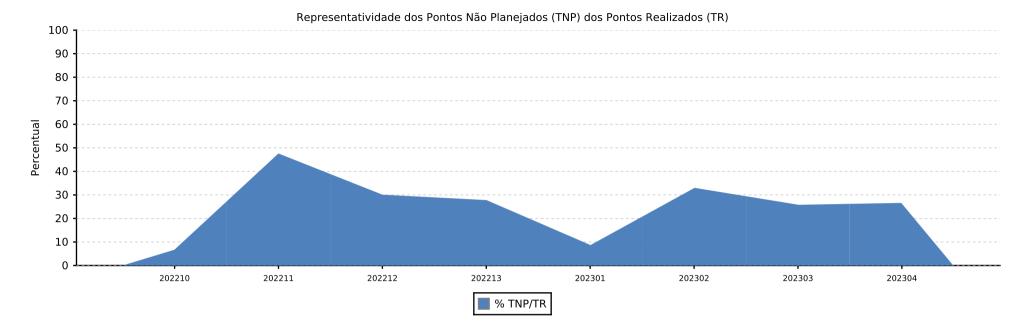


	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304
TR - Pontos Realizados	135	92.5	128	131.5	98.5	189.5	198	165.5
TNP - Pontos Não Planejados	9	44	38.5	36.5	8.5	62.5	51	44
% TNP/TR	6,7	47,6	30,1	27,8	8,7	33,0	25,8	26,6

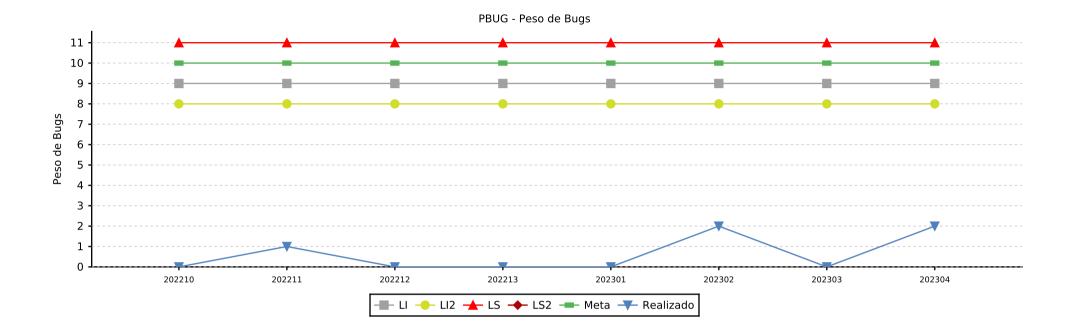


	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304
Realizado	0	1	0	0	0	2	0	2
Meta	10	10	10	10	10	10	10	10
LS2								
LS	11	11	11	11	11	11	11	11
LI2	8	8	8	8	8	8	8	8
LI	9	9	9	9	9	9	9	9
Pontos Entregues	135	92.5	128	131.5	98.5	189.5	198	165.5
% PBUG / TR	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	1,21

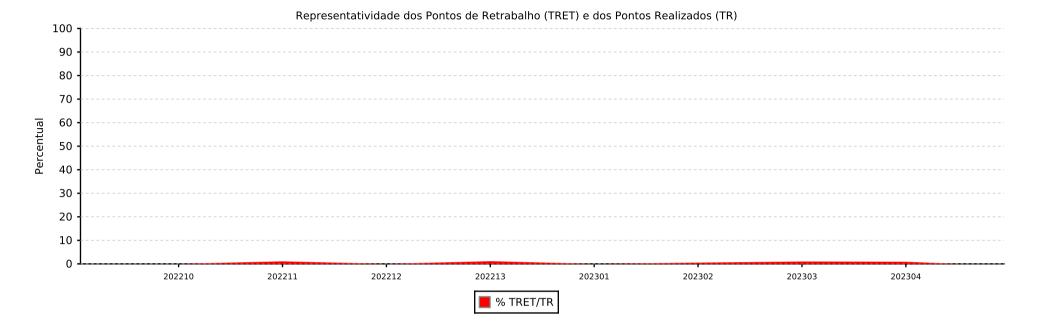


	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304
TR - Pontos Realizados	135	92.5	128	131.5	98.5	189.5	198	165.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1	0	1.5	0	1	2	1.5
% TRET/TR	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,5	1,0	0,9

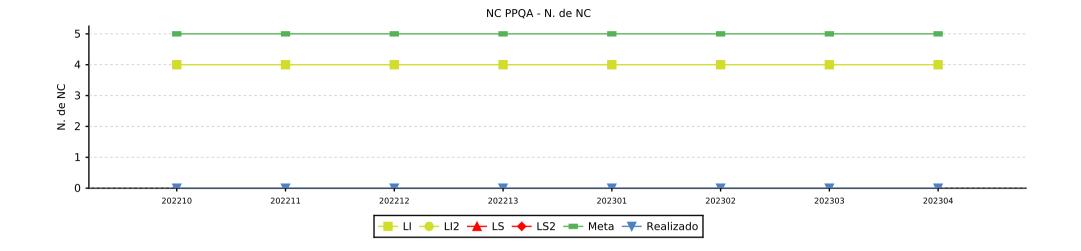


	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

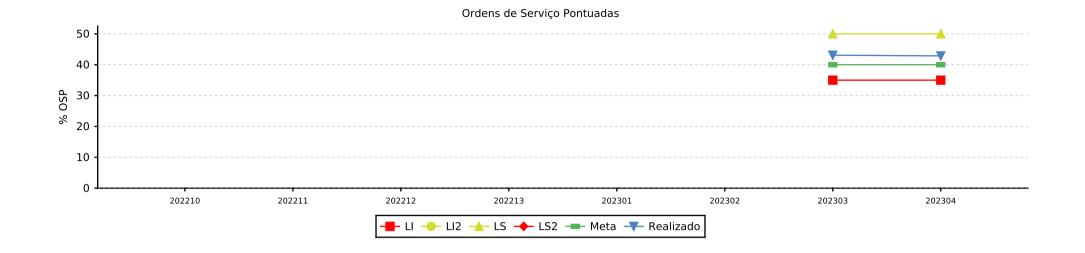

	202210	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304
Realizado	0	0	0	0	0	0	43.08	42.86
Meta	0	0	0	0	0	0	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	0	0	0	0	0	0	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	0	0	0	0	0	0	35	35

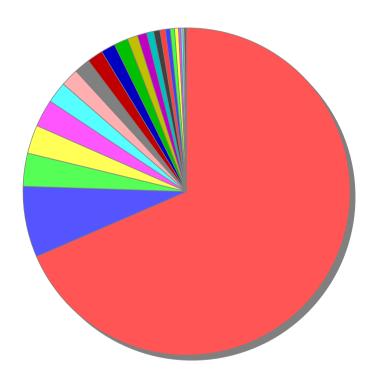

- Desenvolvimento [68.5%]
- Analise de Sistema [7.01%]
- Sprint Planning 1 [3.26%]
- Ausencia [2.83%]
- Cafe [2.7%]
- Retrospectiva [2.11%]
- Correção de Erros Interno [1.76%]
- Daily Scrum [1.58%]
- Reuniao [1.57%]
- Ginastica Laboral [1.4%]
- Code Review [1.39%]
- Sprint Planning 2 [1.03%]
- Sizing [0.91%]
- Compilacao de sistemas [0.71%]
- Atestado [0.62%]
- Clean Code [0.54%]
- Planejamento de Projeto [0.47%]
- Preparando ambiente [0.43%]
- Outros [0.38%]
- Treinamento [0.23%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.2%]
- Correcao de Erros Externo [0.15%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.12%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.08%]
- Atraso / Saida antecipada [0.01%]

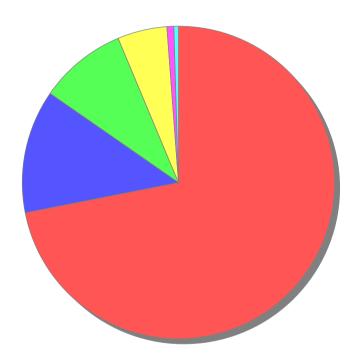

- Desenvolvimento de Requisitos [71.28%]
- Gestao de Requisitos [12.64%]
- Diversos\* [8.96%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.08%]
- Gerencia de Configuracao [0.71%]
- Planejamento de Projeto [0.47%]
