

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	413			202	501	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	308h00m	308h00m	308h00m	192h44m	185h36m	264h00m	264h00m	308h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	314h27m	307h37m	300h20m	248h22m	258h08m	263h05m	237h45m	263h32m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	261h55m	261h55m	261h55m	160h54m	147h51m	226h25m	226h25m	264h25m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	239h02m	233h21m	223h17m	118h56m	143h41m	211h24m	182h19m	209h43m
05. Pontos planejados	80,0	85,5	71,0	37,5	35,5	54,0	50,5	57,0
06. Pontos entregues	78,5	81	78	40,5	46	66,5	55,5	71,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	61,00	65,00	67,00	39,50	38,50	53,00	35,50	59,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	17,50	16,00	11,00	1,00	7,50	13,50	20,00	12,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	3	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	13	26	23	14	15	17	12	14
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	10	7	9	2	7	6	10	6
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	1	0	0	0	2	0
13. Horas de correção de bug	3h00m	0h00m						
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	1,5	0	0	0	1	0
15. Produtividade planejada	0,306	0,327	0,272	0,234	0,241	0,239	0,224	0,216
16. Produtividade realizada	0,329	0,348	0,350	0,341	0,321	0,315	0,305	0,341
17. % Pontos NP / Pontos entregues	22,3	19,8	14,2	2,5	16,4	20,4	36,1	17,5

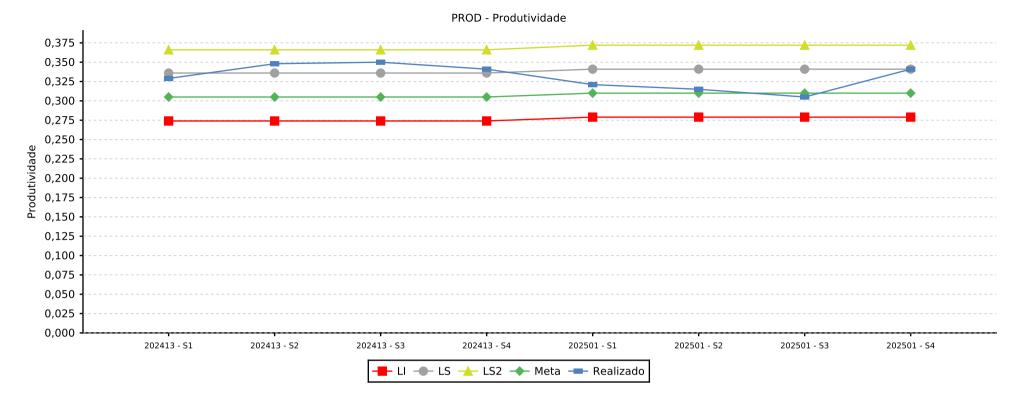


		202	413		202501					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,329	0,348	0,350	0,341	0,321	0,315	0,305	0,341		
Meta	0,305	0,305	0,305	0,305	0,310	0,310	0,310	0,310		
LS2	0,366	0,366	0,366	0,366	0,372	0,372	0,372	0,372		
LS	0,336	0,336	0,336	0,336	0,341	0,341	0,341	0,341		
LI	0,274	0,274	0,274	0,274	0,279	0,279	0,279	0,279		

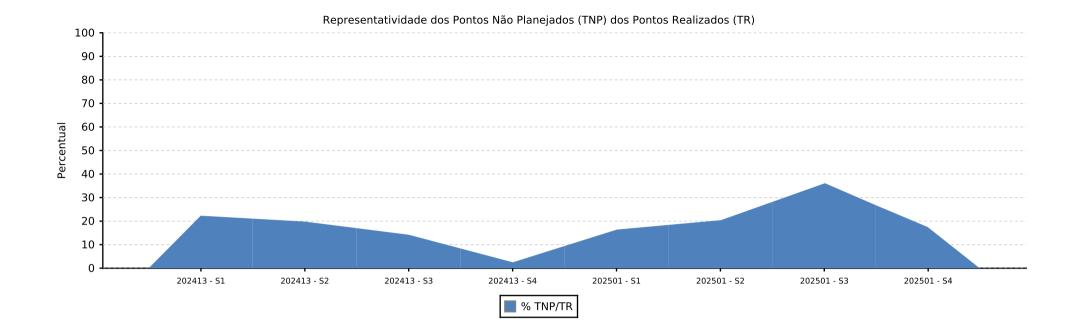


		202	413			202	501	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	78.5	81	78	40.5	46	66.5	55.5	71.5
TNP - Pontos Não Planejados	17.5	16	11	1	7.5	13.5	20	12.5
% TNP/TR	22,3	19,8	14,2	2,5	16,4	20,4	36,1	17,5

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

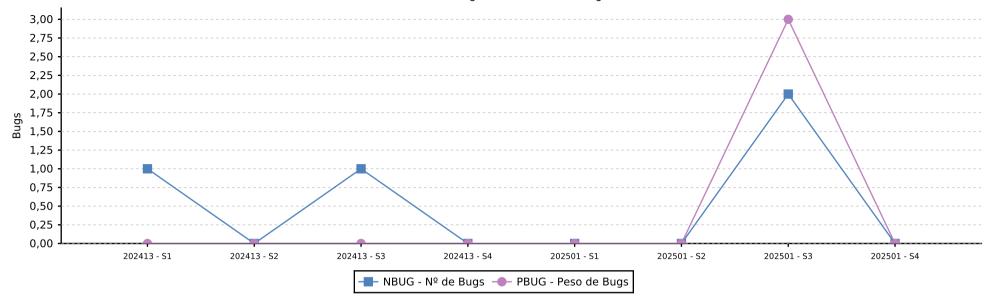

		202	413	-		202	501	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	1	0	1	0	0	0	2	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	3	0
Pontos Entregues	78.5	81	78	40.5	46	66.5	55.5	71.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00

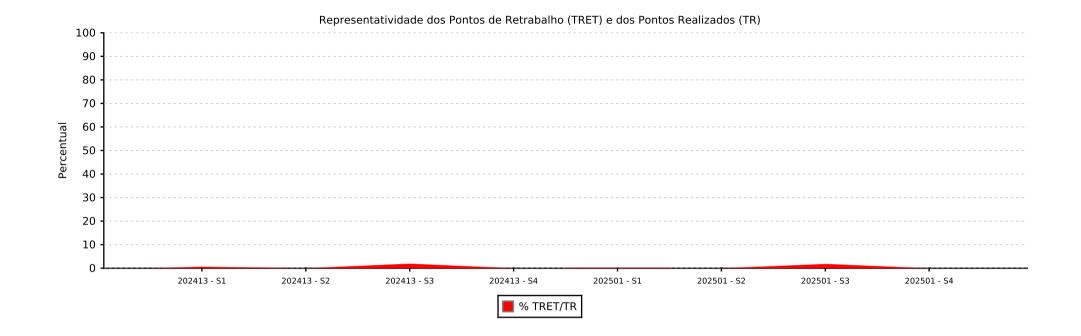


		202	413			202	501	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	78.5	81	78	40.5	46	66.5	55.5	71.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	1.5	0	0	0	1	0
% TRET/TR	0,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	nt 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	115,02	130,25	187,42	190,9	187,42	165,82	216,58	181,75	706,44	668,72	94,7 %
Analise de Sistema	17,67	11,33	20	24,98	20	26,5	21,5	31,12	79,17	93,93	118,6 %
Daily Scrum	9,17	2,42	12	4,42	12	8,33	14	10,33	47,17	25,5	54,1 %
Cafe	5,5	4	7,5	7	7,5	6,5	7,75	7	28,25	24,5	86,7 %
Retrospectiva	5	4,5	6	3	6	2,08	7	6,25	24	15,83	66,0 %
Sprint Planning 1	7,5	2,5	9	3,58	9	2,92	10,5	5,08	36	14,08	39,1 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	0,92	0	3,33	0	1,17	0	3,5	0	8,92	0,0 %
Ginastica Laboral	7,5	2,13	4,17	3,5	4,17	3,13	4,33	3,35	20,17	12,11	60,0 %
Code Review	1,58	3,72	3	6,6	3	10,32	3,25	2,58	10,83	23,22	214,4 %
Compilacao de sistemas	1,83	0	2	2,25	2	1	2,5	2,5	8,33	5,75	69,0 %
Ausencia	0	90,08	0	2,58	0	2	0	2,33	0	96,99	0,0 %
Outros	0,17	0	0	0	0	0	0,17	1,72	0,34	1,72	505,9 %
Sprint Planning 2	5	2,08	6	1,08	6	1,25	7	1,47	24	5,88	24,5 %
Planejamento de Projeto	0,25	0,77	0	0	0	0	2,25	1,33	2,5	2,1	84,0 %
Verificando apontamento	0,17	0,92	0,42	1,83	0,42	1,25	0,42	1,25	1,43	5,25	367,1 %
Reuniao	1	0	0	0	0	0,67	1	1	2	1,67	83,5 %
Atraso / Saida antecipada	0	1,1	0	2,68	0	1,07	0	0,97	0	5,82	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,17	0,17	0,5	0,25	0,5	0	0,5	0	1,67	0,42	25,1 %


Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,5	0	1,58	0	1,58	0	1,67	0	6,33	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	2,75	0	2,92	2,42	2,92	0,5	3,17	0	11,76	2,92	24,8 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Clean Code	1,67	0,25	1,5	2,67	1,5	0,25	1,75	0	6,42	3,17	49,4 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	2	1	0	0	0	0	2	0	4	1	25,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0	0	0	0	0,17	0	0,34	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tota	l Geral 185,62	258,14	264,01	263,07	264,01	237,76	308,01	263,53	1.021,65	1.022,5	100,1 %

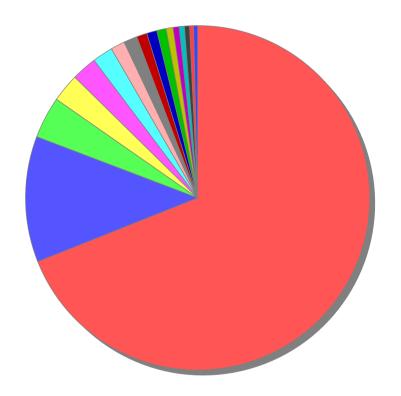

- Desenvolvimento [68.97%]
- Analise de Sistema [11.81%]
- Daily Scrum [3.92%]
- Ocafe [2.66%]
- Retrospectiva [2.37%]
- Sprint Planning 1 [1.93%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.33%]
- Ginastica Laboral [1.27%]
- Code Review [0.98%]
- Compilacao de sistemas [0.95%]
- Ausencia [0.88%]
- Outros [0.65%]
- Sprint Planning 2 [0.56%]
- Planejamento de Projeto [0.5%]
- Verificando apontamento [0.47%]
- Reuniao [0.38%]
- Atraso / Saida antecipada [0.37%]

## HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	121,27	131,58	193,92	199,57	193,92	167,73	223,83	185,25	732,94	684,13	93,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		32,17	16,92	35	29,65	35	30,67	41	37,67	143,17	114,91	80,3 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	15,75	10,63	21	14,02	21	20,73	24,25	19,17	82	64,55	78,7 %
DIV - Diversos*		14,17	96,22	11,67	13,08	11,67	12,3	13,25	15,4	50,76	137	269,9 %
CM - Gerencia de Configuração		1,83	0	2	2,25	2	1	3	2,5	8,83	5,75	65,1 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0,77	0	0	0	0	2,25	1,33	2,5	2,1	84,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	185,44	256,12	263,59	258,57	263,59	232,43	307,58	261,32	1.020,2	1.008,44	98,8 %

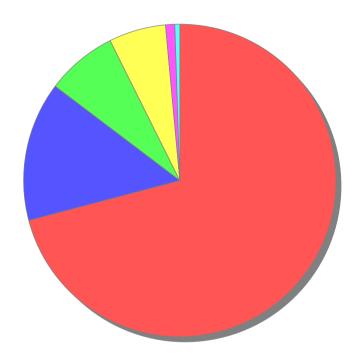


- Desenvolvimento de Requisitos [70.89%]
- Gestao de Requisitos [14.42%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.34%]
- Diversos\* [5.89%]
- Gerencia de Configuracao [0.96%]
- Planejamento de Projeto [0.51%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
01. Horas planejadas de todas atividades	1232h00m	1232h00m	1352h00m	1408h00m	1084h00m	1048h00m	1116h44m	1021h36m
02. Horas realizadas de todas atividades	1273h03m	1258h14m	1361h25m	1321h10m	1128h07m	1140h44m	1170h46m	1022h30m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1051h00m	1049h00m	1146h40m	1196h00m	920h50m	890h00m	946h39m	865h06m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1021h36m	991h50m	1088h53m	1008h14m	899h52m	826h05m	814h36m	747h07m
05. Pontos planejados para o projeto	305,0	305,0	336,0	359,0	276,0	267,0	289,0	265,0
06. Pontos planejados	296,0	290,0	316,0	320,0	309,5	289,0	274,0	197,0
07. Pontos entregues	321	327,5	358,5	339	312,5	263	278	239,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	235,00	259,00	275,00	262,50	234,50	211,00	232,50	186,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	86,00	68,50	83,50	76,50	78,00	52,00	45,50	53,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	4	0	0	6	0	0	3
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	47	50	57	69	68	55	76	58
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	40	30	45	44	40	24	28	29
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	2	0	3	3	0	2	2
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h40m	0h00m	3h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0,5	3,5	0	3,5	4	2,5	2	1
16. Produtividade planejada	0,282	0,277	0,276	0,268	0,337	0,325	0,290	0,228
17. Produtividade realizada	0,315	0,331	0,330	0,337	0,348	0,319	0,342	0,321
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	105,3	107,4	106,7	94,5	113,3	98,6	96,2	90,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	26,8	21	23,3	22,6	25	19,8	16,4	22,4

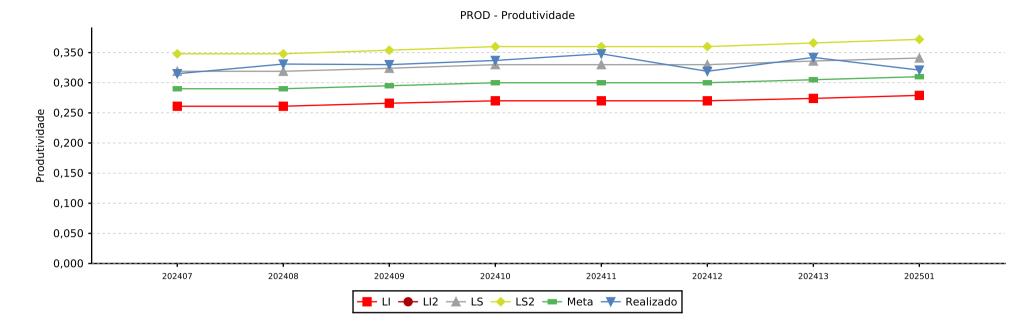


	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
Realizado	0,315	0,331	0,330	0,337	0,348	0,319	0,342	0,321
Meta	0,290	0,290	0,295	0,300	0,300	0,300	0,305	0,310
LS2	0,348	0,348	0,354	0,360	0,360	0,360	0,366	0,372
LS	0,319	0,319	0,324	0,330	0,330	0,330	0,336	0,341
LI2								
LI	0,261	0,261	0,266	0,270	0,270	0,270	0,274	0,279

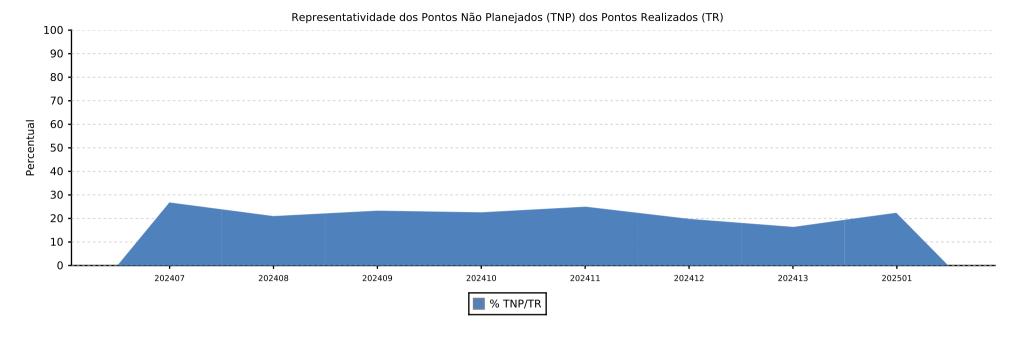


	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
TR - Pontos Realizados	321	327.5	358.5	339	312.5	263	278	239.5
TNP - Pontos Não Planejados	86	68.5	83.5	76.5	78	52	45.5	53.5
% TNP/TR	26,8	21,0	23,3	22,6	25,0	19,8	16,4	22,4

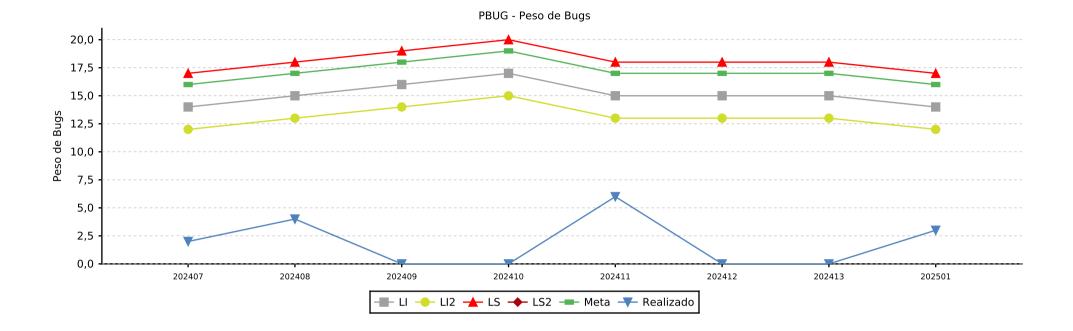


	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
Realizado	2	4	0	0	6	0	0	3
Meta	16	17	18	19	17	17	17	16
LS2								
LS	17	18	19	20	18	18	18	17
LI2	12	13	14	15	13	13	13	12
LI	14	15	16	17	15	15	15	14
Pontos Entregues	321	327.5	358.5	339	312.5	263	278	239.5
% PBUG / TR	0,63	1,23	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,26

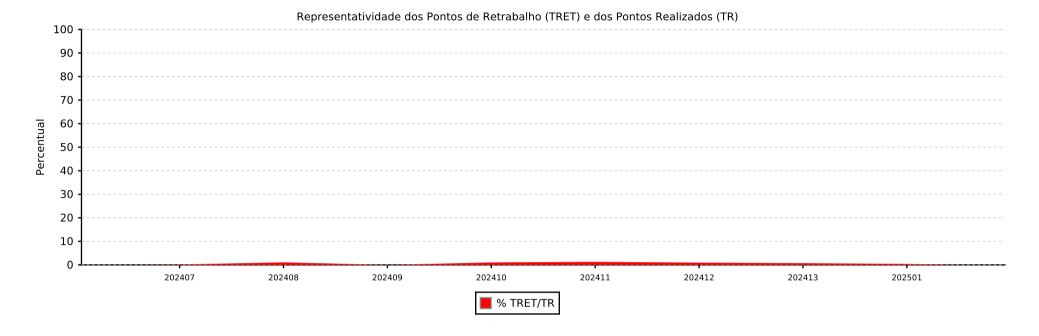


	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
TR - Pontos Realizados	321	327.5	358.5	339	312.5	263	278	239.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	3.5	0	3.5	4	2.5	2	1
% TRET/TR	0,2	1,1	0,0	1,0	1,3	1,0	0,7	0,4

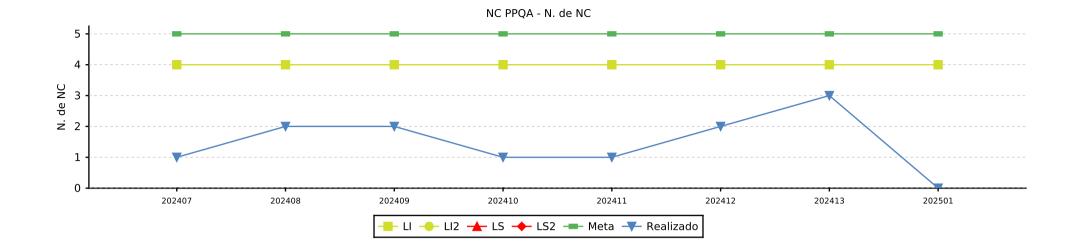


	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
Realizado	1	2	2	1	1	2	3	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

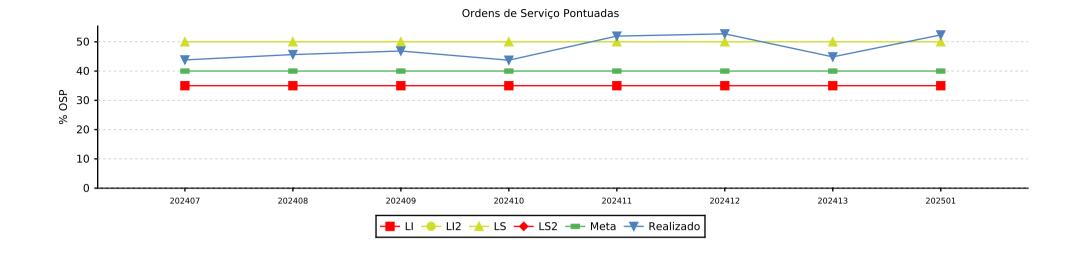

	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
Realizado	43.81	45.63	46.85	43.71	51.94	52.71	44.85	52.35
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

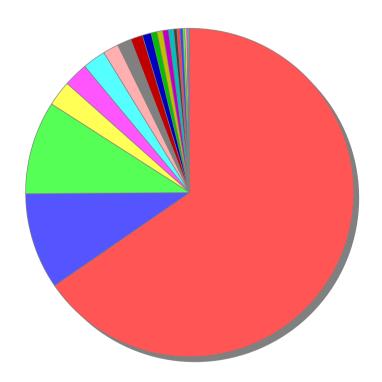

- Desenvolvimento [65.4%]
- Ausencia [9.49%]
- Analise de Sistema [9.19%]
- Daily Scrum [2.49%]
- Cafe [2.4%]
- Code Review [2.27%]
- Retrospectiva [1.55%]
- Sprint Planning 1 [1.38%]
- Ginastica Laboral [1.19%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.87%]
- Sprint Planning 2 [0.58%]
- Atraso / Saida antecipada [0.57%]
- Compilacao de sistemas [0.56%]
- Verificando apontamento [0.51%]
- Clean Code [0.31%]
- Particular [0.29%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.29%]
- Planejamento de Projeto [0.21%]
- Outros [0.17%]
- Reuniao [0.16%]
- Sizing [0.1%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.04%]

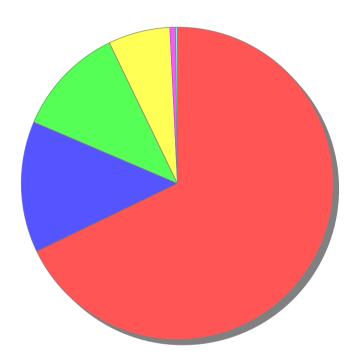

- Desenvolvimento de Requisitos [66.91%]
- Diversos\* [13.4%]
- Gestao de Requisitos [11.24%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.31%]
- Gerencia de Configuracao [0.56%]
- Planejamento de Projeto [0.21%]
