

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	402			202	403	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	176h00m	176h00m	107h12m	132h00m	176h00m	176h00m	176h00m	176h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	183h06m	175h54m	178h28m	135h42m	182h18m	178h33m	183h12m	229h00m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	151h50m	151h40m	90h22m	115h15m	155h15m	155h15m	155h15m	155h15m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	149h29m	142h49m	85h32m	99h40m	148h20m	114h02m	127h38m	149h30m
05. Pontos planejados	54,0	50,0	33,0	42,0	45,5	55,0	48,0	49,0
06. Pontos entregues	49,5	34	32	38	46	35,5	35,5	61
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	39,00	32,00	20,00	26,50	23,00	29,00	20,00	41,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	10,50	2,00	12,00	11,50	23,00	6,50	15,50	19,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	4	0	4	2	0	0	1
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	15	10	5	5	11	6	3	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	8	1	6	7	14	4	9	9
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	2	0	2	1	0	0	1
13. Horas de correção de bug	2h18m	0h00m	0h00m	1h04m	1h10m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	1	1	0	1	0,5	0	4	3,5
15. Produtividade planejada	0,356	0,330	0,366	0,365	0,294	0,355	0,310	0,316
16. Produtividade realizada	0,332	0,239	0,375	0,382	0,311	0,312	0,279	0,409
17. % Pontos NP / Pontos entregues	21,3	5,9	37,5	30,3	50	18,4	43,7	32

PROD - Produtividade

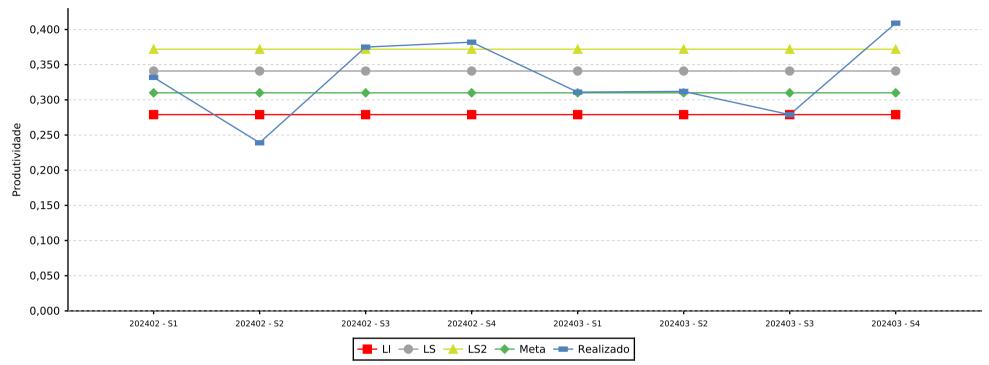


		202	402		202403					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,332	0,239	0,375	0,382	0,311	0,312	0,279	0,409		
Meta	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310		
LS2	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372		
LS	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341		
LI	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279		

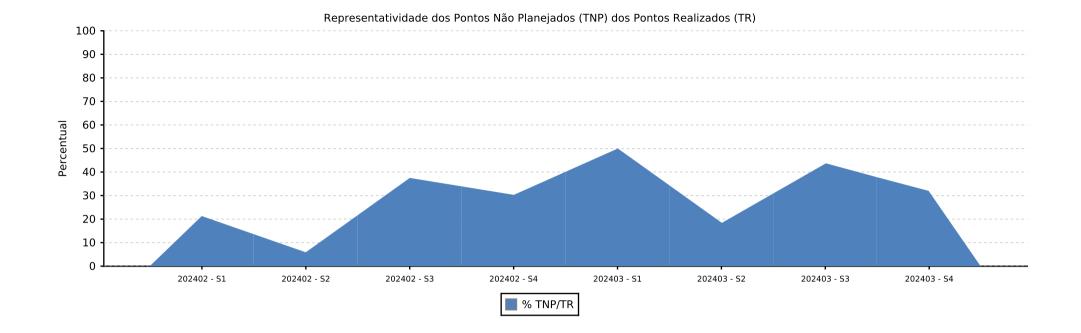


		202	402			202	403	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	49.5	34	32	38	46	35.5	35.5	61
TNP - Pontos Não Planejados	10.5	2	12	11.5	23	6.5	15.5	19.5
% TNP/TR	21,3	5,9	37,5	30,3	50,0	18,4	43,7	32,0

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

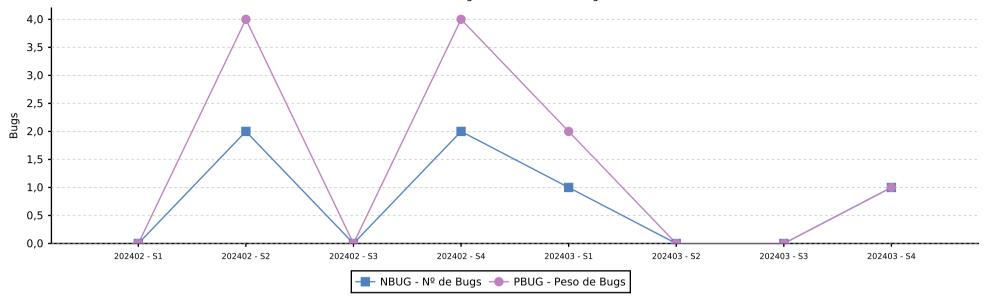

		202	402	-		202	403	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	2	0	2	1	0	0	1
PBUG - Peso de Bugs	0	4	0	4	2	0	0	1
Pontos Entregues	49.5	34	32	38	46	35.5	35.5	61
% PBUG / TR	0,00	11,77	0,00	10,53	4,35	0,00	0,00	1,64

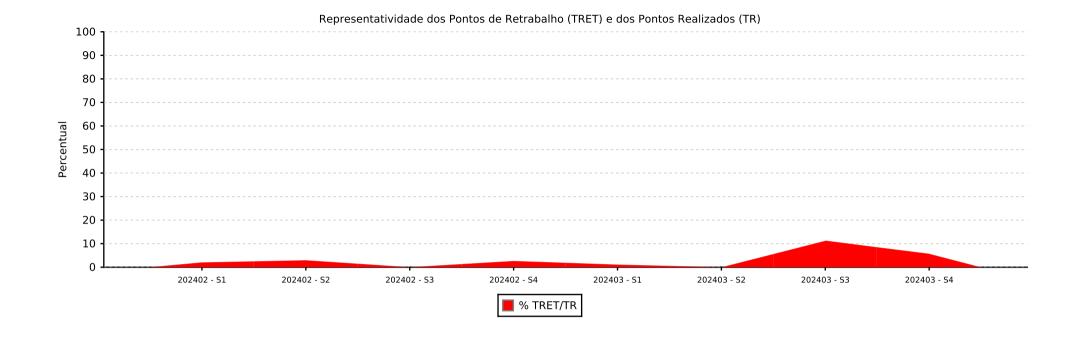


		202	402			202	403	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	49.5	34	32	38	46	35.5	35.5	61
TRET - Pontos de Retrabalho	1	1	0	1	0.5	0	4	3.5
% TRET/TR	2,0	2,9	0,0	2,6	1,1	0,0	11,3	5,7

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spr	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	135,17	132,97	135,17	97,73	135,17	115,55	133,17	136,57	538,68	482,82	89,6 %
Ausencia	0	4,68	0	6,33	0	10,3	0	27,78	0	49,09	0,0 %
Analise de Sistema	7	11,73	7	25,8	7	14,03	7	14,27	28	65,83	235,1 %
Treinamento	0	0	0	21	0	7,8	0	12,5	0	41,3	0,0 %
Daily Scrum	4	5,68	4	4,9	4	6,5	4	6,05	16	23,13	144,6 %
Code Review	1,25	2,98	1,25	1,08	1,25	6,78	1,25	5,82	5	16,66	333,2 %
Cafe	5	4,42	5	4	5	4,5	5	4,83	20	17,75	88,8 %
Retrospectiva	4	2,5	4	2,77	4	2	4	4	16	11,27	70,4 %
Ginastica Laboral	2,83	3,17	2,83	2,47	2,83	2,83	2,83	3,17	11,32	11,64	102,8 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	2,43	0	2,43	0,0 %
Compilacao de sistemas	1,17	1,42	1,17	0,75	1,17	5,98	1,17	2,27	4,68	10,42	222,6 %
Sizing	2	0	2	0	2	0	2	1,67	8	1,67	20,9 %
Reuniao	1	0,83	1	0,5	1	2,33	1	1,5	4	5,16	129,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	1,17	0	1,17	0,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,75	1	2,5	1	40,0 %
Clean Code	1	0,33	1	2,75	1	0,25	1	0,88	4	4,21	105,2 %
Outros	0,08	3,17	0,08	2,25	0,08	0	0,08	0,75	0,32	6,17	1.928,1
Sprint Planning 1	6	3	6	2,67	6	1	6	0,67	24	7,34	30,6 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,25	0,75	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0,43	1	1,43	143,0 %
Verificando apontamento	0	0,42	0	0,33	0	0,42	0	0,42	0	1,59	0,0 %
Sprint Planning 2	4	1	4	0,67	4	0,33	4	0,33	16	2,33	14,6 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,5	0,55	0,5	2,55	0,5	0	0,5	0	2	3,1	155,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	0,33	0	0	0	0,33	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Atividades Gerenciais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Manutenção de Servidores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes		0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,0 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		0,08	1,17	0,08	0	0,08	0	0,08	0	0,32	1,17	365,6 %
Auxilio ao Desenvolvimento		0,25	1,13	0,25	0	0,25	2	0,25	0	1	3,13	313,0 %
Particular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	176	182,3	176	178,55	176	183,18	176	229,01	704	773,04	109,8 %

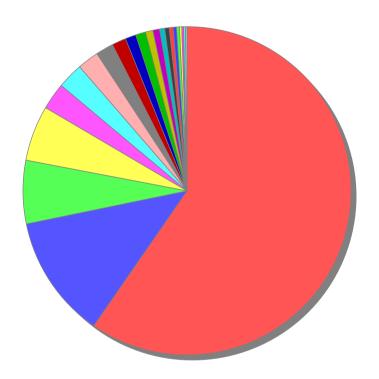

- Desenvolvimento [59.64%]
- Ausencia [12.13%]
- Analise de Sistema [6.23%]
- Treinamento [5.46%]
- Daily Scrum [2.64%]
- Code Review [2.54%]
- Cafe [2.11%]
- Retrospectiva [1.75%]
- Ginastica Laboral [1.38%]
- Preparando ambiente [1.06%]
- Compilacao de sistemas [0.99%]
- Sizing [0.73%]
- Reuniao [0.66%]
- Auxilio suporte [0.51%]
- Planejamento de Projeto [0.44%]
- Clean Code [0.38%]
- Outros [0.33%]
- Sprint Planning 1 [0.29%]
- Atestado [0.22%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [0.19%]
- Verificando apontamento [0.18%]
- Sprint Planning 2 [0.14%]

## HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	137,42	137,3	137,42	103,03	137,42	118,05	135,42	137,88	547,68	496,26	90,6 %
DIV - Diversos*		8,92	16,27	8,92	15,55	8,92	20,3	8,92	38,03	35,68	90,15	252,7 %
REQM - Gestao de Requisitos		19	15,73	19	29,13	19	15,37	19	19,37	76	79,6	104,7 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	9,25	11,17	9,25	8,75	9,25	15,28	9,25	15,87	37	51,07	138,0 %
CM - Gerencia de Configuração		1,17	1,42	1,17	0,75	1,17	5,98	1,67	2,27	5,18	10,42	201,2 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,75	1	2,5	1	40,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	176,01	181,89	176,01	157,21	176,01	174,98	176,01	214,42	704,04	728,5	103,5 %

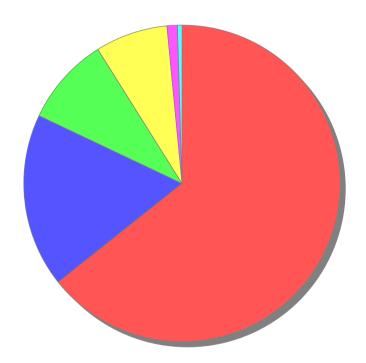


- Desenvolvimento de Requisitos [64.3%]
- Diversos\* [17.74%]
- Gestao de Requisitos [9.03%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.4%]
- Gerencia de Configuracao [1.06%]
- Planejamento de Projeto [0.47%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
01. Horas planejadas de todas atividades	638h24m	704h00m	544h00m	504h00m	442h24m	545h36m	591h12m	704h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	648h01m	729h06m	534h40m	514h40m	496h21m	560h42m	673h10m	773h03m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	524h14m	584h40m	442h20m	412h55m	363h19m	471h46m	509h07m	621h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	490h48m	582h02m	404h28m	403h30m	375h49m	461h52m	477h30m	539h30m
05. Pontos planejados para o projeto	163,0	184,0	140,0	132,0	117,0	146,0	158,0	191,0
06. Pontos planejados	159,0	174,0	137,5	137,0	123,5	161,0	179,0	197,5
07. Pontos entregues	162,5	205,5	134	133,5	133	151,5	153,5	178
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	96,00	157,50	102,00	95,50	91,50	131,50	117,50	113,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	66,50	48,00	32,00	38,00	41,50	20,00	36,00	64,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	6	0	0	0	8	3
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	34	34	49	23	24	35	35	26
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	44	38	37	26	28	14	22	36
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	3	0	0	0	4	2
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	3h31m	0h00m	0h00m	0h00m	3h22m	1h10m
15. Pontos de retrabalho	0	2,5	6	1	0	0	3	8
16. Produtividade planejada	0,304	0,298	0,311	0,332	0,340	0,342	0,352	0,319
17. Produtividade realizada	0,332	0,354	0,332	0,331	0,354	0,329	0,322	0,330
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	99,7	111,7	95,8	101,2	113,7	103,8	97,2	93,2
19. % Pontos NP / Pontos entregues	41	23,4	23,9	28,5	31,3	13,3	23,5	36,3

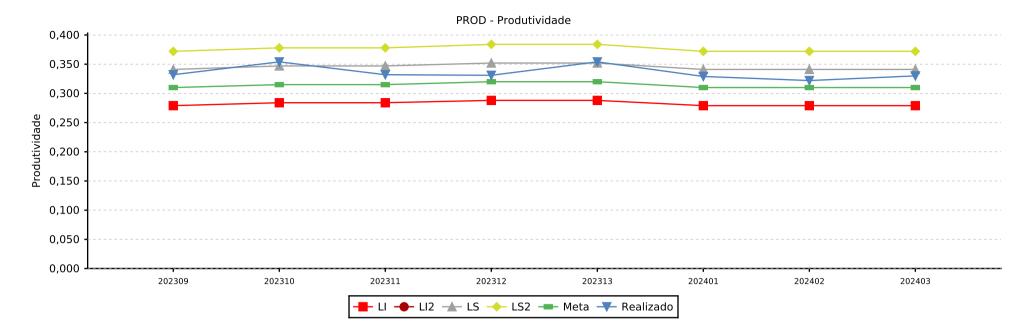


	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
Realizado	0,332	0,354	0,332	0,331	0,354	0,329	0,322	0,330
Meta	0,310	0,315	0,315	0,320	0,320	0,310	0,310	0,310
LS2	0,372	0,378	0,378	0,384	0,384	0,372	0,372	0,372
LS	0,341	0,347	0,347	0,352	0,352	0,341	0,341	0,341
LI2								
LI	0,279	0,284	0,284	0,288	0,288	0,279	0,279	0,279

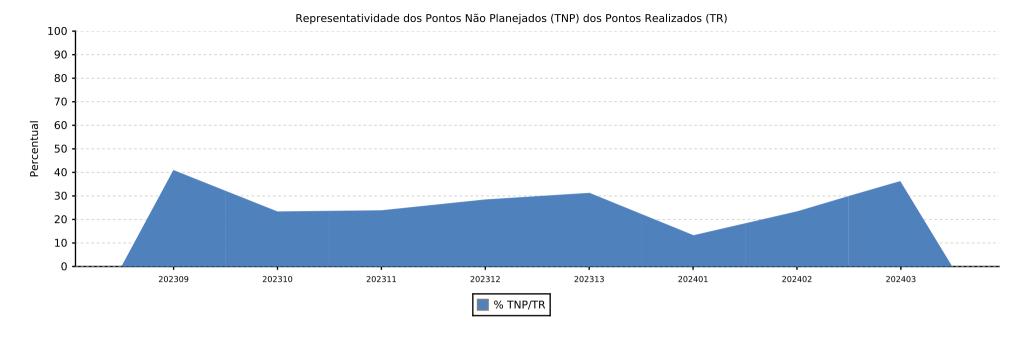


	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
TR - Pontos Realizados	162.5	205.5	134	133.5	133	151.5	153.5	178
TNP - Pontos Não Planejados	66.5	48	32	38	41.5	20	36	64.5
% TNP/TR	41,0	23,4	23,9	28,5	31,3	13,3	23,5	36,3

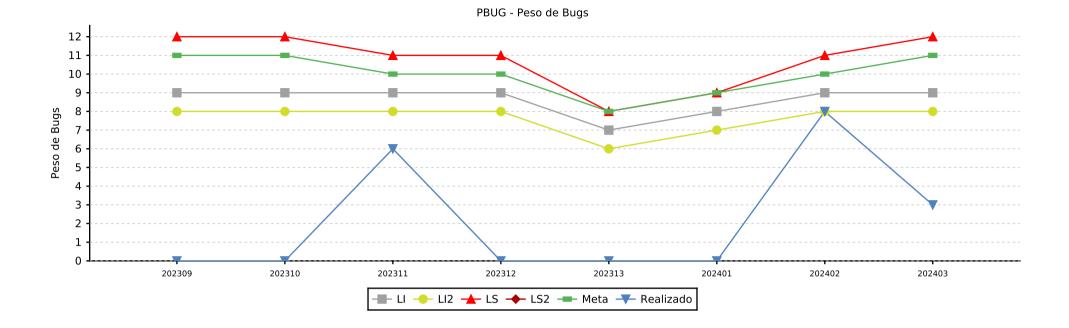


	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
Realizado	0	0	6	0	0	0	8	3
Meta	11	11	10	10	8	9	10	11
LS2								
LS	12	12	11	11	8	9	11	12
LI2	8	8	8	8	6	7	8	8
LI	9	9	9	9	7	8	9	9
Pontos Entregues	162.5	205.5	134	133.5	133	151.5	153.5	178
% PBUG / TR	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	5,22	1,69

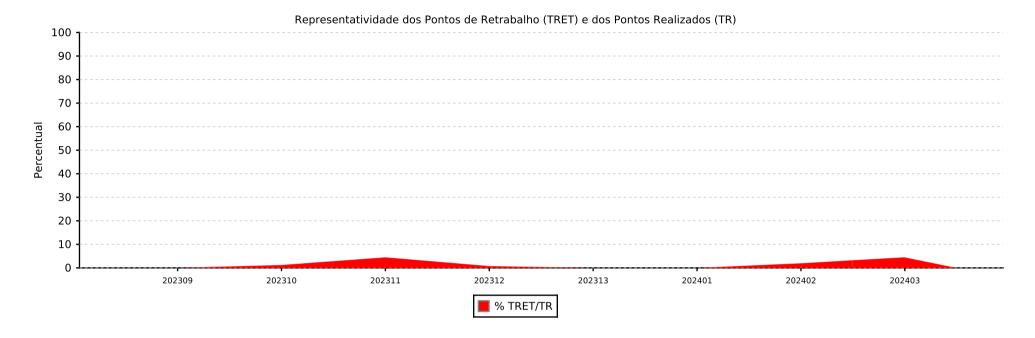


	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
TR - Pontos Realizados	162.5	205.5	134	133.5	133	151.5	153.5	178
TRET - Pontos de Retrabalho	0	2.5	6	1	0	0	3	8
% TRET/TR	0,0	1,2	4,5	0,7	0,0	0,0	2,0	4,5

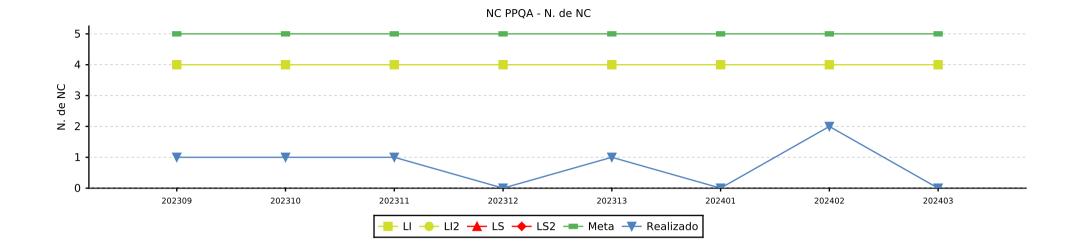


	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
Realizado	1	1	1	0	1	0	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

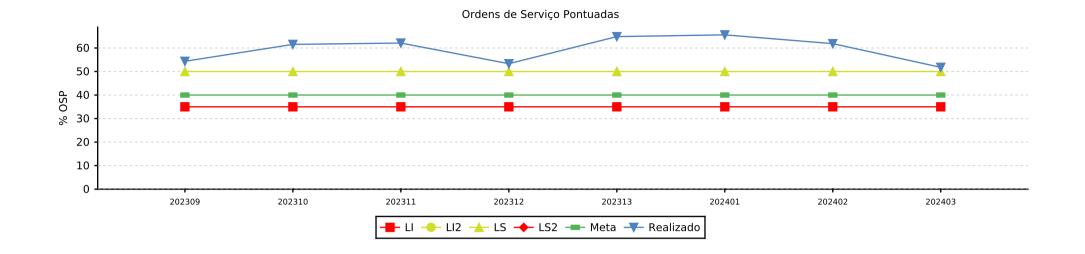

	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
Realizado	54.35	61.54	62.11	53.33	64.84	65.59	61.86	51.79
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

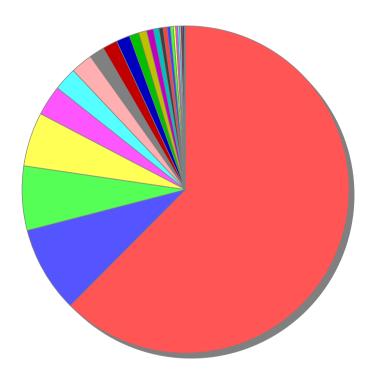

- Desenvolvimento [62.46%]
- Analise de Sistema [8.52%]
- Ausencia [6.35%]
- Treinamento [5.34%]
- Daily Scrum [2.99%]
- Cafe [2.3%]
- Code Review [2.16%]
- Ginastica Laboral [1.5%]
- Retrospectiva [1.46%]
- Compilacao de sistemas [1.35%]
- Sprint Planning 1 [0.95%]
- Outros [0.8%]
- Reuniao [0.67%]
- Clean Code [0.55%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.4%]
- Correção de Erros Interno [0.4%]
- Preparando ambiente [0.31%]
- Sprint Planning 2 [0.3%]
- Sizing [0.22%]
- Verificando apontamento [0.2%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [0.18%]
- Correcao de Erros Externo [0.15%]
- Auxilio suporte [0.15%]
- Planejamento de Projeto [0.13%]
- Atestado [0.06%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.05%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.04%]

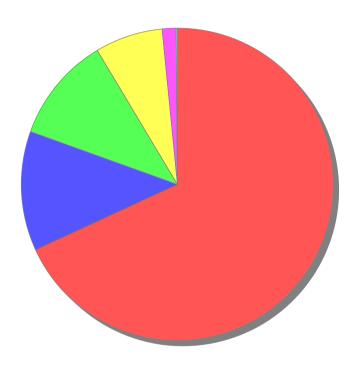

- Desenvolvimento de Requisitos [64.2%]
- Diversos\* [11.66%]
- Gestao de Requisitos [10.3%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.61%]
- Gerencia de Configuracao [1.35%]
- Planejamento de Projeto [0.13%]
