

INDICADORES DA SPRINT

		202	301			202	302	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	80h00m	88h00m	88h00m	132h00m	174h30m	176h00m	176h00m	112h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	100h58m	97h17m	74h42m	178h02m	177h17m	173h42m	185h27m	110h40m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	67h25m	75h25m	75h25m	112h20m	149h35m	151h05m	151h05m	90h25m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	57h04m	39h45m	44h52m	142h36m	147h13m	135h07m	165h06m	84h00m
05. Pontos planejados	22,5	19,0	26,0	33,5	36,5	34,5	29,5	0,0
06. Pontos entregues	14	19	13,5	37	52	55	54	28,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	12,50	18,00	13,00	33,50	33,50	44,50	23,00	26,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	1,50	1,00	0,50	3,50	18,50	10,50	31,00	2,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	2	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	4	4	1	6	12	9	8	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	2	3	1	4	12	12	8	4
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	1	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0
15. Produtividade planejada	0,334	0,252	0,345	0,299	0,245	0,229	0,196	00000
16. Produtividade realizada	0,246	0,478	0,301	0,260	0,354	0,408	0,328	0,340
17. % Pontos NP / Pontos entregues	10,8	5,3	3,8	9,5	35,6	19,1	57,5	8,8

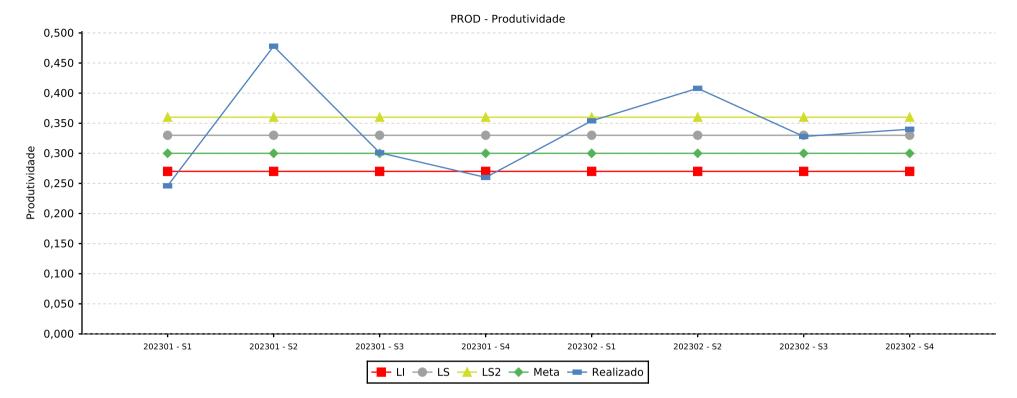


		202	301		202302					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,246	0,478	0,301	0,260	0,354	0,408	0,328	0,340		
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300		
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360		
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330		
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270		

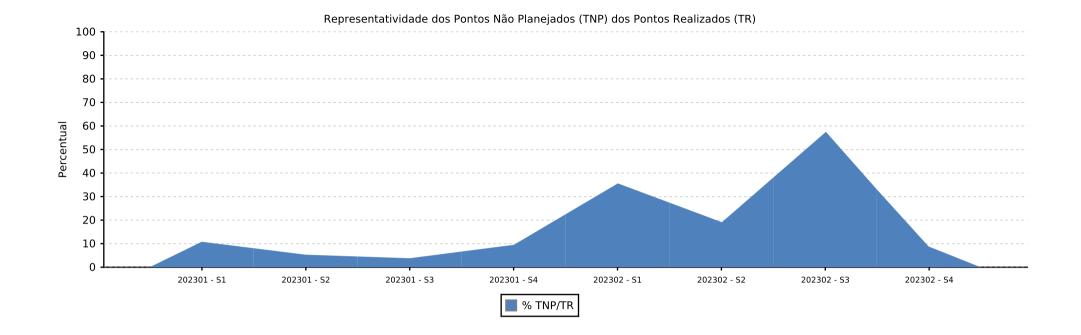


		202	301			202	302	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	14	19	13.5	37	52	55	54	28.5
TNP - Pontos Não Planejados	1.5	1	0.5	3.5	18.5	10.5	31	2.5
% TNP/TR	10,8	5,3	3,8	9,5	35,6	19,1	57,5	8,8

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

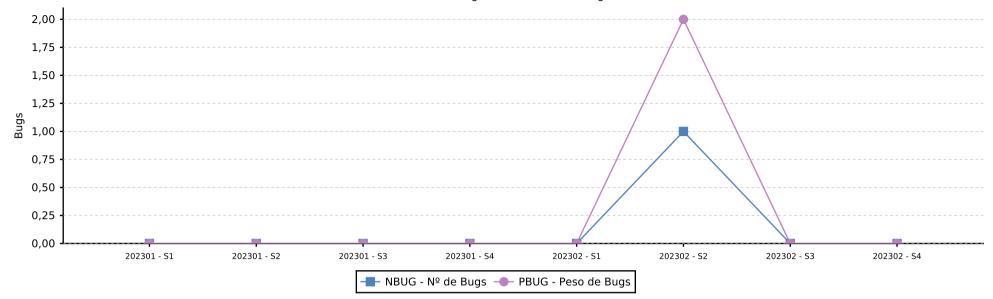

		202	301			202	302	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	1	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	2	0	0
Pontos Entregues	14	19	13.5	37	52	55	54	28.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00




		202	301			202	302	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	14	19	13.5	37	52	55	54	28.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	129,75	135,67	129,75	113,55	129,75	142,98	69,33	73,05	458,58	465,25	101,5 %
Ausencia	0	3,57	0	8,03	0	5,22	0	7,25	0	24,07	0,0 %
Reuniao	1	1	1	1,5	1	1,42	1	6,33	4	10,25	256,2 %
Retrospectiva	4	2,75	4	4,92	4	4,83	4	3,92	16	16,42	102,6 %
Code Review	1	0,23	1	0	1	0	1	3,65	4	3,88	97,0 %
Sprint Planning 1	4,5	2,28	6	3,73	6	2,58	6	3,42	22,5	12,01	53,4 %
Cafe	5	5,08	5	4,33	5	4,25	3	2,75	18	16,41	91,2 %
Analise de O.S	0	0,5	0	0	0	0	0	2,5	0	3	0,0 %
Analise de Sistema	12	17,87	12	19,85	12	4,83	12	2,3	48	44,85	93,4 %
Sprint Planning 2	4	0,33	4	1,67	4	1,08	4	1,5	16	4,58	28,6 %
Ginastica Laboral	2,67	1,17	2,67	2,15	2,67	2,17	1,33	1,22	9,34	6,71	71,8 %
Daily Scrum	4	4,03	4	5,33	4	3,52	2	1	14	13,88	99,1 %
Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,5	0,83	2,25	0,83	36,9 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	1,75	0	0,5	0	2,25	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	1,13	0	2,75	0	0	0	0,28	0	4,16	0,0 %
Outros	0,58	0,27	0,58	2,72	0,58	0,22	0,58	0,17	2,32	3,38	145,7 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0,38	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	1	1,02	1	3,17	1	10,1	1	0	4	14,29	357,2 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Clean Code	1,08	0	1,08	0	1,08	0	1,08	0	4,32	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	6	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	174,5	177,28	176	173,7	176	185,45	111,99	110,67	638,49	647,1	101,3 %

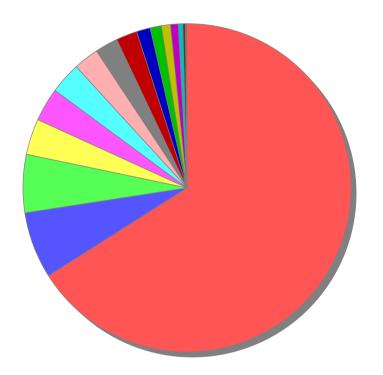

- Desenvolvimento [66.01%]
- Ausencia [6.55%]
- Reuniao [5.72%]
- Retrospectiva [3.54%]
- Code Review [3.3%]
- Sprint Planning 1 [3.09%]
- Cafe [2.48%]
- Analise de O.S [2.26%]
- Analise de Sistema [2.08%]
- Sprint Planning 2 [1.36%]
- Ginastica Laboral [1.1%]
- Daily Scrum [0.9%]
- Planejamento de Projeto [0.75%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.45%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.25%]
- Outros [0.15%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	133	137,82	133	119,47	133	154,83	72,58	73,83	471,58	485,95	103,0 %
DIV - Diversos*		9,5	11,08	9,5	18,73	9,5	13,27	6,17	17,72	34,67	60,8	175,4 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	9	7,02	9	10,25	9	8,35	7	8,57	34	34,19	100,6 %
REQM - Gestao de Requisitos		22	20,87	23,5	25,25	23,5	8,5	23,5	7,22	92,5	61,84	66,9 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,5	0,83	2,25	0,83	36,9 %
CM - Gerencia de Configuração		0,5	0	0,5	0	0,5	0	1	0	2,5	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	174,25	176,79	175,75	173,7	175,75	184,95	111,75	108,17	637,5	643,61	101,0 %

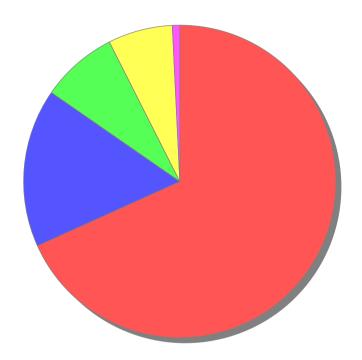


- Desenvolvimento de Requisitos [68.25%]
- Diversos* [16.38%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.92%]
- Gestao de Requisitos [6.67%]
- Planejamento de Projeto [0.77%]

INDICADORES DO PROJETO


	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302
01. Horas planejadas de todas atividades	616h00m	560h00m	559h24m	475h12m	423h24m	336h00m	388h00m	638h30m
02. Horas realizadas de todas atividades	633h23m	485h55m	564h23m	465h13m	527h22m	459h02m	450h59m	647h06m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	488h20m	432h20m	472h44m	388h32m	344h39m	287h00m	330h35m	542h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	455h30m	263h03m	400h24m	289h30m	380h11m	315h48m	284h17m	531h26m
05. Pontos planejados para o projeto	146,0	129,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	163,0
06. Pontos planejados	142,5	105,5	160,5	120,0	107,5	101,5	101,0	100,5
07. Pontos entregues	123,5	90,5	135	92,5	128	131,5	83,5	189,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	102,00	67,50	126,00	48,50	89,50	95,00	77,00	127,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	21,50	23,00	9,00	44,00	38,50	36,50	6,50	62,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	1	0	0	0	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	25	18	33	14	26	22	15	35
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	9	9	3	22	13	28	10	36
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	1	0	0	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m							
15. Pontos de retrabalho	1	0	0	1	0	1,5	0	1
16. Produtividade planejada	0,292	0,245	0,340	0,309	0,312	0,354	0,306	0,186
17. Produtividade realizada	0,272	0,345	0,338	0,320	0,337	0,417	0,294	0,357
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	84,6	70,2	0	72,3	0	0	0	116,3
19. % Pontos NP / Pontos entregues	17,5	25,5	6,7	47,6	30,1	27,8	7,8	33

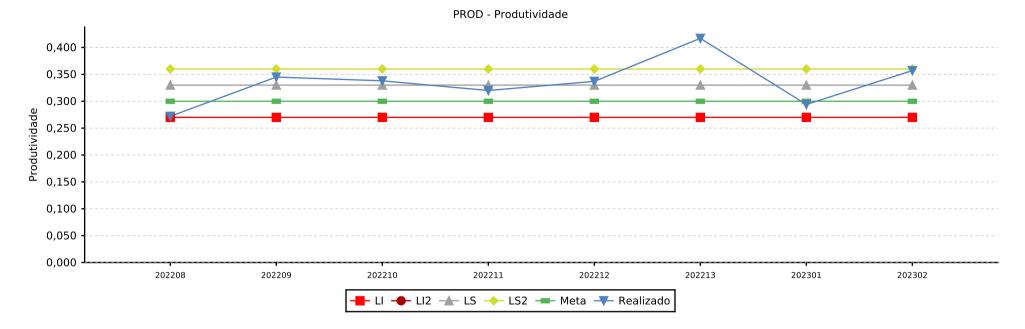


	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302
Realizado	0,272	0,345	0,338	0,320	0,337	0,417	0,294	0,357
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270

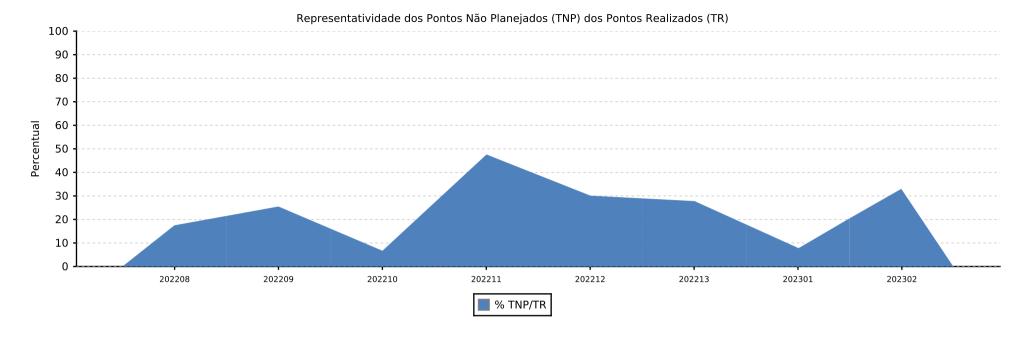


	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302
TR - Pontos Realizados	123.5	90.5	135	92.5	128	131.5	83.5	189.5
TNP - Pontos Não Planejados	21.5	23	9	44	38.5	36.5	6.5	62.5
% TNP/TR	17,5	25,5	6,7	47,6	30,1	27,8	7,8	33,0

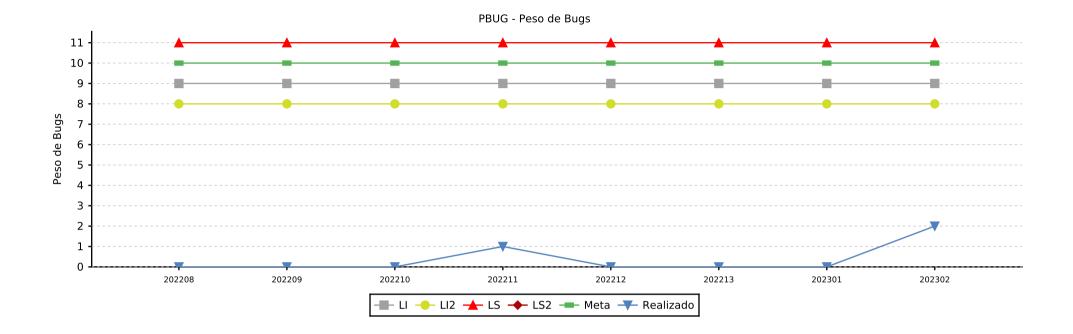


	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302
Realizado	0	0	0	1	0	0	0	2
Meta	10	10	10	10	10	10	10	10
LS2								
LS	11	11	11	11	11	11	11	11
LI2	8	8	8	8	8	8	8	8
LI	9	9	9	9	9	9	9	9
Pontos Entregues	123.5	90.5	135	92.5	128	131.5	83.5	189.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	1,06




	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302
TR - Pontos Realizados	123.5	90.5	135	92.5	128	131.5	83.5	189.5
TRET - Pontos de Retrabalho	1	0	0	1	0	1.5	0	1
% TRET/TR	0,8	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,5

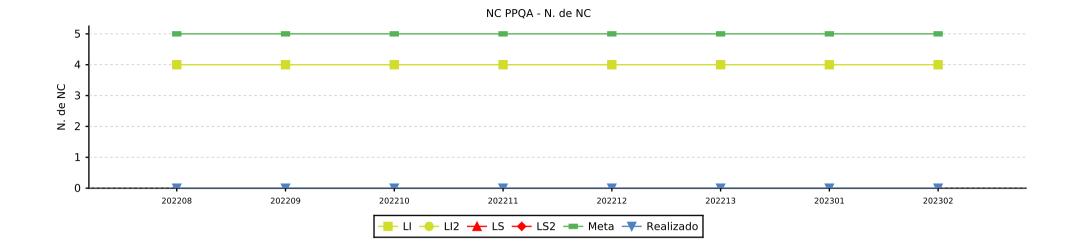


	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301	202302
Realizado								
Meta	0	0	0	0	0	0	0	0
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	0	0	0	0	0	0	0	0
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	0	0	0	0	0	0	0	0

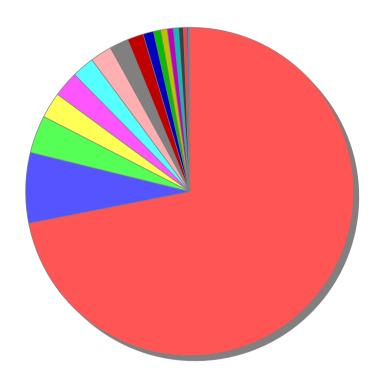

- Desenvolvimento [71.9%]
- Analise de Sistema [6.93%]
- Ausencia [3.72%]
- Cafe [2.54%]
- Retrospectiva [2.54%]
- Correção de Erros Interno [2.21%]
- Daily Scrum [2.14%]
- Sprint Planning 1 [1.86%]
- Reuniao [1.58%]
- Ginastica Laboral [1.04%]
- Sprint Planning 2 [0.71%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.64%]
- Code Review [0.6%]
- Outros [0.52%]
- Analise de O.S [0.46%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.35%]
- Planejamento de Projeto [0.13%]
- Treinamento [0.08%]
- Preparando ambiente [0.06%]

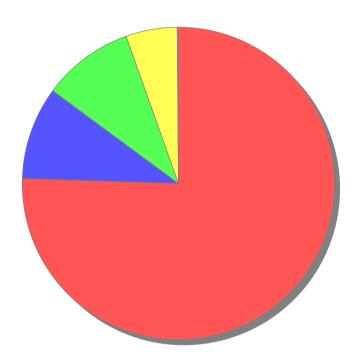

- Desenvolvimento de Requisitos [75.1%]
- Gestao de Requisitos [9.55%]
- Diversos* [9.4%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.28%]
- Planejamento de Projeto [0.13%]
