

INDICADORES DA SPRINT

		202	208			202	209	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	176h00m	176h00m	132h00m	132h00m	108h00m	132h00m	176h00m	144h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	181h40m	184h27m	134h17m	132h59m	109h46m	135h29m	129h40m	111h00m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	138h35m	139h35m	105h05m	105h05m	80h05m	105h05m	139h35m	107h35m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	153h33m	111h25m	118h35m	71h57m	76h04m	49h54m	58h46m	78h19m
05. Pontos planejados	41,0	44,0	29,0	28,5	27,0	26,0	24,5	28,0
06. Pontos entregues	41	25	36,5	21	26,5	18,5	23,5	22
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	33,00	24,50	25,00	19,50	20,00	16,00	12,50	19,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	8,00	0,50	11,50	1,50	6,50	2,50	11,00	3,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	5	8	6	6	6	4	5	3
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	1	1	4	3	3	2	3	1
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,296	0,316	0,276	0,272	0,338	0,248	0,176	0,261
16. Produtividade realizada	0,268	0,225	0,308	0,292	0,349	0,371	0,400	0,281
17. % Pontos NP / Pontos entregues	19,6	2	31,6	7,2	24,6	13,6	46,9	13,7

PROD - Produtividade

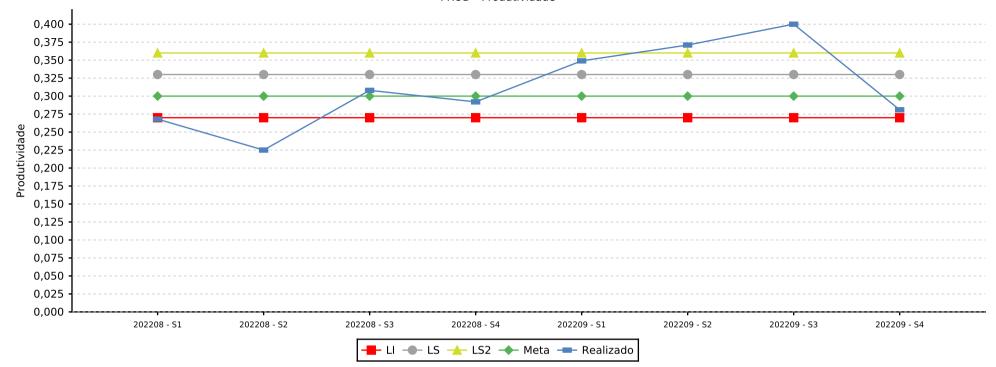


		202	208		202209				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
Realizado	0,268	0,225	0,308	0,292	0,349	0,371	0,400	0,281	
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	

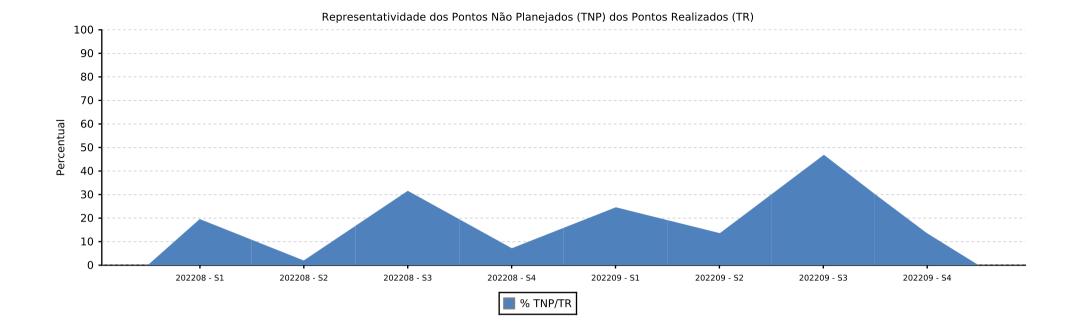


		202	208		202209				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
TR - Pontos Realizados	41	25	36.5	21	26.5	18.5	23.5	22	
TNP - Pontos Não Planejados	8	0.5	11.5	1.5	6.5	2.5	11	3	
% TNP/TR	19,6	2,0	31,6	7,2	24,6	13,6	46,9	13,7	

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

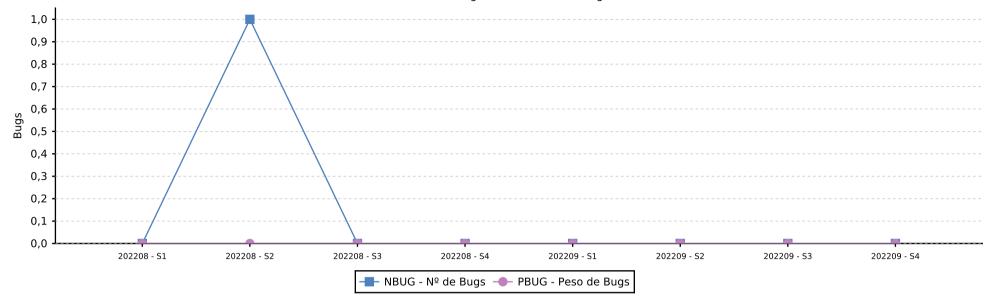

		202	208		202209				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	0	1	0	0	0	0	0	0	
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pontos Entregues	41	25	36.5	21	26.5	18.5	23.5	22	
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

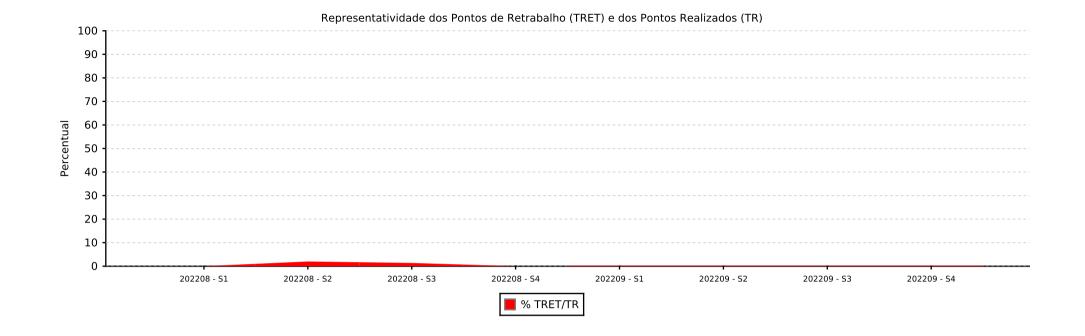


		202	208		202209				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
TR - Pontos Realizados	41	25	36.5	21	26.5	18.5	23.5	22	
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	
% TRET/TR	0,0	2,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	61,83	65,2	86,83	37,8	115,58	51,05	82,08	54,2	346,32	208,25	60,1 %
Correção de Erros Interno	0	0	0	0	0	0	0	17,15	0	17,15	0,0 %
Ausencia	0	4,92	0	5,28	0	2,27	0	12,57	0	25,04	0,0 %
Analise de Sistema	10	19,7	10	28,77	13	24,6	13	8,33	46	81,4	177,0 %
Outros	0,5	0	0,5	1,15	0,5	0	0,5	3,02	2	4,17	208,5 %
Daily Scrum	4	1,8	4	3,98	5,33	3,38	5,33	2,83	18,66	11,99	64,3 %
Cafe	3,75	3	3,75	1,75	5	2,25	5	2,75	17,5	9,75	55,7 %
Curso/Palestra	6	0	6	40,18	6	37,17	6	1,43	24	78,78	328,2 %
Clean Code	0,75	0	0,75	0,78	1	0	1	1,33	3,5	2,11	60,3 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	1,3	0	1,3	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	2,5	0	0	0	1,27	0	3,77	0,0 %
Code Review	0,33	1,9	0,33	1,88	0,67	1,43	0,67	1,18	2	6,39	319,5 %
Retrospectiva	2	2,5	2	2	2,67	1,17	2,67	1,17	9,34	6,84	73,2 %
Sprint Planning 1	4,5	3	4,5	3,92	6	0,83	6	1,02	21	8,77	41,8 %
Ginastica Laboral	2	0,95	2	0,73	2,67	1	2,67	0,83	9,34	3,51	37,6 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	0,6	0	0,75	0	2,33	0	0,62	0	4,3	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0,25	0	0,25	0	0,5	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sprint Planning 2	4,5	0,83	4,5	0,67	6	0	6	0	21	1,5	7,1 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Planejamento de Projeto	1	2,13	1	0	1	0	2	0	5	2,13	42,6 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Sizing	4	0,67	4	0	8	0	8	0	24	0,67	2,8 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0,82	0	0	0	0,82	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Reuniao	1	2,57	0	3,33	0	0,83	0	0	1	6,73	673,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0,53	0	0	0	0,53	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,5	0	1,5	0	2	0	2	0	7	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	107,99	109,77	131,99	135,47	176	129,66	144	111	559,98	485,9	86,8 %

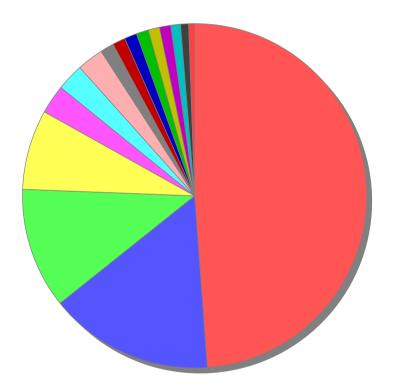

- Desenvolvimento [48.83%]
- Correção de Erros Interno [15.45%]
- Ausencia [11.32%]
- O Analise de Sistema [7.5%]
- Outros [2.72%]
- Daily Scrum [2.55%]
- Cafe [2.48%]
- Curso/Palestra [1.29%]
- Clean Code [1.2%]
- Treinamento [1.17%]
- Preparando ambiente [1.14%]
- Code Review [1.06%]
- Retrospectiva [1.05%]
- Sprint Planning 1 [0.92%]
- Ginastica Laboral [0.75%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.56%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	64,42	65,8	89,42	39,33	118,92	53,38	85,42	73,3	358,18	231,81	64,7 %
DIV - Diversos*		7,25	11,43	6,25	12,25	8,42	7,17	8,42	19,17	30,34	50,02	164,9 %
REQM - Gestao de Requisitos		23	24,2	23	35,85	33	25,43	33	10,62	112	96,1	85,8 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	6,33	6,2	6,33	7,87	8,67	5,98	8,67	5,18	30	25,23	84,1 %
OT - Treinamento na Organizacao		6	0	6	40,18	6	37,17	6	1,43	24	78,78	328,2 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
PP - Planejamento de Projeto		1	2,13	1	0	1	0	2	0	5	2,13	42,6 %
	Total Geral	108	109,76	132	135,48	176,01	129,13	144,01	109,7	560,02	484,07	86,4 %

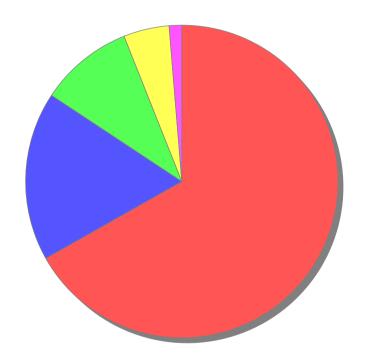

- Desenvolvimento de Requisitos [66.82%]
- Diversos* [17.47%]
- Gestao de Requisitos [9.68%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [4.72%]
- Treinamento na Organizacao [1.3%]


INDICADORES DO PROJETO

	202207	202208	202209
01. Horas planejadas de todas atividades	0h00m	616h00m	560h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	33h38m	633h23m	485h55m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	0h00m	488h20m	432h20m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	20h04m	455h30m	263h03m
05. Pontos planejados para o projeto	0,0	146,0	129,0
06. Pontos planejados	0,0	142,5	105,5
07. Pontos entregues	64	123,5	90,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	0,50	102,00	67,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	63,50	21,50	23,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	1	25	18
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	9	9
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	1	0
16. Produtividade planejada	0	0,292	0,245
17. Produtividade realizada	3,189	0,272	0,345
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	0	84,6	70,2
19. % Pontos NP / Pontos entregues	99,3	17,5	25,5

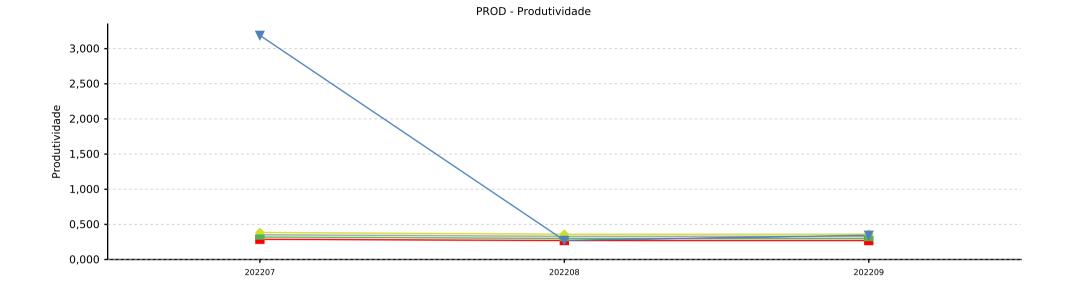


🖶 LI <table-cell-rows> LI2 📥 LS 🔶 LS2 🖚 Meta 🔫 Realizado


	202207	202208	202209
Realizado	3,189	0,272	0,345
Meta	0,320	0,300	0,300
LS2	0,384	0,360	0,360
LS	0,352	0,330	0,330
LI2			
LI	0,288	0,270	0,270

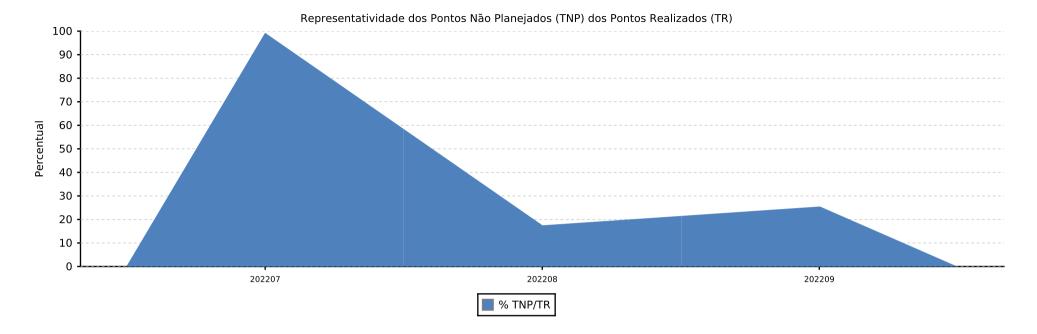


	202207	202208	202209
TR - Pontos Realizados	64	123.5	90.5
TNP - Pontos Não Planejados	63.5	21.5	23
% TNP/TR	99,3	17,5	25,5

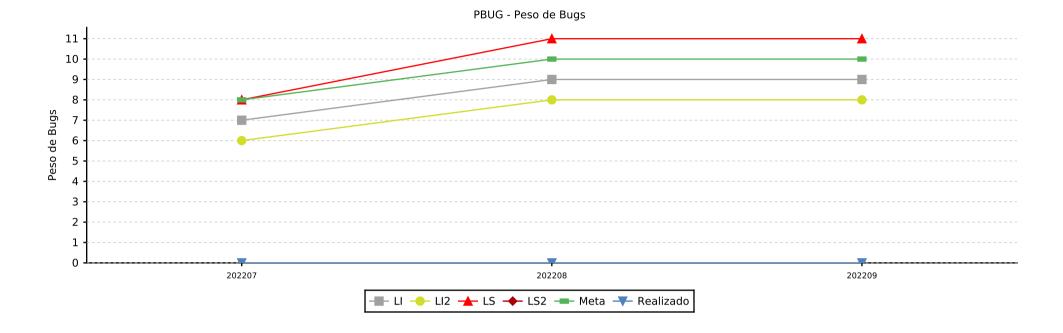


	202207	202208	202209
Realizado	0	0	0
Meta	8	10	10
LS2			
LS	8	11	11
LI2	6	8	8
LI	7	9	9
Pontos Entregues	64	123.5	90.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00

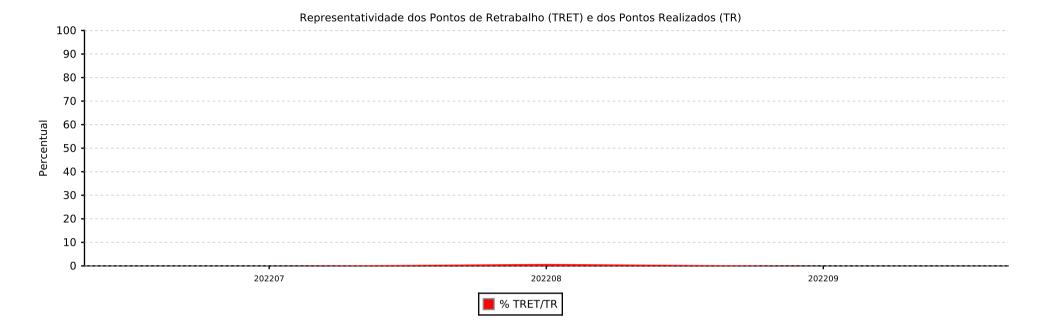


	202207	202208	202209
TR - Pontos Realizados	64	123.5	90.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1	0
% TRET/TR	0,0	0,8	0,0



	202207	202208	202209
Realizado	0	0	0
Meta	5	5	5
LS2			
LS			
LI2			
LI	4	4	4

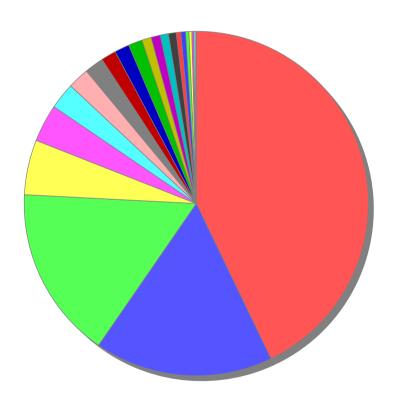

- Desenvolvimento [42.86%]
- Analise de Sistema [16.75%]
- Curso/Palestra [16.21%]
- Ausencia [5.15%]
- Ocrreção de Erros Interno [3.53%]
- Daily Scrum [2.47%]
- Cafe [2.01%]
- Sprint Planning 1 [1.8%]
- Retrospectiva [1.41%]
- Reuniao [1.39%]
- Code Review [1.32%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.88%]
- Outros [0.86%]
- Preparando ambiente [0.78%]
- Ginastica Laboral [0.72%]
- Planejamento de Projeto [0.44%]
- Clean Code [0.44%]
- Sprint Planning 2 [0.31%]
- Treinamento [0.27%]
- Atividades Gerenciais [0.17%]
- Sizing [0.14%]
- Analise de O.S [0.11%]

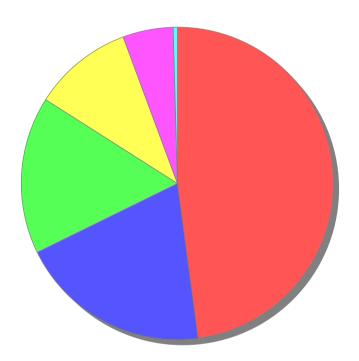

- Desenvolvimento de Requisitos [47.71%]
- Gestao de Requisitos [19.78%]
- Treinamento na Organizacao [16.21%]
- Diversos* [10.29%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.19%]
- O Planejamento de Projeto [0.44%]
