

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	501			202	502	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	185h36m	264h00m	264h00m	308h00m	264h00m	264h00m	264h00m	264h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	258h08m	263h05m	277h45m	303h32m	305h23m	302h42m	301h21m	303h47m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	147h51m	226h25m	226h25m	264h25m	227h40m	226h35m	225h45m	226h35m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	143h41m	211h24m	182h19m	209h43m	238h28m	256h31m	219h31m	252h01m
05. Pontos planejados	35,5	54,0	50,5	57,0	65,5	67,0	69,5	74,0
06. Pontos entregues	46	66,5	55,5	71,5	78	86	78,5	86,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	34,50	53,00	35,50	59,00	74,50	65,50	53,00	69,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	11,50	13,50	20,00	12,50	3,50	20,50	25,50	17,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	3	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	13	17	12	14	26	18	21	12
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	9	6	10	6	4	13	13	10
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	2	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	1	0	0,5	3	0	0
15. Produtividade planejada	0,241	0,239	0,224	0,216	0,288	0,296	0,308	0,327
16. Produtividade realizada	0,321	0,315	0,305	0,341	0,328	0,336	0,358	0,344
17. % Pontos NP / Pontos entregues	25	20,4	36,1	17,5	4,5	23,9	32,5	20,3

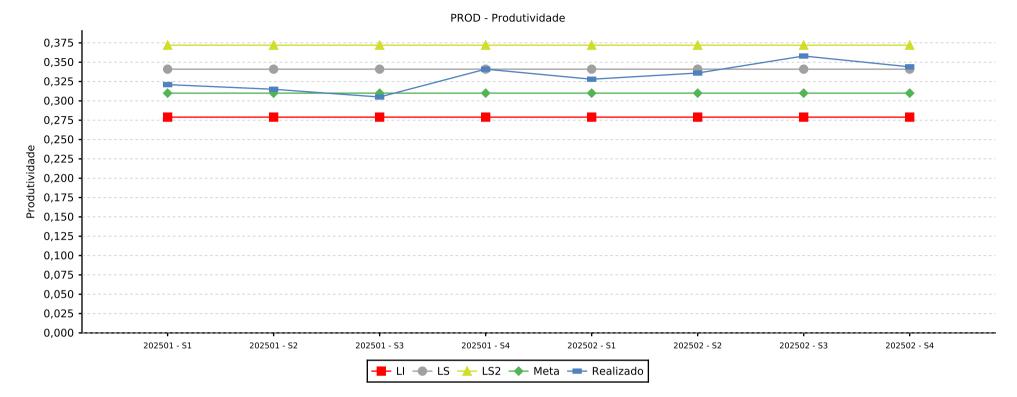


		202	501		202502					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,321	0,315	0,305	0,341	0,328	0,336	0,358	0,344		
Meta	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310		
LS2	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372		
LS	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341		
LI	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279		

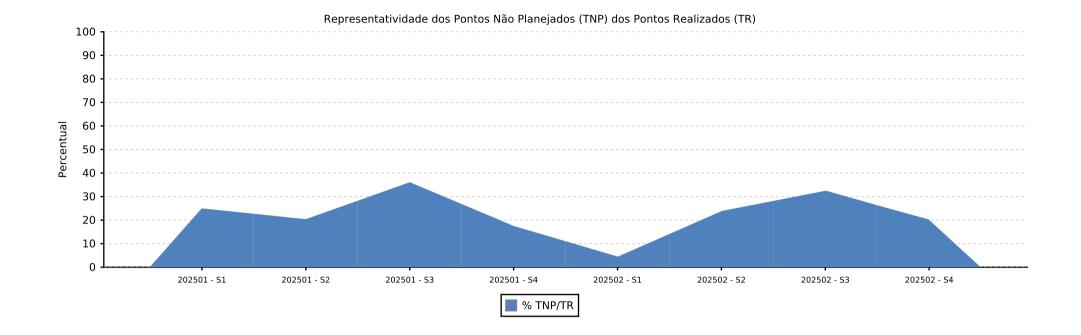


		202	501			202	502	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	46	66.5	55.5	71.5	78	86	78.5	86.5
TNP - Pontos Não Planejados	11.5	13.5	20	12.5	3.5	20.5	25.5	17.5
% TNP/TR	25,0	20,4	36,1	17,5	4,5	23,9	32,5	20,3

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

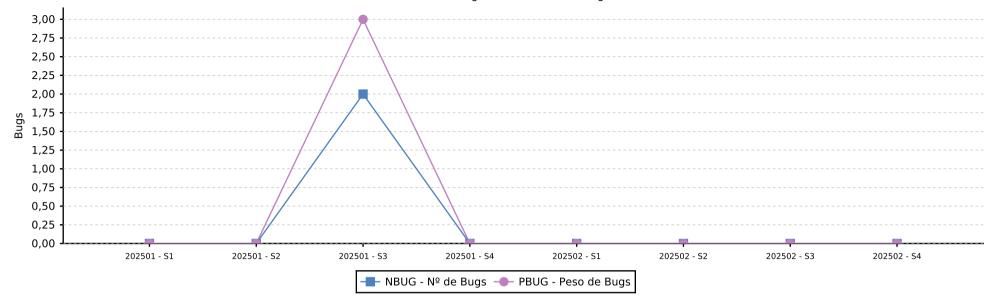

		202	501			202	502	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	2	0	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	3	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	46	66.5	55.5	71.5	78	86	78.5	86.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

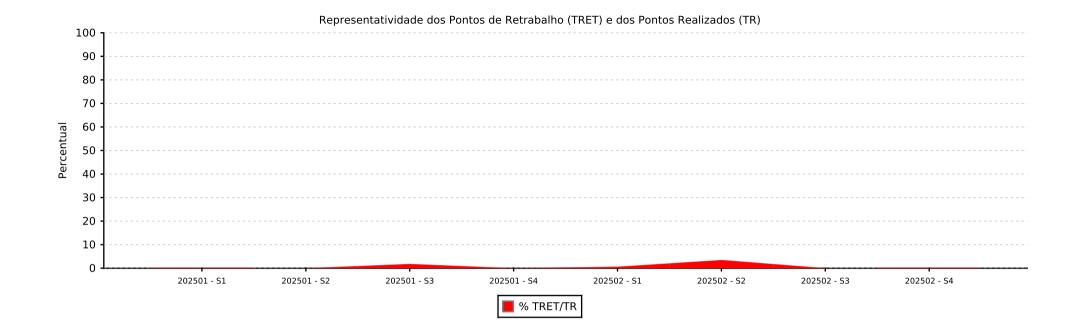


		202	501			202	502	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	46	66.5	55.5	71.5	78	86	78.5	86.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	1	0	0.5	3	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	1,8	0,0	0,6	3,5	0,0	0,0

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	193,08	200,88	188	228,02	187,17	195,07	185,75	231,7	754	855,67	113,5 %
Analise de Sistema	17,5	35,98	17,5	21,45	17,5	48,12	17,5	29,52	70	135,07	193,0 %
Cafe	6,75	7,5	7,5	8,25	7,5	8	7,5	7,5	29,25	31,25	106,8 %
Daily Scrum	11,5	9,85	12	9,5	12	8,02	12	7,15	47,5	34,52	72,7 %
Sprint Planning 1	7,5	8	9	8,83	9	3,5	9	4,5	34,5	24,83	72,0 %
Ginastica Laboral	3,83	4,03	4,17	4,32	4,17	4	4,17	4,3	16,34	16,65	101,9 %
Retrospectiva	5	5,08	6	5,5	6	5,33	6	3,5	23	19,41	84,4 %
Reuniao	1	0	1	0	1	2,28	1	2,33	4	4,61	115,2 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	1,83	0,68	1,83	269,1 %
Verificando apontamento	0	1,42	0	1,92	0	1,83	0	1,75	0	6,92	0,0 %
Correção de Erros Interno	2,5	7,57	2,5	0	2,5	0	2,5	1,67	10	9,24	92,4 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,25	0	1,42	0	0,4	0	1,48	0	3,55	0,0 %
Clean Code	1,5	2,25	1,5	0,67	1,5	1,08	1,5	1,33	6	5,33	88,8 %
Ausencia	0	10,37	0	3,83	0	5,73	0	1,25	0	21,18	0,0 %
Sprint Planning 2	5	4	6	3,33	6	1,17	6	1,17	23	9,67	42,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	0	0	0,33	0	4,92	0	1	0	6,25	0,0 %
Code Review	2,25	1,45	2,25	2,87	2,25	5,02	2,25	0,97	9	10,31	114,6 %
Outros	0,17	2,5	0,17	0	1	2,53	0,17	0,83	1,51	5,86	388,1 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	2,5	1,67	2,5	2,13	2,5	3,92	2,5	0	10	7,72	77,2 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	1,75	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,33	0	1,33	0	1,33	0	1,33	0	5,32	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	0,83	0,25	0,33	0,25	0,43	2	0	2,75	1,59	57,8 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Ger	al 264	305,38	264,01	302,7	264,01	301,35	264,01	303,78	1.056,03	1.213,21	114,9 %

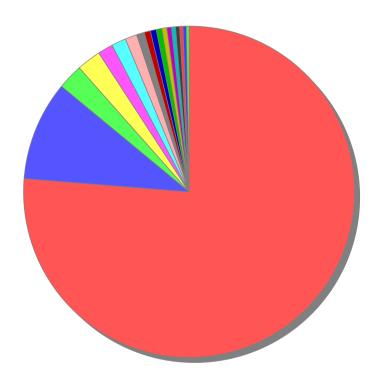

- Desenvolvimento [76.27%]
- Analise de Sistema [9.72%]
- Cafe [2.47%]
- Daily Scrum [2.35%]
- Sprint Planning 1 [1.48%]
- Ginastica Laboral [1.42%]
- Retrospectiva [1.15%]
- Reuniao [0.77%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.6%]
- Verificando apontamento [0.58%]
- Correção de Erros Interno [0.55%]
- Atraso / Saida antecipada [0.49%]
- Clean Code [0.44%]
- Ausencia [0.41%]
- Sprint Planning 2 [0.39%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.33%]
- Code Review [0.32%]
- Outros [0.27%]

## HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	198,58	212,45	193,5	229,02	192,67	201,07	191,25	235,7	776	878,24	113,2 %
REQM - Gestao de Requisitos		32	47,98	34,5	33,62	34,5	52,78	34,5	35,18	135,5	169,56	125,1 %
DIV - Diversos*		11,92	24,4	13	16,4	13,83	22,55	13	18,05	51,75	81,4	157,3 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	18,75	16,38	20,25	17,87	20,25	18,37	20,25	11,62	79,5	64,24	80,8 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0,83	0,25	0,33	0,25	0,43	2	0	2,75	1,59	57,8 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		2,5	1,67	2,5	2,13	2,5	3,92	3	0	10,5	7,72	73,5 %
	Total Geral	264	303,71	264	299,37	264	299,12	264	300,55	1.056	1.202,75	113,9 %

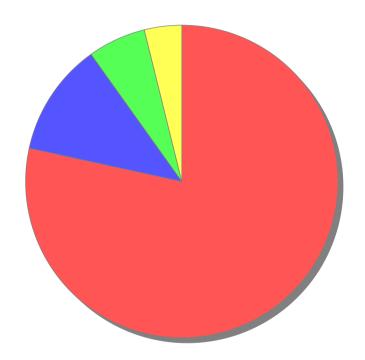


- Desenvolvimento de Requisitos [78.42%]
- Gestao de Requisitos [11.71%]
- Diversos\* [6.01%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [3.87%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
01. Horas planejadas de todas atividades	1232h00m	1352h00m	1408h00m	1084h00m	1048h00m	1116h44m	1021h36m	1056h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1258h14m	1361h25m	1321h10m	1128h07m	1140h44m	1170h46m	1102h30m	1213h13m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1049h00m	1146h40m	1196h00m	920h50m	890h00m	946h39m	865h06m	906h35m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	991h50m	1088h53m	1008h14m	899h52m	826h05m	814h36m	747h07m	966h31m
05. Pontos planejados para o projeto	305,0	336,0	359,0	276,0	267,0	289,0	265,0	280,0
06. Pontos planejados	290,0	316,0	320,0	309,5	289,0	274,0	197,0	276,0
07. Pontos entregues	327,5	358,5	339	312,5	263	278	239,5	329
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	259,00	275,00	262,50	234,50	211,00	232,50	182,00	262,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	68,50	83,50	76,50	78,00	52,00	45,50	57,50	67,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	4	0	0	6	0	0	3	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	50	57	69	68	55	76	56	77
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	30	45	44	40	24	28	31	40
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	0	3	3	0	2	2	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h40m	0h00m	3h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	3,5	0	3,5	4	2,5	2	1	3,5
16. Produtividade planejada	0,277	0,276	0,268	0,337	0,325	0,290	0,228	0,305
17. Produtividade realizada	0,331	0,330	0,337	0,348	0,319	0,342	0,321	0,341
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	107,4	106,7	94,5	113,3	98,6	96,2	90,4	117,5
19. % Pontos NP / Pontos entregues	21	23,3	22,6	25	19,8	16,4	24,1	20,4

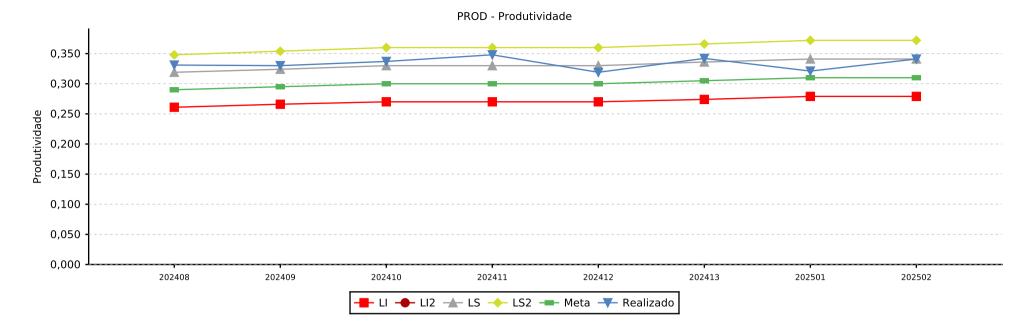


	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
Realizado	0,331	0,330	0,337	0,348	0,319	0,342	0,321	0,341
Meta	0,290	0,295	0,300	0,300	0,300	0,305	0,310	0,310
LS2	0,348	0,354	0,360	0,360	0,360	0,366	0,372	0,372
LS	0,319	0,324	0,330	0,330	0,330	0,336	0,341	0,341
LI2								
LI	0,261	0,266	0,270	0,270	0,270	0,274	0,279	0,279

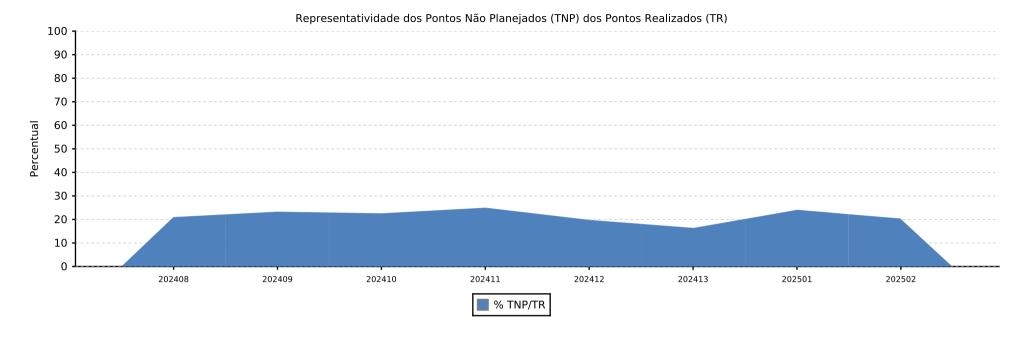


	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
TR - Pontos Realizados	327.5	358.5	339	312.5	263	278	239.5	329
TNP - Pontos Não Planejados	68.5	83.5	76.5	78	52	45.5	57.5	67
% TNP/TR	21,0	23,3	22,6	25,0	19,8	16,4	24,1	20,4

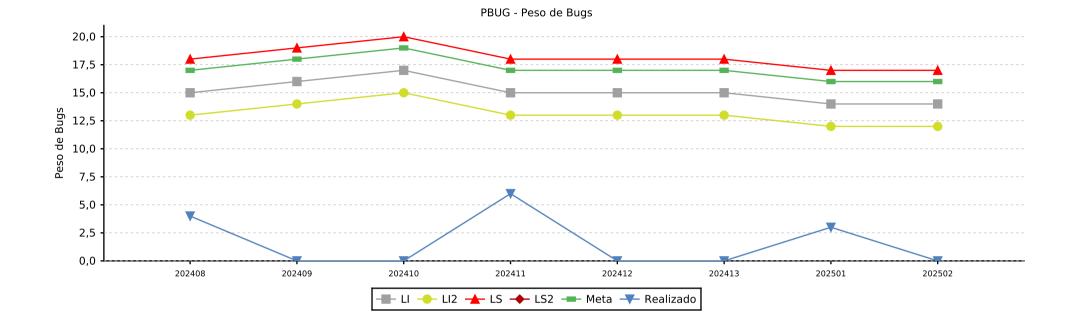


	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
Realizado	4	0	0	6	0	0	3	0
Meta	17	18	19	17	17	17	16	16
LS2								
LS	18	19	20	18	18	18	17	17
LI2	13	14	15	13	13	13	12	12
LI	15	16	17	15	15	15	14	14
Pontos Entregues	327.5	358.5	339	312.5	263	278	239.5	329
% PBUG / TR	1,23	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,26	0,00

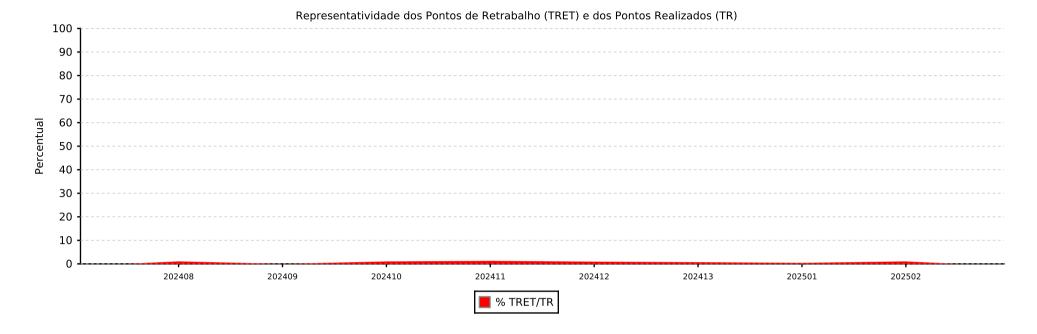


	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
TR - Pontos Realizados	327.5	358.5	339	312.5	263	278	239.5	329
TRET - Pontos de Retrabalho	3.5	0	3.5	4	2.5	2	1	3.5
% TRET/TR	1,1	0,0	1,0	1,3	1,0	0,7	0,4	1,1

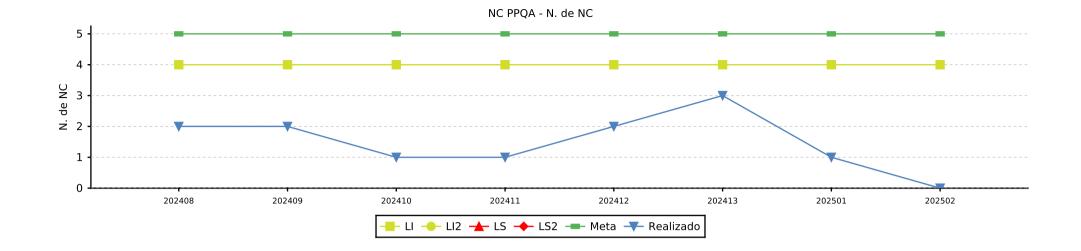


	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
Realizado	2	2	1	1	2	3	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

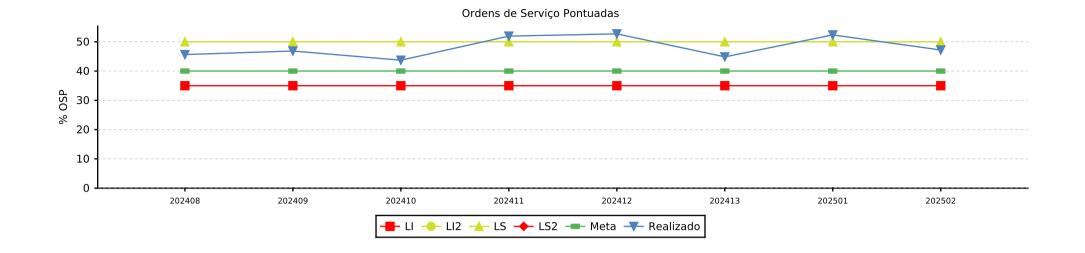

	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
Realizado	45.63	46.85	43.71	51.94	52.71	44.85	52.35	47.2
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

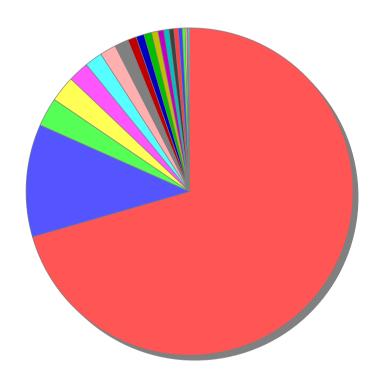

- Desenvolvimento [70.53%]
- Analise de Sistema [11.13%]
- Daily Scrum [2.85%]
- Cafe [2.58%]
- Sprint Planning 1 [2.05%]
- Ausencia [1.75%]
- Retrospectiva [1.6%]
- Ginastica Laboral [1.37%]
- Code Review [0.85%]
- Sprint Planning 2 [0.8%]
- Correção de Erros Interno [0.76%]
- Compilacao de sistemas [0.64%]
- Verificando apontamento [0.57%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.52%]
- Outros [0.48%]
- Clean Code [0.44%]
- Reuniao [0.38%]
- Atraso / Saida antecipada [0.29%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.15%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [0.14%]
- Planejamento de Projeto [0.13%]



- Desenvolvimento de Requisitos [72.39%]
- Gestao de Requisitos [13.98%]
- Diversos\* [6.71%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.29%]
- Gerencia de Configuracao [0.64%]
- Planejamento de Projeto [0.13%]
