

INDICADORES DA SPRINT

		202	503			202	504	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	308h00m	185h04m	308h00m	308h00m	307h50m	307h50m	307h50m	251h50m
02. Horas realizadas de todas atividades	305h53m	183h20m	306h16m	305h50m	305h52m	308h08m	308h52m	250h31m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	265h05m	151h15m	265h05m	264h15m	266h15m	266h25m	266h15m	212h50m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	229h26m	146h42m	259h45m	264h44m	244h56m	258h18m	252h40m	202h05m
05. Pontos planejados	85,0	79,0	78,0	77,5	71,0	95,0	84,5	76,5
06. Pontos entregues	74	50	85,5	87	78,5	87	85	69
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	63,00	49,50	57,00	62,00	53,00	79,50	72,50	67,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	11,00	0,50	28,50	25,00	25,50	7,50	12,50	1,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	2	0	0	0	2
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	14	12	10	16	19	13	15	18
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	11	1	15	12	17	6	11	3
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	1	0	0	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h35m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	0	4	0	0	0	0,5
15. Produtividade planejada	0,321	0,523	0,295	0,294	0,267	0,357	0,318	0,360
16. Produtividade realizada	0,323	0,341	0,330	0,329	0,321	0,337	0,337	0,342
17. % Pontos NP / Pontos entregues	14,9	1	33,4	28,8	32,5	8,7	14,8	2,2

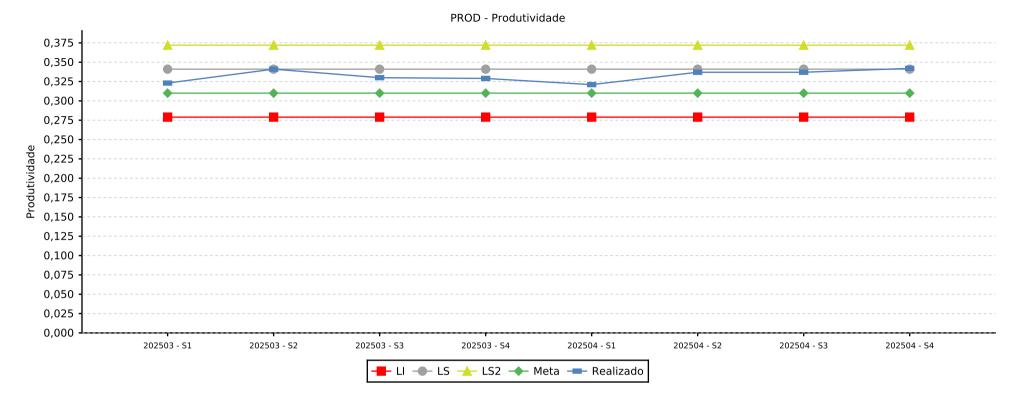


		202	503		202504					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,323	0,341	0,330	0,329	0,321	0,337	0,337	0,342		
Meta	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310		
LS2	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372		
LS	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341		
LI	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279		

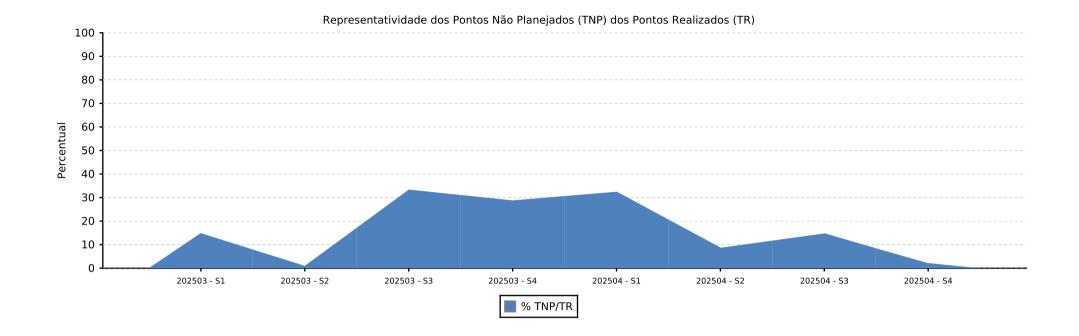


		202	503			202	504	
	1	1 2 3 4					3	4
TR - Pontos Realizados	74	50	85.5	87	78.5	87	85	69
TNP - Pontos Não Planejados	11	0.5	28.5	25	25.5	7.5	12.5	1.5
% TNP/TR	14,9	1,0	33,4	28,8	32,5	8,7	14,8	2,2

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

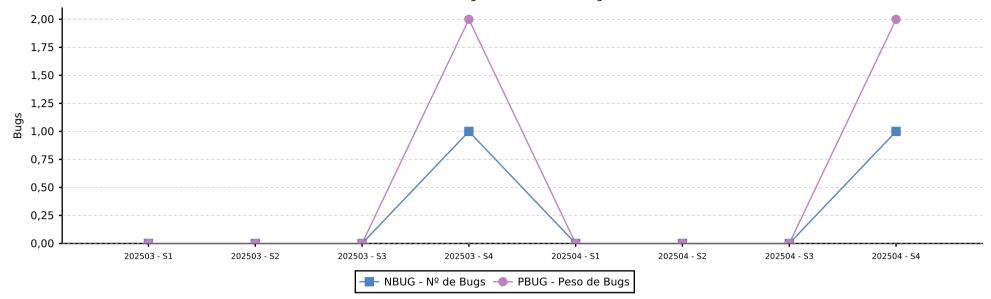

		202	503			202	504	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	1	0	0	0	1
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	2	0	0	0	2
Pontos Entregues	74	50	85.5	87	78.5	87	85	69
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,90

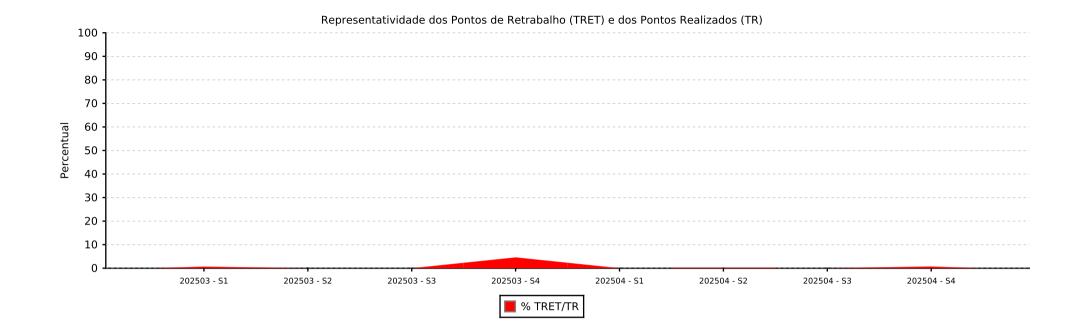


		202	503			202	504	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	74	50	85.5	87	78.5	87	85	69
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	0	4	0	0	0	0.5
% TRET/TR	0,7	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,7

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	nt 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	220,92	212,27	221,08	229,12	220,92	231,32	168,5	177,38	831,42	850,09	102,2 %
Analise de Sistema	18,5	25,05	17,5	23,92	18,5	27,65	17	20,02	71,5	96,64	135,2 %
Sprint Planning 1	10,5	5,83	10,5	9,33	10,5	4,25	10,5	7,08	42	26,49	63,1 %
Retrospectiva	7	6,5	7	6,42	7	2,92	7	7	28	22,84	81,6 %
Daily Scrum	14	10,33	14	8,23	14	8,17	10,67	6,17	52,67	32,9	62,5 %
Sizing	2	0	2	0	2	0	2	5,82	8	5,82	72,8 %
Cafe	8,75	7,5	8,75	8,25	8,75	7,75	7	5,5	33,25	29	87,2 %
Ausencia	0	3,1	0	2	0	5,38	0	4,63	0	15,11	0,0 %
Ginastica Laboral	4,67	3,8	4,67	4,85	4,67	3,85	3,58	3,03	17,59	15,53	88,3 %
Particular	0	0,87	0	1	0	0	0	2,67	0	4,54	0,0 %
Code Review	3,25	9,02	3,25	0,75	3,25	3,48	3	2,58	12,75	15,83	124,2 %
Outros	0,17	0,83	1	0	0,17	0,83	1	2,52	2,34	4,18	178,6 %
Sprint Planning 2	7	1,17	7	3,5	7	1,17	7	2,08	28	7,92	28,3 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	2,92	0	0	0	2,52	0	1,28	0	6,72	0,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	1,03	0,25	0	2,25	1	3	2,03	67,7 %
Verificando apontamento	0,42	1,58	0,42	1,33	0,42	1,33	0,33	1	1,59	5,24	329,6 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0,67	0	0,67	0,0 %
Clean Code	1,75	3	1,75	0,17	1,75	2,33	1,75	0,08	7	5,58	79,7 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0,67	0	0	0	0	0	0,67	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	1,25	0	1,25	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	4	0	0	0	1	0	0	0	5	0,0 %
Correção de Erros Interno	3,5	2,92	3,5	0,5	3,5	0	3,33	0	13,83	3,42	24,7 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,48	0	0	0	0,67	0	0	0	1,15	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	2,5	4,7	2,5	1,82	2,5	0,75	2,5	0	10	7,27	72,7 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Reuniao	1	0	1	3,5	1	2	1	0	4	5,5	137,5 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	1,75	0	0	0	0	0	1,75	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,33	0	1,33	0	1,33	0	1,33	0	5,32	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Ger	al 307,85	305,87	307,84	308,14	307,85	308,87	251,83	250,51	1.175,37	1.173,39	99,8 %

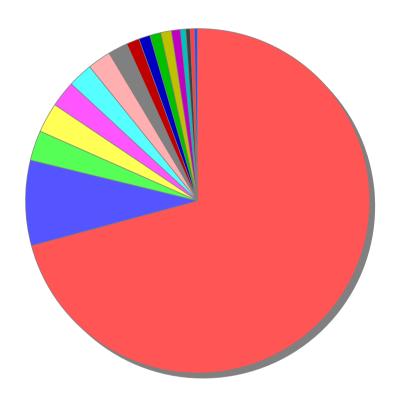

- Desenvolvimento [70.8%]
- Analise de Sistema [7.99%]
- Sprint Planning 1 [2.83%]
- Retrospectiva [2.79%]
- Daily Scrum [2.46%]
- Sizing [2.32%]
- Cafe [2.2%]
- Ausencia [1.85%]
- Ginastica Laboral [1.21%]
- Particular [1.07%]
- Code Review [1.03%]
- Outros [1.01%]
- Sprint Planning 2 [0.83%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.51%]
- Planejamento de Projeto [0.4%]
- Verificando apontamento [0.4%]
- Treinamento [0.27%]
- Clean Code [0.03%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	227,67	221,1	227,83	229,78	227,67	236,17	175,08	178,75	858,25	865,8	100,9 %
REQM - Gestao de Requisitos		38	32,05	37	37,42	38	33,07	36,5	35	149,5	137,54	92,0 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	24,25	25,85	24,25	15,4	24,25	14,57	20,67	15,75	93,42	71,57	76,6 %
DIV - Diversos*		14,75	15,23	15,58	18,6	14,75	19,82	12,75	15,68	57,83	69,33	119,9 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	1,03	0,25	0	2,25	1	3	2,03	67,7 %
CM - Gerencia de Configuração		2,5	4,7	2,5	1,82	2,5	0,75	3	0	10,5	7,27	69,2 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	307,42	298,93	307,41	304,05	307,42	304,38	250,25	246,18	1.172,5	1.153,54	98,4 %

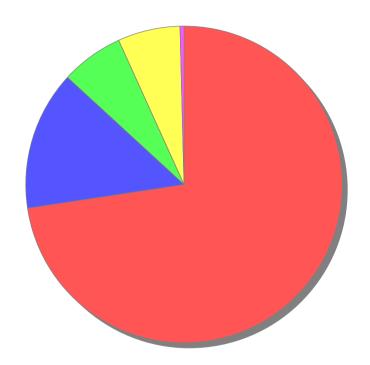


- Desenvolvimento de Requisitos [72.61%]
- Gestao de Requisitos [14.22%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.4%]
- Diversos* [6.37%]
- Planejamento de Projeto [0.41%]

INDICADORES DO PROJETO


	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
01. Horas planejadas de todas atividades	1408h00m	1084h00m	1048h00m	1116h44m	1021h36m	1056h00m	1109h04m	1175h20m
02. Horas realizadas de todas atividades	1321h10m	1128h07m	1140h44m	1170h46m	1102h30m	1213h13m	1101h19m	1173h23m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1196h00m	920h50m	890h00m	946h39m	865h06m	906h35m	945h40m	1011h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1008h14m	899h52m	826h05m	814h36m	747h07m	966h31m	900h37m	957h59m
05. Pontos planejados para o projeto	359,0	276,0	267,0	289,0	265,0	280,0	292,0	313,0
06. Pontos planejados	320,0	309,5	289,0	274,0	197,0	276,0	319,5	327,0
07. Pontos entregues	339	312,5	263	278	239,5	329	296,5	319,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	262,50	234,50	211,00	232,50	182,00	262,00	231,50	272,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	76,50	78,00	52,00	45,50	57,50	67,00	65,00	47,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	6	0	0	3	0	2	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	69	68	55	76	56	77	52	65
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	44	40	24	28	31	40	39	37
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	3	3	0	2	2	0	1	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h40m	0h00m	3h00m	0h00m	0h00m	0h35m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	3,5	4	2,5	2	1	3,5	4,5	0,5
16. Produtividade planejada	0,268	0,337	0,325	0,290	0,228	0,305	0,338	0,324
17. Produtividade realizada	0,337	0,348	0,319	0,342	0,321	0,341	0,330	0,334
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	94,5	113,3	98,6	96,2	90,4	117,5	101,6	102,1
19. % Pontos NP / Pontos entregues	22,6	25	19,8	16,4	24,1	20,4	22	14,8

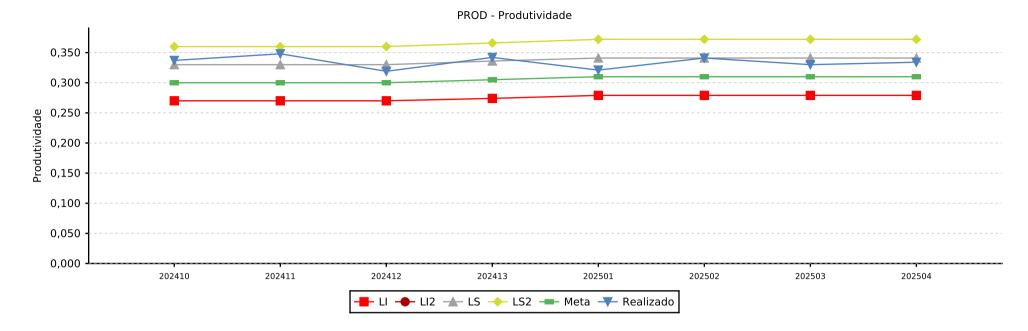


	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
Realizado	0,337	0,348	0,319	0,342	0,321	0,341	0,330	0,334
Meta	0,300	0,300	0,300	0,305	0,310	0,310	0,310	0,310
LS2	0,360	0,360	0,360	0,366	0,372	0,372	0,372	0,372
LS	0,330	0,330	0,330	0,336	0,341	0,341	0,341	0,341
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,274	0,279	0,279	0,279	0,279

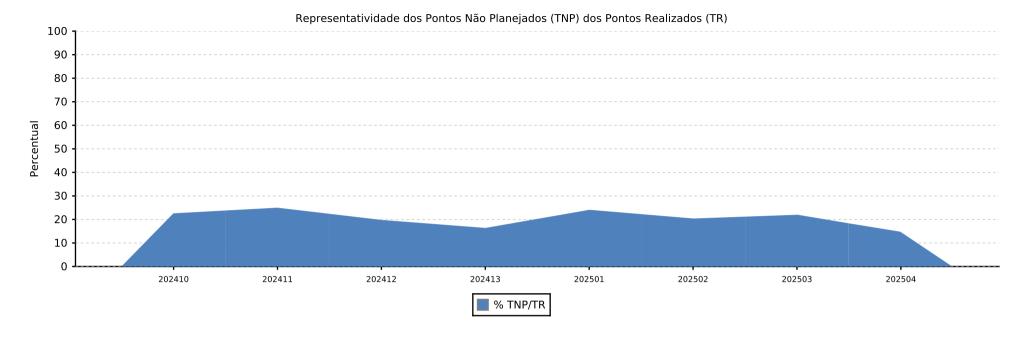


	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
TR - Pontos Realizados	339	312.5	263	278	239.5	329	296.5	319.5
TNP - Pontos Não Planejados	76.5	78	52	45.5	57.5	67	65	47
% TNP/TR	22,6	25,0	19,8	16,4	24,1	20,4	22,0	14,8




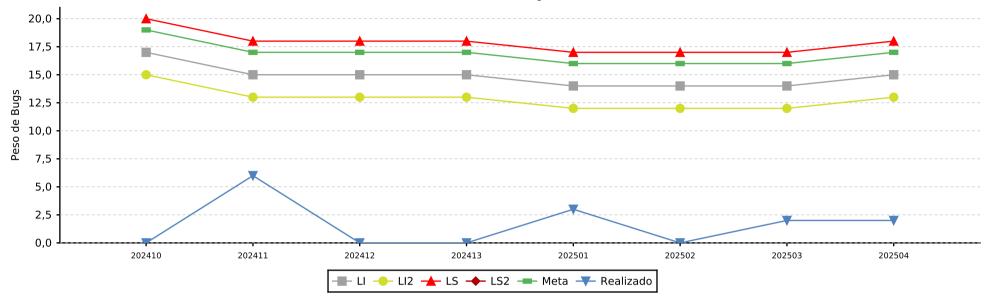


	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
Realizado	0	6	0	0	3	0	2	2
Meta	19	17	17	17	16	16	16	17
LS2								
LS	20	18	18	18	17	17	17	18
LI2	15	13	13	13	12	12	12	13
LI	17	15	15	15	14	14	14	15
Pontos Entregues	339	312.5	263	278	239.5	329	296.5	319.5
% PBUG / TR	0,00	1,92	0,00	0,00	1,26	0,00	0,68	0,63

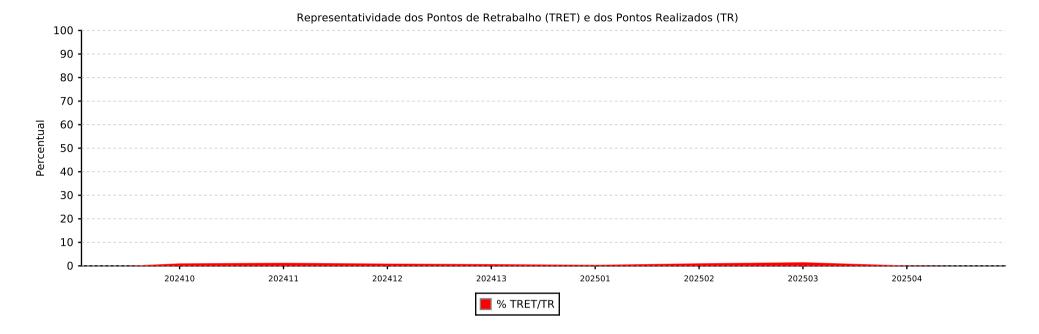


	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
TR - Pontos Realizados	339	312.5	263	278	239.5	329	296.5	319.5
TRET - Pontos de Retrabalho	3.5	4	2.5	2	1	3.5	4.5	0.5
% TRET/TR	1,0	1,3	1,0	0,7	0,4	1,1	1,5	0,2

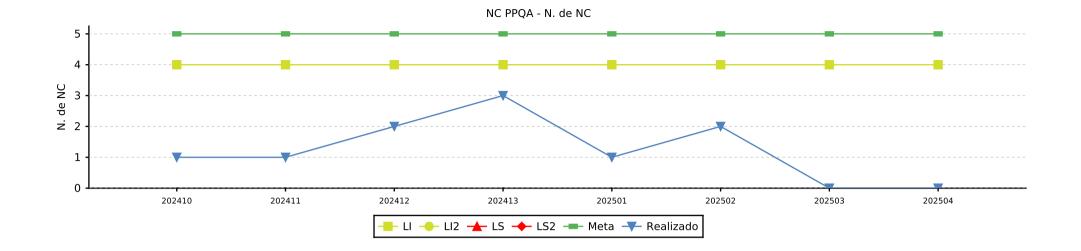


	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
Realizado	1	1	2	3	1	2	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

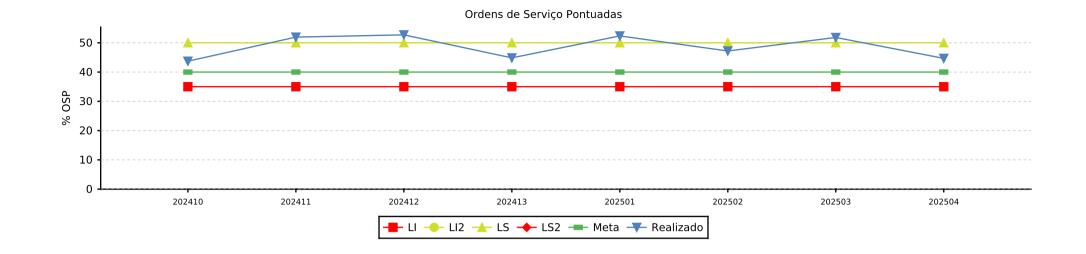

	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
Realizado	43.71	51.94	52.71	44.85	52.35	47.2	51.82	44.68
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

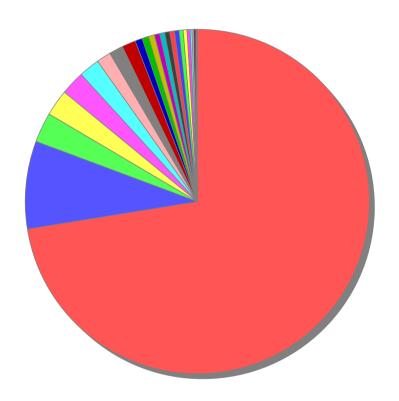

- Desenvolvimento [72.45%]
- Analise de Sistema [8.24%]
- Daily Scrum [2.8%]
- Cafe [2.47%]
- Sprint Planning 1 [2.26%]
- Retrospectiva [1.95%]
- Code Review [1.35%]
- Ginastica Laboral [1.32%]
- Ausencia [1.29%]
- Sprint Planning 2 [0.67%]
- Compilacao de sistemas [0.62%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.57%]
- Sizing [0.5%]
- Clean Code [0.48%]
- Reuniao [0.47%]
- Verificando apontamento [0.45%]
- Atestado [0.43%]
- Particular [0.39%]
- Outros [0.36%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.29%]
- Planejamento de Projeto [0.17%]
- Instrutor Treinamento [0.15%]
- Auxilio suporte [0.13%]
- Atraso / Saida antecipada [0.1%]
- Preparando ambiente [0.06%]
- Treinamento [0.06%]

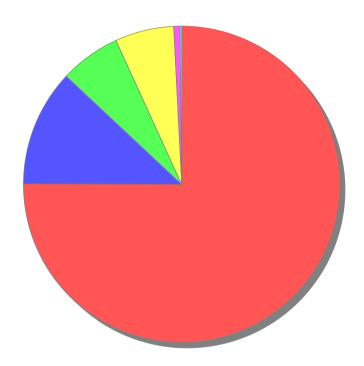

- Desenvolvimento de Requisitos [73.79%]
- Gestao de Requisitos [11.72%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.1%]
- Diversos* [5.91%]
- Gerencia de Configuracao [0.62%]
- Planejamento de Projeto [0.17%]
