

INDICADORES DA SPRINT

		202	401			202	402	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	105h36m	132h00m	132h00m	176h00m	176h00m	176h00m	107h12m	132h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	106h49m	137h35m	134h16m	182h02m	183h06m	175h54m	178h28m	135h42m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	89h51m	115h05m	115h05m	151h45m	151h50m	151h40m	90h22m	115h15m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	89h40m	113h58m	116h26m	141h48m	149h29m	142h49m	85h32m	99h40m
05. Pontos planejados	35,0	43,5	33,0	49,5	54,0	50,0	33,0	42,0
06. Pontos entregues	27	38,5	36,5	49,5	49,5	34	32	38
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	25,50	32,00	29,50	44,50	39,00	32,00	20,00	26,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	1,50	6,50	7,00	5,00	10,50	2,00	12,00	11,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	4	0	4
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	9	8	7	11	15	10	5	5
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	3	6	2	3	8	1	6	7
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	2	0	2
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	2h18m	0h00m	0h00m	1h04m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	1	1	0	1
15. Produtividade planejada	0,390	0,378	0,287	0,327	0,356	0,330	0,366	0,365
16. Produtividade realizada	0,302	0,338	0,314	0,350	0,332	0,239	0,375	0,382
17. % Pontos NP / Pontos entregues	5,6	16,9	19,2	10,2	21,3	5,9	37,5	30,3

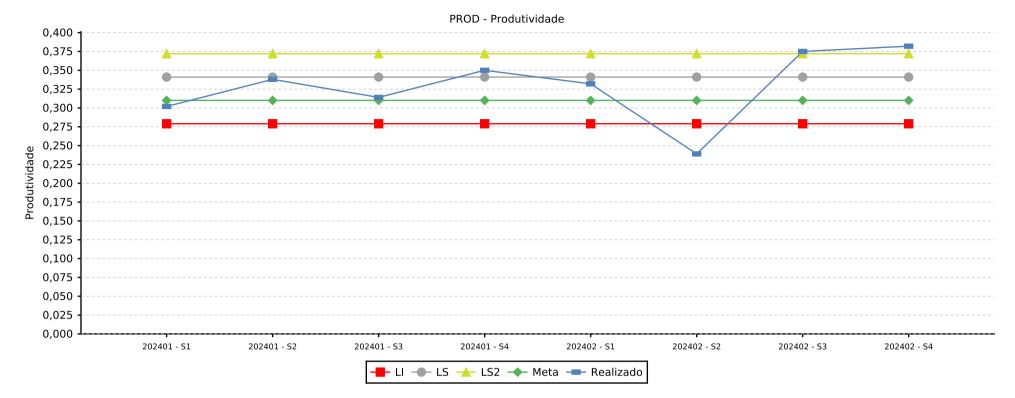


		202	401		202402					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,302	0,338	0,314	0,350	0,332	0,239	0,375	0,382		
Meta	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310		
LS2	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372		
LS	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341		
LI	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279		

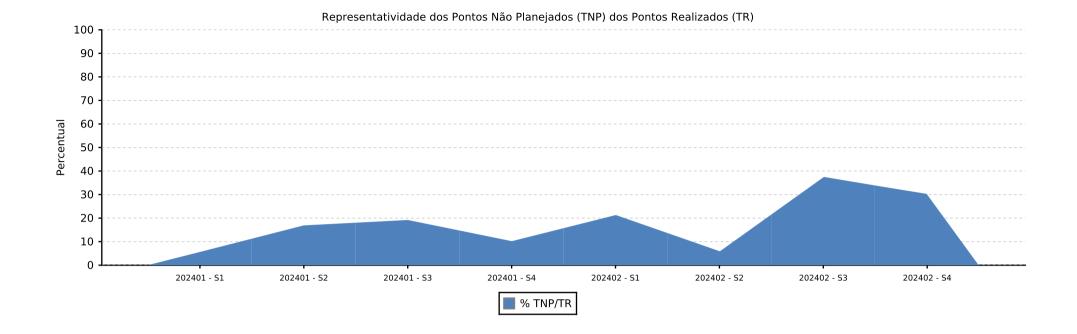


		202	401			202	402	
	1 2 3 4 1				1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	27	38.5	36.5	49.5	49.5	34	32	38
TNP - Pontos Não Planejados	1.5	6.5	7	5	10.5	2	12	11.5
% TNP/TR	5,6	16,9	19,2	10,2	21,3	5,9	37,5	30,3

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

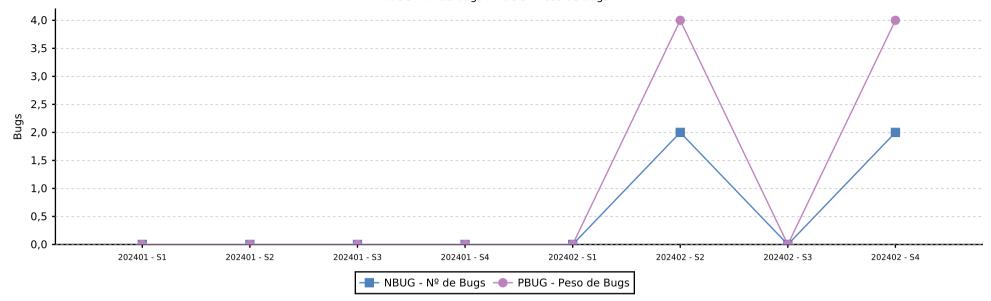

		202	401			202	402	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	2	0	2
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	4	0	4
Pontos Entregues	27	38.5	36.5	49.5	49.5	34	32	38
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	10,53

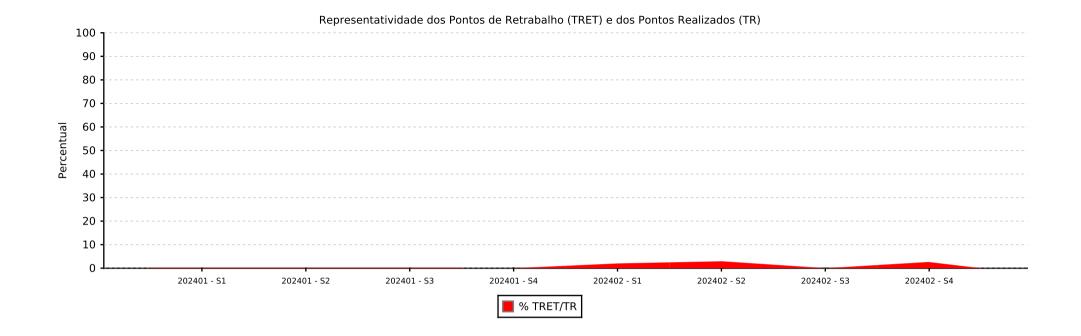


		202	401			202	402	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	27	38.5	36.5	49.5	49.5	34	32	38
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	1	1	0	1
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,9	0,0	2,6

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spri	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	131,25	127,92	131,08	129	71,53	79,02	98,17	93,32	432,03	429,26	99,4 %
Analise de Sistema	9,5	7,4	9,5	9,87	5,67	10,83	5,5	10,08	30,17	38,18	126,5 %
Ausencia	0	6,62	0	10,05	0	73,28	0	9,38	0	99,33	0,0 %
Code Review	2,75	4,33	2,75	4,05	2,25	0,17	1,25	8,8	9	17,35	192,8 %
Daily Scrum	4	5,37	4	2,6	2,25	2,18	3	3,03	13,25	13,18	99,5 %
Cafe	5	4,5	5	4,25	3	2,83	3,75	2,75	16,75	14,33	85,6 %
Ginastica Laboral	2,5	2,77	2,67	2,62	1,5	1,5	2	1,82	8,67	8,71	100,5 %
Compilacao de sistemas	1	2,75	1	0,25	1	0,33	1	1,62	4	4,95	123,8 %
Correcao de Erros Externo	0,33	2,3	0,33	0	0,33	0	0,08	1,07	1,07	3,37	315,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,5	0,92	2,25	0,92	40,9 %
Retrospectiva	4	2	4	4,13	4	3	3	0,83	15	9,96	66,4 %
Outros	0,25	0	0,25	0	0,25	2,88	0,08	0,83	0,83	3,71	447,0 %
Reuniao	1	5,25	1	0,5	1	0,67	1	0,75	4	7,17	179,2 %
Sprint Planning 1	6	5,5	6	3,67	6	1	4,5	0,33	22,5	10,5	46,7 %
Sprint Planning 2	4	2,62	4	2	4	0,33	3	0,17	15	5,12	34,1 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,75	3,08	0,75	0	0,75	0	0,5	0	2,75	3,08	112,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	0,43	0	0	0	0,43	0,0 %
Clean Code	1	0,7	1	0	1	0	0,75	0	3,75	0,7	18,7 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	2	0	2	1,5	2	0	2	0	8	1,5	18,8 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,25	0	0,25	1,42	0,25	0	0,25	0	1	1,42	142,0 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	176	183,11	176	175,91	107,2	178,45	132	135,7	591,2	673,17	113,9 %

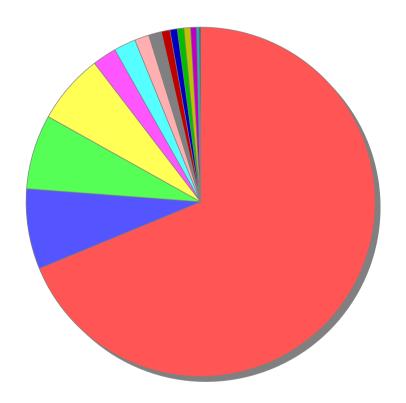

- Desenvolvimento [68.77%]
- Analise de Sistema [7.43%]
- Ausencia [6.91%]
- Code Review [6.48%]
- Daily Scrum [2.23%]
- Cafe [2.03%]
- Ginastica Laboral [1.34%]
- Compilacao de sistemas [1.19%]
- Correcao de Erros Externo [0.79%]
- Planejamento de Projeto [0.68%]
- Retrospectiva [0.61%]
- Outros [0.61%]
- Reuniao [0.55%]
- Sprint Planning 1 [0.24%]
- Sprint Planning 2 [0.13%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	133,75	134	133,58	130,42	74,03	79,02	99,92	94,38	441,28	437,82	99,2 %
DIV - Diversos*		8,75	19,13	8,92	17,42	5,75	81,6	6,83	15,53	30,25	133,68	441,9 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	10,75	11,7	10,75	10,78	8,5	5,35	7,25	12,67	37,25	40,5	108,7 %
REQM - Gestao de Requisitos		21,5	15,52	21,5	17,03	17,67	12,17	15	10,58	75,67	55,3	73,1 %
CM - Gerencia de Configuração		1	2,75	1	0,25	1	0,33	1,5	1,62	4,5	4,95	110,0 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,5	0,92	2,25	0,92	40,9 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	176	183,1	176	175,9	107,2	178,47	132	135,7	591,2	673,17	113,9 %

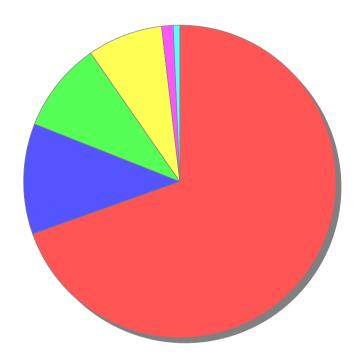


- Desenvolvimento de Requisitos [69.55%]
- Diversos* [11.44%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [9.34%]
- Gestao de Requisitos [7.8%]
- Gerencia de Configuracao [1.19%]
- Planejamento de Projeto [0.68%]

INDICADORES DO PROJETO


	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
01. Horas planejadas de todas atividades	704h00m	638h24m	704h00m	544h00m	504h00m	442h24m	545h36m	591h12m
02. Horas realizadas de todas atividades	729h31m	648h01m	729h06m	534h40m	514h40m	496h21m	560h42m	673h10m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	588h40m	524h14m	584h40m	442h20m	412h55m	363h19m	471h46m	509h07m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	559h52m	490h48m	582h02m	404h28m	403h30m	375h49m	461h52m	477h30m
05. Pontos planejados para o projeto	180,0	163,0	184,0	140,0	132,0	117,0	146,0	158,0
06. Pontos planejados	170,5	159,0	174,0	137,5	137,0	123,5	161,0	179,0
07. Pontos entregues	180	162,5	205,5	134	133,5	133	151,5	153,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	115,50	96,00	157,50	102,00	95,50	91,50	131,50	117,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	64,50	66,50	48,00	32,00	38,00	41,50	20,00	36,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	6	0	0	0	8
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	41	34	34	49	23	24	35	35
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	40	44	38	37	26	28	14	22
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	3	0	0	0	4
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	3h31m	0h00m	0h00m	0h00m	3h22m
15. Pontos de retrabalho	0	0	2,5	6	1	0	0	3
16. Produtividade planejada	0,290	0,304	0,298	0,311	0,332	0,340	0,342	0,352
17. Produtividade realizada	0,322	0,332	0,354	0,332	0,331	0,354	0,329	0,322
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	100	99,7	111,7	95,8	101,2	113,7	103,8	97,2
19. % Pontos NP / Pontos entregues	35,9	41	23,4	23,9	28,5	31,3	13,3	23,5

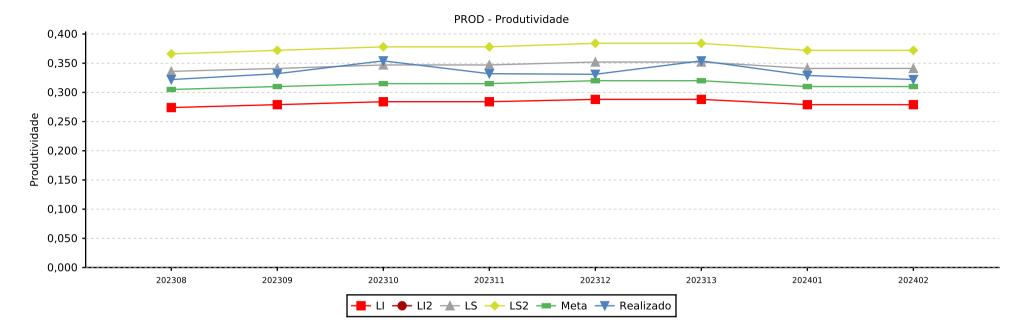


	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
Realizado	0,322	0,332	0,354	0,332	0,331	0,354	0,329	0,322
Meta	0,305	0,310	0,315	0,315	0,320	0,320	0,310	0,310
LS2	0,366	0,372	0,378	0,378	0,384	0,384	0,372	0,372
LS	0,336	0,341	0,347	0,347	0,352	0,352	0,341	0,341
LI2								
LI	0,274	0,279	0,284	0,284	0,288	0,288	0,279	0,279

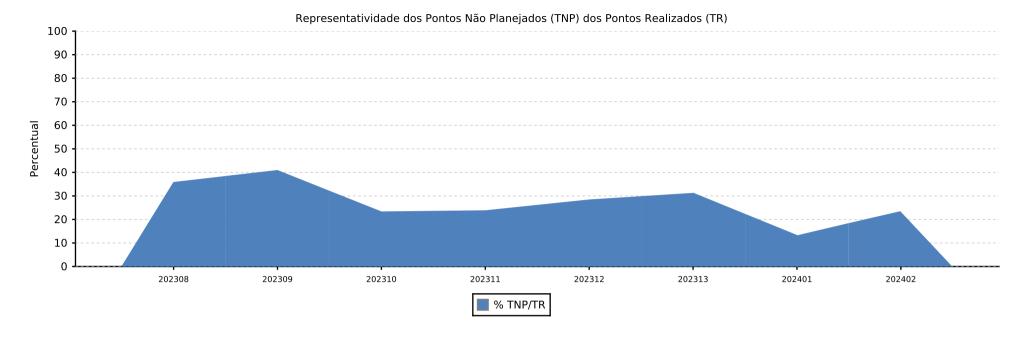


	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
TR - Pontos Realizados	180	162.5	205.5	134	133.5	133	151.5	153.5
TNP - Pontos Não Planejados	64.5	66.5	48	32	38	41.5	20	36
% TNP/TR	35,9	41,0	23,4	23,9	28,5	31,3	13,3	23,5

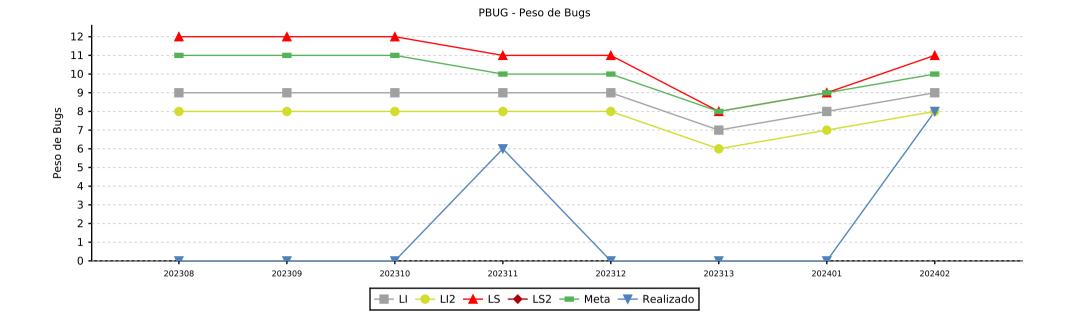


	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
Realizado	0	0	0	6	0	0	0	8
Meta	11	11	11	10	10	8	9	10
LS2								
LS	12	12	12	11	11	8	9	11
LI2	8	8	8	8	8	6	7	8
LI	9	9	9	9	9	7	8	9
Pontos Entregues	180	162.5	205.5	134	133.5	133	151.5	153.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	5,22

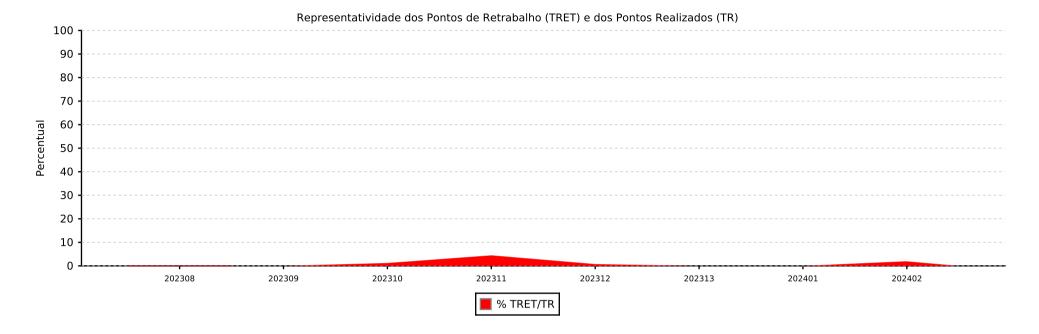


	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
TR - Pontos Realizados	180	162.5	205.5	134	133.5	133	151.5	153.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	2.5	6	1	0	0	3
% TRET/TR	0,0	0,0	1,2	4,5	0,7	0,0	0,0	2,0

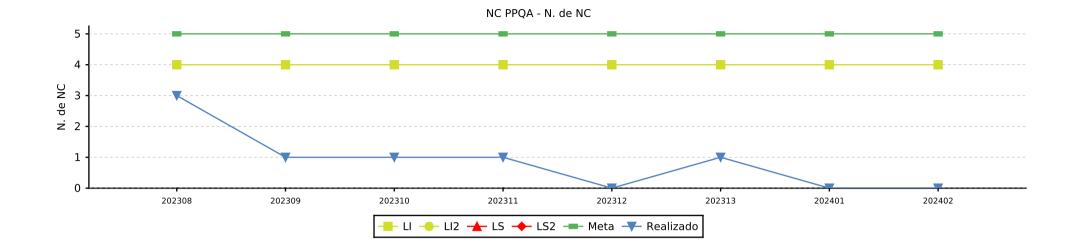


	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
Realizado	3	1	1	1	0	1	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

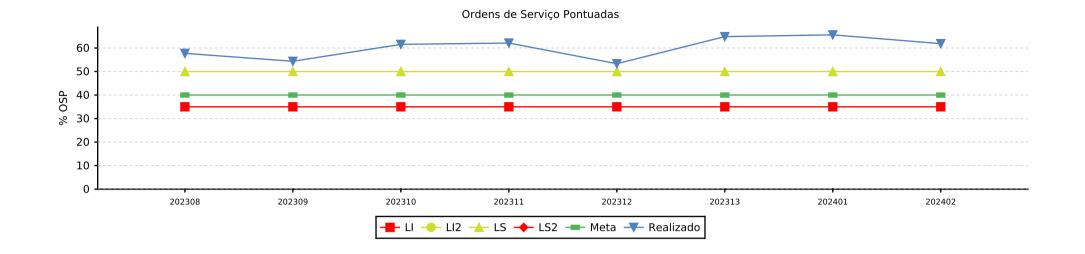

	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
Realizado	57.73	54.35	61.54	62.11	53.33	64.84	65.59	61.86
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

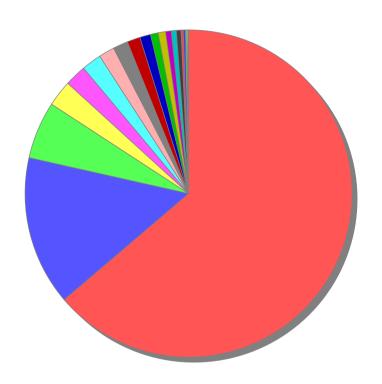

- Desenvolvimento [63.77%]
- Ausencia [14.76%]
- Analise de Sistema [5.67%]
- Code Review [2.58%]
- Cafe [2.13%]
- Daily Scrum [1.96%]
- Sprint Planning 1 [1.56%]
- Retrospectiva [1.48%]
- Ginastica Laboral [1.29%]
- Reuniao [1.07%]
- Sprint Planning 2 [0.76%]
- Compilacao de sistemas [0.74%]
- Outros [0.55%]
- Correcao de Erros Externo [0.5%]
- Correção de Erros Interno [0.46%]
- Sizing [0.22%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.21%]
- Planejamento de Projeto [0.14%]
- Clean Code [0.1%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.06%]

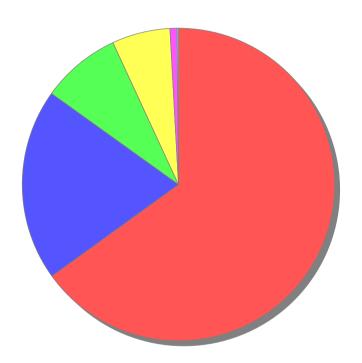

- Desenvolvimento de Requisitos [65.04%]
- Diversos* [19.86%]
- Gestao de Requisitos [8.21%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.02%]
- Gerencia de Configuracao [0.74%]
- O Planejamento de Projeto [0.14%]
