

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	309			202	310	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	143h12m	176h00m	176h00m	143h12m	176h00m	176h00m	176h00m	176h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	140h09m	175h59m	185h20m	146h33m	181h47m	181h31m	184h03m	181h45m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	115h32m	146h40m	146h40m	115h22m	146h10m	146h10m	146h10m	146h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	104h31m	147h28m	116h56m	121h53m	150h26m	152h37m	137h24m	141h35m
05. Pontos planejados	49,5	38,5	27,0	44,0	47,0	55,0	39,5	32,5
06. Pontos entregues	32,5	53	29	48	46,5	58	47,5	53,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	21,00	23,00	10,00	42,00	32,00	53,50	40,00	32,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	11,50	30,00	19,00	6,00	14,50	4,50	7,50	21,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	8	10	6	10	8	8	9	9
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	8	18	13	5	9	5	6	19
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	1	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0,5	0	2	0
15. Produtividade planejada	0,429	0,263	0,185	0,382	0,322	0,377	0,271	0,223
16. Produtividade realizada	0,311	0,360	0,249	0,394	0,310	0,381	0,346	0,378
17. % Pontos NP / Pontos entregues	35,4	56,7	65,6	12,5	31,2	7,8	15,8	40,2

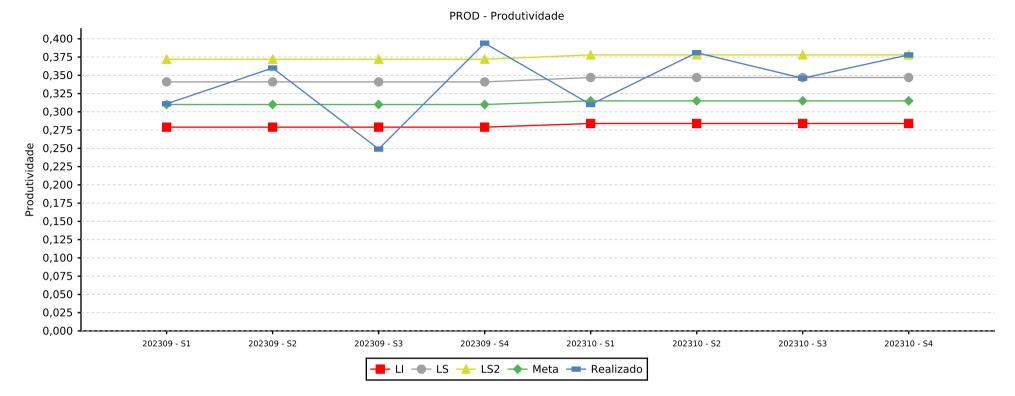


		202	309		202310					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,311	0,360	0,249	0,394	0,310	0,381	0,346	0,378		
Meta	0,310	0,310	0,310	0,310	0,315	0,315	0,315	0,315		
LS2	0,372	0,372	0,372	0,372	0,378	0,378	0,378	0,378		
LS	0,341	0,341	0,341	0,341	0,347	0,347	0,347	0,347		
LI	0,279	0,279	0,279	0,279	0,284	0,284	0,284	0,284		

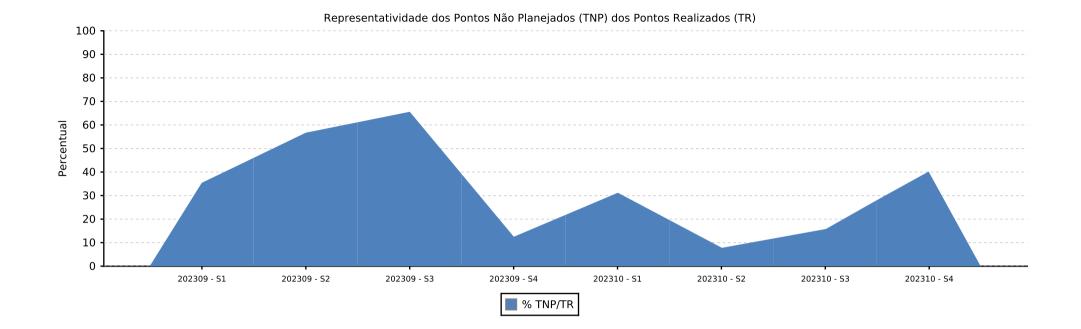


		202	309			202	310	
	1	1 2 3 4					3	4
TR - Pontos Realizados	32.5	53	29	48	46.5	58	47.5	53.5
TNP - Pontos Não Planejados	11.5	30	19	6	14.5	4.5	7.5	21.5
% TNP/TR	35,4	56,7	65,6	12,5	31,2	7,8	15,8	40,2

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

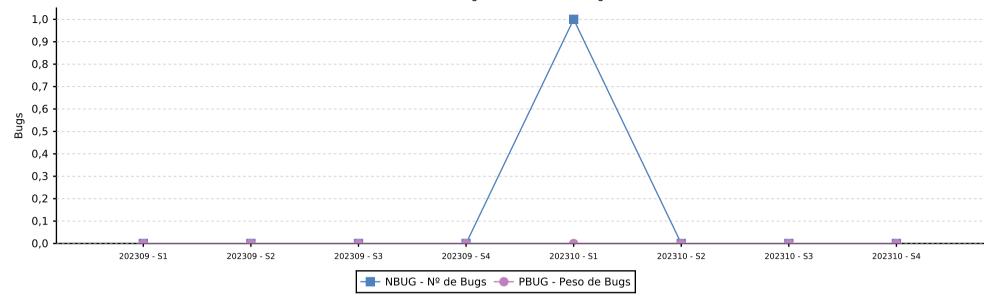

		202	309			202	310	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	1	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	32.5	53	29	48	46.5	58	47.5	53.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

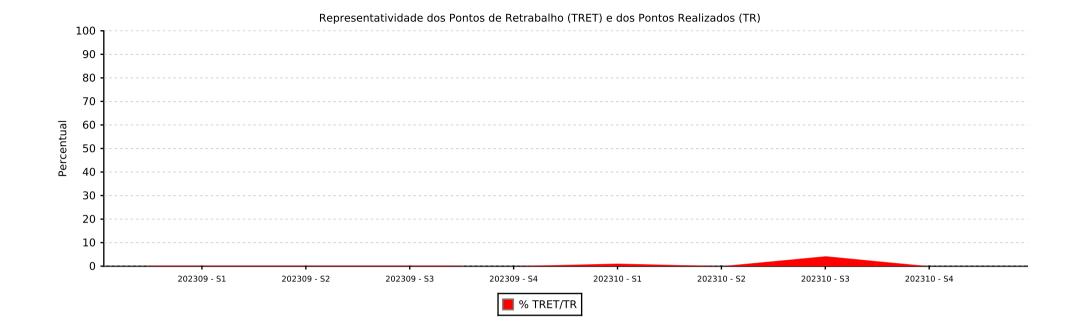


		202	309			202	310	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	32.5	53	29	48	46.5	58	47.5	53.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	0.5	0	2	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	4,2	0,0

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	int 1	Spri	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	124,92	134,52	124,92	138,18	124,92	127,1	123,17	124,83	497,93	524,63	105,4 %
Analise de Sistema	13	12,25	13	8,52	13	13,87	13	16,52	52	51,16	98,4 %
Sprint Planning 1	6	7,75	6	4,78	6	5,53	6	6	24	24,06	100,3 %
Cafe	5	4	5	5,52	5	4,25	5	4,67	20	18,44	92,2 %
Outros	0,58	1,87	0,58	0,48	0,58	0,32	0,58	4,23	2,32	6,9	297,4 %
Code Review	3	3,18	3	3,95	3	5,35	3	4	12	16,48	137,3 %
Daily Scrum	4	3,47	4	3,32	4	1,77	4	3,5	16	12,06	75,4 %
Retrospectiva	4	2,87	4	2,83	4	1	4	3,25	16	9,95	62,2 %
Reuniao	1	2,05	1	1,42	1	0,83	1	2,85	4	7,15	178,8 %
Ginastica Laboral	2,83	1,83	2,83	2,67	2,83	2,17	2,83	2,63	11,32	9,3	82,2 %
Compilacao de sistemas	1	1,5	1	0	1	2,22	1	2,48	4	6,2	155,0 %
Sprint Planning 2	4	1,67	4	2	4	2	4	2	16	7,67	47,9 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	1,58	0	1,58	0,0 %
Clean Code	1	0	1	0,25	1	0	1	1,5	4	1,75	43,8 %
Ausencia	0	4,67	0	5,2	0	11,45	0	1,2	0	22,52	0,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	1,25	0,25	0	1,5	0,5	2,25	1,75	77,8 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	3	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,25	0,17	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0,17	17,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	4,12	0	0	0	4,12	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	3	0	3	1	3	1,75	3	0	12	2,75	22,9 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0,15	0	0,33	0	0	0	0,48	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	176	181,8	176	181,52	176	184,06	176	181,74	704	729,12	103,6 %

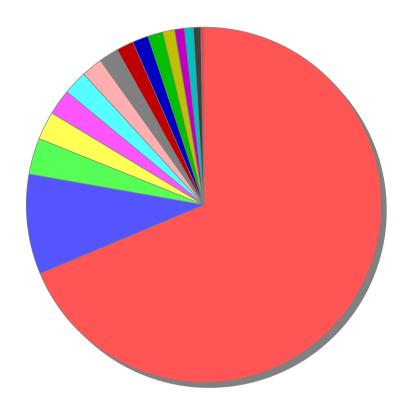

- Desenvolvimento [68.68%]
- Analise de Sistema [9.09%]
- Sprint Planning 1 [3.3%]
- Ocafe [2.57%]
- Outros [2.33%]
- Code Review [2.2%]
- Daily Scrum [1.93%]
- Retrospectiva [1.79%]
- Reuniao [1.57%]
- Ginastica Laboral [1.45%]
- Compilacao de sistemas [1.36%]
- Sprint Planning 2 [1.1%]
- Curso/Palestra [0.87%]
- Clean Code [0.83%]
- Ausencia [0.66%]
- Planejamento de Projeto [0.28%]

## HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	128,08	134,68	128,08	138,43	128,08	127,1	126,33	126,33	510,57	526,54	103,1 %
REQM - Gestao de Requisitos		26	21,67	26	16,3	26	27,27	26	24,52	104	89,76	86,3 %
DIV - Diversos*		9,67	14,42	9,67	15,28	9,67	19,02	9,67	15,58	38,68	64,3	166,2 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	11	9,52	11	10,1	11	8,12	11	10,75	44	38,49	87,5 %
CM - Gerencia de Configuração		1	1,5	1	0	1	2,22	1,5	2,48	4,5	6,2	137,8 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	1,58	0	1,58	0,0 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	1,25	0,25	0	1,5	0,5	2,25	1,75	77,8 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	176	181,79	176	181,36	176	183,73	176	181,74	704	728,62	103,5 %

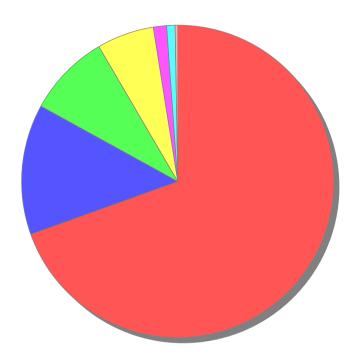


- Desenvolvimento de Requisitos [69.51%]
- Gestao de Requisitos [13.49%]
- Diversos\* [8.57%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.91%]
- Gerencia de Configuracao [1.36%]
- Treinamento na Organizacao [0.87%]
- Planejamento de Projeto [0.28%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310
01. Horas planejadas de todas atividades	704h00m	638h24m	552h00m	504h00m	704h00m	704h00m	638h24m	704h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	718h29m	649h09m	661h21m	589h41m	734h32m	729h31m	648h01m	729h06m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	604h40m	539h24m	455h05m	415h35m	592h40m	588h40m	524h14m	584h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	599h12m	516h13m	555h13m	510h27m	556h18m	559h52m	490h48m	582h02m
05. Pontos planejados para o projeto	200,0	177,0	160,0	0,0	181,0	180,0	163,0	184,0
06. Pontos planejados	126,0	152,0	208,0	139,5	179,0	170,5	159,0	174,0
07. Pontos entregues	198	166	176,5	171	175,5	180	162,5	205,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	147,00	122,00	146,50	145,00	148,50	115,50	96,00	157,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	51,00	44,00	30,00	26,00	27,00	64,50	66,50	48,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	0	2	0	0	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	46	42	32	35	40	41	34	34
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	34	25	22	10	16	40	44	39
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	1	1	0	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h59m	0h00m	0h15m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	2	1,5	1,5	0,5	1	0	0	2,5
16. Produtividade planejada	0,209	0,282	0,458	0,336	0,303	0,290	0,304	0,298
17. Produtividade realizada	0,331	0,322	0,318	0,335	0,316	0,322	0,332	0,354
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	99	93,8	110,4	0	97	100	99,7	111,7
19. % Pontos NP / Pontos entregues	25,8	26,6	17	15,3	15,4	35,9	41	23,4

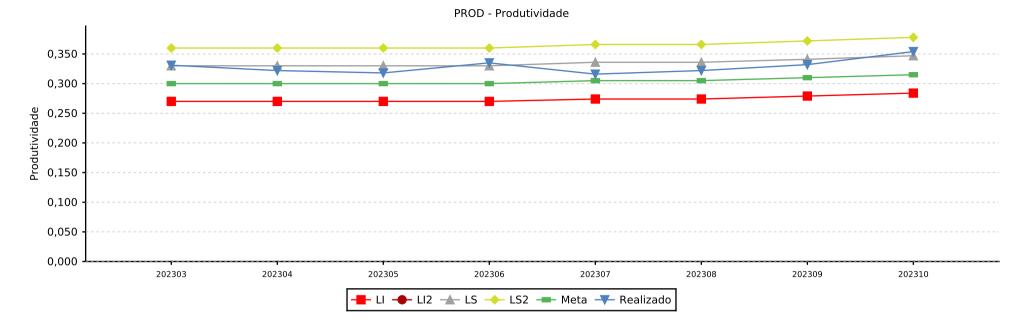


	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310
Realizado	0,331	0,322	0,318	0,335	0,316	0,322	0,332	0,354
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305	0,310	0,315
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366	0,372	0,378
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336	0,341	0,347
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274	0,279	0,284

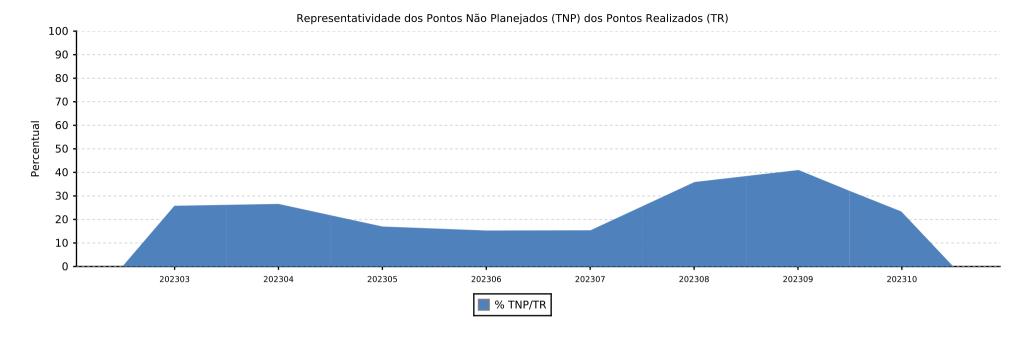


	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310
TR - Pontos Realizados	198	166	176.5	171	175.5	180	162.5	205.5
TNP - Pontos Não Planejados	51	44	30	26	27	64.5	66.5	48
% TNP/TR	25,8	26,6	17,0	15,3	15,4	35,9	41,0	23,4

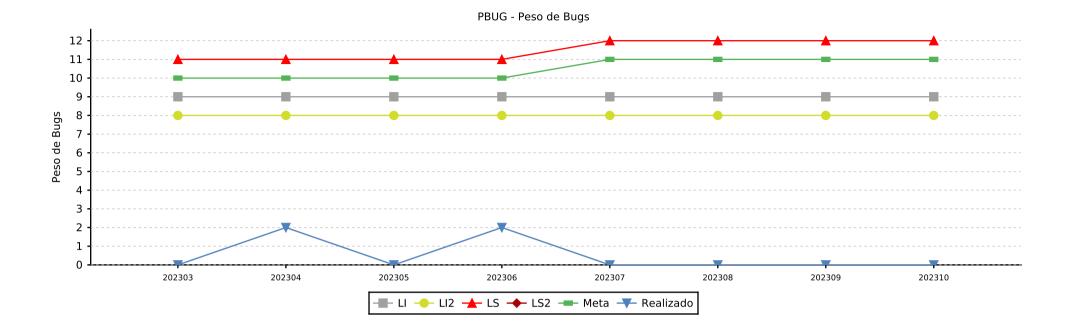


	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310
Realizado	0	2	0	2	0	0	0	0
Meta	10	10	10	10	11	11	11	11
LS2								
LS	11	11	11	11	12	12	12	12
LI2	8	8	8	8	8	8	8	8
LI	9	9	9	9	9	9	9	9
Pontos Entregues	198	166	176.5	171	175.5	180	162.5	205.5
% PBUG / TR	0,00	1,21	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00

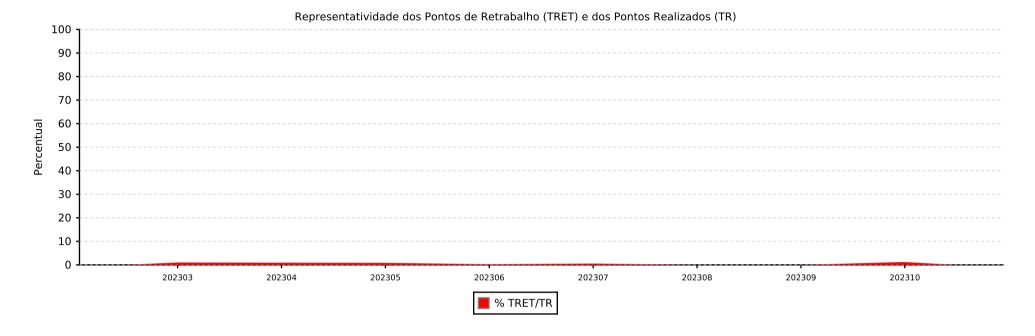


	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310
TR - Pontos Realizados	198	166	176.5	171	175.5	180	162.5	205.5
TRET - Pontos de Retrabalho	2	1.5	1.5	0.5	1	0	0	2.5
% TRET/TR	1,0	0,9	0,8	0,3	0,6	0,0	0,0	1,2

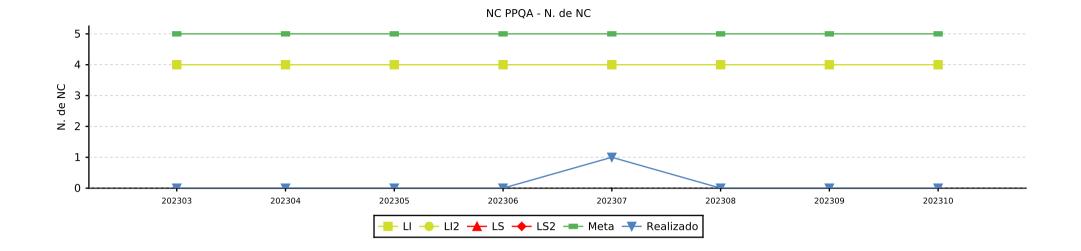


	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310
Realizado	0	0	0	0	1	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

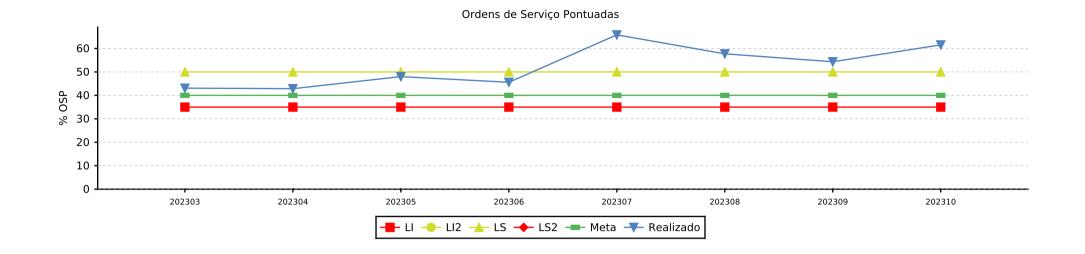

	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310
Realizado	43.08	42.86	48	45.59	65.82	57.73	54.35	61.54
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

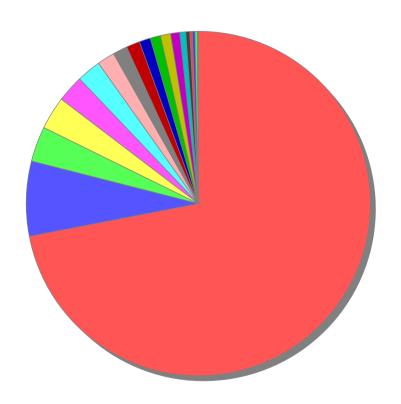

- Desenvolvimento [71.96%]
- Analise de Sistema [7.02%]
- Sprint Planning 1 [3.3%]
- Ausencia [3.09%]
- Cafe [2.53%]
- Code Review [2.26%]
- Daily Scrum [1.65%]
- Retrospectiva [1.36%]
- Ginastica Laboral [1.28%]
- Sprint Planning 2 [1.05%]
- Reuniao [0.98%]
- Outros [0.95%]
- Compilacao de sistemas [0.85%]
- Preparando ambiente [0.57%]
- Sizing [0.38%]
- Planejamento de Projeto [0.24%]
- Clean Code [0.24%]
- Curso/Palestra [0.22%]
- Atraso / Saida antecipada [0.07%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.02%]

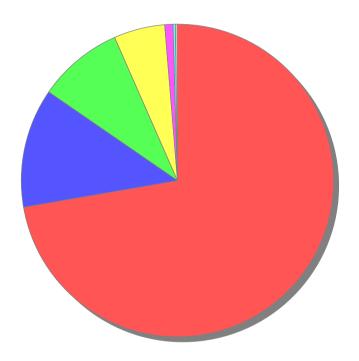

- Desenvolvimento de Requisitos [72.22%]
- Gestao de Requisitos [12.31%]
- Diversos\* [8.82%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.28%]
- Gerencia de Configuracao [0.85%]
- Planejamento de Projeto [0.24%]
- Treinamento na Organizacao [0.22%]
