

INDICADORES DA SPRINT

		202	405			202	406	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	300h00m	241h36m	264h00m	196h48m	256h00m	224h00m	264h00m	264h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	311h34m	228h04m	266h55m	189h57m	269h45m	271h45m	317h38m	324h32m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	253h45m	203h36m	225h25m	165h18m	216h40m	186h30m	224h15m	224h15m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	231h23m	163h09m	216h36m	141h29m	206h23m	182h43m	251h40m	258h28m
05. Pontos planejados	50,0	35,0	53,0	54,5	57,5	41,5	47,0	63,5
06. Pontos entregues	67,5	53	69	44,5	71	57	79,5	87
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	45,00	40,00	46,00	39,00	54,50	34,00	48,00	57,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	22,50	13,00	23,00	5,50	16,50	23,00	31,50	29,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	2	0	2	0	4	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	10	12	9	11	15	9	16	11
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	9	9	10	6	9	11	21	12
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	0	1	0	2	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h15m	0h00m	0h45m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	2	0	0,5	0	0,5	0	1	0
15. Produtividade planejada	0,198	0,172	0,236	0,330	0,266	0,223	0,210	0,284
16. Produtividade realizada	0,292	0,325	0,319	0,315	0,345	0,312	0,316	0,337
17. % Pontos NP / Pontos entregues	33,4	24,6	33,4	12,4	23,3	40,4	39,7	34

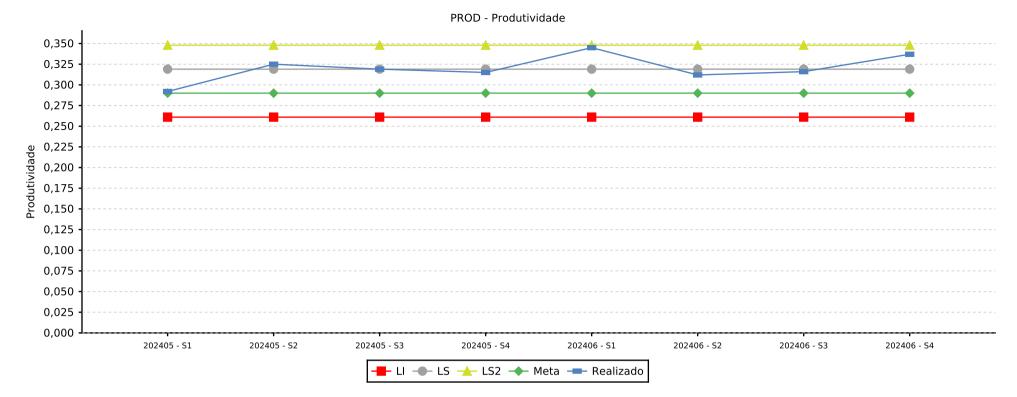


		202	405			202	406	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,292	0,325	0,319	0,315	0,345	0,312	0,316	0,337
Meta	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
LS2	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348
LS	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319
LI	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261

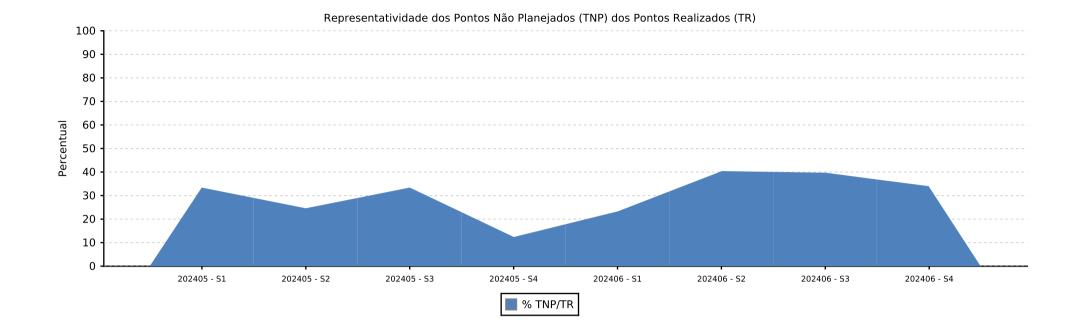


		202	405			202	406	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	67.5	53	69	44.5	71	57	79.5	87
TNP - Pontos Não Planejados	22.5	13	23	5.5	16.5	23	31.5	29.5
% TNP/TR	33,4	24,6	33,4	12,4	23,3	40,4	39,7	34,0

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

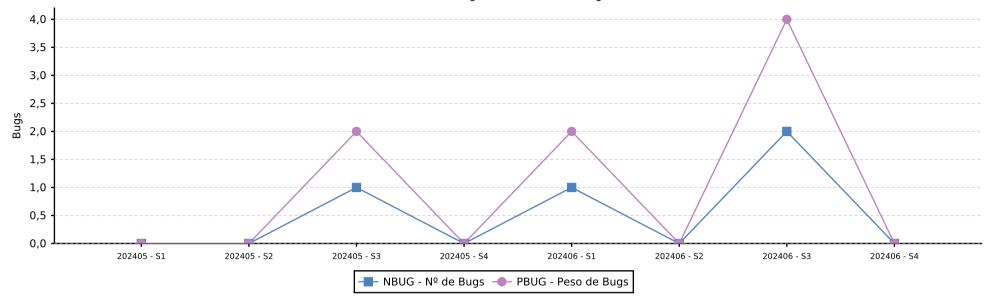

		202	405		202406					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
NBUG - Nº de Bugs	0	0	1	0	1	0	2	0		
PBUG - Peso de Bugs	0	0	2	0	2	0	4	0		
Pontos Entregues	67.5	53	69	44.5	71	57	79.5	87		
% PBUG / TR	0,00	0,00	2,90	0,00	2,82	0,00	5,04	0,00		

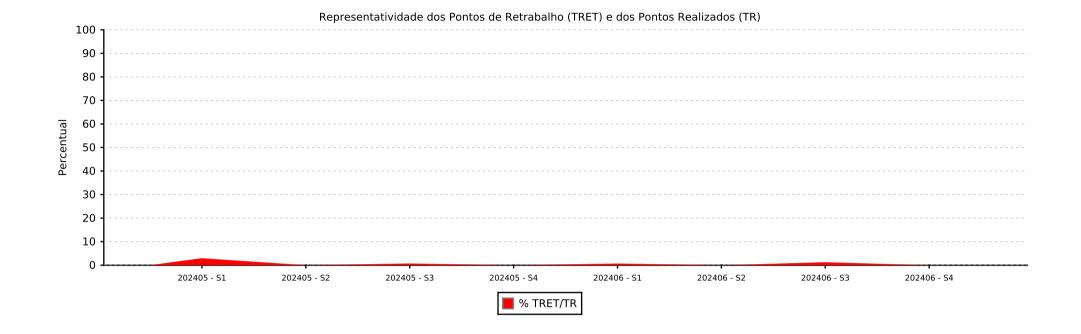


		202	405			202	406	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	67.5	53	69	44.5	71	57	79.5	87
TRET - Pontos de Retrabalho	2	0	0.5	0	0.5	0	1	0
% TRET/TR	3,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	1,3	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	179,17	186,12	150,33	157	184,17	211,33	184,25	230,92	697,92	785,37	112,5 %
Analise de Sistema	17,5	24,57	16,75	18,65	17,5	15,9	17,5	25,08	69,25	84,2	121,6 %
Daily Scrum	11	7,63	9,83	9,78	11,33	11,48	11,33	11,73	43,49	40,62	93,4 %
Retrospectiva	6	4,98	6	3,83	6	5,25	6	7,98	24	22,04	91,8 %
Cafe	7,25	7,25	6,5	5,75	7,5	7,83	7,5	7,67	28,75	28,5	99,1 %
Code Review	3,75	4,65	3,75	4,63	3,75	18,65	3,75	5,57	15	33,5	223,3 %
Ausencia	0	8,95	0	36,05	0	3,8	0	5,15	0	53,95	0,0 %
Compilacao de sistemas	2,5	1,58	2,5	2	2,5	6,07	2,5	4,45	10	14,1	141,0 %
Ginastica Laboral	4	3,72	3,67	3,05	4,17	4,67	4,17	4,35	16,01	15,79	98,6 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,32	0	2,95	0	0,63	0	3,58	0	7,48	0,0 %
Sprint Planning 2	6	1,48	6	1,5	6	2,07	6	3,5	24	8,55	35,6 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0,75	0	0,58	0	2,82	0	4,15	0,0 %
Outros	1,17	9,5	1,17	2,38	1,17	2,83	1,17	2,08	4,68	16,79	358,8 %
Sprint Planning 1	9	4,58	9	4,5	9	7,9	9	1,75	36	18,73	52,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	1,68	0	1,68	0,0 %
Clean Code	1,5	1,33	1,5	0	1,5	1,33	1,5	1,68	6	4,34	72,3 %
Verificando apontamento	0	1,17	0	0,9	0	1,58	0	1,58	0	5,23	0,0 %
Sizing	2	0	2	0	2	0	2	1	8	1	12,5 %
Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,92	0,9	2,67	0,9	33,7 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0,6	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0,92	0	0,45	0	1,37	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Reuniao	1	1,67	1	0	1	2,5	1	0	4	4,17	104,2 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	1,92	0	0	0	0	0	1,92	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	0	0,5	6,1	0,5	2	0,5	0	2	8,1	405,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1	0,25	0,92	0	1	0,75	1	0	3,92	1	25,5 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	2,25	0	2,17	0	4,5	9,55	2,25	0	11,17	9,55	85,5 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	256,01	269,75	224,01	271,74	264,01	317,62	264,01	324,52	1.008,04	1.183,63	117,4 %

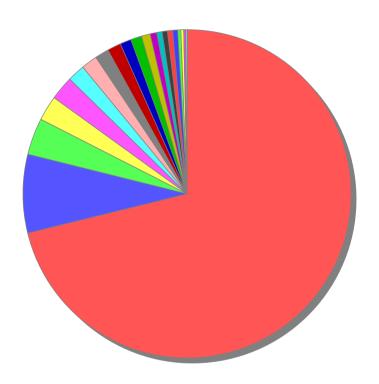

- Desenvolvimento [71.16%]
- Analise de Sistema [7.73%]
- Daily Scrum [3.61%]
- Retrospectiva [2.46%]
- Cafe [2.36%]
- Code Review [1.72%]
- Ausencia [1.59%]
- Compilacao de sistemas [1.37%]
- Ginastica Laboral [1.34%]
- Atraso / Saida antecipada [1.1%]
- Sprint Planning 2 [1.08%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.87%]
- Outros [0.64%]
- Sprint Planning 1 [0.54%]
- Atestado [0.52%]
- Clean Code [0.52%]
- Verificando apontamento [0.49%]
- Sizing [0.31%]
- O Planejamento de Projeto [0.28%]
- Auxilio suporte [0.18%]
- Preparando ambiente [0.14%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	184,58	187,7	155,58	165,77	191,83	225,55	189,67	235,42	721,66	814,44	112,9 %
REQM - Gestao de Requisitos		34,5	30,63	33,75	24,65	34,5	26,78	34,5	31,78	137,25	113,84	82,9 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	20,75	17,27	19,58	18,25	21,08	35,38	21,08	25,28	82,49	96,18	116,6 %
DIV - Diversos*		13,42	31,08	12,33	47,23	13,83	21,63	13,83	19,25	53,41	119,19	223,2 %
CM - Gerencia de Configuração		2,5	1,58	2,5	2	2,5	6,07	3	4,45	10,5	14,1	134,3 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,92	0,9	2,67	0,9	33,7 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	256	268,26	223,99	257,9	263,99	315,41	264	317,08	1.007,98	1.158,65	114,9 %

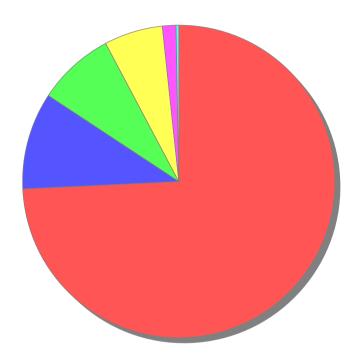


- Desenvolvimento de Requisitos [74.25%]
- Gestao de Requisitos [10.02%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.97%]
- Diversos* [6.07%]
- Gerencia de Configuracao [1.4%]
- Planejamento de Projeto [0.28%]

INDICADORES DO PROJETO


	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
01. Horas planejadas de todas atividades	504h00m	442h24m	545h36m	591h12m	704h00m	1176h00m	1002h24m	1008h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	514h40m	496h21m	560h42m	673h10m	778h03m	1138h29m	996h30m	1183h40m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	412h55m	363h19m	471h46m	509h07m	621h00m	1001h20m	848h04m	851h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	403h30m	375h49m	461h52m	477h30m	539h30m	927h28m	752h37m	899h14m
05. Pontos planejados para o projeto	132,0	117,0	146,0	158,0	191,0	207,0	245,0	247,0
06. Pontos planejados	137,0	123,5	161,0	179,0	197,5	247,0	192,5	209,5
07. Pontos entregues	133,5	133	151,5	153,5	178	304	234	294,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	95,50	91,50	131,50	117,50	112,50	262,50	170,00	194,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	38,00	41,50	20,00	36,00	65,50	41,50	64,00	100,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	8	3	4	2	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	23	24	35	35	24	50	42	51
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	26	28	14	22	38	25	34	53
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	4	2	2	1	3
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	3h22m	1h10m	0h00m	0h00m	1h00m
15. Pontos de retrabalho	1	0	0	3	8	3,5	2,5	1,5
16. Produtividade planejada	0,332	0,340	0,342	0,352	0,319	0,247	0,227	0,246
17. Produtividade realizada	0,331	0,354	0,329	0,322	0,330	0,328	0,311	0,328
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	101,2	113,7	103,8	97,2	93,2	146,9	95,6	119,3
19. % Pontos NP / Pontos entregues	28,5	31,3	13,3	23,5	36,8	13,7	27,4	34,2

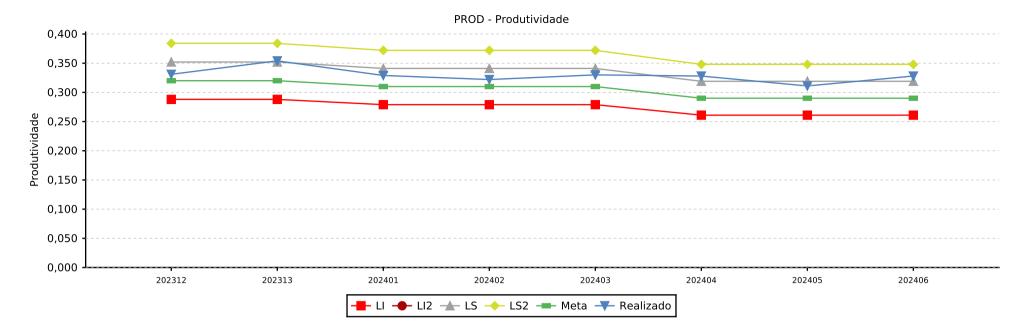


	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
Realizado	0,331	0,354	0,329	0,322	0,330	0,328	0,311	0,328
Meta	0,320	0,320	0,310	0,310	0,310	0,290	0,290	0,290
LS2	0,384	0,384	0,372	0,372	0,372	0,348	0,348	0,348
LS	0,352	0,352	0,341	0,341	0,341	0,319	0,319	0,319
LI2								
LI	0,288	0,288	0,279	0,279	0,279	0,261	0,261	0,261

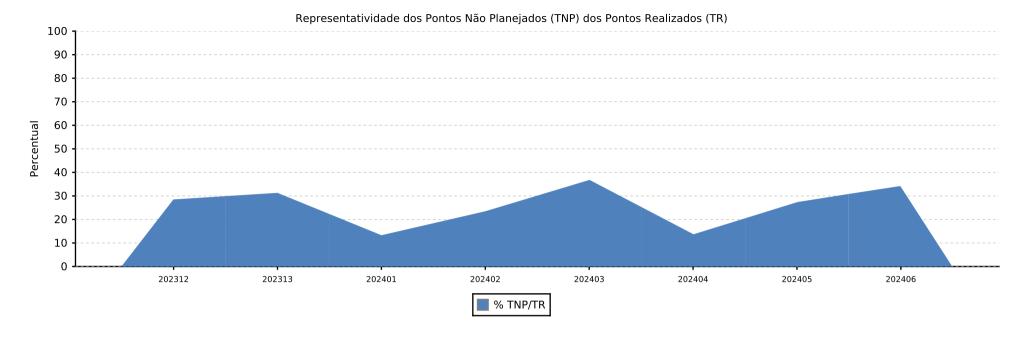


	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
TR - Pontos Realizados	133.5	133	151.5	153.5	178	304	234	294.5
TNP - Pontos Não Planejados	38	41.5	20	36	65.5	41.5	64	100.5
% TNP/TR	28,5	31,3	13,3	23,5	36,8	13,7	27,4	34,2

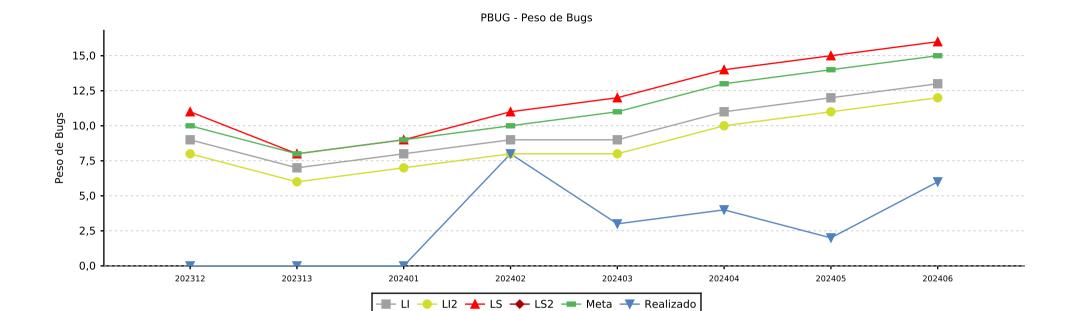


	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
Realizado	0	0	0	8	3	4	2	6
Meta	10	8	9	10	11	13	14	15
LS2								
LS	11	8	9	11	12	14	15	16
LI2	8	6	7	8	8	10	11	12
LI	9	7	8	9	9	11	12	13
Pontos Entregues	133.5	133	151.5	153.5	178	304	234	294.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	5,22	1,69	1,32	0,86	2,04

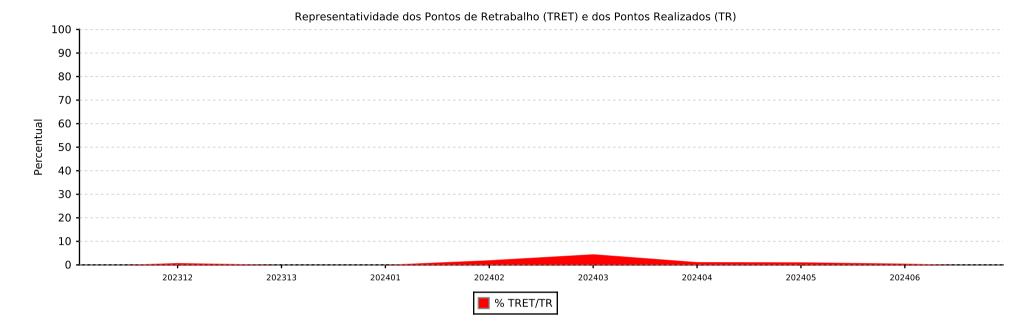


	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
TR - Pontos Realizados	133.5	133	151.5	153.5	178	304	234	294.5
TRET - Pontos de Retrabalho	1	0	0	3	8	3.5	2.5	1.5
% TRET/TR	0,7	0,0	0,0	2,0	4,5	1,2	1,1	0,5

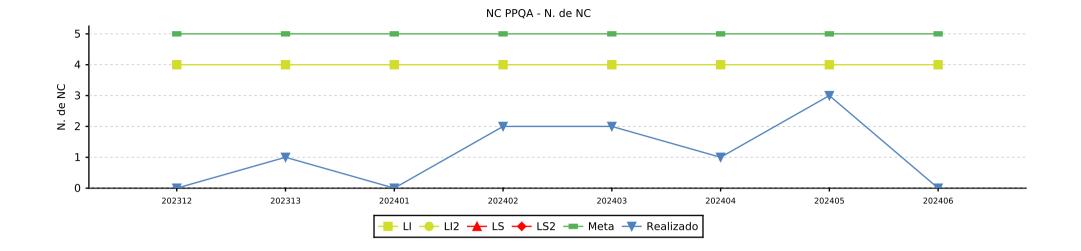


	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
Realizado	0	1	0	2	2	1	3	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

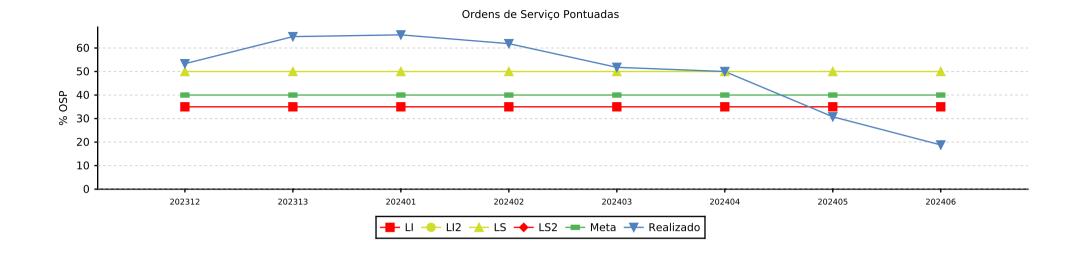

	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
Realizado	53.33	64.84	65.59	61.86	51.79	50	30.77	18.8
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

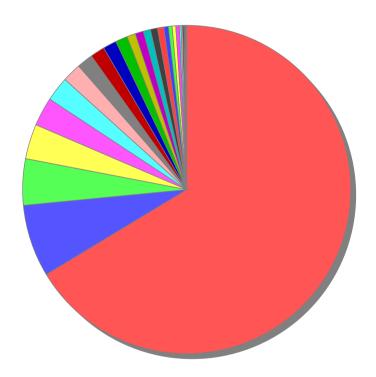

- Desenvolvimento [66.35%]
- Analise de Sistema [7.11%]
- Ausencia [4.56%]
- Daily Scrum [3.43%]
- Code Review [2.83%]
- Cafe [2.41%]
- Retrospectiva [1.86%]
- Sprint Planning 1 [1.58%]
- Outros [1.42%]
- Ginastica Laboral [1.33%]
- Compilacao de sistemas [1.19%]
- Feriado [0.84%]
- Correção de Erros Interno [0.81%]
- Sprint Planning 2 [0.72%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.68%]
- Atraso / Saida antecipada [0.63%]
- Verificando apontamento [0.44%]
- Clean Code [0.37%]
- Reuniao [0.35%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [0.35%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.16%]
- Atestado [0.14%]
- Preparando ambiente [0.12%]
- Correcao de Erros Externo [0.08%]
- Sizing [0.08%]
- Planejamento de Projeto [0.08%]
- Auxilio suporte [0.05%]

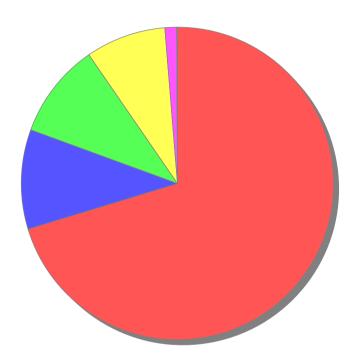

- Desenvolvimento de Requisitos [68.81%]
- Diversos* [10.07%]
- Gestao de Requisitos [9.62%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [8.13%]
- Gerencia de Configuracao [1.19%]
- Planejamento de Projeto [0.08%]
