

INDICADORES DA SPRINT

		202	404			202	405	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	252h00m	308h00m	308h00m	308h00m	300h00m	241h36m	264h00m	196h48m
02. Horas realizadas de todas atividades	243h25m	307h45m	316h35m	270h44m	311h34m	228h04m	266h55m	189h57m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	212h35m	257h55m	265h25m	265h25m	253h45m	203h36m	225h25m	165h18m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	203h19m	249h12m	245h13m	229h44m	231h23m	163h09m	216h36m	141h29m
05. Pontos planejados	57,0	72,0	60,0	58,0	50,0	35,0	53,0	54,5
06. Pontos entregues	65,5	86	78,5	74	69,5	53	69	44,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	59,50	70,00	64,00	69,00	47,00	40,00	46,00	39,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	6,00	16,00	14,50	5,00	22,50	13,00	23,00	5,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	4	0	0	0	2	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	13	12	14	11	11	12	9	11
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	3	8	10	4	9	9	10	6
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	2	0	0	0	1	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	1	2,5	0	2	0	0,5	0
15. Produtividade planejada	0,269	0,280	0,227	0,219	0,198	0,172	0,236	0,330
16. Produtividade realizada	0,323	0,346	0,321	0,323	0,301	0,325	0,319	0,315
17. % Pontos NP / Pontos entregues	9,2	18,7	18,5	6,8	32,4	24,6	33,4	12,4

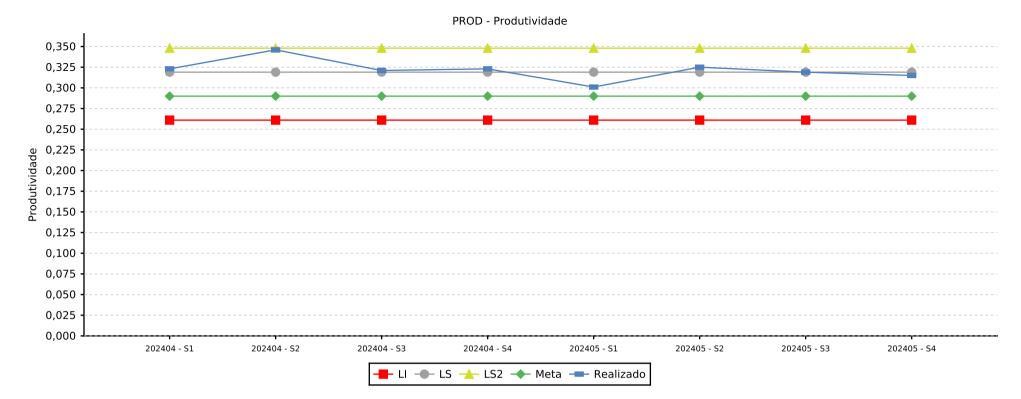


		202	404			202	405	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,323	0,346	0,321	0,323	0,301	0,325	0,319	0,315
Meta	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
LS2	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348
LS	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319
LI	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261

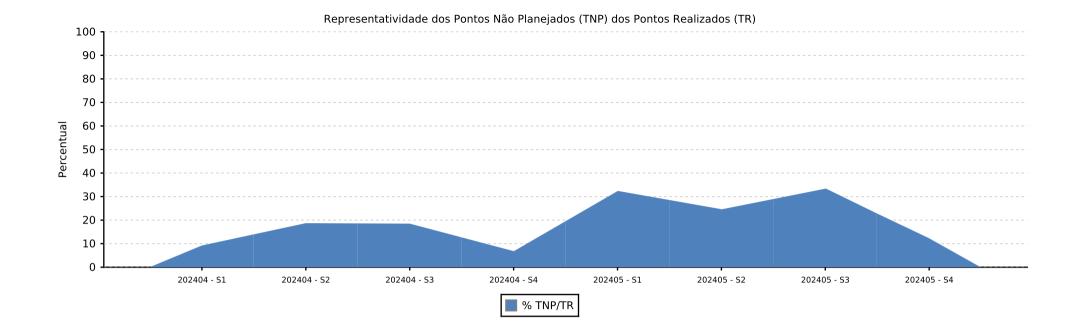


		202	404			202	405	
	1	1 2 3 4				2	3	4
TR - Pontos Realizados	65.5	86	78.5	74	69.5	53	69	44.5
TNP - Pontos Não Planejados	6	16	14.5	5	22.5	13	23	5.5
% TNP/TR	9,2	18,7	18,5	6,8	32,4	24,6	33,4	12,4

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

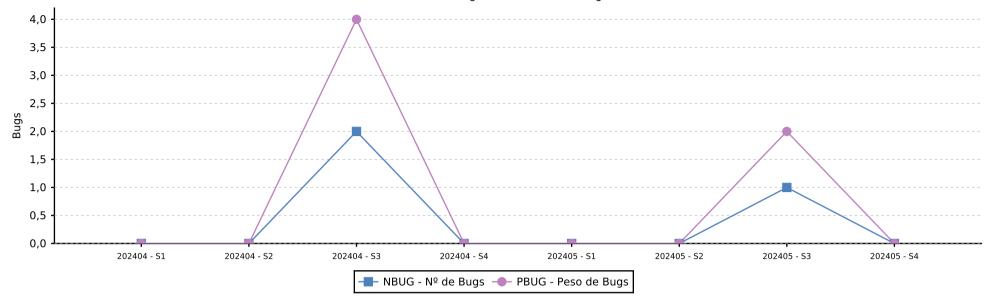

		202	404			202	405	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	2	0	0	0	1	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	4	0	0	0	2	0
Pontos Entregues	65.5	86	78.5	74	69.5	53	69	44.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00

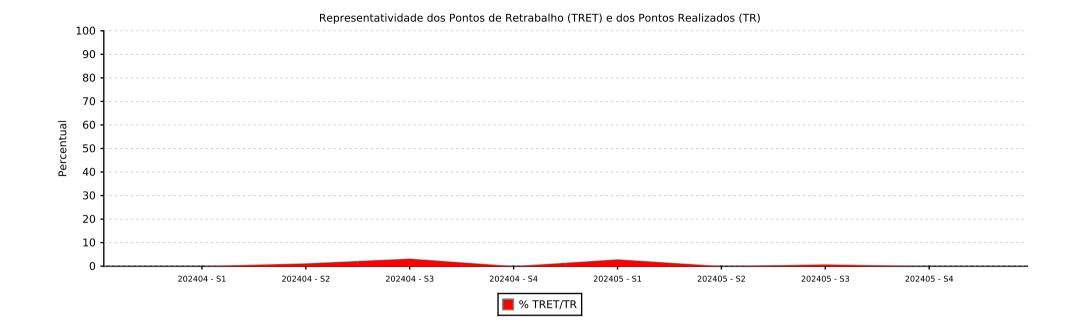


		202	404			202	405	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	65.5	86	78.5	74	69.5	53	69	44.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1	2.5	0	2	0	0.5	0
% TRET/TR	0,0	1,2	3,2	0,0	2,9	0,0	0,7	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	193	204,32	161,02	141,6	188,5	196,9	133,97	109,62	676,49	652,44	96,4 %
Analise de Sistema	21,5	34,6	18,67	30,07	19,5	23,85	15,42	14,32	75,09	102,84	137,0 %
Ausencia	0	23,25	0	8,83	0	8,15	0	10,58	0	50,81	0,0 %
Correção de Erros Interno	2,75	3,1	6,17	2,58	2,5	0	1,92	8,6	13,34	14,28	107,0 %
Outros	1,08	0	1,08	3,83	1,08	1	1,08	7,67	4,32	12,5	289,4 %
Daily Scrum	30	11,88	9,33	8,13	10,67	8,37	7,33	6,68	57,33	35,06	61,2 %
Sprint Planning 1	10,5	3,33	10,5	0,58	9	4,67	7,5	5,5	37,5	14,08	37,5 %
Retrospectiva	7	4,67	7	5,25	6	5	5	5	25	19,92	79,7 %
Cafe	8,5	7,25	6,75	5,5	7,5	6,75	5,75	4,25	28,5	23,75	83,3 %
Code Review	3,75	4,18	2,75	8,17	1,75	3,28	1,75	3,87	10	19,5	195,0 %
Sprint Planning 2	7	2	7	1,17	6	1	5	2,5	25	6,67	26,7 %
Ginastica Laboral	4,83	4,5	3,83	3,33	4,17	3,83	3,33	2,33	16,16	13,99	86,6 %
Clean Code	1,75	0,42	1,42	3,33	1,5	0,67	1,25	2,17	5,92	6,59	111,3 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,92	0	0,85	0	1,78	0	1,87	0	5,42	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	1,5	0,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	0,42	0,25	0	0,25	0	1,92	1,42	2,67	1,84	68,9 %
Compilacao de sistemas	2,5	0,48	1	0,83	0,5	0	1	1,33	5	2,64	52,8 %
Verificando apontamento	0,42	1,67	0,33	1,25	0,42	1,67	0	0,75	1,17	5,34	456,4 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	0,7	0,42	0,75	0,5	0	0	0	1,42	1,45	102,1 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1	0	0,92	0	1	0	0,92	0	3,84	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	1,25	0	0,5	0	0	0	0	0,5	1,75	350,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	1,63	0	0	0	0	0	0	0	1,63	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Reuniao	1	1	1	1,5	1	0	1	0	4	2,5	62,5 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total G	eral 300	311,57	241,61	228,05	264,01	266,92	196,81	189,96	1.002,43	996,5	99,4 %

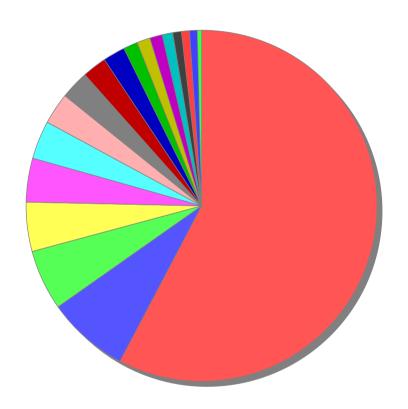

- Desenvolvimento [57.71%]
- Analise de Sistema [7.54%]
- Ausencia [5.57%]
- Ocrreção de Erros Interno [4.53%]
- Outros [4.04%]
- Daily Scrum [3.52%]
- Sprint Planning 1 [2.9%]
- Retrospectiva [2.63%]
- Cafe [2.24%]
- Code Review [2.04%]
- Sprint Planning 2 [1.32%]
- Ginastica Laboral [1.23%]
- Clean Code [1.14%]
- Atraso / Saida antecipada [0.98%]
- Atestado [0.79%]
- Planejamento de Projeto [0.75%]
- Compilacao de sistemas [0.7%]
- Verificando apontamento [0.39%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	199,67	209,78	170,1	148,77	194,17	197,57	138,22	120,38	702,16	676,5	96,3 %
DIV - Diversos*		15,42	36	12,67	23	13,75	19,73	11,17	24,83	53,01	103,56	195,4 %
REQM - Gestao de Requisitos		41	41,57	38,17	31,82	36,5	29,52	29,92	22,32	145,59	125,23	86,0 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	40,75	20,73	19,08	21,55	18,42	16,65	14,08	15,55	92,33	74,48	80,7 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0,42	0,25	0	0,25	0	1,92	1,42	2,67	1,84	68,9 %
CM - Gerencia de Configuração		2,5	0,48	1	0,83	0,5	0	1,5	1,33	5,5	2,64	48,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	299,59	308,98	241,27	225,97	263,59	263,47	196,81	185,83	1.001,26	984,25	98,3 %

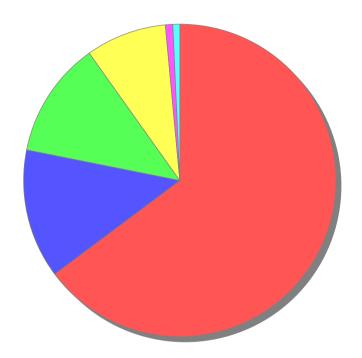


- Desenvolvimento de Requisitos [64.78%]
- Diversos* [13.36%]
- Gestao de Requisitos [12.01%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [8.37%]
- Planejamento de Projeto [0.76%]
- Gerencia de Configuracao [0.72%]

INDICADORES DO PROJETO

	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
01. Horas planejadas de todas atividades	544h00m	504h00m	442h24m	545h36m	591h12m	704h00m	1176h00m	1002h24m
02. Horas realizadas de todas atividades	534h40m	514h40m	496h21m	560h42m	673h10m	778h03m	1138h29m	996h30m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	442h20m	412h55m	363h19m	471h46m	509h07m	621h00m	1001h20m	848h04m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	404h28m	403h30m	375h49m	461h52m	477h30m	539h30m	927h28m	752h37m
05. Pontos planejados para o projeto	140,0	132,0	117,0	146,0	158,0	191,0	207,0	245,0
06. Pontos planejados	137,5	137,0	123,5	161,0	179,0	197,5	247,0	192,5
07. Pontos entregues	134	133,5	133	151,5	153,5	178	304	236
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	102,00	95,50	91,50	131,50	117,50	112,50	262,50	172,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	32,00	38,00	41,50	20,00	36,00	65,50	41,50	64,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	6	0	0	0	8	3	4	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	49	23	24	35	35	24	50	43
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	37	26	28	14	22	38	25	34
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	3	0	0	0	4	2	2	1
14. Horas de correção de bug	3h31m	0h00m	0h00m	0h00m	3h22m	1h10m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	6	1	0	0	3	8	3,5	2,5
16. Produtividade planejada	0,311	0,332	0,340	0,342	0,352	0,319	0,247	0,227
17. Produtividade realizada	0,332	0,331	0,354	0,329	0,322	0,330	0,328	0,314
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	95,8	101,2	113,7	103,8	97,2	93,2	146,9	96,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	23,9	28,5	31,3	13,3	23,5	36,8	13,7	27,2

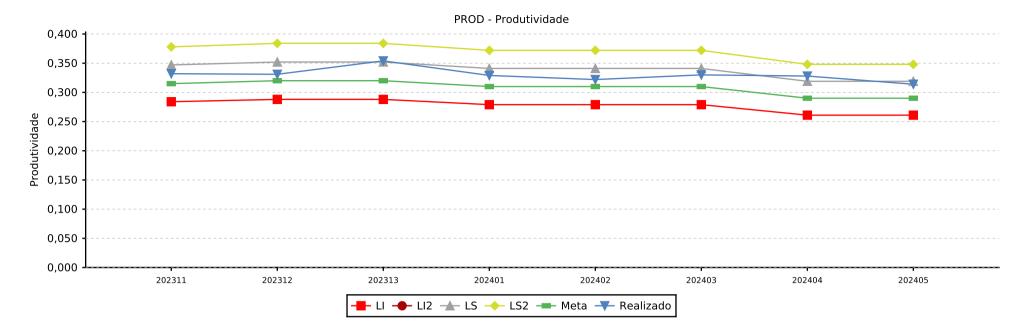

	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
Realizado	0,332	0,331	0,354	0,329	0,322	0,330	0,328	0,314
Meta	0,315	0,320	0,320	0,310	0,310	0,310	0,290	0,290
LS2	0,378	0,384	0,384	0,372	0,372	0,372	0,348	0,348
LS	0,347	0,352	0,352	0,341	0,341	0,341	0,319	0,319
LI2								
LI	0,284	0,288	0,288	0,279	0,279	0,279	0,261	0,261

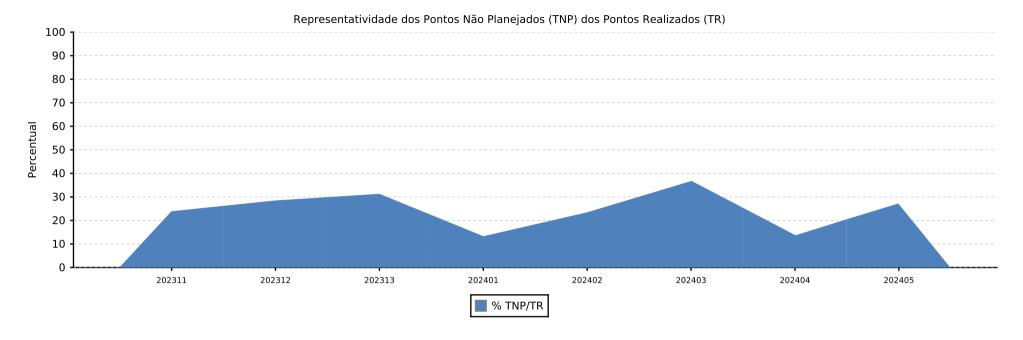


	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
TR - Pontos Realizados	134	133.5	133	151.5	153.5	178	304	236
TNP - Pontos Não Planejados	32	38	41.5	20	36	65.5	41.5	64
% TNP/TR	23,9	28,5	31,3	13,3	23,5	36,8	13,7	27,2




2,5								
0,0								
7,5								
5,0 +								
2,5 +								
			_					Y
` () 	1	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
),0 1	202311	202312						


	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
Realizado	6	0	0	0	8	3	4	2
Meta	10	10	8	9	10	11	13	14
LS2								
LS	11	11	8	9	11	12	14	15
LI2	8	8	6	7	8	8	10	11
LI	9	9	7	8	9	9	11	12
Pontos Entregues	134	133.5	133	151.5	153.5	178	304	236
% PBUG / TR	4,48	0,00	0,00	0,00	5,22	1,69	1,32	0,85

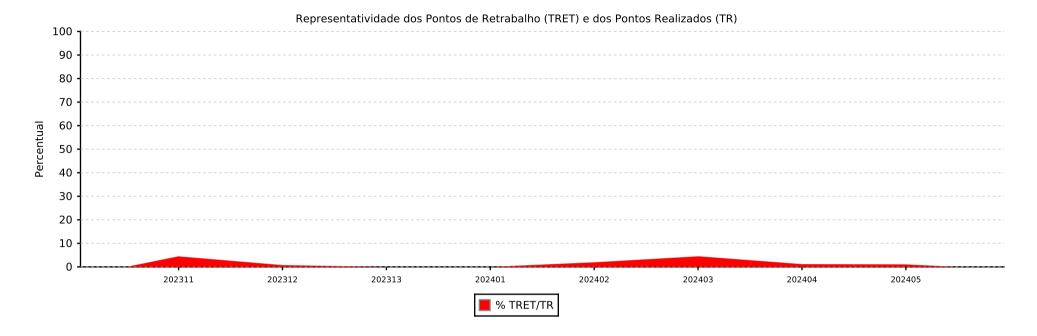


	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
TR - Pontos Realizados	134	133.5	133	151.5	153.5	178	304	236
TRET - Pontos de Retrabalho	6	1	0	0	3	8	3.5	2.5
% TRET/TR	4,5	0,7	0,0	0,0	2,0	4,5	1,2	1,1

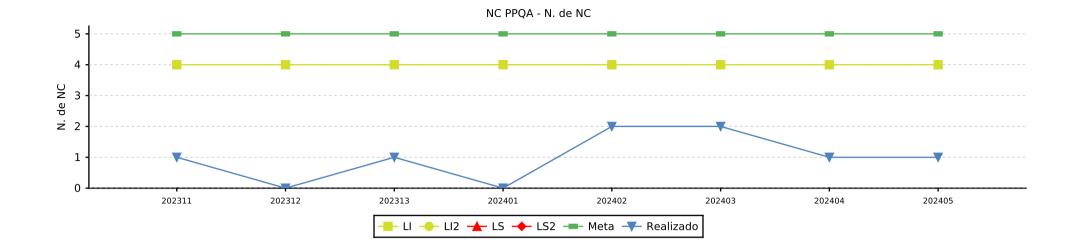


	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
Realizado	1	0	1	0	2	2	1	1
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

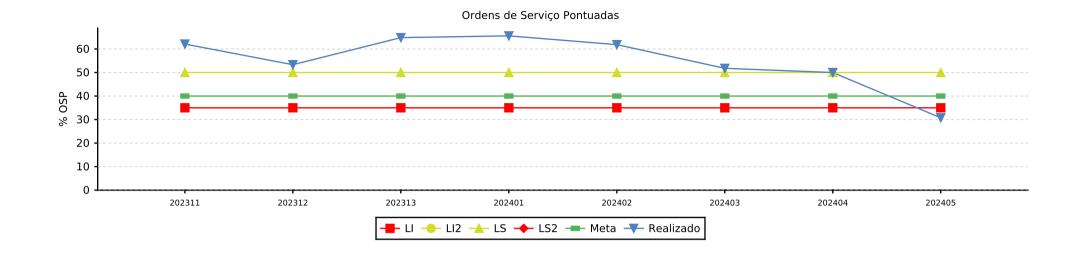

	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
Realizado	62.11	53.33	64.84	65.59	61.86	51.79	50	30.77
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

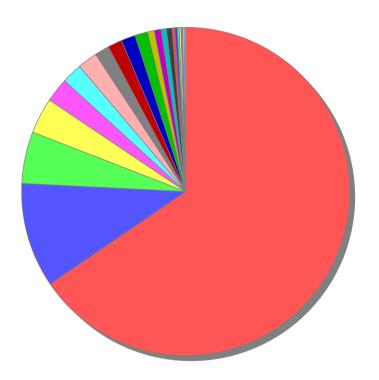

- Desenvolvimento [65.47%]
- Analise de Sistema [10.32%]
- Ausencia [5.1%]
- Daily Scrum [3.52%]
- Cafe [2.38%]
- Retrospectiva [2%]
- Code Review [1.96%]
- Correção de Erros Interno [1.43%]
- Sprint Planning 1 [1.41%]
- Ginastica Laboral [1.4%]
- Outros [1.25%]
- Sprint Planning 2 [0.67%]
- Clean Code [0.66%]
- Atraso / Saida antecipada [0.54%]
- Verificando apontamento [0.53%]
- Compilacao de sistemas [0.27%]
- Reuniao [0.25%]
- Planejamento de Projeto [0.18%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.18%]
- Preparando ambiente [0.16%]
- Atestado [0.15%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.15%]

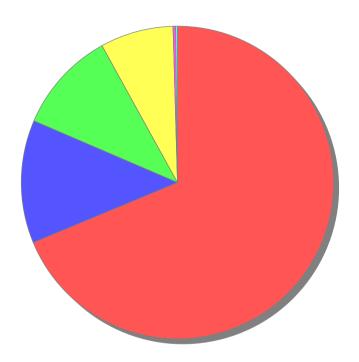

- Desenvolvimento de Requisitos [67.89%]
- Gestao de Requisitos [12.57%]
- Diversos* [10.39%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.47%]
- Gerencia de Configuracao [0.27%]
- Planejamento de Projeto [0.18%]
