

INDICADORES DA SPRINT

		202	502			202	503	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	264h00m	264h00m	264h00m	264h00m	308h00m	185h04m	308h00m	308h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	305h23m	302h42m	301h21m	303h47m	305h53m	183h20m	306h16m	308h20m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	227h40m	226h35m	225h45m	226h35m	265h05m	151h15m	265h05m	264h15m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	238h28m	256h31m	219h31m	252h01m	229h26m	146h42m	259h45m	264h44m
05. Pontos planejados	65,5	67,0	69,5	74,0	85,0	79,0	78,0	77,5
06. Pontos entregues	78	86	78,5	86,5	74	50	85,5	87
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	74,50	65,50	53,00	69,00	63,00	49,50	57,00	62,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	3,50	20,50	25,50	17,50	11,00	0,50	28,50	25,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	2
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	26	18	21	12	14	12	10	16
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	4	13	13	10	11	1	15	12
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h35m						
14. Pontos de retrabalho	0,5	3	0	0	0,5	0	0	3,5
15. Produtividade planejada	0,288	0,296	0,308	0,327	0,321	0,523	0,295	0,294
16. Produtividade realizada	0,328	0,336	0,358	0,344	0,323	0,341	0,330	0,329
17. % Pontos NP / Pontos entregues	4,5	23,9	32,5	20,3	14,9	1	33,4	28,8

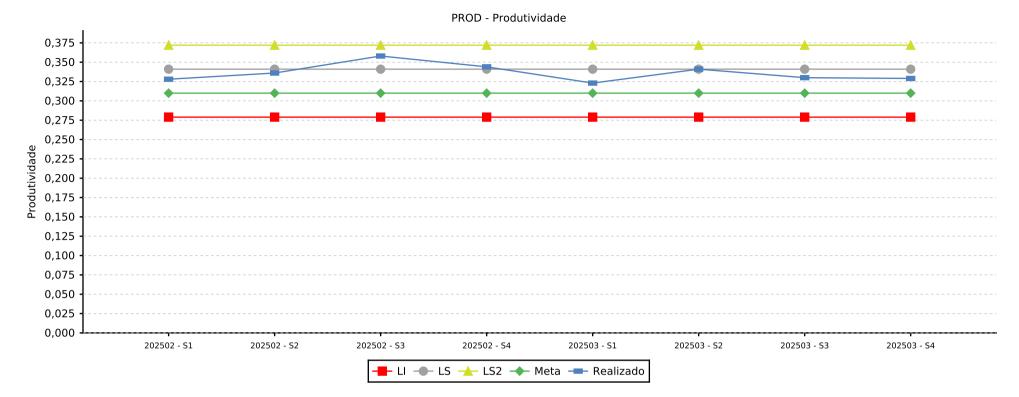


		202	502		202503					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,328	0,336	0,358	0,344	0,323	0,341	0,330	0,329		
Meta	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310		
LS2	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372		
LS	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341		
LI	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279		

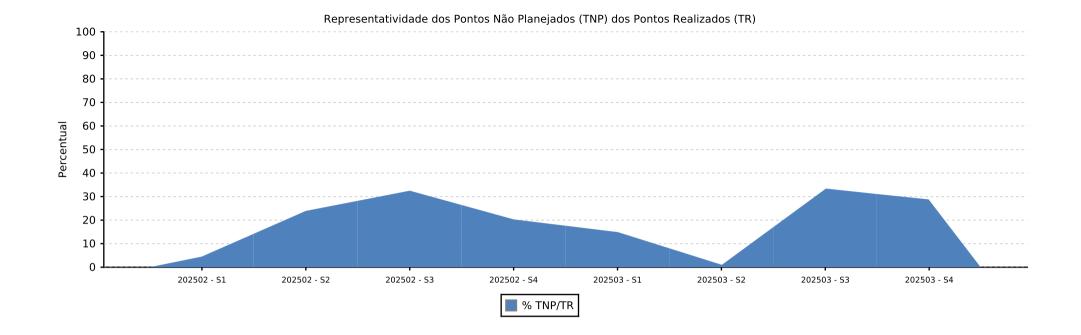


		202	502			202	503	
	1	1 2 3 4 1 2					3	4
TR - Pontos Realizados	78	86	78.5	86.5	74	50	85.5	87
TNP - Pontos Não Planejados	3.5	20.5	25.5	17.5	11	0.5	28.5	25
% TNP/TR	4,5	23,9	32,5	20,3	14,9	1,0	33,4	28,8

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

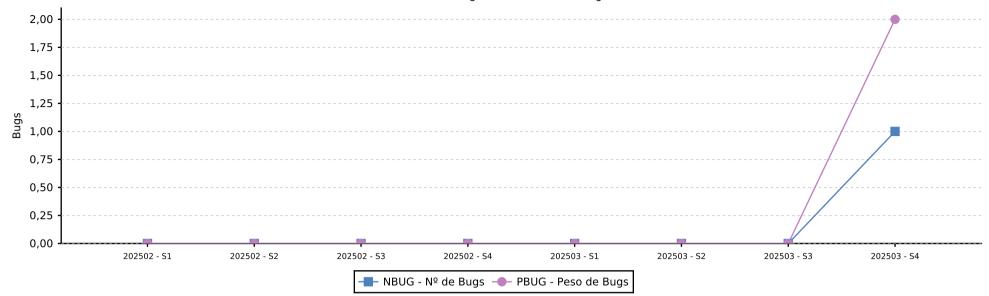

		·						
		202	502			202	503	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	1
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	2
Pontos Entregues	78	86	78.5	86.5	74	50	85.5	87
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30

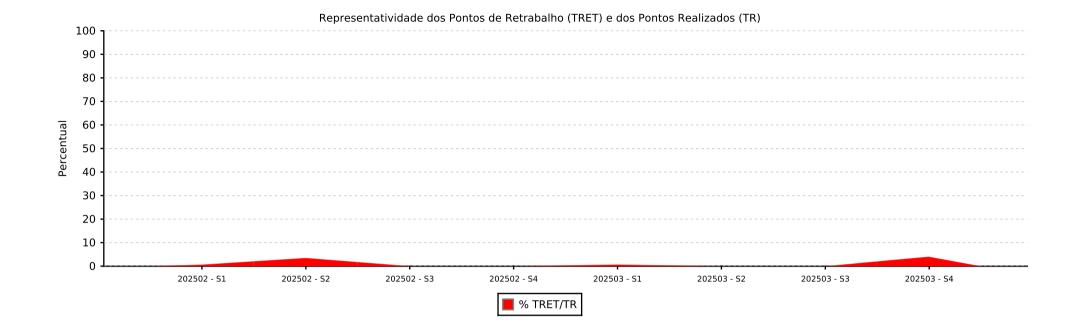


		202	502			202	503	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	78	86	78.5	86.5	74	50	85.5	87
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	3	0	0	0.5	0	0	3.5
% TRET/TR	0,6	3,5	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	4,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	nt 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	219,75	207,4	112,8	127,88	219,75	234,5	216,42	225,95	768,72	795,73	103,5 %
Analise de Sistema	19,5	26,87	15,4	11,25	19,5	20,27	19,5	18,32	73,9	76,71	103,8 %
Daily Scrum	14	7,92	7,2	3,35	14	8,83	14	11,75	49,2	31,85	64,7 %
Cafe	8,75	7,75	5,25	4,75	8,75	8,25	8,75	8,5	31,5	29,25	92,9 %
Retrospectiva	7	2,92	7	5,25	7	5,92	7	7,67	28	21,76	77,7 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	3,07	0	1,55	0	2,17	0	6,37	0	13,16	0,0 %
Sprint Planning 1	10,5	4,5	10,5	3,5	10,5	2,92	10,5	6	42	16,92	40,3 %
Ginastica Laboral	5	3,63	3,17	1,83	5	3,5	5	3,75	18,17	12,71	70,0 %
Correção de Erros Interno	3,5	0,5	3,5	1,25	3,5	1,58	3,5	3,25	14	6,58	47,0 %
Ausencia	0	4,78	0	1,5	0	3,27	0	3,22	0	12,77	0,0 %
Code Review	3,25	4,58	2,92	3,23	3,25	0,25	3,25	3,17	12,67	11,23	88,6 %
Compilacao de sistemas	2,5	8,27	2,5	1	2,5	1,78	2,5	2,32	10	13,37	133,7 %
Verificando apontamento	0,42	1,67	0,25	1,08	0,42	1,83	0,42	1,75	1,51	6,33	419,2 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,15	0	0,32	0	2,95	0	1,75	0	5,17	0,0 %
Clean Code	1,75	1,47	1,67	2,17	1,75	3,25	1,75	1,5	6,92	8,39	121,2 %
Sprint Planning 2	7	1,67	7	1,75	7	0,58	7	1,17	28	5,17	18,5 %
Outros	0,17	1,5	1	0,5	0,17	0	1	0,83	2,34	2,83	120,9 %
Correcao de Erros Externo	1,33	0	1,33	0	1,33	0	1,33	0,58	5,32	0,58	10,9 %
Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	0	0,25	0	2,25	0,5	3	0,5	16,7 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	8,25	0	0	0	0	0	8,25	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	2,5	0	1,42	0	0	0	3,92	0,0 %
Reuniao	1	1,75	1	0	1	0	1	0	4	1,75	43,8 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Curso/Palestra		0	0	0	0,42	0	0	0	0	0	0,42	0,0 %
Banheiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.		0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Particular		0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado		0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao		0,17	2,25	0,17	0	0,17	2,5	0,17	0	0,68	4,75	698,5 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing		2	1,75	2	0	2	0	2	0	8	1,75	21,9 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	308,01	305,9	185,08	183,33	308,01	306,27	308,01	308,35	1.109,11	1.103,85	99,5 %

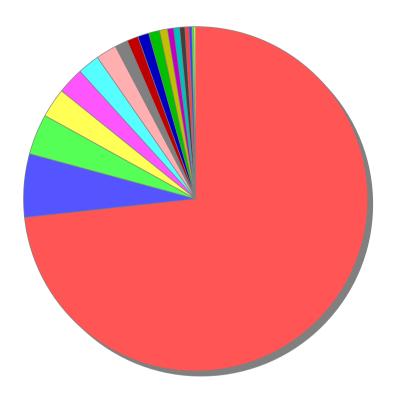

- Desenvolvimento [73.28%]
- Analise de Sistema [5.94%]
- Daily Scrum [3.81%]
- Ocafe [2.76%]
- Retrospectiva [2.49%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [2.07%]
- Sprint Planning 1 [1.95%]
- Ginastica Laboral [1.22%]
- Correção de Erros Interno [1.05%]
- Ausencia [1.04%]
- Code Review [1.03%]
- Compilacao de sistemas [0.75%]
- Verificando apontamento [0.57%]
- Atraso / Saida antecipada [0.57%]
- Clean Code [0.49%]
- Sprint Planning 2 [0.38%]
- Outros [0.27%]
- Correcao de Erros Externo [0.19%]
- Planejamento de Projeto [0.16%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	226,5	213,93	119,47	132,85	226,5	241,5	223,17	237,65	795,64	825,93	103,8 %
REQM - Gestao de Requisitos		39	34,78	34,9	19	39	25,18	39	25,48	151,9	104,44	68,8 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	24,25	15,42	17,12	11,83	24,25	15	24,25	22,58	89,87	64,83	72,1 %
DIV - Diversos*		15,08	21,67	10,58	8,58	15,08	17,52	15,92	16,3	56,66	64,07	113,1 %
CM - Gerencia de Configuração		2,5	8,27	2,5	1	2,5	1,78	3	2,32	10,5	13,37	127,3 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	2,25	0,5	3	0,5	16,7 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0,42	0	0	0	0	0	0,42	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	307,58	294,07	184,82	173,68	307,58	300,98	307,59	304,83	1.107,57	1.073,56	96,9 %

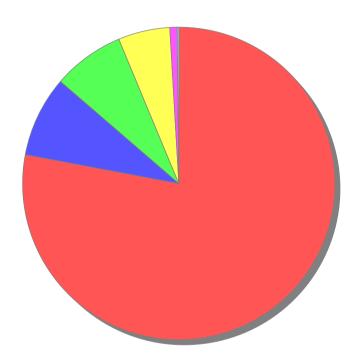


- Desenvolvimento de Requisitos [77.96%]
- Gestao de Requisitos [8.36%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.41%]
- Diversos* [5.35%]
- Gerencia de Configuração [0.76%]
- Planejamento de Projeto [0.16%]

INDICADORES DO PROJETO


	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
01. Horas planejadas de todas atividades	1352h00m	1408h00m	1084h00m	1048h00m	1116h44m	1021h36m	1056h00m	1109h04m
02. Horas realizadas de todas atividades	1361h25m	1321h10m	1128h07m	1140h44m	1170h46m	1102h30m	1213h13m	1103h49m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1146h40m	1196h00m	920h50m	890h00m	946h39m	865h06m	906h35m	945h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1088h53m	1008h14m	899h52m	826h05m	814h36m	747h07m	966h31m	900h37m
05. Pontos planejados para o projeto	336,0	359,0	276,0	267,0	289,0	265,0	280,0	292,0
06. Pontos planejados	316,0	320,0	309,5	289,0	274,0	197,0	276,0	319,5
07. Pontos entregues	358,5	339	312,5	263	278	239,5	329	296,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	275,00	262,50	234,50	211,00	232,50	182,00	262,00	231,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	83,50	76,50	78,00	52,00	45,50	57,50	67,00	65,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	6	0	0	3	0	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	57	69	68	55	76	56	77	52
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	45	44	40	24	28	31	40	39
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	3	3	0	2	2	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h40m	0h00m	3h00m	0h00m	0h00m	0h35m
15. Pontos de retrabalho	0	3,5	4	2,5	2	1	3,5	4
16. Produtividade planejada	0,276	0,268	0,337	0,325	0,290	0,228	0,305	0,338
17. Produtividade realizada	0,330	0,337	0,348	0,319	0,342	0,321	0,341	0,330
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	106,7	94,5	113,3	98,6	96,2	90,4	117,5	101,6
19. % Pontos NP / Pontos entregues	23,3	22,6	25	19,8	16,4	24,1	20,4	22

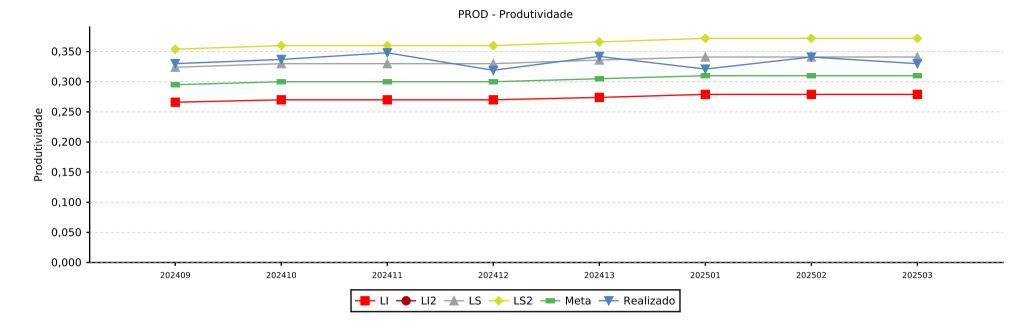


	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
Realizado	0,330	0,337	0,348	0,319	0,342	0,321	0,341	0,330
Meta	0,295	0,300	0,300	0,300	0,305	0,310	0,310	0,310
LS2	0,354	0,360	0,360	0,360	0,366	0,372	0,372	0,372
LS	0,324	0,330	0,330	0,330	0,336	0,341	0,341	0,341
LI2								
LI	0,266	0,270	0,270	0,270	0,274	0,279	0,279	0,279

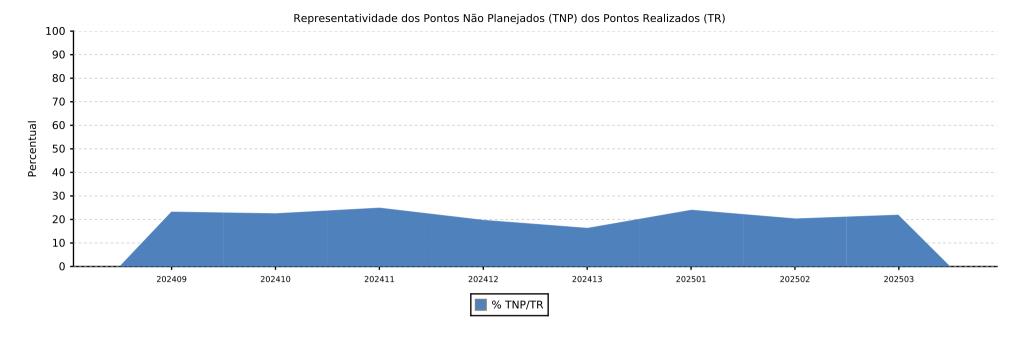


	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
TR - Pontos Realizados	358.5	339	312.5	263	278	239.5	329	296.5
TNP - Pontos Não Planejados	83.5	76.5	78	52	45.5	57.5	67	65
% TNP/TR	23,3	22,6	25,0	19,8	16,4	24,1	20,4	22,0

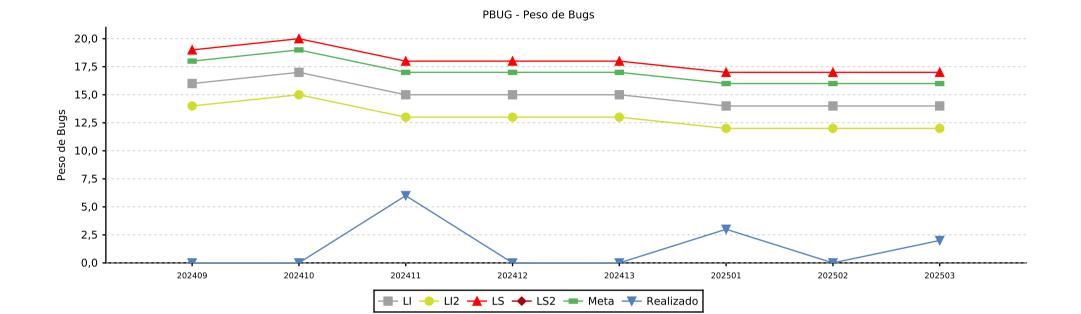


	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
Realizado	0	0	6	0	0	3	0	2
Meta	18	19	17	17	17	16	16	16
LS2								
LS	19	20	18	18	18	17	17	17
LI2	14	15	13	13	13	12	12	12
LI	16	17	15	15	15	14	14	14
Pontos Entregues	358.5	339	312.5	263	278	239.5	329	296.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,26	0,00	0,68

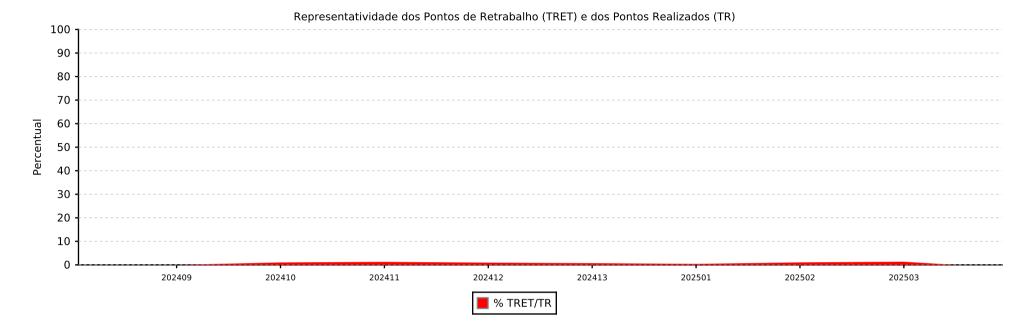


	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
TR - Pontos Realizados	358.5	339	312.5	263	278	239.5	329	296.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	3.5	4	2.5	2	1	3.5	4
% TRET/TR	0,0	1,0	1,3	1,0	0,7	0,4	1,1	1,3

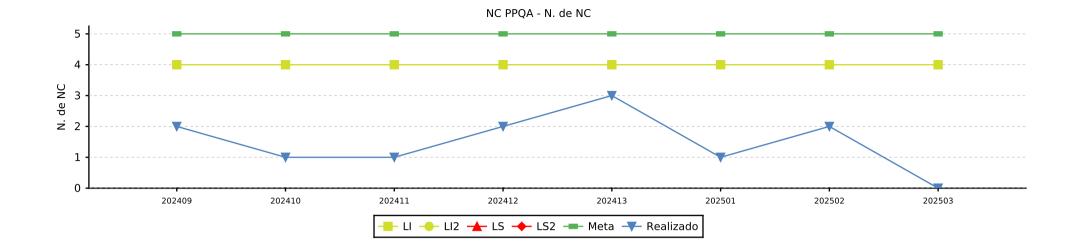


	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
Realizado	2	1	1	2	3	1	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

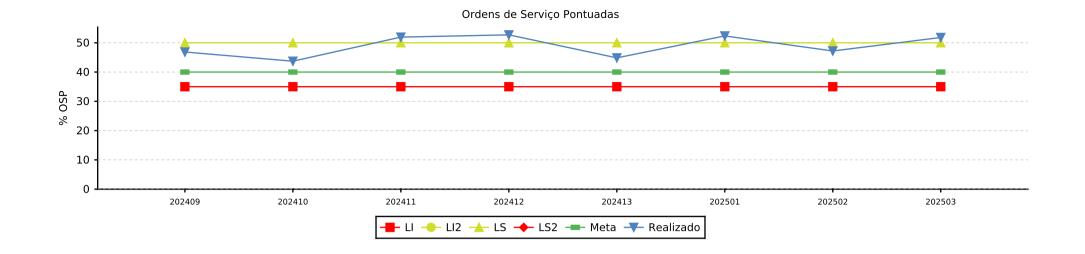

	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
Realizado	46.85	43.71	51.94	52.71	44.85	52.35	47.2	51.82
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

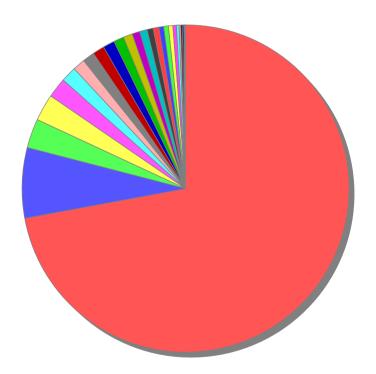

- Desenvolvimento [72.09%]
- Analise de Sistema [6.95%]
- Daily Scrum [2.89%]
- Cafe [2.65%]
- Retrospectiva [1.97%]
- Sprint Planning 1 [1.53%]
- Compilacao de sistemas [1.21%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.19%]
- Ausencia [1.16%]
- Ginastica Laboral [1.15%]
- Code Review [1.02%]
- Atestado [0.91%]
- Clean Code [0.76%]
- Treinamento [0.75%]
- Correção de Erros Interno [0.6%]
- Verificando apontamento [0.57%]
- Atraso / Saida antecipada [0.47%]
- Sprint Planning 2 [0.47%]
- O Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.43%]
- Analise Retorno O.S. [0.36%]
- Outros [0.26%]
- Reuniao [0.16%]
- Sizing [0.16%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.14%]
- Correcao de Erros Externo [0.05%]
- Planejamento de Projeto [0.05%]
- Particular [0.05%]
- Curso/Palestra [0.04%]

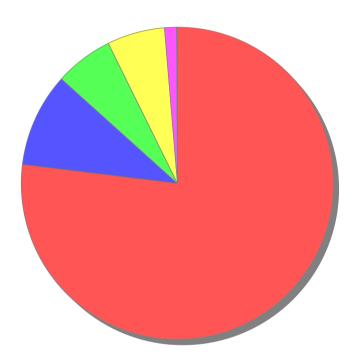

- Desenvolvimento de Requisitos [74.82%]
- Gestao de Requisitos [9.46%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.87%]
- Diversos* [5.8%]
- Gerencia de Configuracao [1.21%]
- Planejamento de Projeto [0.05%]
- Treinamento na Organizacao [0.04%]
