

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	504			202	505	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	307h50m	307h50m	307h50m	251h50m	216h00m	216h00m	292h00m	216h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	306h22m	308h08m	309h52m	252h29m	214h02m	220h31m	301h32m	212h36m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	266h15m	266h25m	266h15m	212h50m	183h45m	184h35m	250h45m	180h50m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	245h26m	258h18m	253h40m	203h13m	166h34m	174h46m	246h37m	151h06m
05. Pontos planejados	71,0	95,0	84,5	76,5	56,0	49,0	67,0	54,0
06. Pontos entregues	78,5	87	85	69	54	61	80,5	51
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	53,00	79,50	72,50	67,50	38,00	55,00	73,00	35,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	25,50	7,50	12,50	1,50	16,00	6,00	7,50	16,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	2	0	0	0	2
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	19	13	15	18	12	11	13	8
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	17	6	11	3	6	5	7	6
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	1	0	1	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0,5	0	0,5	0	3
15. Produtividade planejada	0,267	0,357	0,318	0,360	0,305	0,266	0,268	0,299
16. Produtividade realizada	0,320	0,337	0,336	0,340	0,325	0,350	0,327	0,338
17. % Pontos NP / Pontos entregues	32,5	8,7	14,8	2,2	29,7	9,9	9,4	31,4

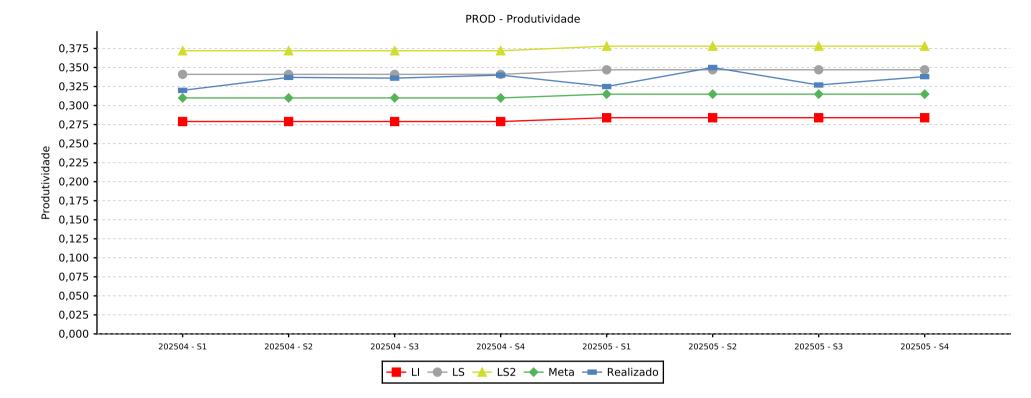


		202	504		202505					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,320	0,337	0,336	0,340	0,325	0,350	0,327	0,338		
Meta	0,310	0,310	0,310	0,310	0,315	0,315	0,315	0,315		
LS2	0,372	0,372	0,372	0,372	0,378	0,378	0,378	0,378		
LS	0,341	0,341	0,341	0,341	0,347	0,347	0,347	0,347		
LI	0,279	0,279	0,279	0,279	0,284	0,284	0,284	0,284		

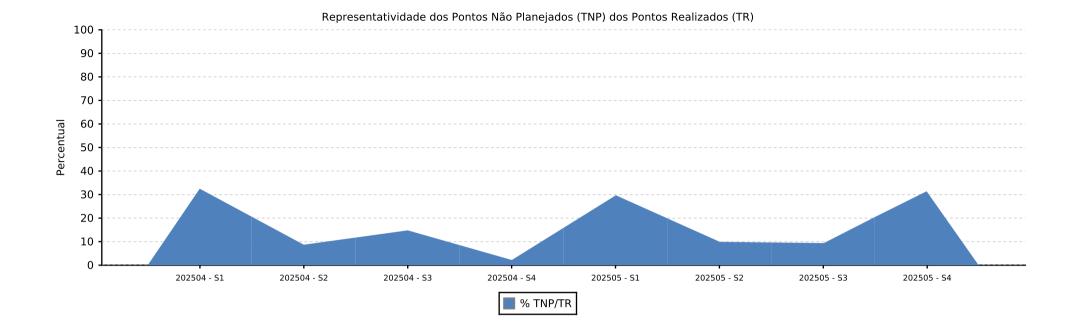


		202	504			202	505	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	78.5	87	85	69	54	61	80.5	51
TNP - Pontos Não Planejados	25.5	7.5	12.5	1.5	16	6	7.5	16
% TNP/TR	32,5	8,7	14,8	2,2	29,7	9,9	9,4	31,4

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

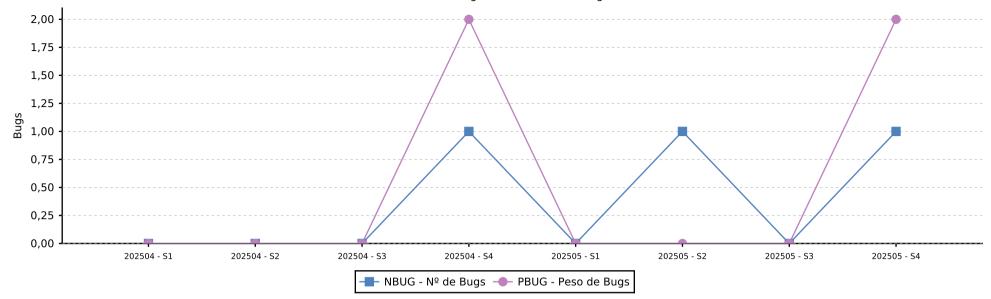

		202	504		202505					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	1	0	1	0	1		
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	2	0	0	0	2		
Pontos Entregues	78.5	87	85	69	54	61	80.5	51		
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	3,93		

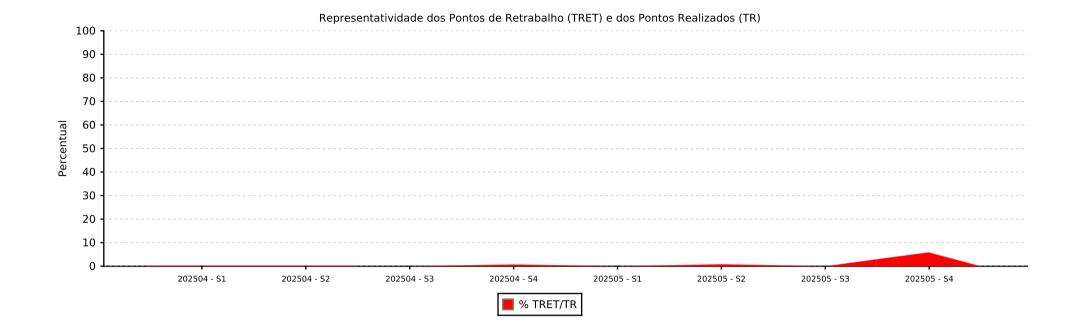


		202	504			202	505	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	78.5	87	85	69	54	61	80.5	51
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0.5	0	0.5	0	3
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,8	0,0	5,9

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	147,67	152,58	148,5	163,6	209,42	228,9	142,5	134,37	648,09	679,45	104,8 %
Analise de Sistema	16	16,25	16	19,03	18	22,48	15,5	25,07	65,5	82,83	126,5 %
Treinamento	0	0,33	0	0,42	0	0	0	14,42	0	15,17	0,0 %
Cafe	6	5,5	6	5,5	8,25	7,5	6	5,75	26,25	24,25	92,4 %
Ausencia	0	9,9	0	5,17	0	0,63	0	5,32	0	21,02	0,0 %
Daily Scrum	9,17	4,23	9,17	3,67	13,5	8,08	9,17	5,25	41,01	21,23	51,8 %
Code Review	1	2,17	1	1,5	3,25	10,87	3	4,45	8,25	18,99	230,2 %
Retrospectiva	6	5	6	3	6	4	6	3,58	24	15,58	64,9 %
Sprint Planning 1	9	3	9	2	9	2,33	9	3,08	36	10,41	28,9 %
Ginastica Laboral	3,08	2,17	3,08	2,33	4,5	3,85	3,08	2,47	13,74	10,82	78,7 %
Compilacao de sistemas	1,5	4	1,5	0	2,5	0,33	2,5	1,67	8	6	75,0 %
Sprint Planning 2	6	1	6	0,5	6	0,67	6	1,5	24	3,67	15,3 %
Verificando apontamento	0,33	1,58	0,33	1,5	0,42	1,67	0,33	1,42	1,41	6,17	437,6 %
Clean Code	1,5	0,75	1,5	1	1,75	0,42	1,5	1,17	6,25	3,34	53,4 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	0	0	0	0	1,22	0	1,15	0	2,37	0,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	0	0,25	0	2	1	2,75	1	36,4 %
Outros	1	0,83	0,17	5,17	1	4,83	0,17	0,5	2,34	11,33	484,2 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,98	0	0,22	0	0,17	0	0,45	0	1,82	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	1,25	0	1,25	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	3,08	0	3,08	1	3,5	1	2,83	0	12,49	2	16,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,17	1,67	0,17	0,75	0,17	0,75	0,17	0	0,68	3,17	466,2 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Reuniao	1	1	1	0,67	1	0	1	0	4	1,67	41,8 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	3,5	0	0	0	0	0	3,5	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	1,08	0	0	0	0,83	0	0	0	1,91	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,08	0	1,08	0	1,33	0	1,33	0	4,82	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	216	214,02	216	220,53	292,01	301,53	216	212,62	940,01	948,7	100,9 %

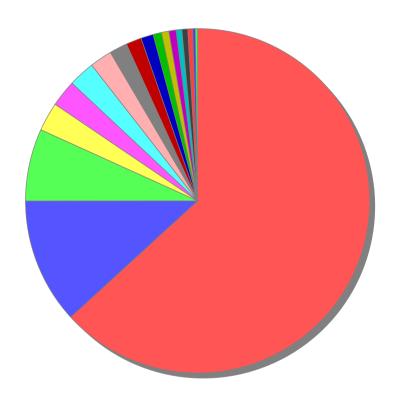

- Desenvolvimento [63.2%]
- Analise de Sistema [11.79%]
- Treinamento [6.78%]
- Cafe [2.7%]
- Ausencia [2.5%]
- Daily Scrum [2.47%]
- Code Review [2.09%]
- Retrospectiva [1.68%]
- Sprint Planning 1 [1.45%]
- Ginastica Laboral [1.16%]
- Compilacao de sistemas [0.79%]
- Sprint Planning 2 [0.71%]
- Verificando apontamento [0.67%]
- Clean Code [0.55%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.54%]
- Planejamento de Projeto [0.47%]
- Outros [0.24%]
- Atraso / Saida antecipada [0.21%]

## HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	153,5	154,42	154,33	165,6	216,17	232,37	148,33	136,68	672,33	689,07	102,5 %
REQM - Gestao de Requisitos		33	20,25	33	21,53	35	26,48	32,5	29,65	133,5	97,91	73,3 %
DIV - Diversos*		11,25	21,07	10,42	19,58	14,92	17,57	10,42	14,03	47,01	72,25	153,7 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	16,17	11,4	16,17	8,17	22,75	22,95	18,17	13,28	73,26	55,8	76,2 %
CM - Gerencia de Configuração		1,5	4	1,5	0	2,5	0,33	3	1,67	8,5	6	70,6 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	2	1	2,75	1	36,4 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	3,5	0	0	0	0	0	3,5	0,0 %
	Total Geral	215,67	211,14	215,67	218,38	291,59	299,7	214,42	196,31	937,35	925,53	98,7 %

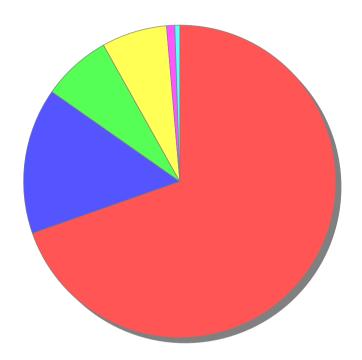


- Desenvolvimento de Requisitos [69.62%]
- Gestao de Requisitos [15.1%]
- Diversos\* [7.15%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.76%]
- Gerencia de Configuracao [0.85%]
- Planejamento de Projeto [0.51%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
01. Horas planejadas de todas atividades	1084h00m	1048h00m	1116h44m	1021h36m	1056h00m	1109h04m	1175h20m	940h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1128h07m	1140h44m	1170h46m	1102h30m	1213h13m	1101h19m	1176h51m	948h41m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	920h50m	890h00m	946h39m	865h06m	906h35m	945h40m	1011h45m	799h55m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	899h52m	826h05m	814h36m	747h07m	966h31m	900h37m	960h37m	739h03m
05. Pontos planejados para o projeto	276,0	267,0	289,0	265,0	280,0	292,0	313,0	252,0
06. Pontos planejados	309,5	289,0	274,0	197,0	276,0	319,5	327,0	226,0
07. Pontos entregues	312,5	263	278	239,5	329	295,5	319,5	246,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	234,50	211,00	232,50	182,00	262,00	231,50	272,50	201,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	78,00	52,00	45,50	57,50	67,00	64,00	47,00	45,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	6	0	0	3	0	2	2	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	68	55	76	56	77	52	65	44
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	40	24	28	31	40	38	37	24
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	3	0	2	2	0	1	1	2
14. Horas de correção de bug	0h40m	0h00m	3h00m	0h00m	0h00m	0h35m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	4	2,5	2	1	3,5	4,5	0,5	3,5
16. Produtividade planejada	0,337	0,325	0,290	0,228	0,305	0,338	0,324	0,283
17. Produtividade realizada	0,348	0,319	0,342	0,321	0,341	0,329	0,333	0,334
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	113,3	98,6	96,2	90,4	117,5	101,2	102,1	97,9
19. % Pontos NP / Pontos entregues	25	19,8	16,4	24,1	20,4	21,7	14,8	18,5

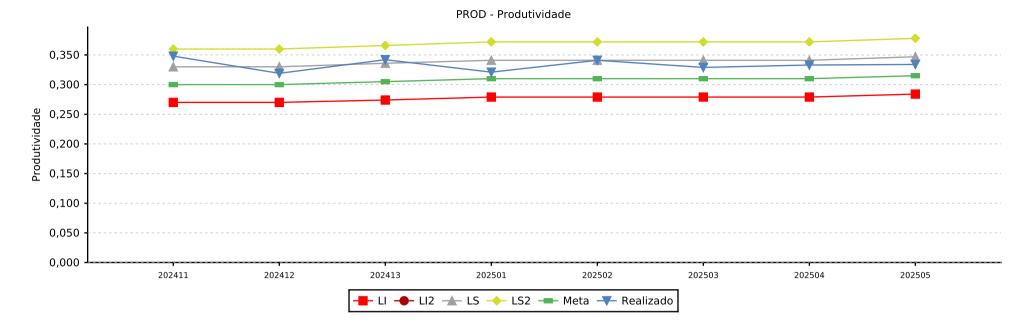


	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
Realizado	0,348	0,319	0,342	0,321	0,341	0,329	0,333	0,334
Meta	0,300	0,300	0,305	0,310	0,310	0,310	0,310	0,315
LS2	0,360	0,360	0,366	0,372	0,372	0,372	0,372	0,378
LS	0,330	0,330	0,336	0,341	0,341	0,341	0,341	0,347
LI2								
LI	0,270	0,270	0,274	0,279	0,279	0,279	0,279	0,284

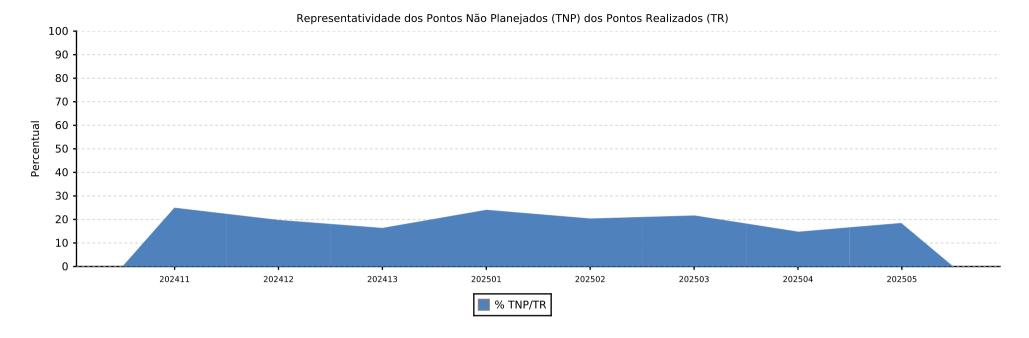


	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
TR - Pontos Realizados	312.5	263	278	239.5	329	295.5	319.5	246.5
TNP - Pontos Não Planejados	78	52	45.5	57.5	67	64	47	45.5
% TNP/TR	25,0	19,8	16,4	24,1	20,4	21,7	14,8	18,5




	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
Realizado	6	0	0	3	0	2	2	2
Meta	17	17	17	16	16	16	17	16
LS2								
LS	18	18	18	17	17	17	18	17
LI2	13	13	13	12	12	12	13	12
LI	15	15	15	14	14	14	15	14
Pontos Entregues	312.5	263	278	239.5	329	295.5	319.5	246.5
% PBUG / TR	1,92	0,00	0,00	1,26	0,00	0,68	0,63	0,82

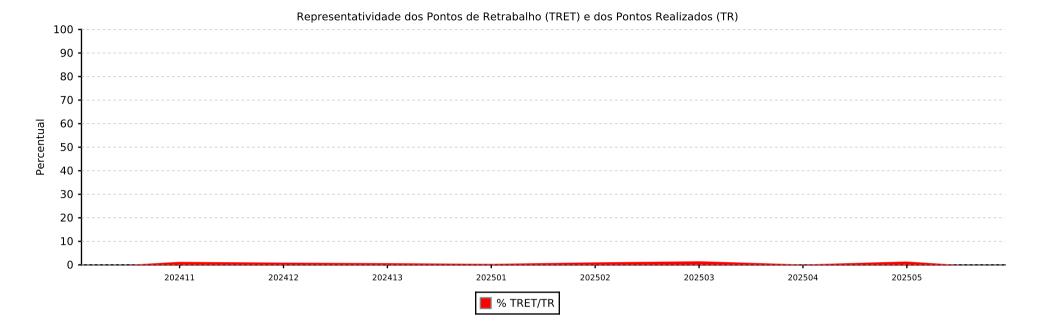


	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
TR - Pontos Realizados	312.5	263	278	239.5	329	295.5	319.5	246.5
TRET - Pontos de Retrabalho	4	2.5	2	1	3.5	4.5	0.5	3.5
% TRET/TR	1,3	1,0	0,7	0,4	1,1	1,5	0,2	1,4

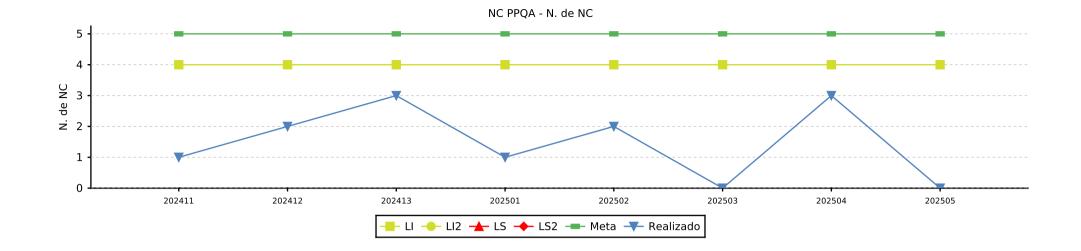


	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
Realizado	1	2	3	1	2	0	3	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

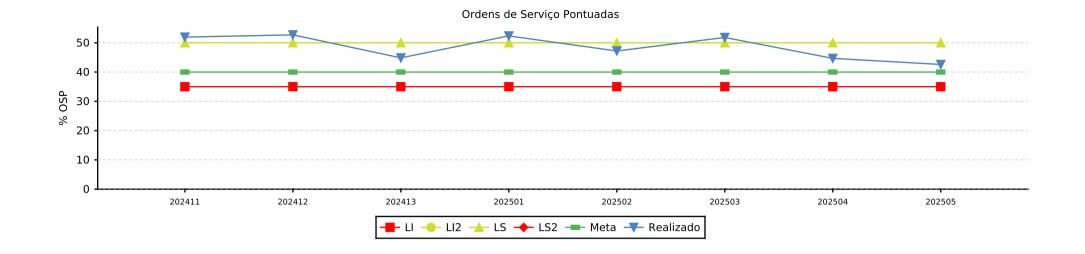

	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
Realizado	51.94	52.71	44.85	52.35	47.2	51.82	44.68	42.6
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

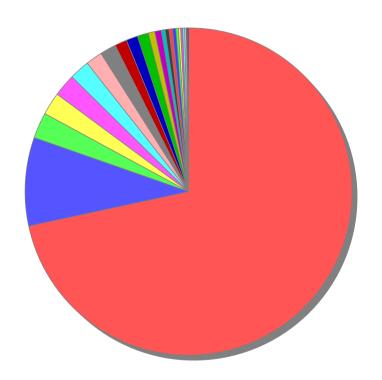

- Desenvolvimento [71.62%]
- Analise de Sistema [8.73%]
- Cafe [2.56%]
- Daily Scrum [2.24%]
- Ausencia [2.22%]
- Code Review [2%]
- Retrospectiva [1.64%]
- Treinamento [1.6%]
- Outros [1.19%]
- Ginastica Laboral [1.14%]
- Sprint Planning 1 [1.1%]
- Verificando apontamento [0.65%]
- Compilacao de sistemas [0.63%]
- Sprint Planning 2 [0.39%]
- Curso/Palestra [0.37%]
- Clean Code [0.35%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.33%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.25%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.21%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.2%]
- Atraso / Saida antecipada [0.19%]
- Reuniao [0.18%]
- Planejamento de Projeto [0.11%]
- Preparando ambiente [0.11%]

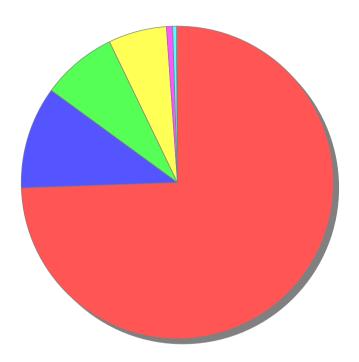

- Desenvolvimento de Requisitos [72.63%]
- Gestao de Requisitos [10.32%]
- Diversos\* [7.62%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.88%]
- Gerencia de Configuracao [0.63%]
- Treinamento na Organizacao [0.37%]
- Planejamento de Projeto [0.11%]
