

INDICADORES DA SPRINT

		202	506			202	507	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	264h00m	264h00m	264h00m	264h00m	224h00m	264h00m	228h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	327h58m	325h19m	317h50m	324h47m	254h41m	264h23m	229h55m	217h58m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	212h05m	212h05m	212h05m	210h50m	177h00m	214h05m	184h35m	177h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	213h36m	193h22m	246h34m	225h51m	179h57m	193h46m	169h32m	167h03m
05. Pontos planejados	68,5	72,5	69,0	82,0	64,0	58,0	72,5	52,0
06. Pontos entregues	71	64,5	81,5	77	51	63	56,5	54
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	44,00	47,00	62,50	62,50	34,50	36,00	41,00	35,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	27,00	17,50	19,00	14,50	16,50	27,00	15,50	19,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	12	12	17	16	9	16	15	14
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	11	9	6	9	6	13	11	13
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	1	1	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	0	0,5	6	0	0,5	0,5
15. Produtividade planejada	0,323	0,342	0,326	0,389	0,362	0,271	0,393	0,294
16. Produtividade realizada	0,333	0,334	0,331	0,341	0,284	0,326	0,334	0,324
17. % Pontos NP / Pontos entregues	38,1	27,2	23,4	18,9	32,4	42,9	27,5	35,2

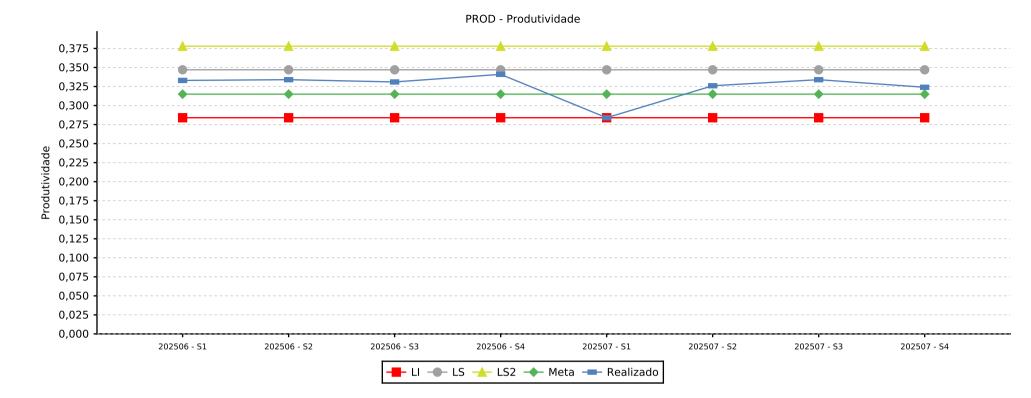


		202	506		202507					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,333	0,334	0,331	0,341	0,284	0,326	0,334	0,324		
Meta	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315		
LS2	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378		
LS	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347		
LI	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284		

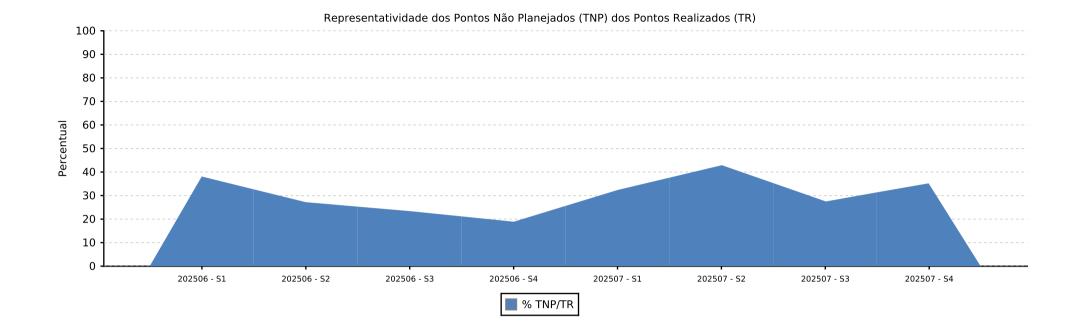


		202	506			202	507	
	1 2 3 4				1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	71	64.5	81.5	77	51	63	56.5	54
TNP - Pontos Não Planejados	27	17.5	19	14.5	16.5	27	15.5	19
% TNP/TR	38,1	27,2	23,4	18,9	32,4	42,9	27,5	35,2

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

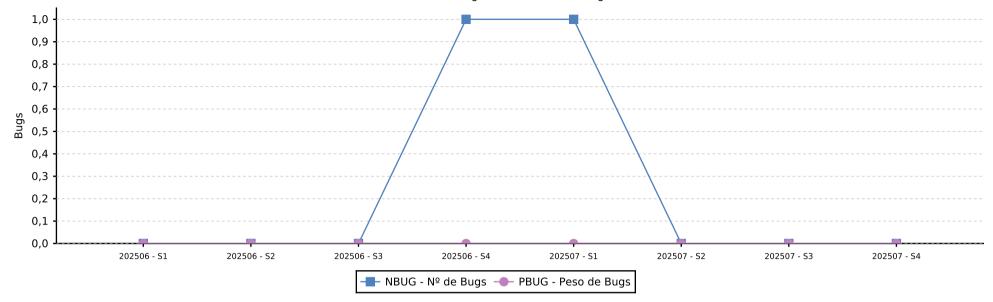

		202	506		202507					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	1	1	0	0	0		
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pontos Entregues	71	64.5	81.5	77	51	63	56.5	54		
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

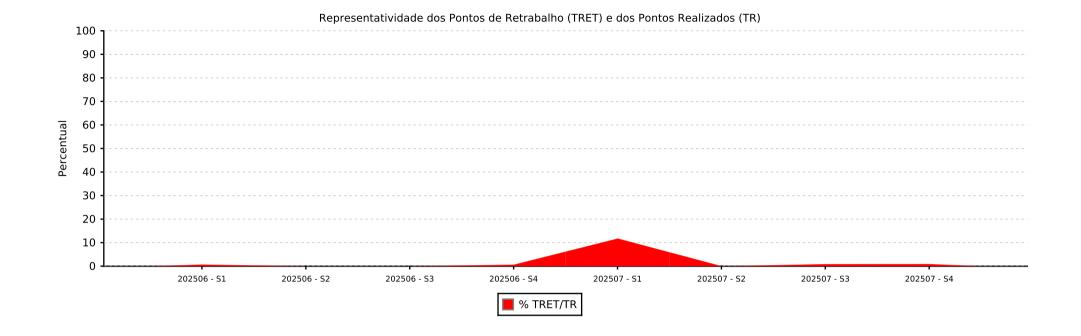


		202	506			202	507	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	71	64.5	81.5	77	51	63	56.5	54
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	0	0.5	6	0	0.5	0.5
% TRET/TR	0,7	0,0	0,0	0,6	11,8	0,0	0,9	0,9

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	140,75	141,9	175,33	171,17	147,58	143,13	142,83	136,37	606,49	592,57	97,7 %
Analise de Sistema	14,75	23,3	15,5	19,2	11,5	18,52	11,5	18,13	53,25	79,15	148,6 %
Code Review	3,25	1,7	3,25	5,02	3,25	1,27	3,25	10,05	13	18,04	138,8 %
Correção de Erros Interno	2,83	10,38	3	0,5	3	2,58	2,5	9,93	11,33	23,39	206,4 %
Daily Scrum	9,67	7,43	12	8,32	10,25	7,33	10	7,08	41,92	30,16	71,9 %
Cafe	6	6	7,25	6	6,25	5,75	6	5,5	25,5	23,25	91,2 %
Retrospectiva	6	6,67	6	4,42	6	5,83	5	4,67	23	21,59	93,9 %
Sprint Planning 1	9	7	9	4,5	9	6	7,5	4,5	34,5	22	63,8 %
Treinamento	12	12,17	12	16,33	12	13,9	12	4,23	48	46,63	97,1 %
Ginastica Laboral	3,33	3	4,17	3,82	3,67	3,63	3,5	3,6	14,67	14,05	95,8 %
Ausencia	0	21,27	0	7,17	0	4,57	0	3,4	0	36,41	0,0 %
Reuniao	1	5,13	1	4,67	1	3,17	1	3,17	4	16,14	403,5 %
Sprint Planning 2	6	1,33	6	1,5	6	1	5	1,5	23	5,33	23,2 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	1,98	0	1,63	0	1,98	0	1,42	0	7,01	0,0 %
Verificando apontamento	0,33	1,17	0,42	1,67	0,42	1,67	0,42	1,42	1,59	5,93	373,0 %
Clean Code	1,5	2,08	1,5	1,73	1,5	1,17	1,25	0,83	5,75	5,81	101,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	1,17	0,25	0	0,25	0,5	1,75	0,75	2,5	2,42	96,8 %
Compilacao de sistemas	2,5	0,33	2,5	1	1,5	3,25	1,5	0,5	8	5,08	63,5 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5	2	0,5	25,0 %
Outros	1	0,67	1	3,42	1	0,67	1	0,25	4	5,01	125,2 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0,17	0,68	0,17	25,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	1,42	0	0	0	0	0	1,42	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1	0	1	0	1	0	0,67	0	3,67	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0,92	0	0	0	0	0	0,92	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	224	254,68	264,01	264,41	228,01	229,92	220,01	217,97	936,03	966,98	103,3 %

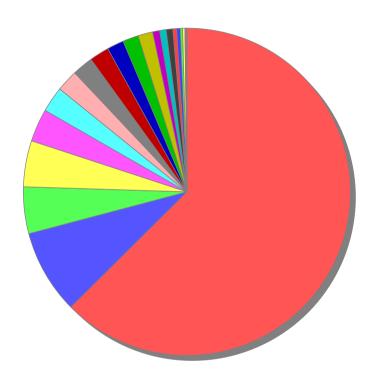

- Desenvolvimento [62.56%]
- Analise de Sistema [8.32%]
- Code Review [4.61%]
- Ocrreção de Erros Interno [4.56%]
- Daily Scrum [3.25%]
- Ocafe [2.52%]
- Retrospectiva [2.14%]
- Sprint Planning 1 [2.06%]
- Treinamento [1.94%]
- Ginastica Laboral [1.65%]
- Ausencia [1.56%]
- Reuniao [1.45%]
- Sprint Planning 2 [0.69%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.65%]
- Verificando apontamento [0.65%]
- Clean Code [0.38%]
- Planejamento de Projeto [0.34%]
- Compilacao de sistemas [0.23%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [0.23%]
- Outros [0.11%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.08%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	146,75	156,35	181,5	175,03	153,75	148,87	147,92	149,05	629,92	629,3	99,9 %
REQM - Gestao de Requisitos		31,75	31,63	32,5	26,12	28,5	25,52	26	24,13	118,75	107,4	90,4 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	18,92	15,8	21,25	17,75	19,5	14,43	18,25	21,8	77,92	69,78	89,6 %
DIV - Diversos*		11,5	36,07	13,58	25,07	12,08	17,78	11,67	16,08	48,83	95	194,6 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	1,17	0,25	0	0,25	0,5	1,75	0,75	2,5	2,42	96,8 %
CM - Gerencia de Configuração		2,5	0,33	2,5	1	1,5	3,25	2	0,5	8,5	5,08	59,8 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	211,67	241,35	251,58	244,97	215,58	210,35	207,59	212,31	886,42	908,98	102,5 %

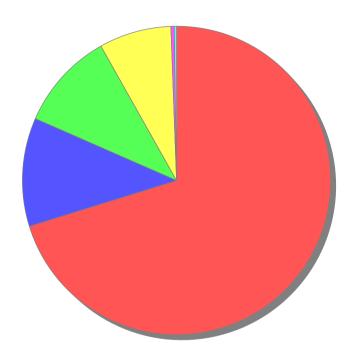


- Desenvolvimento de Requisitos [70.2%]
- Gestao de Requisitos [11.36%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.27%]
- Oiversos* [7.57%]
- Planejamento de Projeto [0.35%]
- Gerencia de Configuração [0.24%]

INDICADORES DO PROJETO


	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
01. Horas planejadas de todas atividades	1116h44m	1021h36m	1056h00m	1109h04m	1175h20m	940h00m	1056h00m	936h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1170h46m	1102h30m	1213h13m	1101h19m	1176h51m	985h41m	1295h54m	966h57m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	946h39m	865h06m	906h35m	945h40m	1011h45m	799h55m	847h05m	752h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	814h36m	747h07m	966h31m	900h37m	960h37m	739h03m	879h23m	710h18m
05. Pontos planejados para o projeto	289,0	265,0	280,0	292,0	313,0	252,0	267,0	238,0
06. Pontos planejados	274,0	197,0	276,0	319,5	327,0	226,0	292,0	246,5
07. Pontos entregues	278	239,5	329	295,5	319,5	247	294	224,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	232,50	182,00	262,00	231,50	272,50	201,00	216,00	146,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	45,50	57,50	67,00	64,00	47,00	46,00	78,00	78,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	3	0	2	2	2	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	76	56	77	52	65	44	57	54
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	28	31	40	38	37	25	35	43
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	2	0	1	1	2	1	1
14. Horas de correção de bug	3h00m	0h00m	0h00m	0h35m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	2	1	3,5	4,5	0,5	3,5	1	7
16. Produtividade planejada	0,290	0,228	0,305	0,338	0,324	0,283	0,345	0,328
17. Produtividade realizada	0,342	0,321	0,341	0,329	0,333	0,335	0,335	0,317
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	96,2	90,4	117,5	101,2	102,1	98,1	110,2	94,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	16,4	24,1	20,4	21,7	14,8	18,7	26,6	34,8

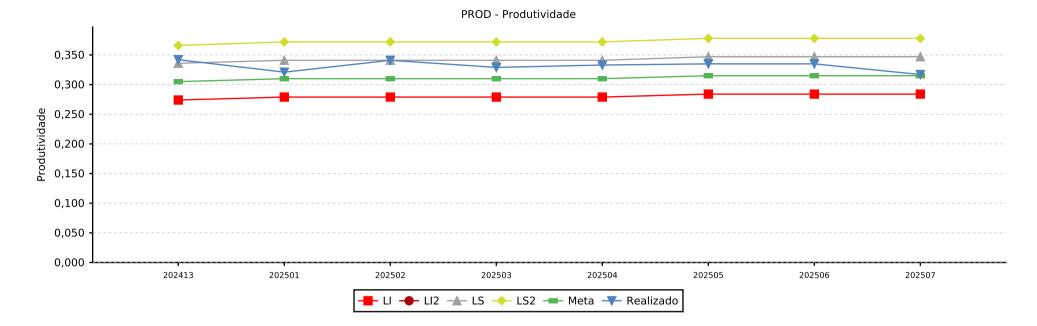


	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
Realizado	0,342	0,321	0,341	0,329	0,333	0,335	0,335	0,317
Meta	0,305	0,310	0,310	0,310	0,310	0,315	0,315	0,315
LS2	0,366	0,372	0,372	0,372	0,372	0,378	0,378	0,378
LS	0,336	0,341	0,341	0,341	0,341	0,347	0,347	0,347
LI2								
LI	0,274	0,279	0,279	0,279	0,279	0,284	0,284	0,284

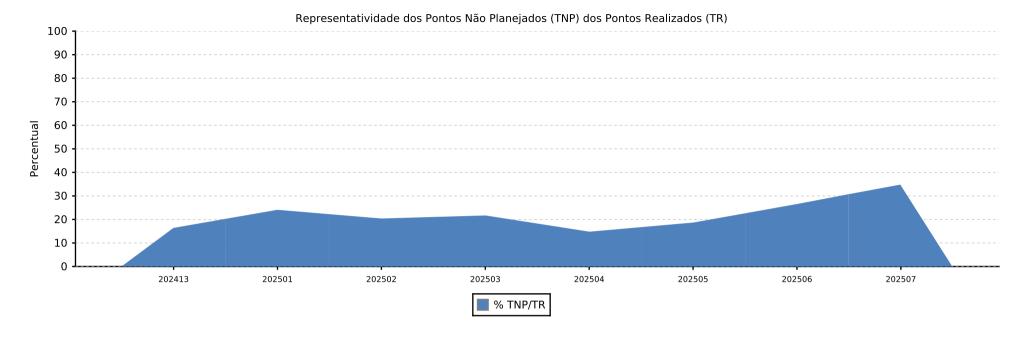


	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
TR - Pontos Realizados	278	239.5	329	295.5	319.5	247	294	224.5
TNP - Pontos Não Planejados	45.5	57.5	67	64	47	46	78	78
% TNP/TR	16,4	24,1	20,4	21,7	14,8	18,7	26,6	34,8

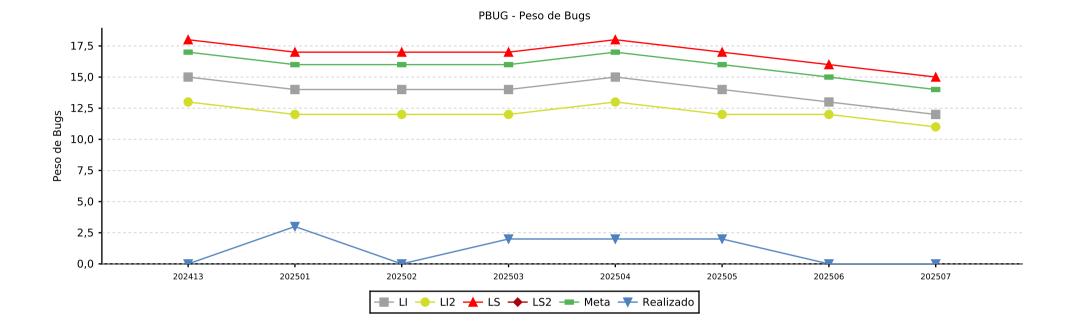


	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
Realizado	0	3	0	2	2	2	0	0
Meta	17	16	16	16	17	16	15	14
LS2								
LS	18	17	17	17	18	17	16	15
LI2	13	12	12	12	13	12	12	11
LI	15	14	14	14	15	14	13	12
Pontos Entregues	278	239.5	329	295.5	319.5	247	294	224.5
% PBUG / TR	0,00	1,26	0,00	0,68	0,63	0,81	0,00	0,00

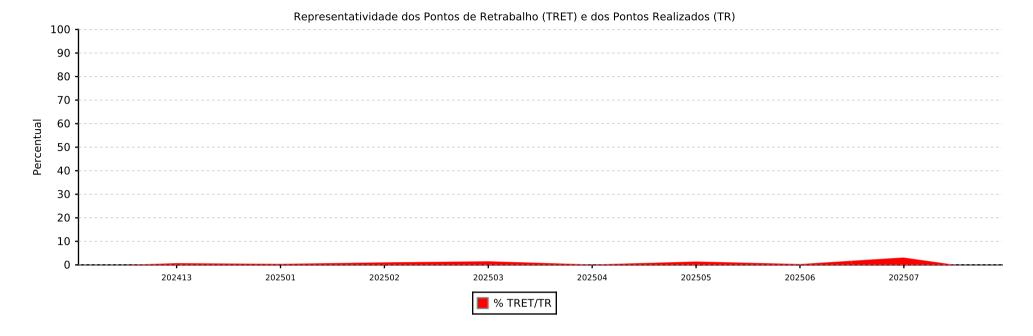


	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
TR - Pontos Realizados	278	239.5	329	295.5	319.5	247	294	224.5
TRET - Pontos de Retrabalho	2	1	3.5	4.5	0.5	3.5	1	7
% TRET/TR	0,7	0,4	1,1	1,5	0,2	1,4	0,3	3,1

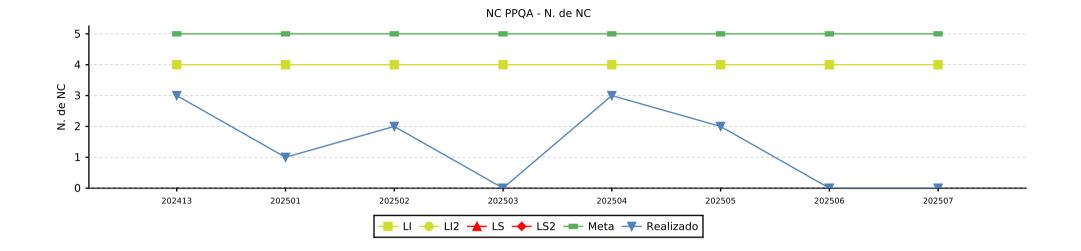


	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
Realizado	3	1	2	0	3	2	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

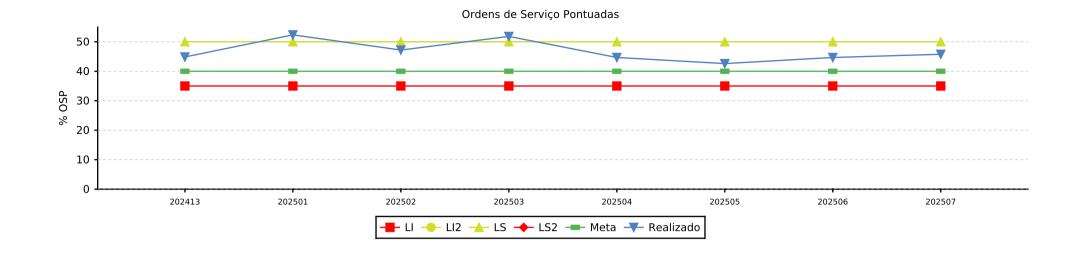

	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
Realizado	44.85	52.35	47.2	51.82	44.68	42.6	44.67	45.76
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

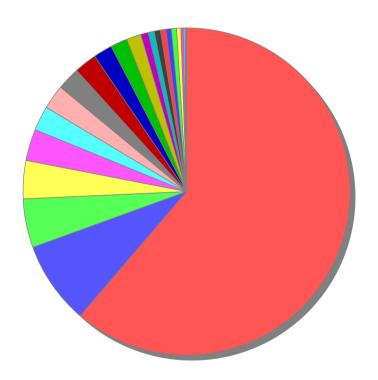

- Desenvolvimento [61.28%]
- Analise de Sistema [8.19%]
- Treinamento [4.82%]
- Ausencia [3.76%]
- Daily Scrum [3.12%]
- Ocrreção de Erros Interno [2.42%]
- Cafe [2.4%]
- Sprint Planning 1 [2.28%]
- Retrospectiva [2.23%]
- Code Review [1.86%]
- Reuniao [1.67%]
- Ginastica Laboral [1.45%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.73%]
- Verificando apontamento [0.61%]
- Clean Code [0.6%]
- Sprint Planning 2 [0.55%]
- Compilacao de sistemas [0.53%]
- Outros [0.52%]
- Atestado [0.41%]
- Planejamento de Projeto [0.25%]
- Analise de O.S [0.15%]
- Preparando ambiente [0.1%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.05%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.02%]

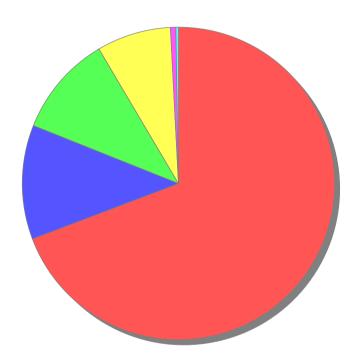

- Desenvolvimento de Requisitos [65.08%]
- Gestao de Requisitos [11.11%]
- Diversos* [9.82%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.22%]
- Gerencia de Configuracao [0.53%]
- Planejamento de Projeto [0.25%]
