

INDICADORES DA SPRINT

| | | 202 | 313 | | | 202 | 401 | |
|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01. Horas planejadas de todas atividades | 132h00m | 132h00m | 132h00m | 46h24m | 105h36m | 132h00m | 132h00m | 176h00m |
| 02. Horas realizadas de todas atividades | 136h53m | 144h24m | 137h54m | 77h10m | 106h49m | 137h35m | 134h16m | 182h02m |
| 03. Horas planejadas de desenvolvimento | 109h10m | 109h45m | 109h10m | 35h14m | 89h51m | 115h05m | 115h05m | 151h45m |
| 04. Horas realizadas de desenvolvimento | 108h39m | 113h58m | 111h49m | 41h23m | 89h40m | 113h58m | 116h26m | 141h48m |
| 05. Pontos planejados | 36,5 | 32,5 | 39,5 | 15,0 | 35,0 | 43,5 | 33,0 | 49,5 |
| 06. Pontos entregues | 36 | 40,5 | 41 | 15,5 | 27 | 38,5 | 36,5 | 49,5 |
| 07. Pontos entregues (apenas Tarefa) | 19,00 | 34,50 | 27,00 | 11,00 | 25,50 | 32,00 | 29,50 | 44,50 |
| 08. Pontos entregues (apenas NP) | 17,00 | 6,00 | 14,00 | 4,50 | 1,50 | 6,50 | 7,00 | 5,00 |
| 09. Pontos entregues (apenas Erro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa) | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 |
| 11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP) | 5 | 9 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Horas de correção de bug | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m |
| 14. Pontos de retrabalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Produtividade planejada | 0,335 | 0,297 | 0,362 | 0,426 | 0,390 | 0,378 | 0,287 | 0,327 |
| 16. Produtividade realizada | 0,332 | 0,356 | 0,367 | 0,375 | 0,302 | 0,338 | 0,314 | 0,350 |
| 17. % Pontos NP / Pontos entregues | 47,3 | 14,9 | 34,2 | 29,1 | 5,6 | 16,9 | 19,2 | 10,2 |

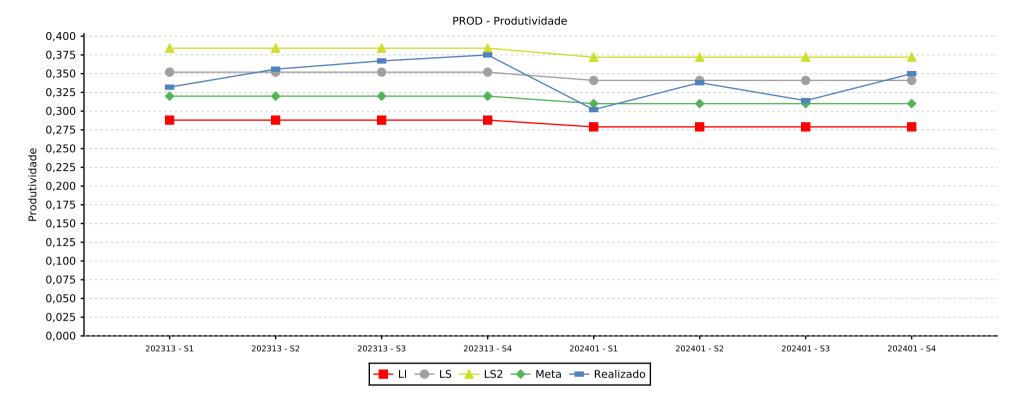


| | | 202 | 313 | | 202401 | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Realizado | 0,332 | 0,356 | 0,367 | 0,375 | 0,302 | 0,338 | 0,314 | 0,350 | | |
| Meta | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | | |
| LS2 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | | |
| LS | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | | |
| LI | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | | |

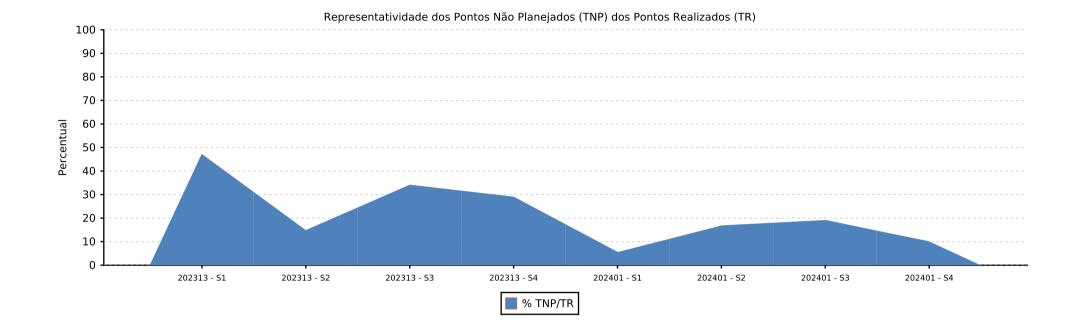


| | | 202 | 313 | | | 202 | 401 | |
|-----------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TR - Pontos Realizados | 36 | 40.5 | 41 | 15.5 | 27 | 38.5 | 36.5 | 49.5 |
| TNP - Pontos Não Planejados | 17 | 6 | 14 | 4.5 | 1.5 | 6.5 | 7 | 5 |
| % TNP/TR | 47,3 | 14,9 | 34,2 | 29,1 | 5,6 | 16,9 | 19,2 | 10,2 |

NBUG - № de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



| | | 202 | 313 | | 202401 | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| NBUG - Nº de Bugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PBUG - Peso de Bugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pontos Entregues | 36 | 40.5 | 41 | 15.5 | 27 | 38.5 | 36.5 | 49.5 | |
| % PBUG / TR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |




| | | 202 | 313 | | | 202 | 401 | |
|-----------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TR - Pontos Realizados | 36 | 40.5 | 41 | 15.5 | 27 | 38.5 | 36.5 | 49.5 |
| TRET - Pontos de Retrabalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % TRET/TR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

HORAS POR ATIVIDADE

| | Spri | int 1 | Spr | int 2 | Spri | int 3 | Spri | nt 4 | То | tal | % HP/HR |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Atividade | Planejado | Realizado | Total |
| Desenvolvimento | 74,6 | 79,03 | 99,83 | 103,68 | 99,83 | 109,7 | 129,75 | 131,22 | 404,01 | 423,63 | 104,9 % |
| Ausencia | 0 | 2,02 | 0 | 1,88 | 0 | 0,88 | 0 | 13,5 | 0 | 18,28 | 0,0 % |
| Code Review | 2,25 | 2,98 | 2,5 | 3,22 | 2,5 | 3,08 | 2,5 | 7,55 | 9,75 | 16,83 | 172,6 % |
| Analise de Sistema | 7,5 | 3,47 | 8 | 11,98 | 8 | 6,73 | 11 | 6,7 | 34,5 | 28,88 | 83,7 % |
| Daily Scrum | 3 | 1,23 | 3 | 1,55 | 3 | 2,9 | 3,25 | 4,48 | 12,25 | 10,16 | 82,9 % |
| Cafe | 3,5 | 2,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 5 | 4,33 | 16 | 14,33 | 89,6 % |
| Compilacao de sistemas | 0,5 | 0,57 | 0,5 | 0,42 | 0,5 | 1,3 | 1 | 3,23 | 2,5 | 5,52 | 220,8 % |
| Ginastica Laboral | 1,83 | 2,05 | 2 | 2,37 | 2 | 2,33 | 2,67 | 2,67 | 8,5 | 9,42 | 110,8 % |
| Sprint Planning 1 | 4,5 | 0,67 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 6 | 2,33 | 19,5 | 7 | 35,9 % |
| Retrospectiva | 3 | 0,5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2,02 | 13 | 5,52 | 42,5 % |
| Outros | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 0,42 | 2 | 0,93 | 2 | 215,1 % |
| Sprint Planning 2 | 3 | 0,5 | 3 | 1,5 | 3 | 0,25 | 4 | 1 | 13 | 3,25 | 25,0 % |
| Planejamento de Projeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0,75 | 1,75 | 0,75 | 42,9 % |
| Reuniao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 25,0 % |
| Teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 0,0 % |
| Treinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Manutenção de Servidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Analise Retorno O.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Analise de O.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Recursos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Integrações de sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Geracao de Baseline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,0 % |
| Atividade Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio suporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Análise de Sistemas H/FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Instrutor Treinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atendimento GBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Fazendo manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Curso/Palestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Banheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria de Gerencia de Configuracao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Criacao de Ambiente de Desenv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxílio Desenv. Outras Equipes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |


| Abrir o.s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
|------------------------------------|-------|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Auxilio ao Desenvolvimento | 0,25 | 7,73 | 0,25 | 2,73 | 0,25 | 1,08 | 0,25 | 0 | 1 | 11,54 | 1.154,0 |
| Particular | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio Comercial / Backoffice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Solicitar merge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Correcao de Erros Externo | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0,5 | 0 | 1,25 | 0 | 0,0 % |
| Check List | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Verificando apontamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Merge O.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria de DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Pre-teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Verificar o.s no nome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Documentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Gerenciamento de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Preparando ambiente | 0 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,32 | 0,0 % |
| Folga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Checklist dos Backups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atendimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Recesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atestado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Correção de Erros Interno | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,75 | 0 | 2,25 | 0 | 0,0 % |
| Clean Code | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | 1 | 0 | 3,25 | 0 | 0,0 % |
| Teste Automatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Zabbix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio ao Suporte e Implantacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria da Garantia da Qualidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Férias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Manutenção Preventiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Geração de Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sizing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,0 % |
| Atividades Gerenciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Release Notes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atraso / Saida antecipada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Levantamento de Requisito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Feriado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Organização sala / equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atualizacao de Versao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Total Geral | 105,6 | 106,82 | 132 | 137,58 | 132 | 134,25 | 176,01 | 182,03 | 545,61 | 560,68 | 102,8 % |

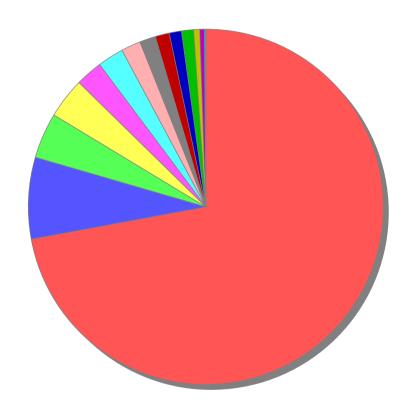

- Desenvolvimento [72.09%]
- Ausencia [7.42%]
- Code Review [4.15%]
- O Analise de Sistema [3.68%]
- Daily Scrum [2.46%]
- Cafe [2.38%]
- Compilacao de sistemas [1.77%]
- Ginastica Laboral [1.47%]
- Sprint Planning 1 [1.28%]
- Retrospectiva [1.11%]
- Outros [1.1%]
- Sprint Planning 2 [0.55%]
- Planejamento de Projeto [0.41%]
- Reuniao [0.14%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


| | | Spri | nt 1 | Spri | nt 2 | Spri | int 3 | Spri | nt 4 | То | tal | % HP/HR |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Area CMMI | | Planejado | Realizado | Total |
| RD - Desenvolvimento de Requisitos | 3 | 76,35 | 86,77 | 101,58 | 106,42 | 101,58 | 110,78 | 132,42 | 131,22 | 411,93 | 435,19 | 105,6 % |
| DIV - Diversos* | | 5,5 | 6,82 | 5,92 | 8 | 5,92 | 6,72 | 9,08 | 22,75 | 26,42 | 44,29 | 167,6 % |
| PMC - Monitoramento e Controle de | Projeto | 8,25 | 4,72 | 8,5 | 5,77 | 8,5 | 7,98 | 9,75 | 14,05 | 35 | 32,52 | 92,9 % |
| REQM - Gestao de Requisitos | | 15 | 7,95 | 15,5 | 16,98 | 15,5 | 7,48 | 21,5 | 10,03 | 67,5 | 42,44 | 62,9 % |
| CM - Gerencia de Configuração | | 0,5 | 0,57 | 0,5 | 0,42 | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 3,23 | 3 | 5,52 | 184,0 % |
| PP - Planejamento de Projeto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0,75 | 1,75 | 0,75 | 42,9 % |
| OT - Treinamento na Organizacao | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| PI - Integracao de Produto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| PPQA - Garantia da Qualidade de P | rocesso e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | Total Geral | 105,6 | 106,83 | 132 | 137,59 | 132 | 134,26 | 176 | 182,03 | 545,6 | 560,71 | 102,8 % |

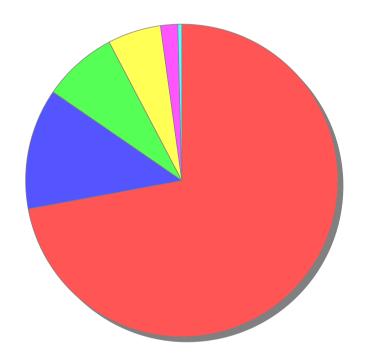


- Desenvolvimento de Requisitos [72.09%]
- Diversos* [12.5%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.72%]
- Gestao de Requisitos [5.51%]
- Gerencia de Configuracao [1.77%]
- Planejamento de Projeto [0.41%]

INDICADORES DO PROJETO


| | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 | 202312 | 202313 | 202401 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01. Horas planejadas de todas atividades | 704h00m | 704h00m | 638h24m | 704h00m | 544h00m | 504h00m | 442h24m | 545h36m |
| 02. Horas realizadas de todas atividades | 734h32m | 729h31m | 648h01m | 729h06m | 534h40m | 514h40m | 496h21m | 560h42m |
| 03. Horas planejadas de desenvolvimento | 592h40m | 588h40m | 524h14m | 584h40m | 442h20m | 412h55m | 363h19m | 471h46m |
| 04. Horas realizadas de desenvolvimento | 556h18m | 559h52m | 490h48m | 582h02m | 404h28m | 403h30m | 375h49m | 461h52m |
| 05. Pontos planejados para o projeto | 181,0 | 180,0 | 163,0 | 184,0 | 140,0 | 132,0 | 117,0 | 146,0 |
| 06. Pontos planejados | 179,0 | 170,5 | 159,0 | 174,0 | 137,5 | 137,0 | 123,5 | 161,0 |
| 07. Pontos entregues | 175,5 | 180 | 162,5 | 205,5 | 134 | 133,5 | 133 | 151,5 |
| 08. Pontos entregues (apenas Tarefa) | 148,50 | 115,50 | 96,00 | 157,50 | 102,00 | 95,50 | 91,50 | 131,50 |
| 09. Pontos entregues (apenas NP) | 27,00 | 64,50 | 66,50 | 48,00 | 32,00 | 38,00 | 41,50 | 20,00 |
| 10. Pontos entregues (apenas Erro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa) | 40 | 41 | 34 | 34 | 49 | 23 | 24 | 35 |
| 12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP) | 16 | 40 | 44 | 38 | 37 | 26 | 28 | 14 |
| 13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Horas de correção de bug | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 3h31m | 0h00m | 0h00m | 0h00m |
| 15. Pontos de retrabalho | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 16. Produtividade planejada | 0,303 | 0,290 | 0,304 | 0,298 | 0,311 | 0,332 | 0,340 | 0,342 |
| 17. Produtividade realizada | 0,316 | 0,322 | 0,332 | 0,354 | 0,332 | 0,331 | 0,354 | 0,329 |
| 18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto | 97 | 100 | 99,7 | 111,7 | 95,8 | 101,2 | 113,7 | 103,8 |
| 19. % Pontos NP / Pontos entregues | 15,4 | 35,9 | 41 | 23,4 | 23,9 | 28,5 | 31,3 | 13,3 |

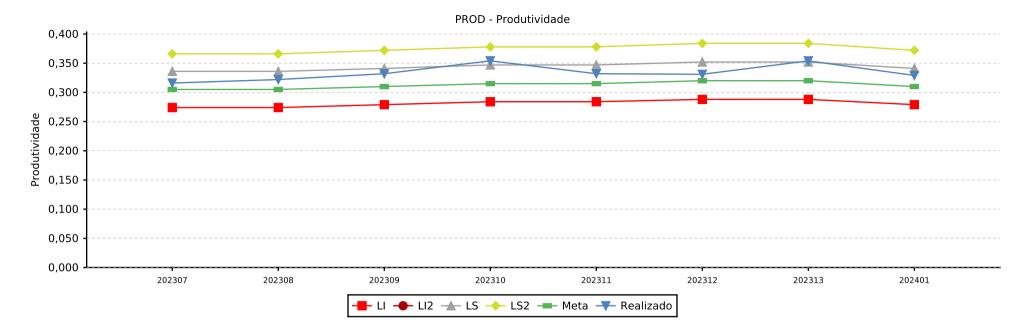


| | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 | 202312 | 202313 | 202401 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 0,316 | 0,322 | 0,332 | 0,354 | 0,332 | 0,331 | 0,354 | 0,329 |
| Meta | 0,305 | 0,305 | 0,310 | 0,315 | 0,315 | 0,320 | 0,320 | 0,310 |
| LS2 | 0,366 | 0,366 | 0,372 | 0,378 | 0,378 | 0,384 | 0,384 | 0,372 |
| LS | 0,336 | 0,336 | 0,341 | 0,347 | 0,347 | 0,352 | 0,352 | 0,341 |
| LI2 | | | | | | | | |
| LI | 0,274 | 0,274 | 0,279 | 0,284 | 0,284 | 0,288 | 0,288 | 0,279 |

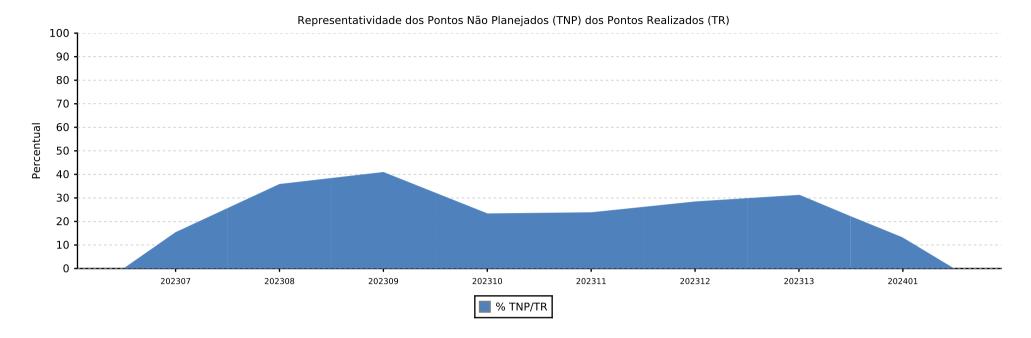


| | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 | 202312 | 202313 | 202401 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TR - Pontos Realizados | 175.5 | 180 | 162.5 | 205.5 | 134 | 133.5 | 133 | 151.5 |
| TNP - Pontos Não Planejados | 27 | 64.5 | 66.5 | 48 | 32 | 38 | 41.5 | 20 |
| % TNP/TR | 15,4 | 35,9 | 41,0 | 23,4 | 23,9 | 28,5 | 31,3 | 13,3 |

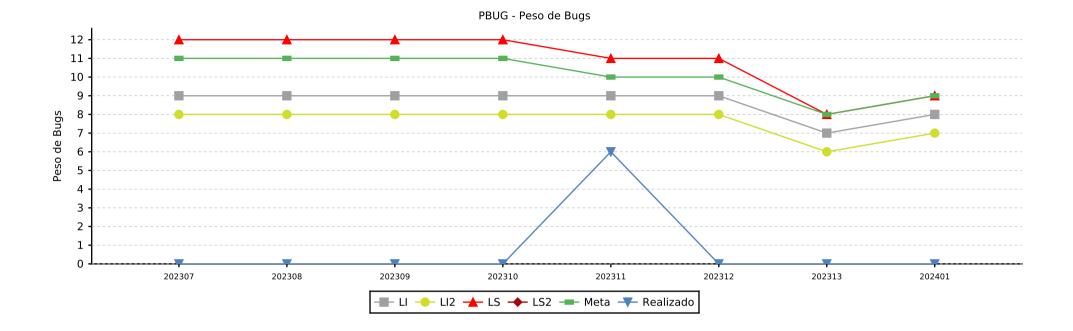


| | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 | 202312 | 202313 | 202401 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Meta | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| LS2 | | | | | | | | |
| LS | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 9 |
| LI2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| LI | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Pontos Entregues | 175.5 | 180 | 162.5 | 205.5 | 134 | 133.5 | 133 | 151.5 |
| % PBUG / TR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

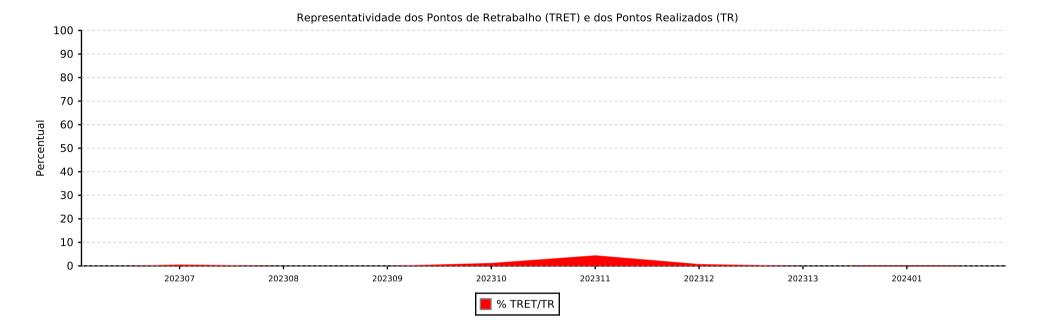


| | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 | 202312 | 202313 | 202401 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TR - Pontos Realizados | 175.5 | 180 | 162.5 | 205.5 | 134 | 133.5 | 133 | 151.5 |
| TRET - Pontos de Retrabalho | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| % TRET/TR | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 4,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |

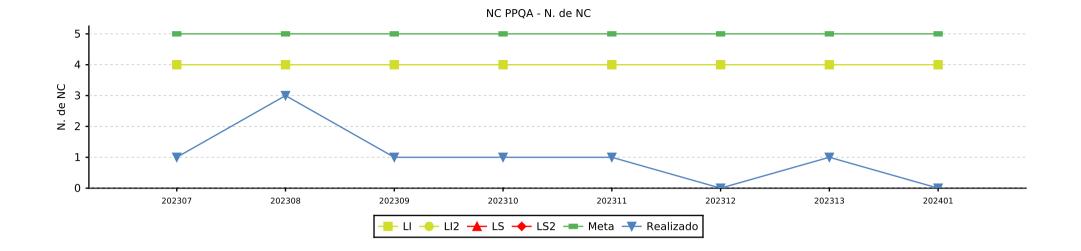


| | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 | 202312 | 202313 | 202401 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Meta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LS2 | | | | | | | | |
| LS | | | | | | | | |
| LI2 | | | | | | | | |
| LI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

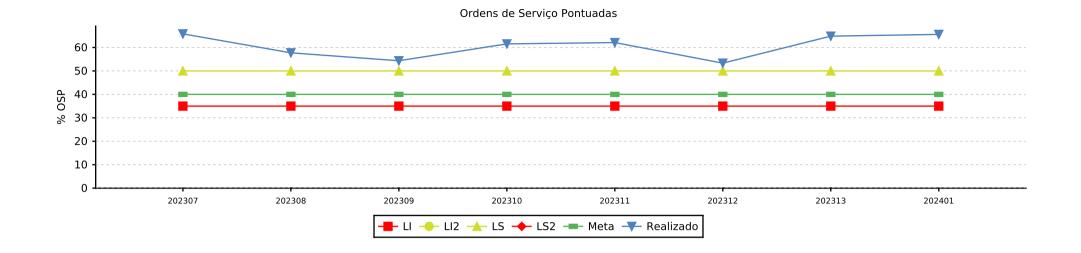

| | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 | 202312 | 202313 | 202401 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 65.82 | 57.73 | 54.35 | 61.54 | 62.11 | 53.33 | 64.84 | 65.59 |
| Meta | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| LS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| LI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

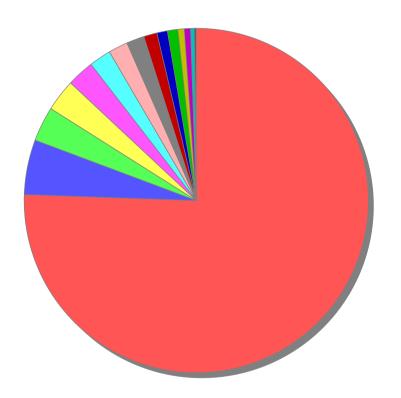

- Desenvolvimento [75.55%]
- Analise de Sistema [5.15%]
- Ausencia [3.26%]
- Code Review [3%]
- Cafe [2.56%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [2.06%]
- Daily Scrum [1.81%]
- Ginastica Laboral [1.68%]
- Sprint Planning 1 [1.25%]
- Compilacao de sistemas [0.98%]
- Retrospectiva [0.98%]
- Preparando ambiente [0.59%]
- Sprint Planning 2 [0.58%]
- Outros [0.36%]
- Planejamento de Projeto [0.13%]
- Reuniao [0.04%]

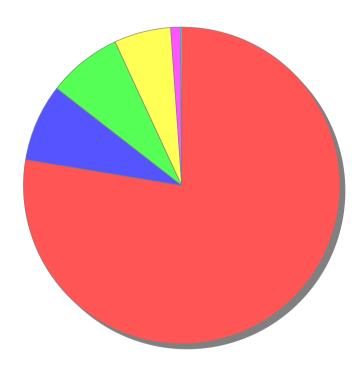

- Desenvolvimento de Requisitos [77.61%]
- Diversos* [7.9%]
- Gestao de Requisitos [7.57%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.8%]
- Gerencia de Configuracao [0.98%]
- O Planejamento de Projeto [0.13%]
