



INDICADORES DA SPRINT


	202510				202511			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	244h00m	200h00m	188h00m	264h00m	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	273h14m	234h52m	241h01m	270h05m	256h57m	225h30m	227h14m	220h11m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	208h50m	170h50m	159h55m	225h20m	188h00m	187h10m	188h00m	187h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	204h35m	172h37m	150h00m	233h32m	183h21m	178h44m	195h38m	184h48m
05. Pontos planejados	65,0	62,5	40,5	76,0	43,5	38,5	57,5	60,0
06. Pontos entregues	70,5	57	49	80,5	63	62	69,5	61,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	52,00	46,50	36,00	70,50	34,50	53,00	63,50	58,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	18,50	10,50	13,00	10,00	28,50	9,00	6,00	3,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	2	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	13	10	7	15	12	15	13	15
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	5	6	10	15	10	6	5
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0,5	0	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,312	0,366	0,254	0,338	0,232	0,206	0,306	0,321
16. Produtividade realizada	0,345	0,331	0,327	0,345	0,344	0,347	0,356	0,333
17. % Pontos NP / Pontos entregues	26,3	18,5	26,6	12,5	45,3	14,6	8,7	5,7

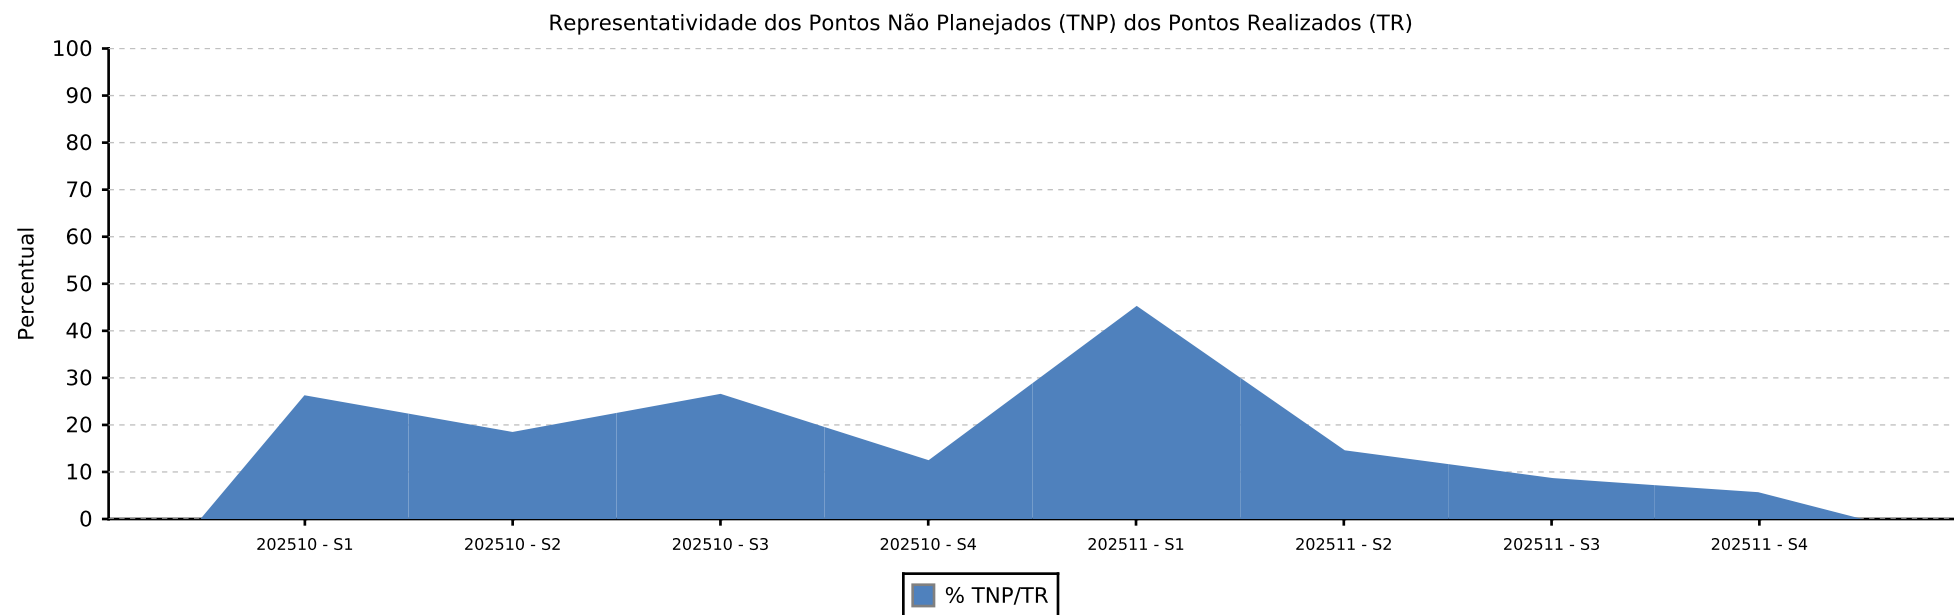

	202510				202511			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	70.5	57	49	80.5	63	62	69.5	61.5
TNP - Pontos Não Planejados	18.5	10.5	13	10	28.5	9	6	3.5
% TNP/TR	26,3	18,5	26,6	12,5	45,3	14,6	8,7	5,7

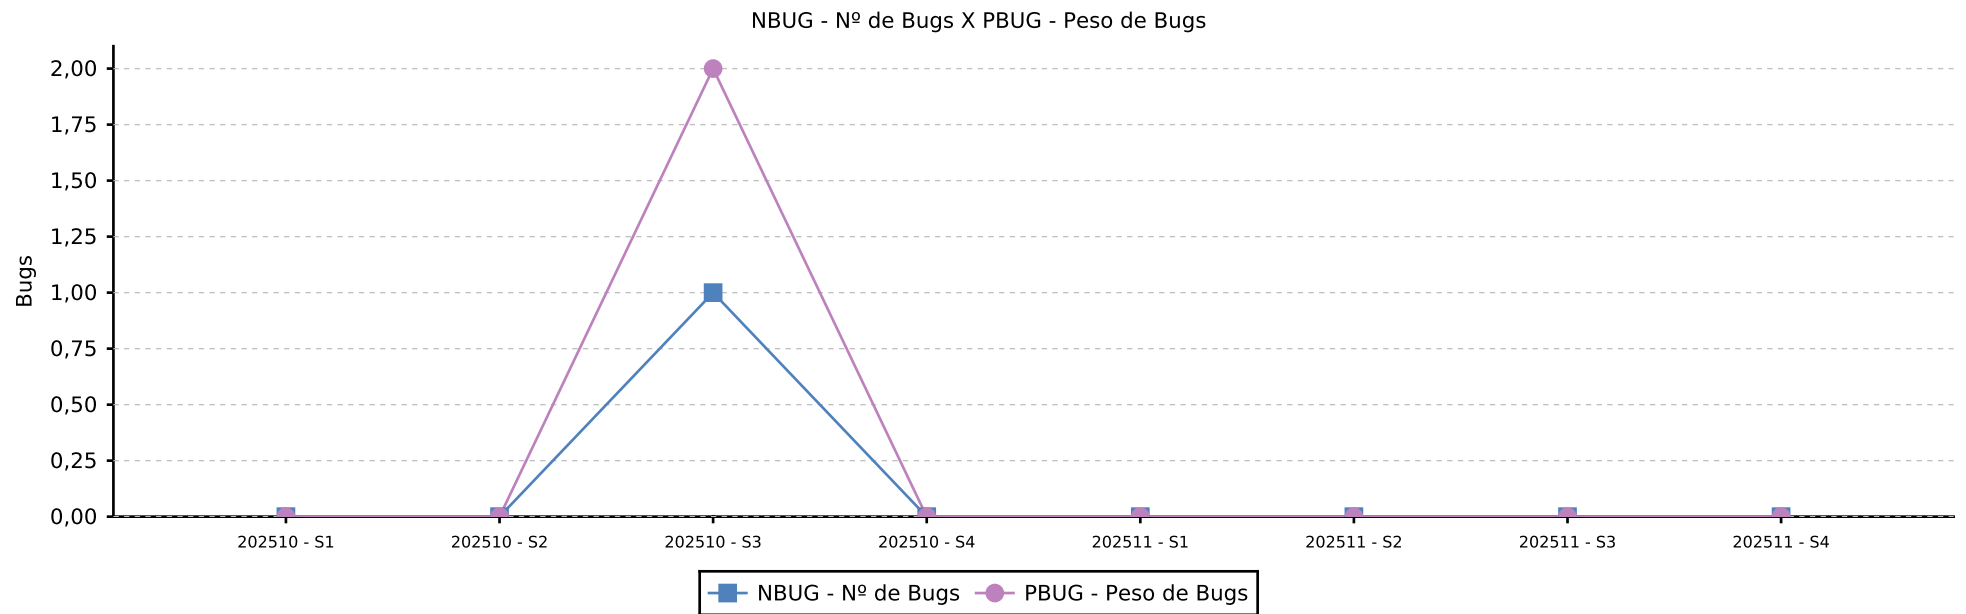

	202510				202511			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	1	0	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	2	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	70.5	57	49	80.5	63	62	69.5	61.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

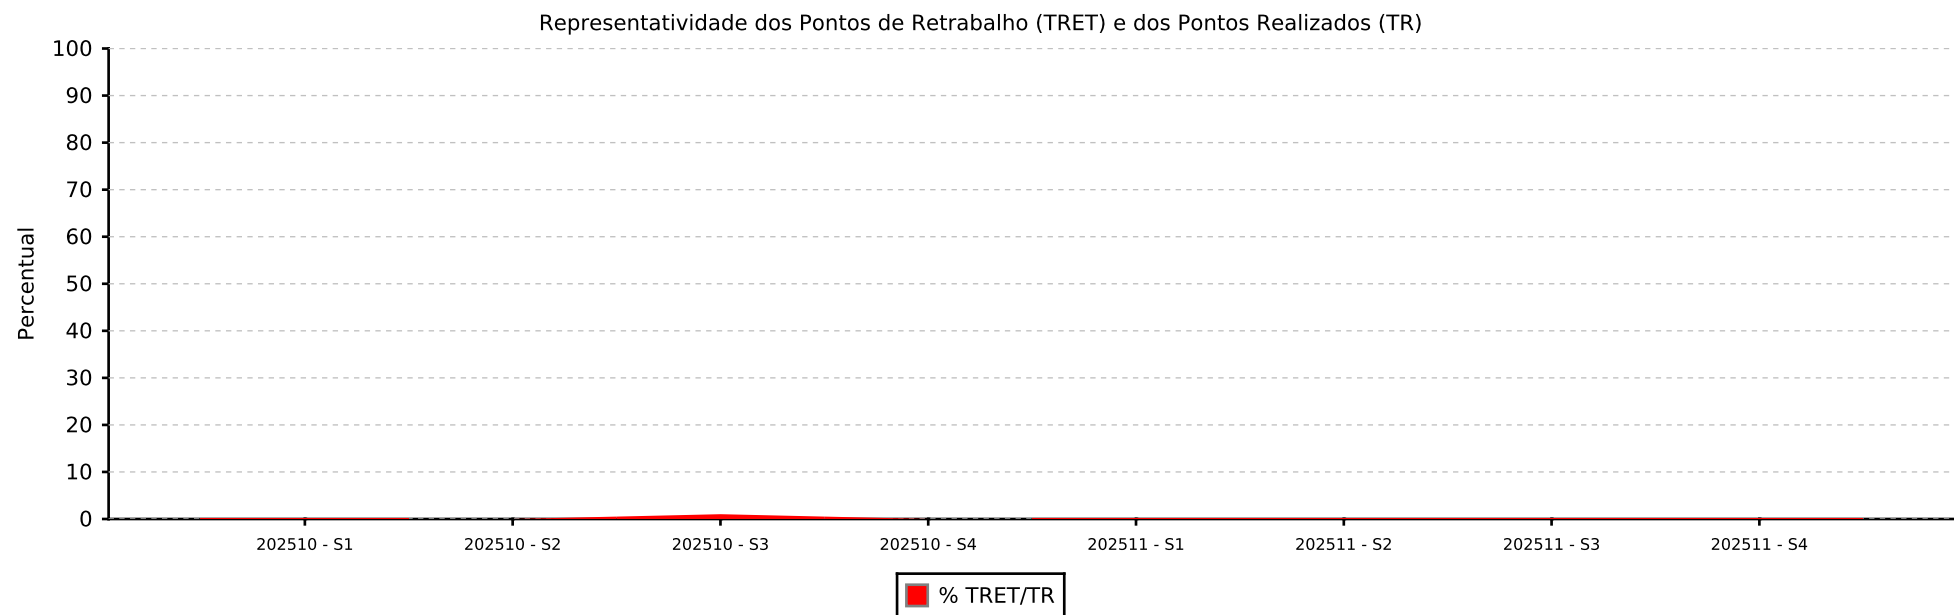


	202510				202511			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	70.5	57	49	80.5	63	62	69.5	61.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0.5	0	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Correcao de Erros Externo	0,67	0	0,67	0	0,67	0	0,67	0	2,68	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	1	1	0,27	1	0	1	0	4	1,27	31,8 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	0,17	3,33	1	3,17	0,17	0	1	0	2,34	6,5	277,8 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	1,77	0	0	0	0	0	0	0	1,77	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220,01	256,97	220,01	225,52	220,01	227,24	220,01	220,18	880,04	929,91	105,7 %


% de Horas por Atividade

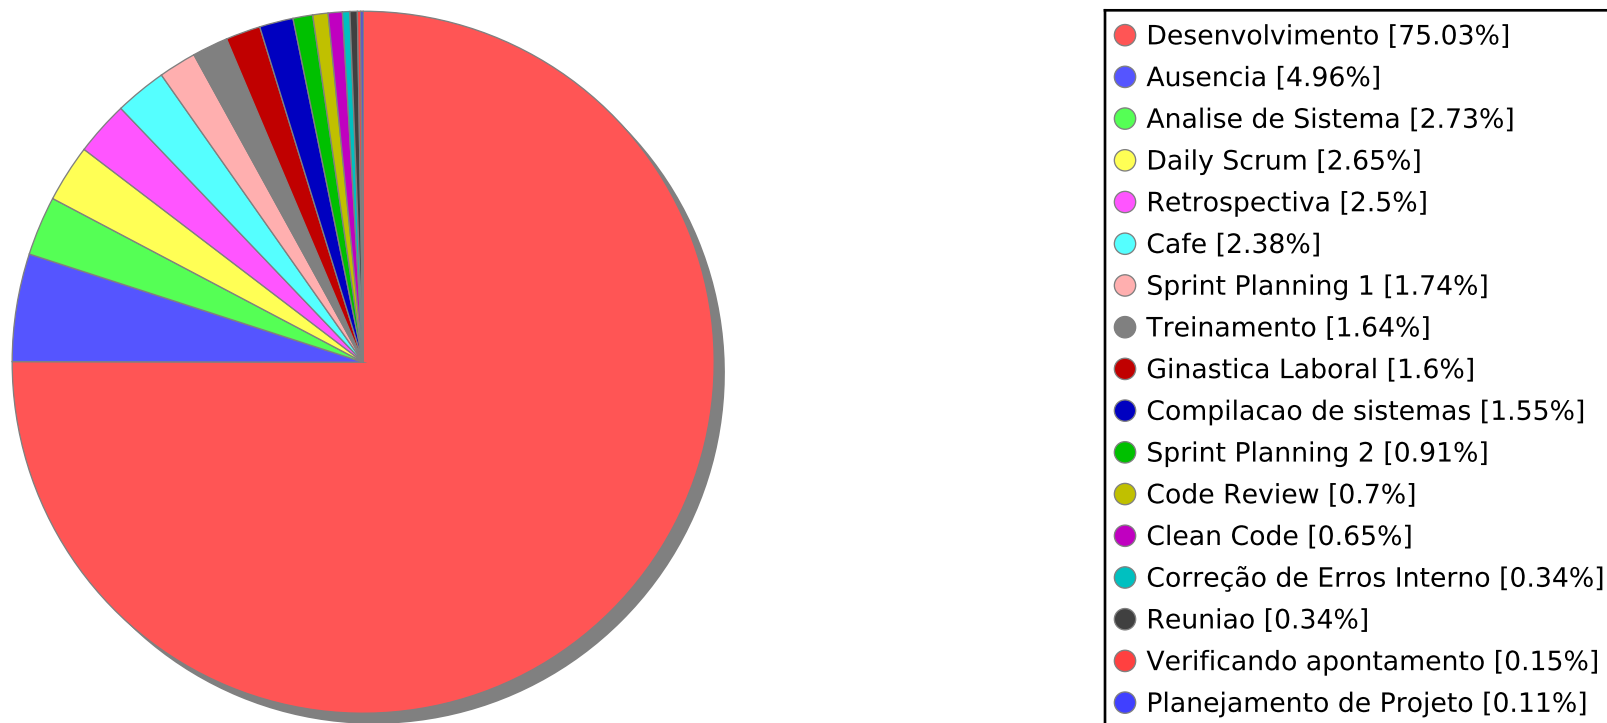

HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	161,92	167,02	161,08	160,55	161,92	177,97	159,33	167,38	644,25	672,92	104,5 %
DIV - Diversos*	10,92	27,57	11,75	22,02	10,92	18,73	11,75	20,45	45,34	88,77	195,8 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	19,25	19,2	19,25	17,18	19,25	11,5	19,25	12,88	77	60,76	78,9 %
REQM - Gestao de Requisitos	25,25	32,92	25,25	13,75	25,25	12,78	25,25	11,85	101	71,3	70,6 %
CM - Gerencia de Configuracao	2	3,95	2	5	2	3,33	2,5	3,42	8,5	15,7	184,7 %
PP - Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,5	0,25	2,25	0,25	11,1 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,0 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	219,59	250,66	219,58	219,5	219,59	224,31	219,58	216,23	878,34	910,7	103,7 %

% de Horas por Área do CMMI

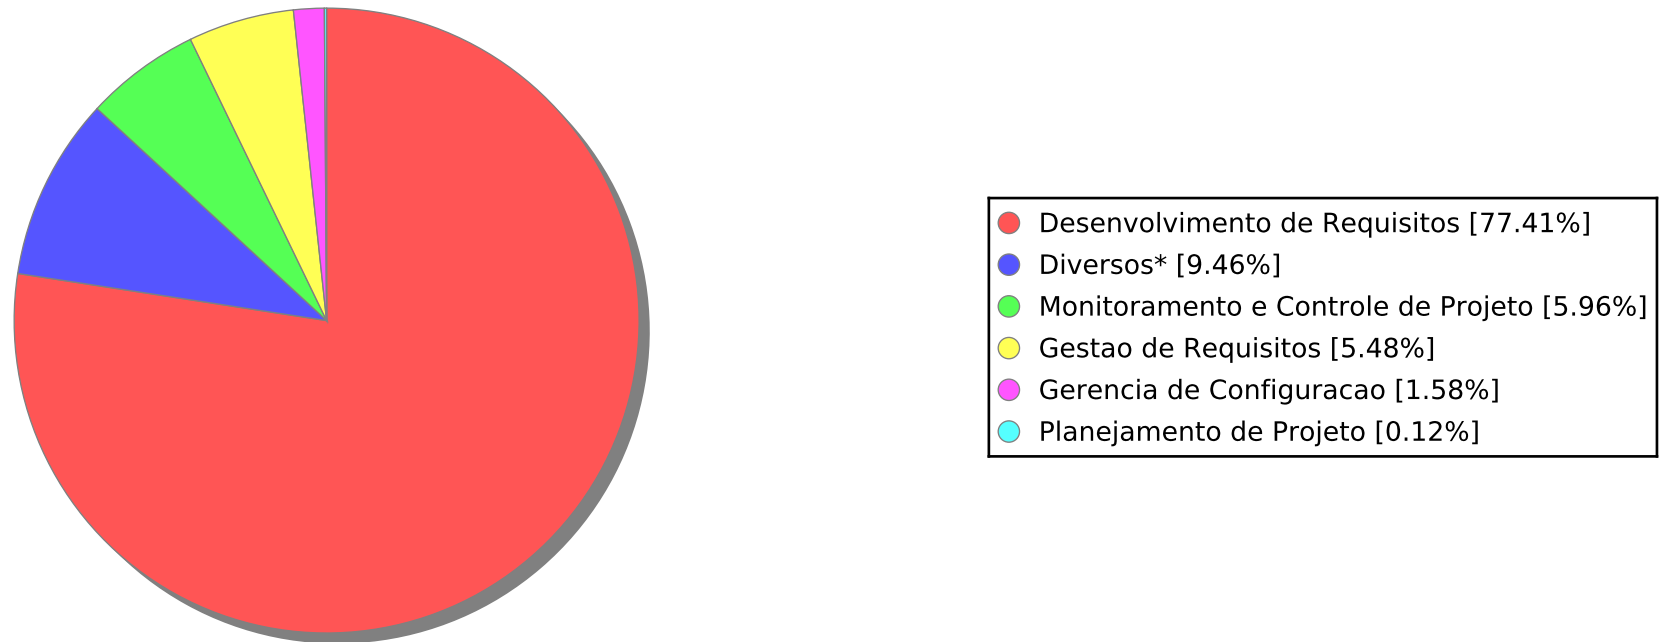


INDICADORES DO PROJETO


	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
01. Horas planejadas de todas atividades	1175h20m	940h00m	1056h00m	936h00m	784h00m	1008h04m	896h00m	880h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1176h51m	985h41m	1295h54m	966h57m	925h30m	1031h42m	1019h12m	929h52m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1011h45m	799h55m	847h05m	752h40m	636h35m	834h25m	764h55m	750h20m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	960h37m	739h03m	879h23m	710h18m	702h06m	859h55m	760h44m	742h31m
05. Pontos planejados para o projeto	313,0	252,0	267,0	238,0	200,0	0,0	240,0	240,0
06. Pontos planejados	327,0	226,0	292,0	246,5	239,5	286,0	244,0	199,5
07. Pontos entregues	319,5	247	294	225,5	229	283	257	256
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	272,50	201,00	216,00	147,50	186,50	244,00	205,00	209,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	47,00	46,00	78,00	78,00	42,50	39,00	52,00	47,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	2	0	0	2	2	2	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	65	44	57	55	35	48	45	55
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	37	25	35	43	28	34	33	36
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	2	1	1	1	1	1	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	1h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0,5	3,5	1	7	2	1,5	0,5	0
16. Produtividade planejada	0,324	0,283	0,345	0,328	0,377	0,343	0,319	0,266
17. Produtividade realizada	0,333	0,335	0,335	0,318	0,327	0,330	0,338	0,345
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	102,1	98,1	110,2	94,8	114,5	0	107,1	106,7
19. % Pontos NP / Pontos entregues	14,8	18,7	26,6	34,6	18,6	13,8	20,3	18,4

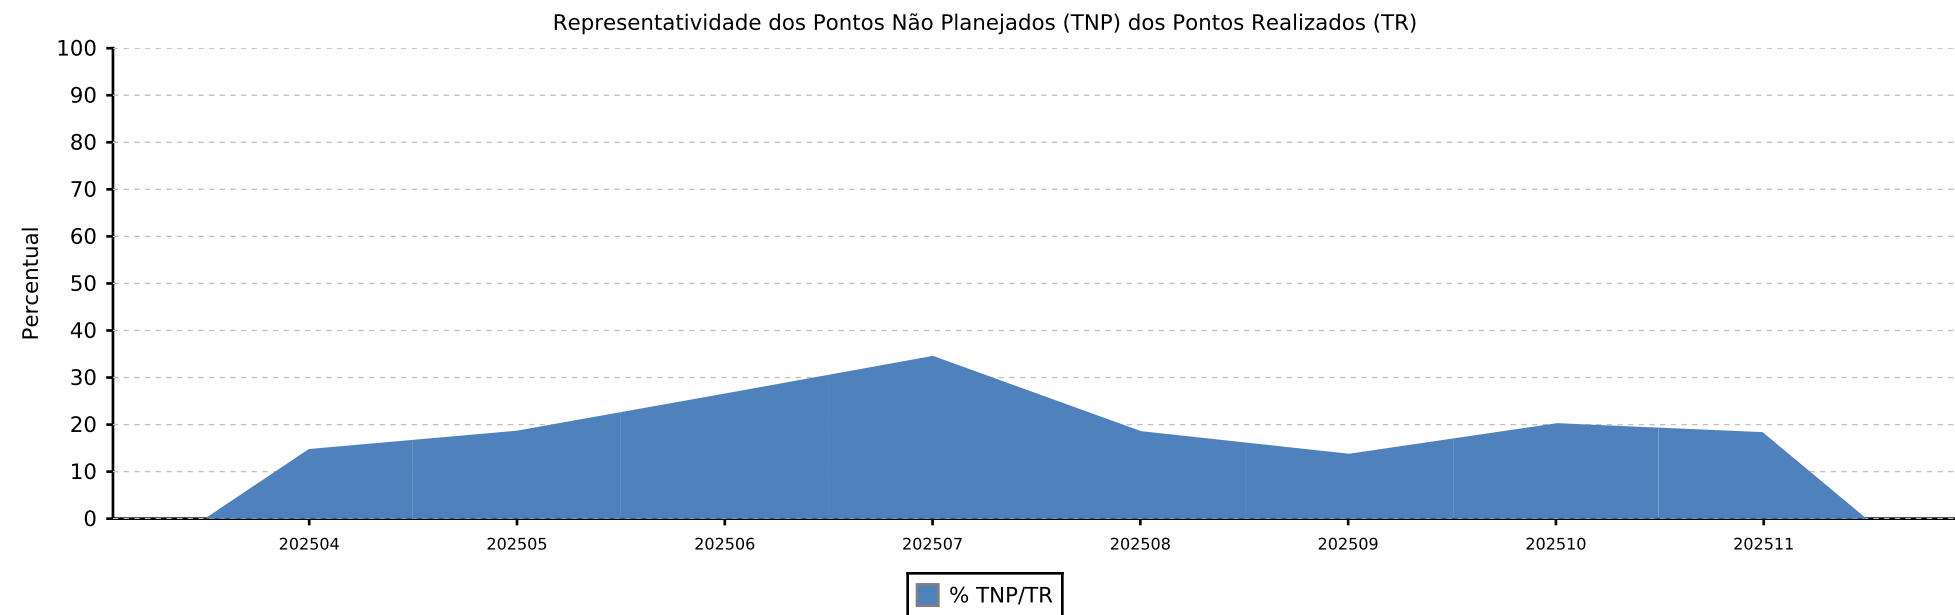


	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
TR - Pontos Realizados	319.5	247	294	225.5	229	283	257	256
TNP - Pontos Não Planejados	47	46	78	78	42.5	39	52	47
% TNP/TR	14,8	18,7	26,6	34,6	18,6	13,8	20,3	18,4

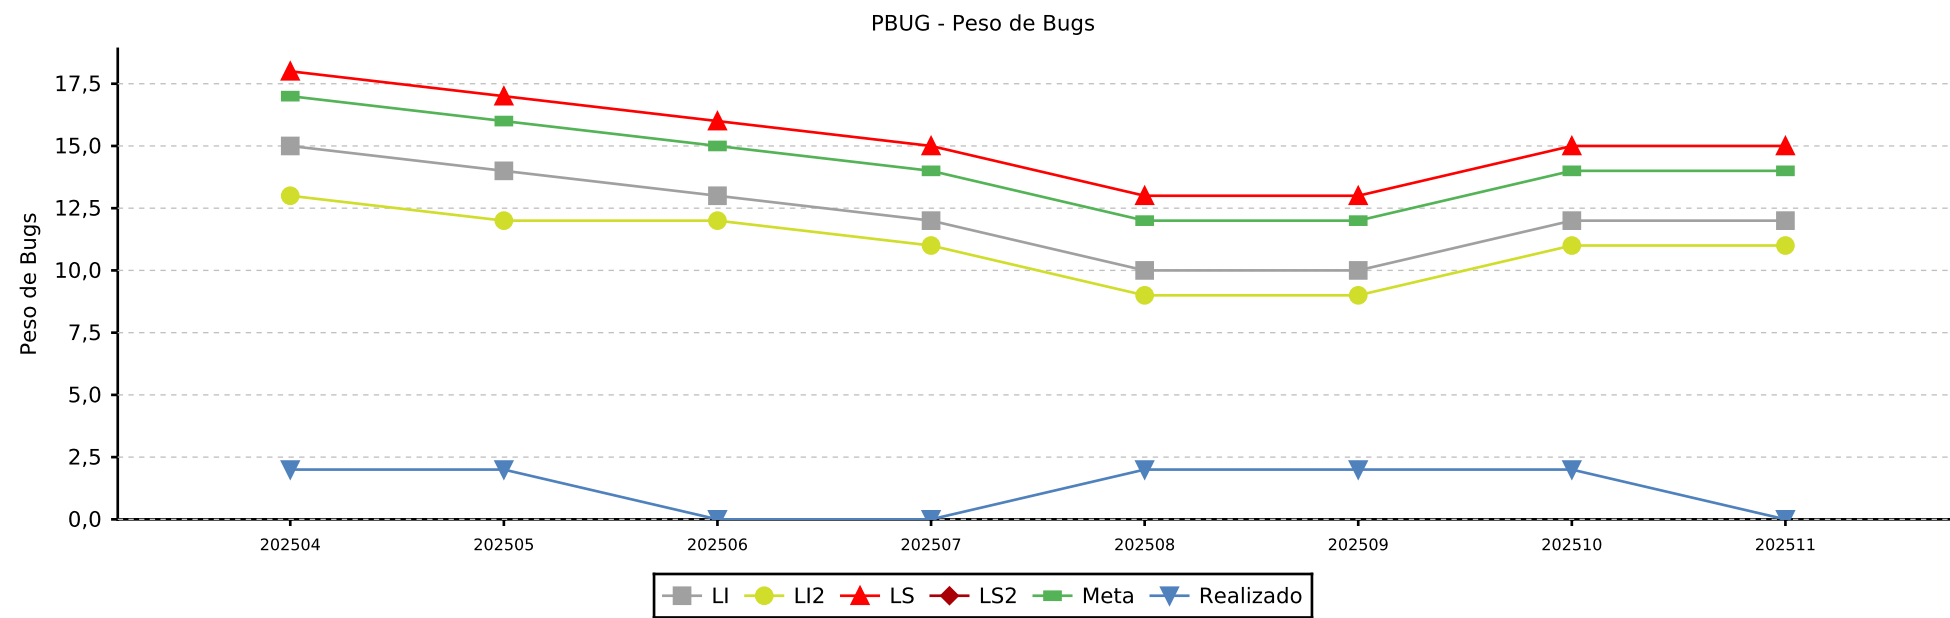

	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
Realizado	2	2	0	0	2	2	2	0
Meta	17	16	15	14	12	12	14	14
LS2								
LS	18	17	16	15	13	13	15	15
LI2	13	12	12	11	9	9	11	11
LI	15	14	13	12	10	10	12	12
Pontos Entregues	319.5	247	294	225.5	229	283	257	256
% PBUG / TR	0,63	0,81	0,00	0,00	0,88	0,71	0,78	0,00

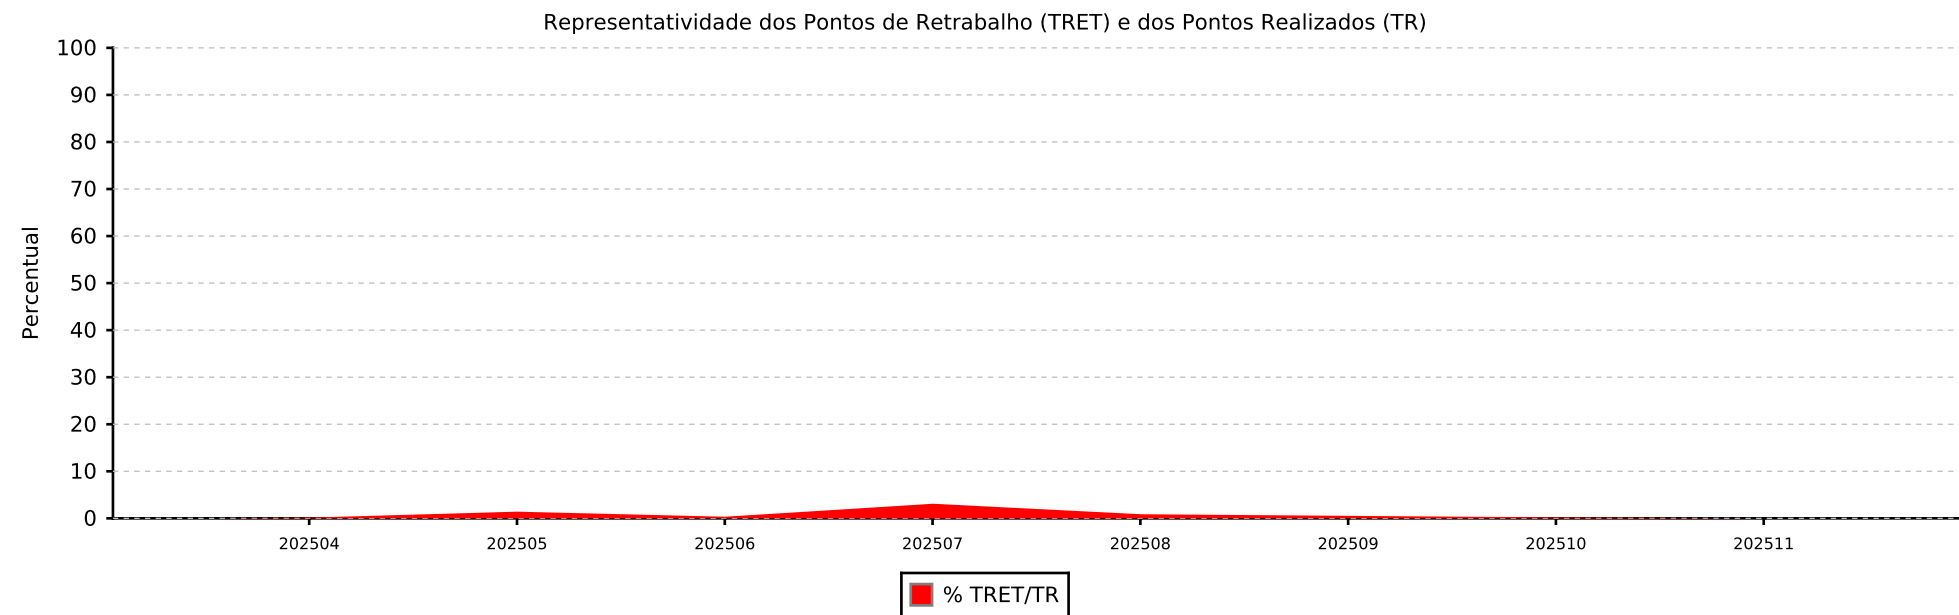


	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
TR - Pontos Realizados	319.5	247	294	225.5	229	283	257	256
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	3.5	1	7	2	1.5	0.5	0
% TRET/TR	0,2	1,4	0,3	3,1	0,9	0,5	0,2	0,0

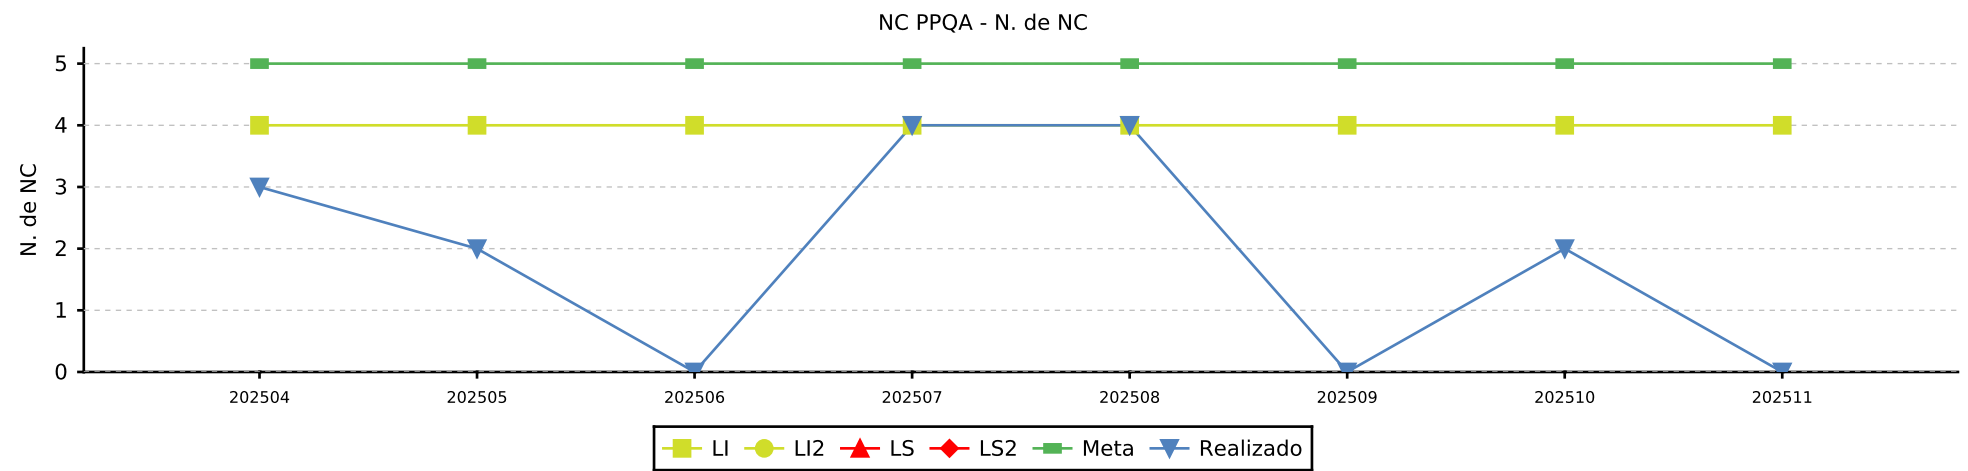


	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
Realizado	3	2	0	4	4	0	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

Ordens de Serviço Pontuadas

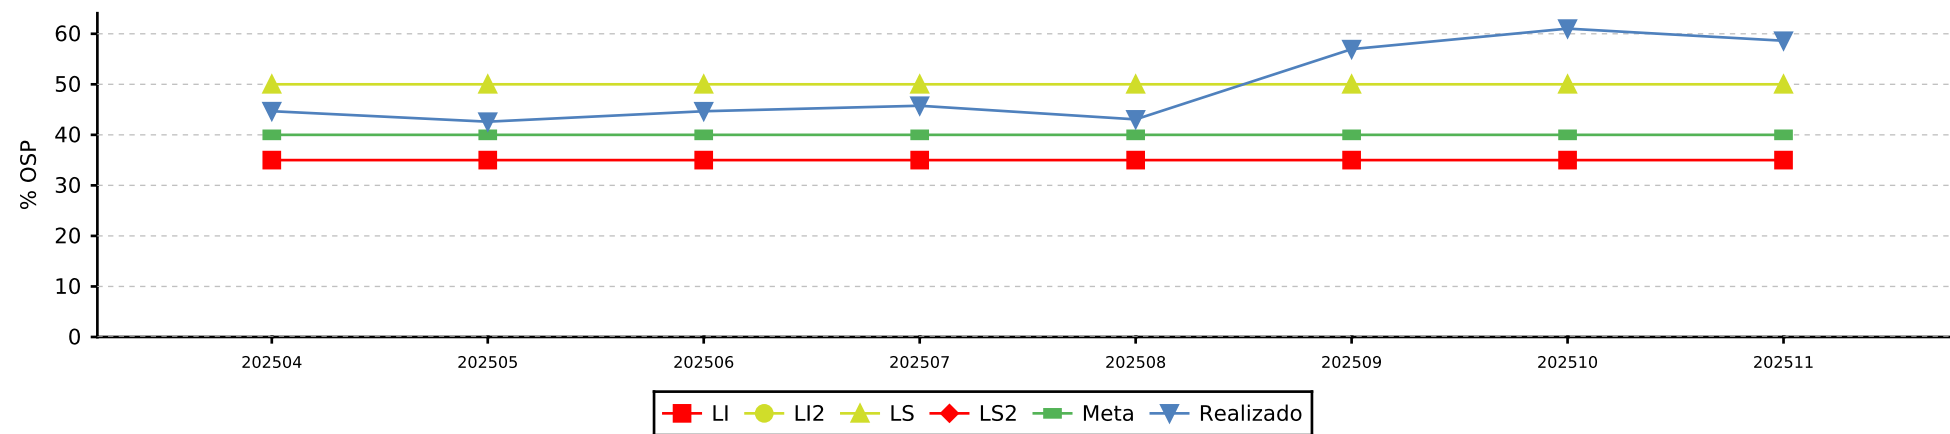

	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
Realizado	44.68	42.6	44.67	45.76	43.06	56.96	61.02	58.62
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

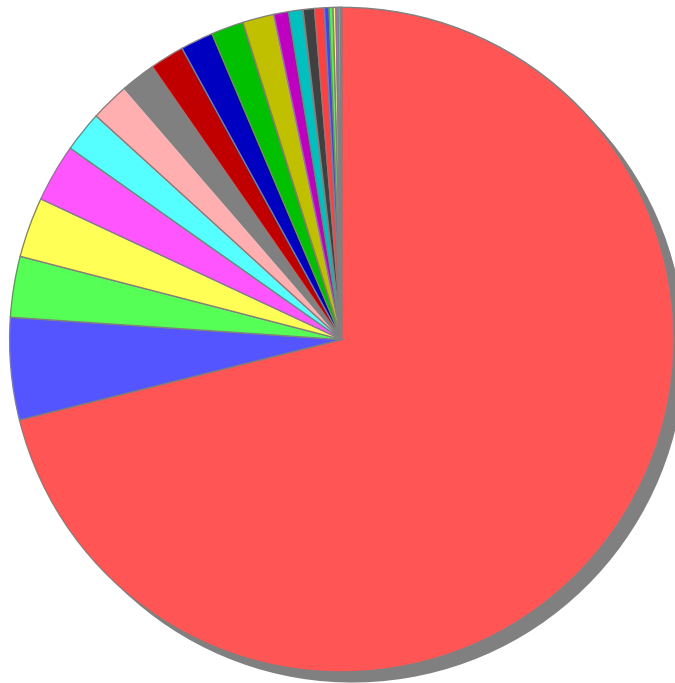

- Desenvolvimento [71.1%]
- Analise de Sistema [4.97%]
- Daily Scrum [2.96%]
- Ausencia [2.93%]
- Cafe [2.81%]
- Sprint Planning 1 [1.98%]
- Retrospectiva [1.9%]
- Compilacao de sistemas [1.69%]
- Code Review [1.68%]
- Treinamento [1.59%]
- Reuniao [1.59%]
- Ginastica Laboral [1.52%]
- Sprint Planning 2 [0.72%]
- Outros [0.7%]
- Clean Code [0.55%]
- Correção de Erros Interno [0.48%]
- Verificando apontamento [0.22%]
- Atraso / Saida antecipada [0.19%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.14%]
- Curso/Palestra [0.11%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.1%]
- Atestado [0.05%]
- Planejamento de Projeto [0.03%]

% de Horas por Área do CMMI

