

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	213			202	301	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	80h00m	88h00m	88h00m	80h00m	80h00m	88h00m	88h00m	132h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	92h33m	114h04m	137h45m	114h40m	100h58m	97h17m	74h42m	178h02m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	67h45m	75h45m	75h45m	67h45m	67h25m	75h25m	75h25m	112h20m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	65h31m	74h45m	109h41m	65h51m	57h04m	39h45m	44h52m	142h36m
05. Pontos planejados	20,0	23,5	35,0	23,0	22,5	19,0	26,0	33,5
06. Pontos entregues	13	42,5	48	28	14	19	13,5	37
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	10,50	26,50	35,00	23,00	12,50	18,00	13,00	33,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	2,50	16,00	13,00	5,00	1,50	1,00	0,50	3,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	4	8	5	5	4	4	1	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	3	14	6	5	2	3	1	4
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	1,5	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,296	0,311	0,463	0,340	0,334	0,252	0,345	0,299
16. Produtividade realizada	0,199	0,569	0,438	0,426	0,246	0,478	0,301	0,260
17. % Pontos NP / Pontos entregues	19,3	37,7	27,1	17,9	10,8	5,3	3,8	9,5

PROD - Produtividade

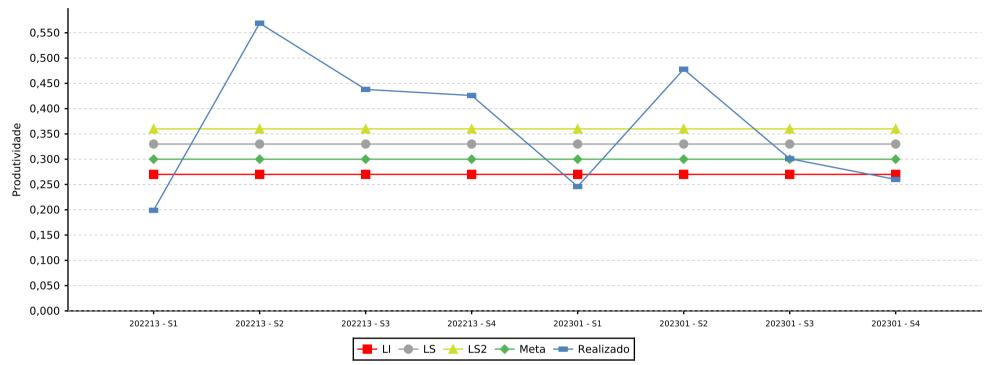


		202	213		202301					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,199	0,569	0,438	0,426	0,246	0,478	0,301	0,260		
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300		
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360		
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330		
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270		

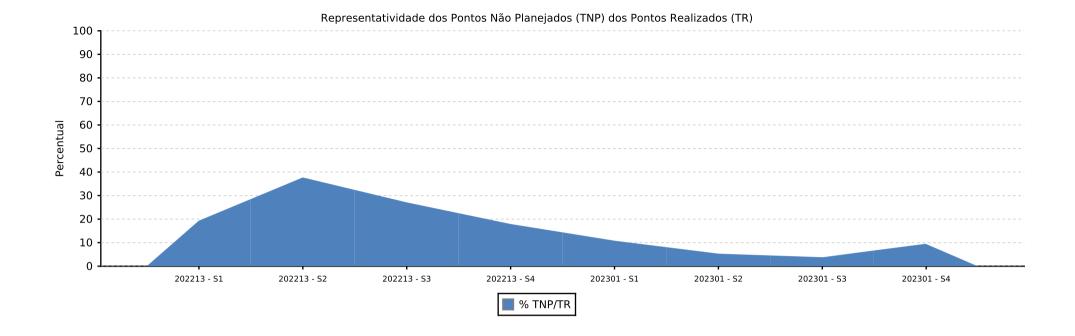


		202	213			202	301	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	13	42.5	48	28	14	19	13.5	37
TNP - Pontos Não Planejados	2.5	16	13	5	1.5	1	0.5	3.5
% TNP/TR	19,3	37,7	27,1	17,9	10,8	5,3	3,8	9,5

NBUG - № de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202	213		202301					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0		
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pontos Entregues	13	42.5	48	28	14	19	13.5	37		
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

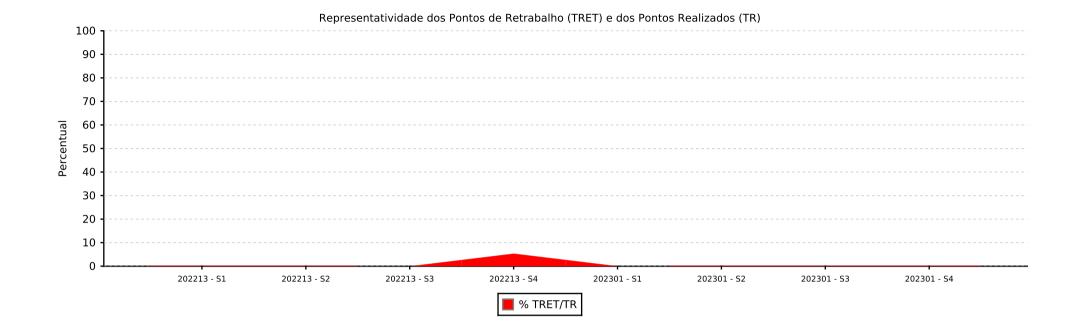


		202	213			202	301	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	13	42.5	48	28	14	19	13.5	37
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	1.5	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	int 1	Spr	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	55,75	50,83	63,75	34,77	63,75	37,07	93,17	128,87	276,42	251,54	91,0 %
Ausencia	0	21,08	0	13,13	0	8,32	0	6,5	0	49,03	0,0 %
Reuniao	0	1,75	0	0,5	0	1	1	6,17	1	9,42	942,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	4,52	0	0	0	4,33	0	8,85	0,0 %
Curso/Palestra	0	0,17	0	2,27	0	10,43	0	4	0	16,87	0,0 %
Daily Scrum	2	1,03	2	2,07	2	1,12	3	3,77	9	7,99	88,8 %
Cafe	2,5	2	2,5	2,25	2,5	1,75	3,75	3,75	11,25	9,75	86,7 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	3,82	0	1,25	0	5,25	0	3,67	0	13,99	0,0 %
Outros	0	0,42	0	0	0	0	0,25	3,17	0,25	3,59	1.436,0
Analise de Sistema	4	7,32	4	16,08	4	6,4	6	3	18	32,8	182,2 %
Sprint Planning 1	3	0,75	3	0,93	3	0,42	4,5	2,25	13,5	4,35	32,2 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,5	2,13	1,5	2,13	142,0 %
Retrospectiva	2	0,17	2	0,57	2	0,33	3	1,67	9	2,74	30,4 %
Atividades Gerenciais	0	0,17	0	0,17	0	0,2	0	1,37	0	1,91	0,0 %
Sizing	0	0	0	0	0	0	1,5	1	1,5	1	66,7 %
Ginastica Laboral	1,33	1,17	1,33	1,33	1,33	1,17	2	0,8	5,99	4,47	74,6 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	7,97	0	13,45	0	0	0	0,67	0	22,09	0,0 %
Code Review	2	0,68	2	0,25	2	0,08	2	0,43	8	1,44	18,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0,25	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,5	0,33	0,5	0	0,5	0,52	0,5	0,17	2	1,02	51,0 %
Sprint Planning 2	3	0,13	3	0,17	3	0,17	4,5	0,08	13,5	0,55	4,1 %
Correcao de Erros Externo	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,75	0	2,25	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,0 %
Merge O.S.	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0,25	0	0,0 %
Clean Code	0,67	0	0,67	0	0,67	0	0,92	0	2,93	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0,13	0	0,52	0	0,48	0	0	0	1,13	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	2	0,92	2	2,58	2	0	2	0	8	3,5	43,8 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0,17	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0,5	0	0,5	0,48	0,5	0	0,5	0	2	0,48	24,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	80	100,97	88	97,29	88	74,71	132,01	178,05	388,01	451,02	116,2 %



- Desenvolvimento [72.39%]
- Ausencia [3.65%]
- Reuniao [3.47%]
- Preparando ambiente [2.43%]
- Curso/Palestra [2.25%]
- Daily Scrum [2.12%]
- Cafe [2.11%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [2.06%]
- Outros [1.78%]
- Analise de Sistema [1.69%]
- Sprint Planning 1 [1.26%]
- Planejamento de Projeto [1.2%]
- Retrospectiva [0.94%]
- Atividades Gerenciais [0.77%]
- Sizing [0.56%]
- Ginastica Laboral [0.45%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.38%]
- Code Review [0.24%]
- Analise de O.S [0.14%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.1%]
- Sprint Planning 2 [0.04%]

## HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	57,42	62,95	65,42	49,47	65,42	42,83	95,5	133,37	283,76	288,62	101,7 %
DIV - Diversos*		4,08	26,58	4,08	17,38	4,08	12,43	7,5	21,75	19,74	78,14	395,8 %
REQM - Gestao de Requisitos		10	8,2	10	21,7	10	6,98	16,5	10,67	46,5	47,55	102,3 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	6	1,88	6	2,88	6	1,53	8	5,87	26	12,16	46,8 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0,17	0	2,27	0	10,43	0	4	0	16,87	0,0 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,5	2,13	1,5	2,13	142,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		2	0,92	2	2,58	2	0	2,5	0	8,5	3,5	41,2 %
	Total Geral	79,5	100,7	87,5	96,28	87,5	74,2	131,5	177,79	386	448,97	116,3 %

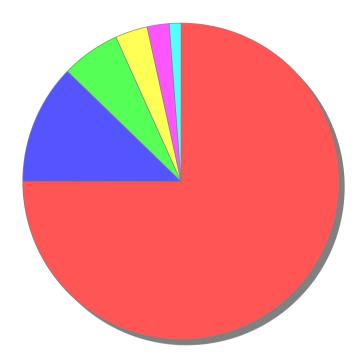


- Desenvolvimento de Requisitos [75.02%]
- Diversos\* [12.23%]
- Gestao de Requisitos [6%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [3.3%]
- Treinamento na Organizacao [2.25%]
- Planejamento de Projeto [1.2%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202207	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301
01. Horas planejadas de todas atividades	0h00m	616h00m	560h00m	559h24m	475h12m	423h24m	336h00m	388h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	33h38m	633h23m	485h55m	564h23m	465h13m	527h22m	459h02m	450h59m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	0h00m	488h20m	432h20m	472h44m	388h32m	344h39m	287h00m	330h35m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	20h04m	455h30m	263h03m	400h24m	289h30m	380h11m	315h48m	284h17m
05. Pontos planejados para o projeto	0,0	146,0	129,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0
06. Pontos planejados	0,0	142,5	105,5	160,5	120,0	107,5	101,5	101,0
07. Pontos entregues	67	123,5	90,5	135	92,5	128	131,5	83,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	3,50	102,00	67,50	126,00	48,50	89,50	95,00	77,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	63,50	21,50	23,00	9,00	44,00	38,50	36,50	6,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	1	0	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	2	25	18	33	14	26	22	15
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	9	9	3	22	13	28	10
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	1	0	0	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	1	0	0	1	0	1,5	0
16. Produtividade planejada	0	0,292	0,245	0,340	0,309	0,312	0,354	0,306
17. Produtividade realizada	3,339	0,272	0,345	0,338	0,320	0,337	0,417	0,294
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	0	84,6	70,2	0	72,3	0	0	0
19. % Pontos NP / Pontos entregues	94,8	17,5	25,5	6,7	47,6	30,1	27,8	7,8

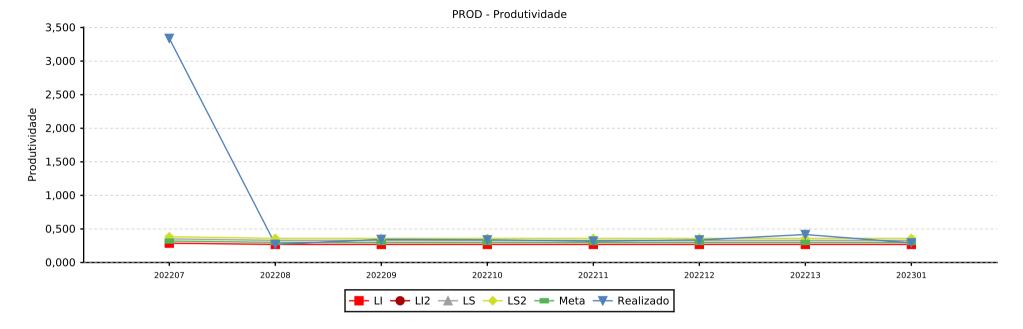


	202207	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301
Realizado	3,339	0,272	0,345	0,338	0,320	0,337	0,417	0,294
Meta	0,320	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
LS2	0,384	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
LS	0,352	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
LI2								
LI	0,288	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270

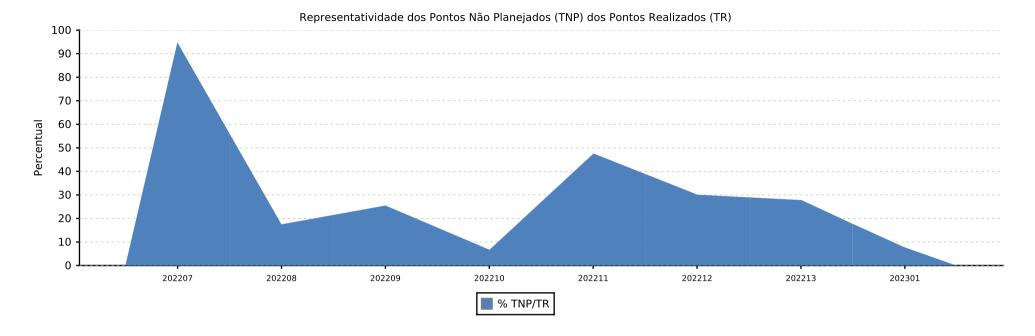


	202207	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301
TR - Pontos Realizados	67	123.5	90.5	135	92.5	128	131.5	83.5
TNP - Pontos Não Planejados	63.5	21.5	23	9	44	38.5	36.5	6.5
% TNP/TR	94,8	17,5	25,5	6,7	47,6	30,1	27,8	7,8




	202207	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301
Realizado	0	0	0	0	1	0	0	0
Meta	8	10	10	10	10	10	10	10
LS2								
LS	8	11	11	11	11	11	11	11
LI2	6	8	8	8	8	8	8	8
LI	7	9	9	9	9	9	9	9
Pontos Entregues	67	123.5	90.5	135	92.5	128	131.5	83.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00

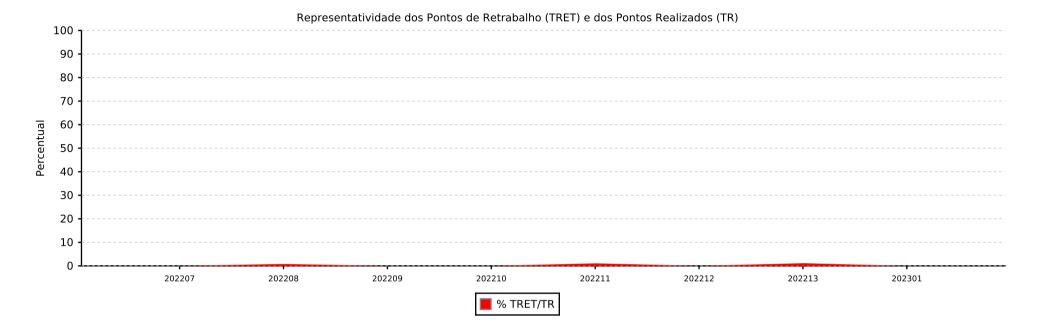


	202207	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301
TR - Pontos Realizados	67	123.5	90.5	135	92.5	128	131.5	83.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1	0	0	1	0	1.5	0
% TRET/TR	0,0	0,8	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0

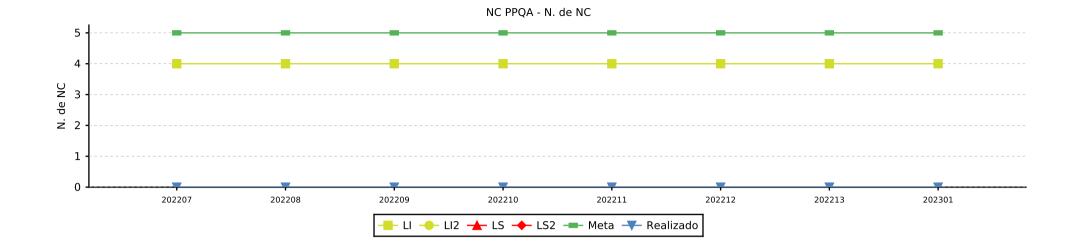

	202207	202208	202209	202210	202211	202212	202213	202301
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

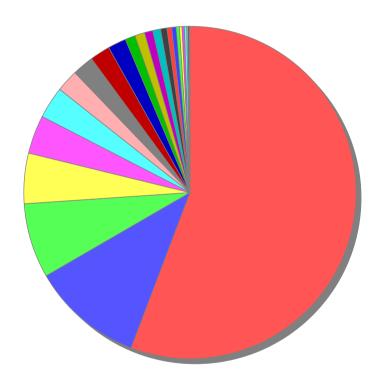

- Desenvolvimento [55.77%]
- Ausencia [10.87%]
- Analise de Sistema [7.27%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [4.9%]
- Curso/Palestra [3.74%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [3.1%]
- Cafe [2.16%]
- Reuniao [2.09%]
- Preparando ambiente [1.96%]
- Daily Scrum [1.77%]
- Ginastica Laboral [0.99%]
- Sprint Planning 1 [0.96%]
- Outros [0.79%]
- Compilacao de sistemas [0.78%]
- Retrospectiva [0.61%]
- Planejamento de Projeto [0.47%]
- Atividades Gerenciais [0.42%]
- Code Review [0.32%]
- O Geração de Atas [0.25%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.23%]
- Sizing [0.22%]
- Sprint Planning 2 [0.12%]
- Auxilio suporte [0.11%]
- Analise de O.S [0.06%]
- Verificando apontamento [0.03%]

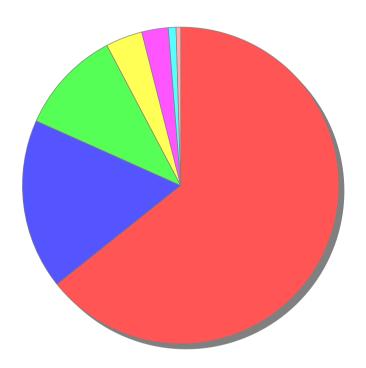

- Desenvolvimento de Requisitos [64%]
- Diversos\* [17.33%]
- Gestao de Requisitos [10.54%]
- Treinamento na Organizacao [3.74%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [2.7%]
- Gerencia de Configuracao [0.78%]
- Planejamento de Projeto [0.47%]
