

INDICADORES DA SPRINT

		202	408			202	409	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	308h00m	308h00m	308h00m	308h00m	296h00m	352h00m	352h00m	352h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	312h15m	318h39m	309h48m	317h32m	279h56m	363h53m	356h23m	352h43m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	262h15m	262h15m	262h15m	262h15m	246h40m	300h00m	300h00m	300h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	257h00m	248h21m	241h37m	244h52m	213h58m	300h22m	296h57m	277h36m
05. Pontos planejados	80,5	73,5	71,0	65,0	53,0	96,5	90,5	76,0
06. Pontos entregues	89	90,5	73	75	71,5	98	92,5	91,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	62,50	74,50	67,00	55,00	54,00	73,00	74,50	73,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	26,50	16,00	6,00	20,00	17,50	25,00	18,00	18,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	2	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	16	11	14	9	14	15	12	16
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	8	9	4	9	13	10	11	10
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	1	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	1,5	2	0	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,307	0,281	0,271	0,248	0,215	0,322	0,302	0,254
16. Produtividade realizada	0,347	0,365	0,303	0,307	0,335	0,327	0,312	0,330
17. % Pontos NP / Pontos entregues	29,8	17,7	8,3	26,7	24,5	25,6	19,5	19,7

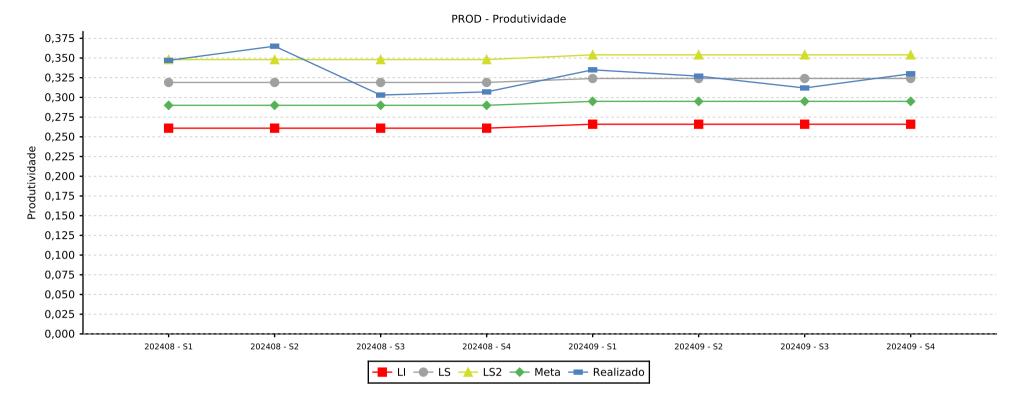


		202	408			202	409	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,347	0,365	0,303	0,307	0,335	0,327	0,312	0,330
Meta	0,290	0,290	0,290	0,290	0,295	0,295	0,295	0,295
LS2	0,348	0,348	0,348	0,348	0,354	0,354	0,354	0,354
LS	0,319	0,319	0,319	0,319	0,324	0,324	0,324	0,324
LI	0,261	0,261	0,261	0,261	0,266	0,266	0,266	0,266

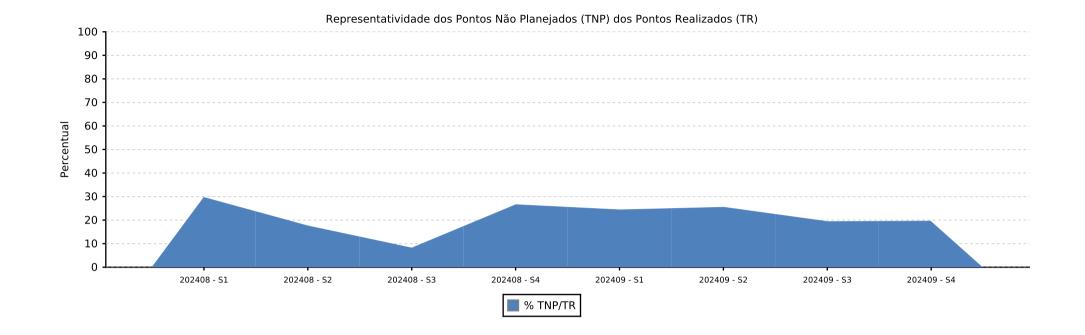


		202	408			202	409	
	1 2 3 4 1 2 3					4		
TR - Pontos Realizados	89	90.5	73	75	71.5	98	92.5	91.5
TNP - Pontos Não Planejados	26.5	16	6	20	17.5	25	18	18
% TNP/TR	29,8	17,7	8,3	26,7	24,5	25,6	19,5	19,7

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

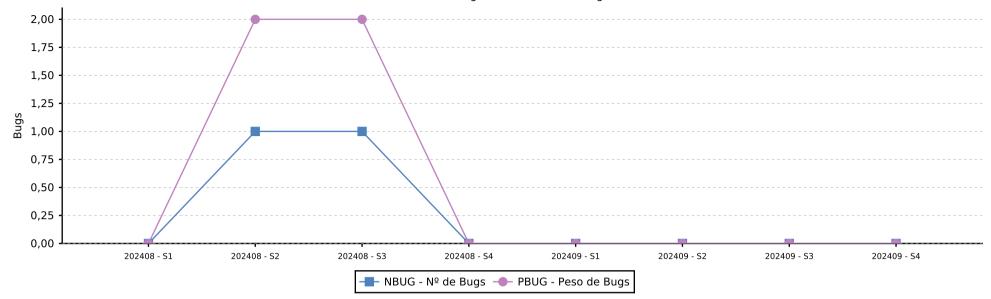

		202	408			202	409	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	1	1	0	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	2	2	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	89	90.5	73	75	71.5	98	92.5	91.5
% PBUG / TR	0,00	2,21	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

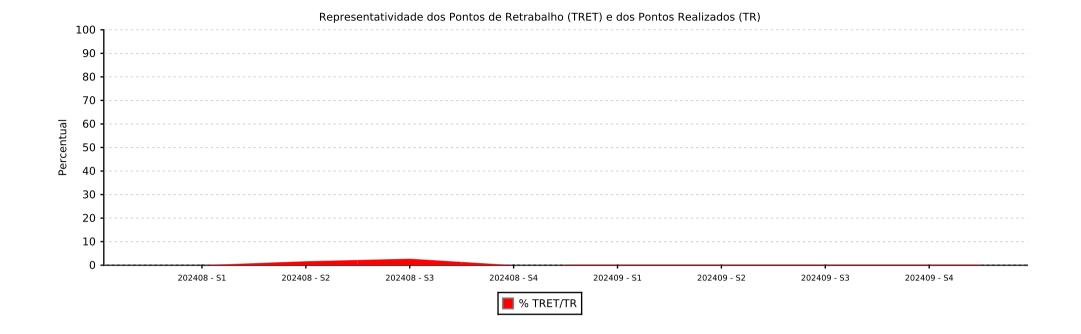


		202	408			202	409	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	89	90.5	73	75	71.5	98	92.5	91.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1.5	2	0	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	1,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	198,67	179,48	248,33	259,48	248,33	266,33	245,67	251,08	941	956,37	101,6 %
Analise de Sistema	23,5	19,48	23,5	19,8	23,5	11,02	23,5	31,38	94	81,68	86,9 %
Daily Scrum	12,5	11,4	16	14,88	16	13,32	16	11,12	60,5	50,72	83,8 %
Cafe	8,25	7,5	10	9,25	10	8,75	10	9,25	38,25	34,75	90,8 %
Atestado	0	0	0	0	0	4	0	8,5	0	12,5	0,0 %
Code Review	5,25	9,27	5,25	2,7	5,25	8,65	5,25	6,92	21	27,54	131,1 %
Retrospectiva	8	7,33	8	5,92	8	3,5	8	4,67	32	21,42	66,9 %
Ginastica Laboral	4,67	3,1	5,5	4	5,5	4,33	5,5	4,55	21,17	15,98	75,5 %
Ausencia	0	15,1	0	14,87	0	10,72	0	4,1	0	44,79	0,0 %
Sprint Planning 1	12	4,67	12	7,17	12	5,33	12	4,08	48	21,25	44,3 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	0	0,5	1,83	0,5	3,47	0,5	3,32	2	8,62	431,0 %
Sprint Planning 2	8	2	8	4,83	8	3,5	8	2,58	32	12,91	40,3 %
Sizing	2	0	2	2,67	2	3	2	2,25	8	7,92	99,0 %
Reuniao	1	5,4	1	1,5	1	0	1	2	4	8,9	222,5 %
Outros	1,17	1,83	1,17	2,5	1,17	0	1,17	1,92	4,68	6,25	133,5 %
Compilacao de sistemas	2,5	2,5	2,5	3,8	2,5	3,17	2,5	1,77	10	11,24	112,4 %
Verificando apontamento	0,33	1,37	0,42	1,73	0,42	1,83	0,42	1,67	1,59	6,6	415,1 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,42	0	0	0	0,35	0	0,82	0	1,59	0,0 %
Clean Code	2	1,07	2	1,25	2	0	2	0,42	8	2,74	34,2 %
Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	0	0,25	0,5	2,42	0,33	3,17	0,83	26,2 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	3,17	8,02	3,25	5	3,25	1	3,25	0	12,92	14,02	108,5 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0,7	0	0	0	0	0	0,7	0,0 %


Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	0	0,5	0	0,5	1,62	0,5	0	2	1,62	81,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,58	0	1,67	0	1,67	0	1,67	0	6,59	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	296,01	279,94	352,01	363,88	352,01	356,39	352,02	352,73	1.352,05	1.352,94	100,1 %

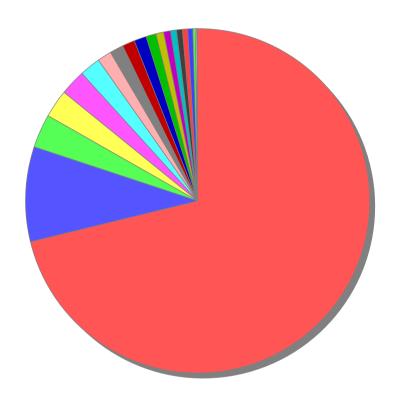

- Desenvolvimento [71.18%]
- Analise de Sistema [8.9%]
- Daily Scrum [3.15%]
- Cafe [2.62%]
- Atestado [2.41%]
- Code Review [1.96%]
- Retrospectiva [1.32%]
- Ginastica Laboral [1.29%]
- Ausencia [1.16%]
- Sprint Planning 1 [1.16%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.94%]
- Sprint Planning 2 [0.73%]
- Sizing [0.64%]
- Reuniao [0.57%]
- Outros [0.54%]
- Compilacao de sistemas [0.5%]
- Verificando apontamento [0.47%]
- Atraso / Saida antecipada [0.23%]
- Clean Code [0.12%]
- Planejamento de Projeto [0.09%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	206,58	188,57	256,42	267,57	256,42	272,42	253,75	254,82	973,17	983,38	101,0 %
REQM - Gestao de Requisitos		45,5	26,15	45,5	34,47	45,5	22,85	45,5	40,3	182	123,77	68,0 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	25,75	28	29,25	23,5	29,25	25,47	29,25	22,7	113,5	99,67	87,8 %
DIV - Diversos*		15,08	32,93	17,67	32,82	17,67	23,8	17,67	21,82	68,09	111,37	163,6 %
CM - Gerencia de Configuração		2,5	2,5	2,5	3,8	2,5	3,17	3	1,77	10,5	11,24	107,0 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0,5	2,42	0,33	3,17	0,83	26,2 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	295,66	278,15	351,59	362,16	351,59	348,21	351,59	341,74	1.350,43	1.330,26	98,5 %

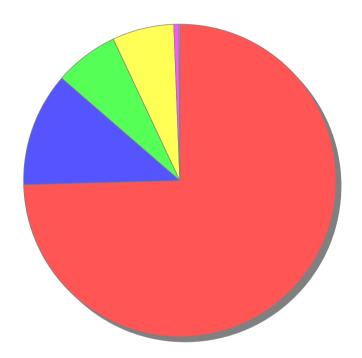


- Desenvolvimento de Requisitos [74.57%]
- Gestao de Requisitos [11.79%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.64%]
- Diversos* [6.39%]
- Gerencia de Configuracao [0.52%]
- Planejamento de Projeto [0.1%]

INDICADORES DO PROJETO


	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
01. Horas planejadas de todas atividades	591h12m	704h00m	1176h00m	1002h24m	1008h00m	1232h00m	1232h00m	1352h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	673h10m	778h03m	1138h29m	996h30m	1183h00m	1273h03m	1258h14m	1352h55m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	509h07m	621h00m	1001h20m	848h04m	851h40m	1051h00m	1049h00m	1146h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	477h30m	539h30m	927h28m	752h37m	898h34m	1021h36m	991h50m	1088h53m
05. Pontos planejados para o projeto	158,0	191,0	207,0	245,0	247,0	305,0	305,0	336,0
06. Pontos planejados	179,0	197,5	247,0	192,5	209,5	296,0	290,0	316,0
07. Pontos entregues	153,5	178	304	234	294,5	321	327,5	353,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	117,50	112,50	262,50	170,00	194,00	235,00	259,00	275,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	36,00	65,50	41,50	64,00	100,50	86,00	68,50	78,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	8	3	4	2	6	2	4	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	35	24	50	42	51	47	50	57
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	22	38	25	34	53	40	30	44
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	4	2	2	1	3	1	2	0
14. Horas de correção de bug	3h22m	1h10m	0h00m	0h00m	1h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	3	8	3,5	2,5	1,5	0,5	3,5	0
16. Produtividade planejada	0,352	0,319	0,247	0,227	0,246	0,282	0,277	0,276
17. Produtividade realizada	0,322	0,330	0,328	0,311	0,328	0,315	0,331	0,325
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	97,2	93,2	146,9	95,6	119,3	105,3	107,4	105,3
19. % Pontos NP / Pontos entregues	23,5	36,8	13,7	27,4	34,2	26,8	21	22,3

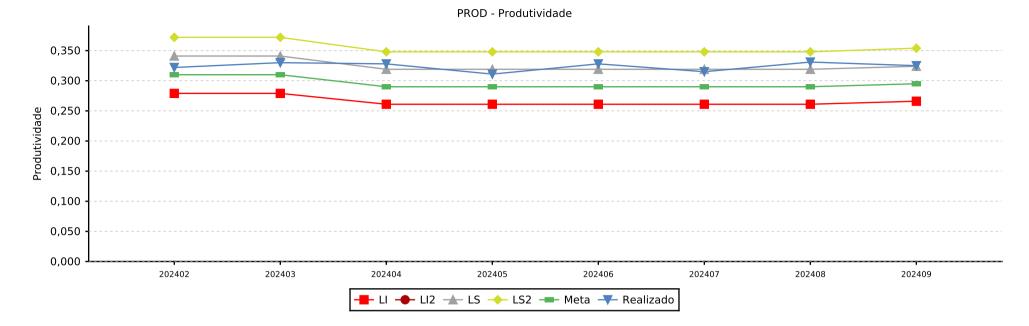


	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
Realizado	0,322	0,330	0,328	0,311	0,328	0,315	0,331	0,325
Meta	0,310	0,310	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,295
LS2	0,372	0,372	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,354
LS	0,341	0,341	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,324
LI2								
LI	0,279	0,279	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,266

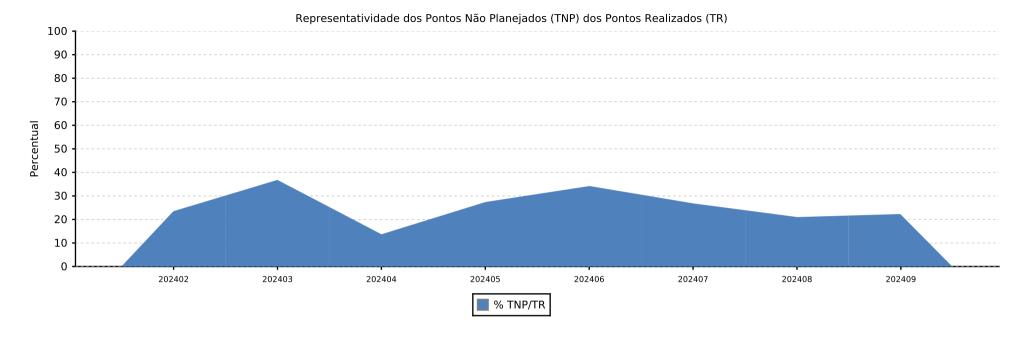


	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
TR - Pontos Realizados	153.5	178	304	234	294.5	321	327.5	353.5
TNP - Pontos Não Planejados	36	65.5	41.5	64	100.5	86	68.5	78.5
% TNP/TR	23,5	36,8	13,7	27,4	34,2	26,8	21,0	22,3

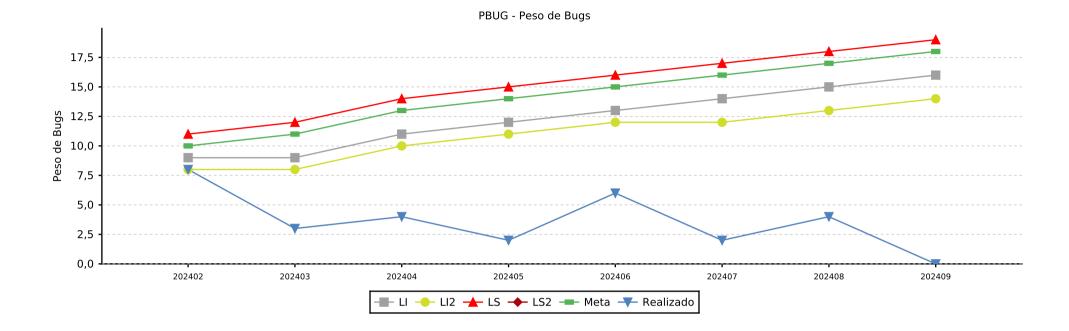


	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
Realizado	8	3	4	2	6	2	4	0
Meta	10	11	13	14	15	16	17	18
LS2								
LS	11	12	14	15	16	17	18	19
LI2	8	8	10	11	12	12	13	14
LI	9	9	11	12	13	14	15	16
Pontos Entregues	153.5	178	304	234	294.5	321	327.5	353.5
% PBUG / TR	5,22	1,69	1,32	0,86	2,04	0,63	1,23	0,00

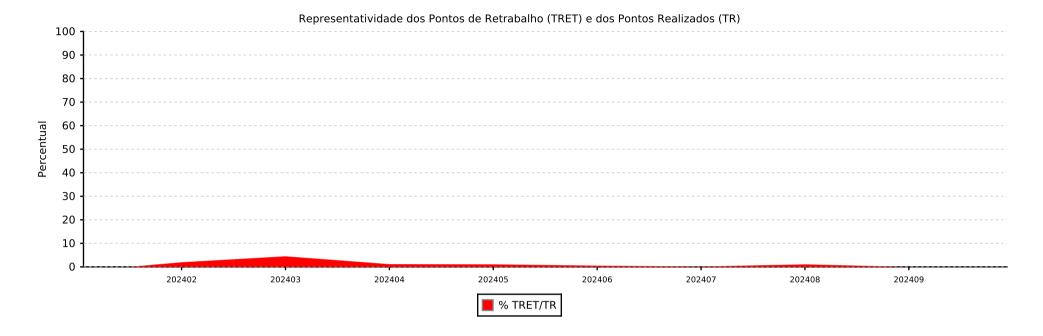


	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
TR - Pontos Realizados	153.5	178	304	234	294.5	321	327.5	353.5
TRET - Pontos de Retrabalho	3	8	3.5	2.5	1.5	0.5	3.5	0
% TRET/TR	2,0	4,5	1,2	1,1	0,5	0,2	1,1	0,0

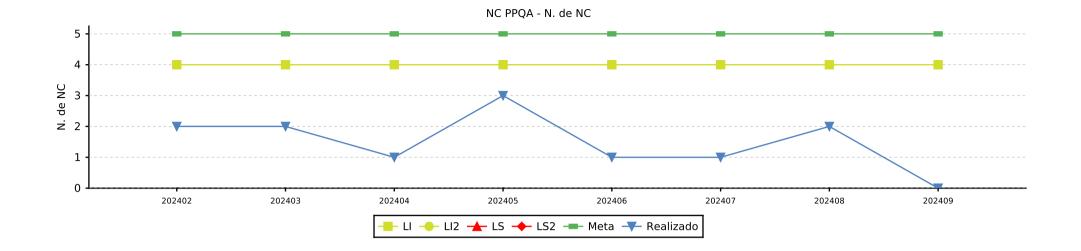


	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
Realizado	2	2	1	3	1	1	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

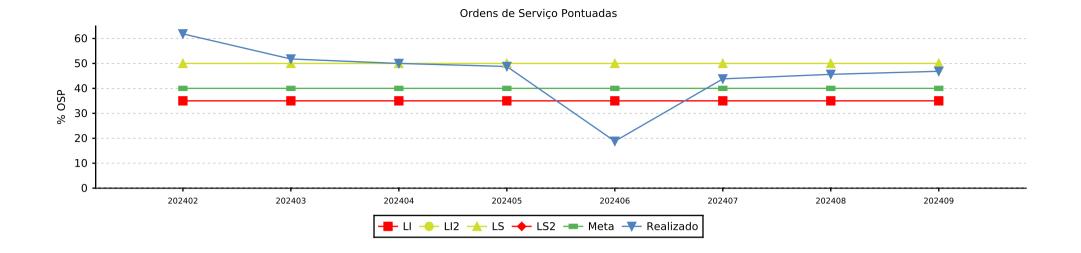

	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
Realizado	61.86	51.79	50	48.78	18.8	43.81	45.63	46.85
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35



- Desenvolvimento [70.69%]
- Analise de Sistema [6.04%]
- Daily Scrum [3.75%]
- Ausencia [3.31%]
- Cafe [2.57%]
- Code Review [2.03%]
- Retrospectiva [1.58%]
- Sprint Planning 1 [1.57%]
- Ginastica Laboral [1.18%]
- Ocrreção de Erros Interno [1.04%]
- Sprint Planning 2 [0.95%]
- Atestado [0.92%]
- Compilacao de sistemas [0.83%]
- Reuniao [0.66%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.64%]
- Sizing [0.59%]
- Verificando apontamento [0.49%]
- Outros [0.46%]
- Clean Code [0.2%]
- Particular [0.15%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.12%]
- Atraso / Saida antecipada [0.12%]
- Planejamento de Projeto [0.06%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.05%]

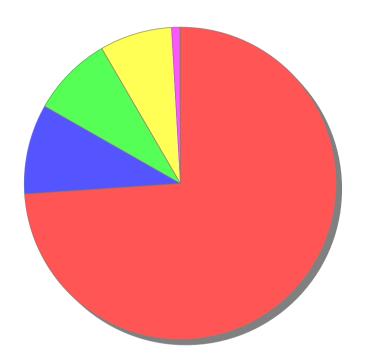

- Desenvolvimento de Requisitos [72.69%]
- Gestao de Requisitos [9.15%]
- Diversos* [8.23%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.37%]
- Gerencia de Configuracao [0.83%]
- Planejamento de Projeto [0.06%]
