

INDICADORES DA SPRINT

		202	407			202	408	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	308h00m							
02. Horas realizadas de todas atividades	329h57m	318h57m	314h13m	309h56m	312h15m	318h39m	309h48m	319h17m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	262h45m	262h45m	262h45m	262h45m	262h15m	262h15m	262h15m	262h15m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	267h54m	247h55m	249h06m	256h41m	257h00m	248h21m	241h37m	246h32m
05. Pontos planejados	66,5	64,5	79,5	85,5	80,5	73,5	71,0	65,0
06. Pontos entregues	82,5	71,5	76	91	89	90,5	73	75
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	69,50	52,00	46,00	67,50	62,50	74,50	67,00	55,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	13,00	19,50	30,00	23,50	26,50	16,00	6,00	20,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	2	0	2	2	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	17	9	8	13	16	11	14	9
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	10	6	13	11	8	9	4	9
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	1	0	1	1	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0,5	0	1,5	2	0
15. Produtividade planejada	0,254	0,246	0,303	0,326	0,307	0,281	0,271	0,248
16. Produtividade realizada	0,308	0,289	0,306	0,355	0,347	0,365	0,303	0,305
17. % Pontos NP / Pontos entregues	15,8	27,3	39,5	25,9	29,8	17,7	8,3	26,7

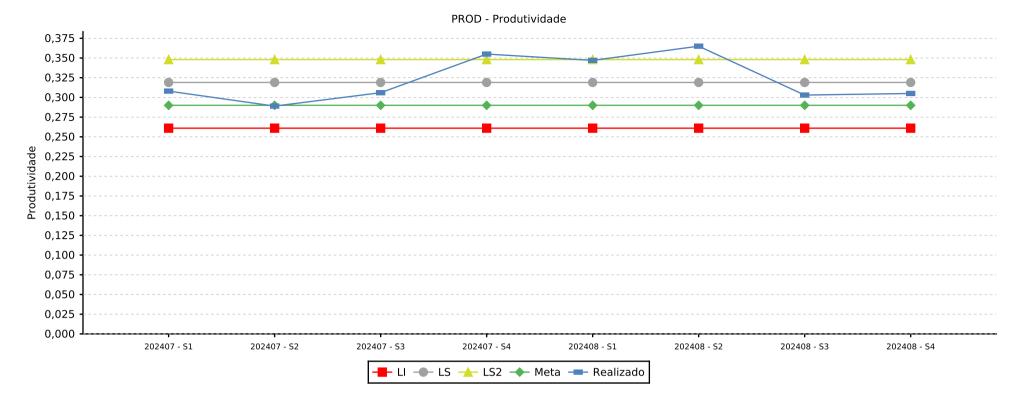


		202	407		202408					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,308	0,289	0,306	0,355	0,347	0,365	0,303	0,305		
Meta	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290		
LS2	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348		
LS	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319		
LI	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261		

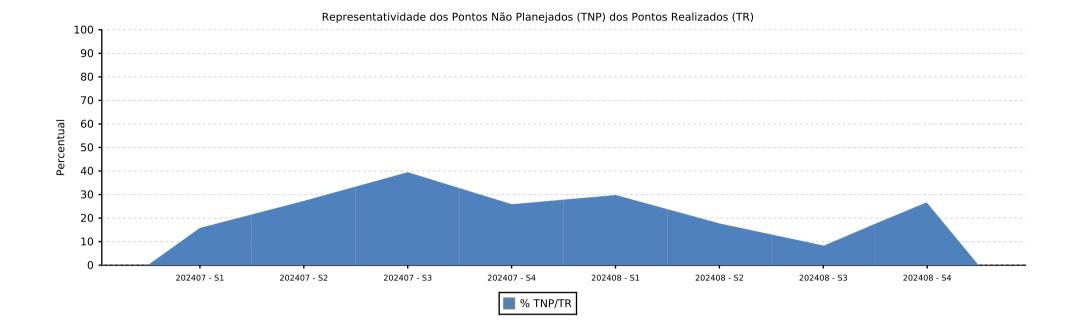


		202	407			202	408	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	82.5	71.5	76	91	89	90.5	73	75
TNP - Pontos Não Planejados	13	19.5	30	23.5	26.5	16	6	20
% TNP/TR	15,8	27,3	39,5	25,9	29,8	17,7	8,3	26,7

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

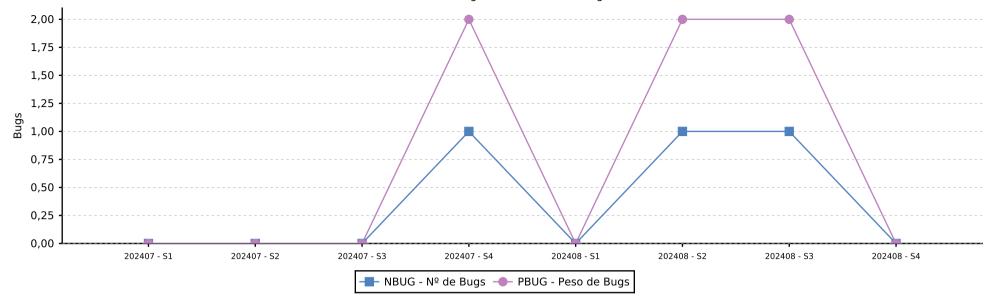

		202	407		202408				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	1	0	1	1	0	
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	2	0	2	2	0	
Pontos Entregues	82.5	71.5	76	91	89	90.5	73	75	
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	2,21	2,74	0,00	




		202	407			202	408	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	82.5	71.5	76	91	89	90.5	73	75
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0.5	0	1.5	2	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,7	2,7	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	nt 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	217,17	227,73	217,17	225,85	217,17	213,03	214,75	212,5	866,26	879,11	101,5 %
Analise de Sistema	19	17,95	19	15,8	19	24,9	19	30,38	76	89,03	117,1 %
Ausencia	0	6,3	0	18,35	0	7,05	0	15,9	0	47,6	0,0 %
Daily Scrum	14	13,35	14	5,58	14	11,07	14	13,47	56	43,47	77,6 %
Cafe	8,75	7,5	8,75	7,83	8,75	8,33	8,75	8	35	31,66	90,5 %
Sprint Planning 1	10,5	5,25	10,5	5,33	10,5	5,25	10,5	7,33	42	23,16	55,1 %
Retrospectiva	7	7	7	5	7	7	7	5,5	28	24,5	87,5 %
Code Review	5,25	2,4	5,25	6,28	5,25	7,72	5,25	5,07	21	21,47	102,2 %
Ginastica Laboral	5	4,3	5	4,05	5	4,33	5	4,33	20	17,01	85,0 %
Sprint Planning 2	7	1,75	7	2,67	7	1,75	7	3,58	28	9,75	34,8 %
Correção de Erros Interno	2,75	0,25	2,75	2,92	2,75	1,07	2,75	2,65	11	6,89	62,6 %
Compilacao de sistemas	2,5	0,33	2,5	2,3	2,5	4,03	2,5	2,25	10	8,91	89,1 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,87	0	2,85	0	0,72	0	2,15	0	6,59	0,0 %
Verificando apontamento	0,42	1,93	0,42	2	0,42	1,5	0,42	2,08	1,68	7,51	447,0 %
Outros	1,17	0	1,17	1,75	1,17	7,18	1,17	1,17	4,68	10,1	215,8 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0,75	0	0	0	1	0	1,75	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	0,92	0,5	0,75	0,5	0,92	0,5	0,5	2	3,09	154,5 %
Planejamento de Projeto	0,25	0,5	0,25	0	0,25	0,5	2,17	0,5	2,92	1,5	51,4 %
Clean Code	1,75	0,25	1,75	0,25	1,75	1,03	1,75	0,5	7	2,03	29,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	0,42	0,5	0	0,5	0,25	0,5	0,42	2	1,09	54,5 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,33	0	1,33	0	1,33	0	1,33	0	5,32	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente		0	1	0	0	0	0,17	0	0	0	1,17	0,0 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado		0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing		2	0	2	1,17	2	0	2	0	8	1,17	14,6 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Reuniao		1	2	1	7,17	1	2	1	0	4	11,17	279,2 %
Analise de O.S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	308,01	312,25	308,01	318,65	308,01	309,8	308,01	319,28	1.232,04	1.259,98	102,3 %

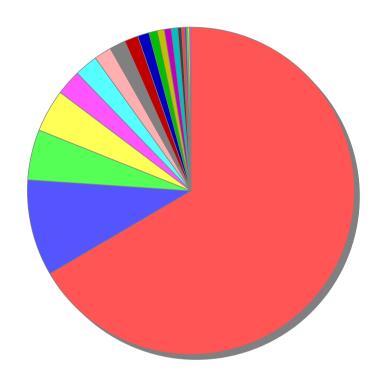

- Desenvolvimento [66.56%]
- Analise de Sistema [9.52%]
- Ausencia [4.98%]
- Daily Scrum [4.22%]
- Cafe [2.51%]
- Sprint Planning 1 [2.3%]
- Retrospectiva [1.72%]
- Code Review [1.59%]
- Ginastica Laboral [1.36%]
- Sprint Planning 2 [1.12%]
- Correção de Erros Interno [0.83%]
- Compilacao de sistemas [0.7%]
- Atraso / Saida antecipada [0.67%]
- Verificando apontamento [0.65%]
- Outros [0.37%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.31%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.16%]
- Planejamento de Projeto [0.16%]
- Clean Code [0.16%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [0.13%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	224,17	229,57	224,17	229,77	224,17	216,3	221,75	216,57	894,26	892,21	99,8 %
REQM - Gestao de Requisitos		38,5	25,95	38,5	24,97	38,5	32,07	38,5	41,3	154	124,29	80,7 %
DIV - Diversos*		15,92	20,1	15,92	39,9	15,92	28,9	15,92	30,4	63,68	119,3	187,3 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	26,25	22,75	26,25	16,87	26,25	25,78	26,25	24,03	105	89,43	85,2 %
CM - Gerencia de Configuração		2,5	0,33	2,5	2,3	2,5	4,03	3	2,25	10,5	8,91	84,9 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0,5	0,25	0	0,25	0,5	2,17	0,5	2,92	1,5	51,4 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	307,59	299,2	307,59	313,81	307,59	307,58	307,59	315,05	1.230,36	1.235,64	100,4 %




- Desenvolvimento de Requisitos [68.74%]
- Gestao de Requisitos [13.11%]
- Diversos* [9.65%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.63%]
- Gerencia de Configuracao [0.71%]
- Planejamento de Projeto [0.16%]

INDICADORES DO PROJETO


	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408
01. Horas planejadas de todas atividades	545h36m	591h12m	704h00m	1176h00m	1002h24m	1008h00m	1232h00m	1232h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	560h42m	673h10m	778h03m	1138h29m	996h30m	1183h00m	1273h03m	1259h59m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	471h46m	509h07m	621h00m	1001h20m	848h04m	851h40m	1051h00m	1049h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	461h52m	477h30m	539h30m	927h28m	752h37m	898h34m	1021h36m	993h30m
05. Pontos planejados para o projeto	146,0	158,0	191,0	207,0	245,0	247,0	305,0	305,0
06. Pontos planejados	161,0	179,0	197,5	247,0	192,5	209,5	296,0	290,0
07. Pontos entregues	151,5	153,5	178	304	234	294,5	321	327,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	131,50	117,50	112,50	262,50	170,00	194,00	235,00	259,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	20,00	36,00	65,50	41,50	64,00	100,50	86,00	68,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	8	3	4	2	6	2	4
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	35	35	24	50	42	51	47	50
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	14	22	38	25	34	53	40	30
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	4	2	2	1	3	1	2
14. Horas de correção de bug	0h00m	3h22m	1h10m	0h00m	0h00m	1h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	3	8	3,5	2,5	1,5	0,5	3,5
16. Produtividade planejada	0,342	0,352	0,319	0,247	0,227	0,246	0,282	0,277
17. Produtividade realizada	0,329	0,322	0,330	0,328	0,311	0,328	0,315	0,330
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	103,8	97,2	93,2	146,9	95,6	119,3	105,3	107,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	13,3	23,5	36,8	13,7	27,4	34,2	26,8	21

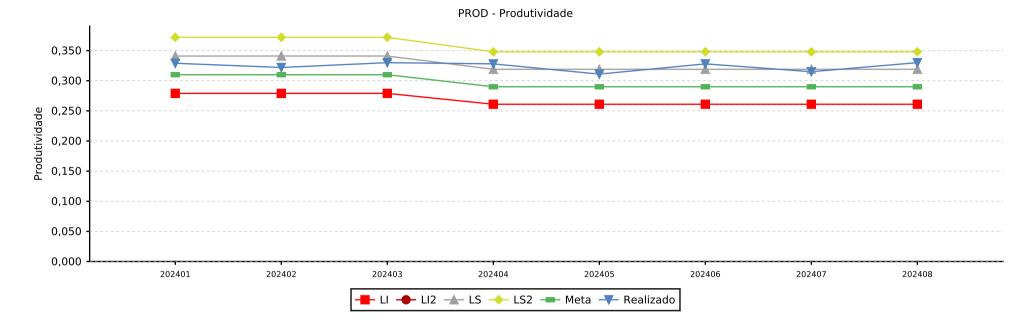

	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408
Realizado	0,329	0,322	0,330	0,328	0,311	0,328	0,315	0,330
Meta	0,310	0,310	0,310	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
LS2	0,372	0,372	0,372	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348
LS	0,341	0,341	0,341	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319
LI2								
LI	0,279	0,279	0,279	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261

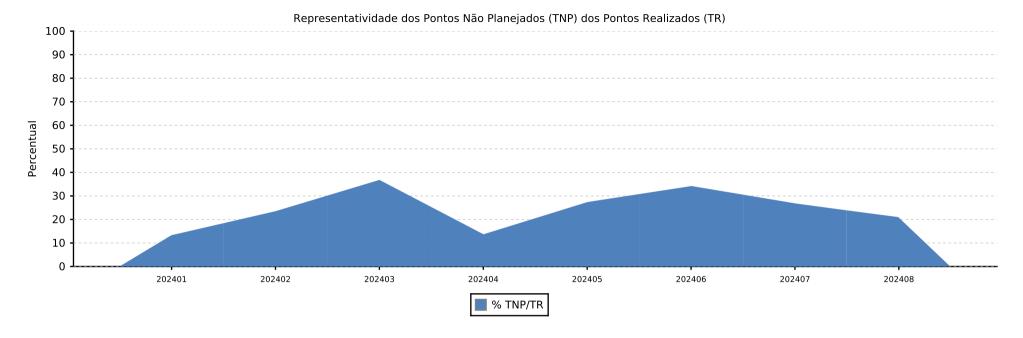


	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408
TR - Pontos Realizados	151.5	153.5	178	304	234	294.5	321	327.5
TNP - Pontos Não Planejados	20	36	65.5	41.5	64	100.5	86	68.5
% TNP/TR	13,3	23,5	36,8	13,7	27,4	34,2	26,8	21,0




--- LI → LI2 → LS → LS2 --- Meta → Realizado

	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408
Realizado	0	8	3	4	2	6	2	4
Meta	9	10	11	13	14	15	16	17
LS2								
LS	9	11	12	14	15	16	17	18
LI2	7	8	8	10	11	12	12	13
LI	8	9	9	11	12	13	14	15
Pontos Entregues	151.5	153.5	178	304	234	294.5	321	327.5
% PBUG / TR	0,00	5,22	1,69	1,32	0,86	2,04	0,63	1,23


0,0

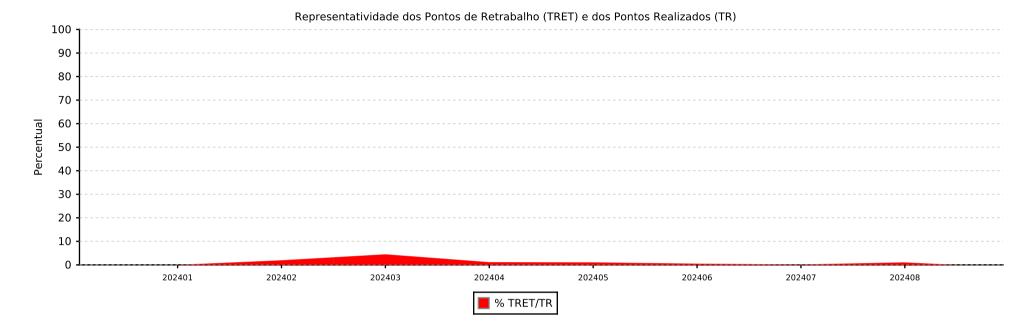


	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408
TR - Pontos Realizados	151.5	153.5	178	304	234	294.5	321	327.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	3	8	3.5	2.5	1.5	0.5	3.5
% TRET/TR	0,0	2,0	4,5	1,2	1,1	0,5	0,2	1,1

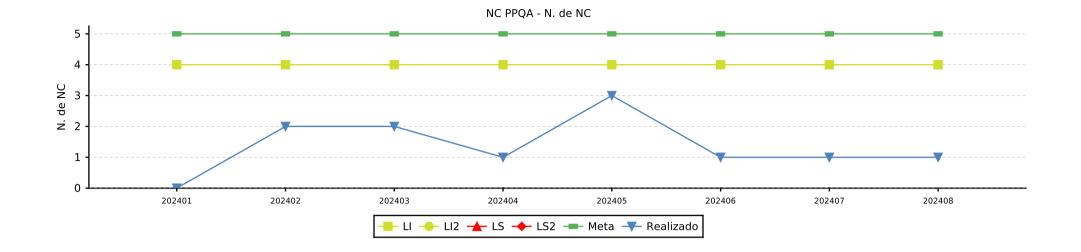


	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408
Realizado	0	2	2	1	3	1	1	1
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408
Realizado	65.59	61.86	51.79	50	48.78	18.8	43.81	45.63
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

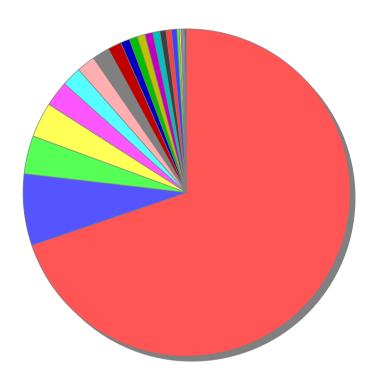

- Desenvolvimento [69.77%]
- Analise de Sistema [7.07%]
- Ausencia [3.78%]
- Daily Scrum [3.45%]
- Cafe [2.51%]
- Retrospectiva [1.94%]
- Sprint Planning 1 [1.84%]
- Code Review [1.7%]
- Ginastica Laboral [1.35%]
- Reuniao [0.89%]
- Outros [0.8%]
- Atestado [0.79%]
- Sprint Planning 2 [0.77%]
- Compilacao de sistemas [0.71%]
- Verificando apontamento [0.6%]
- Correção de Erros Interno [0.55%]
- Atraso / Saida antecipada [0.52%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.24%]
- Clean Code [0.16%]
- O Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.14%]
- Planejamento de Projeto [0.12%]
- Preparando ambiente [0.09%]
- Sizing [0.09%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.09%]
- Auxilio suporte [0.02%]

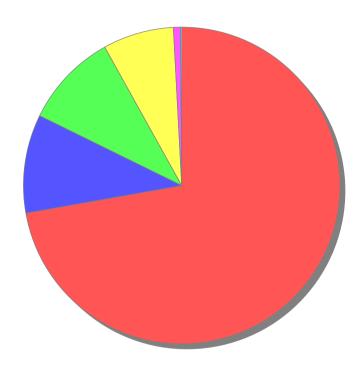

- Desenvolvimento de Requisitos [70.81%]
- Gestao de Requisitos [9.86%]
- Diversos* [9.47%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.1%]
- Gerencia de Configuracao [0.71%]
- O Planejamento de Projeto [0.12%]
