

INDICADORES DA SPRINT

		202	410			202	411	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	352h00m	352h00m	352h00m	352h00m	240h00m	264h00m	300h00m	280h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	360h02m	339h19m	312h54m	308h55m	260h25m	260h28m	300h16m	306h58m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	299h00m	299h00m	299h00m	299h00m	202h10m	226h10m	256h35m	235h55m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	252h52m	260h08m	247h57m	247h17m	206h15m	202h17m	240h45m	250h35m
05. Pontos planejados	94,0	88,5	69,0	68,5	73,0	74,0	93,5	69,0
06. Pontos entregues	90	82,5	88,5	78	77,5	64	84,5	85,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	73,00	57,50	75,50	56,50	49,00	44,00	75,00	70,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	17,00	25,00	13,00	21,50	28,50	20,00	9,50	15,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	2	4
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	16	11	27	15	15	13	19	21
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	15	13	10	6	13	7	9	10
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	2	0	1	0	0	1	2
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h40m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	1,5	0	2	0,5	1	0,5	1
15. Produtividade planejada	0,315	0,296	0,231	0,230	0,362	0,328	0,365	0,293
16. Produtividade realizada	0,356	0,318	0,357	0,316	0,376	0,317	0,351	0,342
17. % Pontos NP / Pontos entregues	18,9	30,4	14,7	27,6	36,8	31,3	11,3	17,6

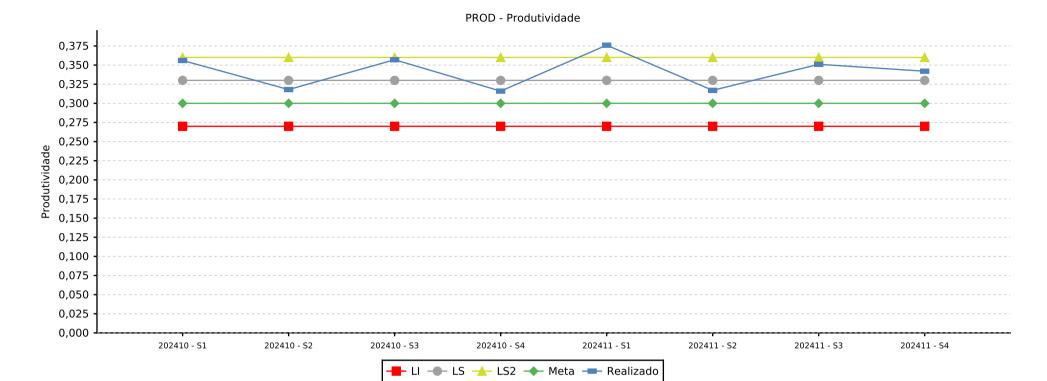


		202	410			202	411	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,356	0,318	0,357	0,316	0,376	0,317	0,351	0,342
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270

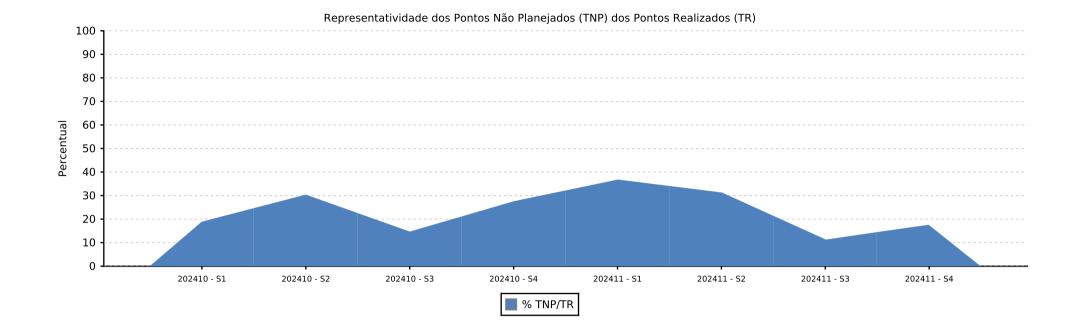


		202	410			202	411	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	90	82.5	88.5	78	77.5	64	84.5	85.5
TNP - Pontos Não Planejados	17	25	13	21.5	28.5	20	9.5	15
% TNP/TR	18,9	30,4	14,7	27,6	36,8	31,3	11,3	17,6

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

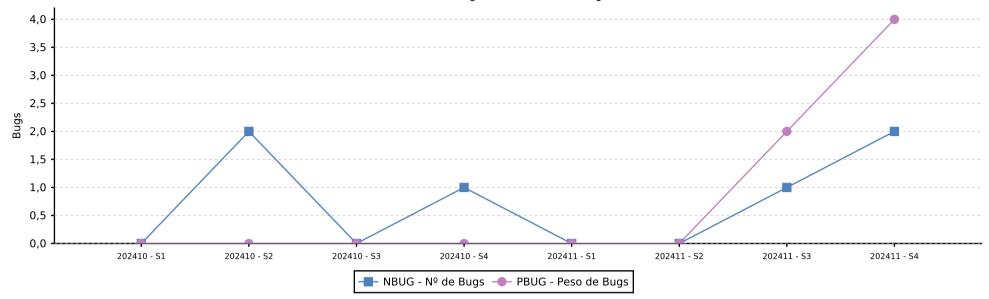

		202	410			202	411	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	2	0	1	0	0	1	2
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	2	4
Pontos Entregues	90	82.5	88.5	78	77.5	64	84.5	85.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	4,68

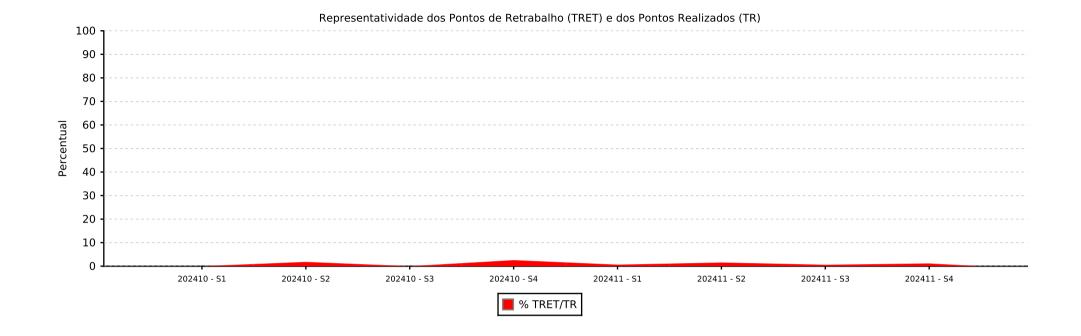


		202	410			202	411	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	90	82.5	88.5	78	77.5	64	84.5	85.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1.5	0	2	0.5	1	0.5	1
% TRET/TR	0,0	1,8	0,0	2,6	0,6	1,6	0,6	1,2

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spri	int 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	163,58	179,13	187,08	176,62	215,25	221,63	188,08	213,58	753,99	790,96	104,9 %
Analise de Sistema	19,5	19,12	19,5	20,15	21,5	24,55	21,5	20,53	82	84,35	102,9 %
Daily Scrum	11,5	10,42	12	10,42	13,5	6,78	14	10,87	51	38,49	75,5 %
Particular	0	0,33	0	1,17	0	2,25	0	9,05	0	12,8	0,0 %
Sprint Planning 1	9	4,5	9	7,5	9	3	10,5	8,17	37,5	23,17	61,8 %
Retrospectiva	6	4,42	6	4	6	2,92	7	8	25	19,34	77,4 %
Cafe	7,5	7,75	7,5	7,67	8,25	8,08	8,75	7,83	32	31,33	97,9 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0,0 %
Ginastica Laboral	4	3,12	4	2,83	4,67	3,52	4,83	3,52	17,5	12,99	74,2 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	1,53	0	0,5	0	1,92	0	3,43	0	7,38	0,0 %
Code Review	0,25	1	0,25	3,25	2,25	3,98	2,25	3,25	5	11,48	229,6 %
Sprint Planning 2	6	1,5	6	3	6	1,17	7	2,33	25	8	32,0 %
Correção de Erros Interno	2,92	1,5	2,92	0	3,17	1	3,17	2,22	12,18	4,72	38,8 %
Sizing	2	1,75	2	1,17	2	0	2	1,75	8	4,67	58,4 %
Ausencia	0	4,1	0	8,55	0	6,2	0	1,7	0	20,55	0,0 %
Compilacao de sistemas	1,5	3,83	1,5	3,65	1,5	2,5	1,5	1,67	6	11,65	194,2 %
Verificando apontamento	0,42	1,58	0,42	1,33	0,42	1,67	0,42	1,58	1,68	6,16	366,7 %
Planejamento de Projeto	0,25	0,5	0,25	0	0,25	0	2,25	1,48	3	1,98	66,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,25	0	0,08	0	1,18	0	1,33	0	2,84	0,0 %
Clean Code	1,5	2,75	1,5	0,25	1,75	1,67	1,75	0,5	6,5	5,17	79,5 %
Outros	1	0,67	1	0,5	1,17	4,25	1,17	0,17	4,34	5,59	128,8 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	0	0,5	0	0,5	0,83	0,5	0	2	0,83	41,5 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,42	0	1,42	0	1,67	0,67	1,67	0	6,18	0,67	10,8 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Reuniao		1	10,67	1	7,83	1	0,5	1	0	4	19	475,0 %
Analise de O.S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	240,01	260,42	264,01	260,47	300,02	300,27	280,01	306,96	1.084,05	1.128,12	104,1 %

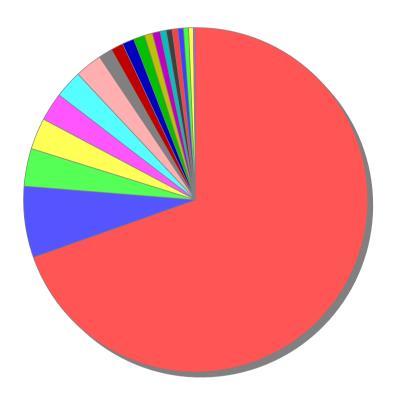

- Desenvolvimento [69.58%]
- Analise de Sistema [6.69%]
- Daily Scrum [3.54%]
- Particular [2.95%]
- Sprint Planning 1 [2.66%]
- Retrospectiva [2.61%]
- Cafe [2.55%]
- Atestado [1.3%]
- Ginastica Laboral [1.15%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.12%]
- Code Review [1.06%]
- Sprint Planning 2 [0.76%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.72%]
- Sizing [0.57%]
- Ausencia [0.55%]
- Compilacao de sistemas [0.54%]
- Verificando apontamento [0.51%]
- Planejamento de Projeto [0.48%]
- Atraso / Saida antecipada [0.43%]
- Clean Code [0.16%]
- Outros [0.06%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	170,08	184,92	193,58	177,37	222,5	227,72	195,33	219,73	781,49	809,74	103,6 %
REQM - Gestao de Requisitos		36,5	26,87	36,5	31,82	38,5	28,72	41	32,78	152,5	120,19	78,8 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	17,75	15,83	18,25	17,67	21,75	13,68	23,25	22,12	81	69,3	85,6 %
DIV - Diversos*		13,5	26,3	13,5	27,38	15,08	22,55	15,75	13,22	57,83	89,45	154,7 %
CM - Gerencia de Configuração		1,5	3,83	1,5	3,65	1,5	2,5	2	1,67	6,5	11,65	179,2 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0,5	0,25	0	0,25	0	2,25	1,48	3	1,98	66,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	239,58	258,25	263,58	257,89	299,58	295,17	279,58	291	1.082,32	1.102,31	101,8 %

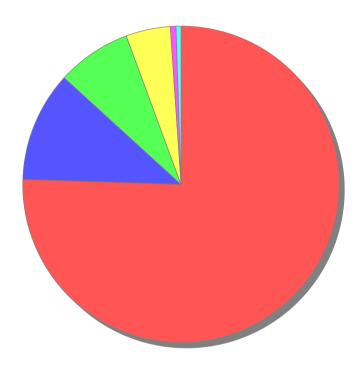


- Desenvolvimento de Requisitos [75.51%]
- Gestao de Requisitos [11.26%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.6%]
- Oiversos* [4.54%]
- Gerencia de Configuracao [0.57%]
- Planejamento de Projeto [0.51%]

INDICADORES DO PROJETO


	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
01. Horas planejadas de todas atividades	1176h00m	1002h24m	1008h00m	1232h00m	1232h00m	1352h00m	1408h00m	1084h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1138h29m	996h30m	1183h00m	1273h03m	1258h14m	1361h25m	1321h10m	1128h07m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1001h20m	848h04m	851h40m	1051h00m	1049h00m	1146h40m	1196h00m	920h50m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	927h28m	752h37m	898h34m	1021h36m	991h50m	1088h53m	1008h14m	899h52m
05. Pontos planejados para o projeto	207,0	245,0	247,0	305,0	305,0	336,0	359,0	276,0
06. Pontos planejados	247,0	192,5	209,5	296,0	290,0	316,0	320,0	309,5
07. Pontos entregues	304	234	294,5	321	327,5	358,5	339	311,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	262,50	170,00	194,00	235,00	259,00	275,00	262,50	238,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	41,50	64,00	100,50	86,00	68,50	83,50	76,50	73,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	4	2	6	2	4	0	0	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	50	42	51	47	50	57	69	68
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	25	34	53	40	30	45	44	39
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	1	3	1	2	0	3	3
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	1h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h40m
15. Pontos de retrabalho	3,5	2,5	1,5	0,5	3,5	0	3,5	3
16. Produtividade planejada	0,247	0,227	0,246	0,282	0,277	0,276	0,268	0,337
17. Produtividade realizada	0,328	0,311	0,328	0,315	0,331	0,330	0,337	0,347
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	146,9	95,6	119,3	105,3	107,4	106,7	94,5	112,9
19. % Pontos NP / Pontos entregues	13,7	27,4	34,2	26,8	21	23,3	22,6	23,5

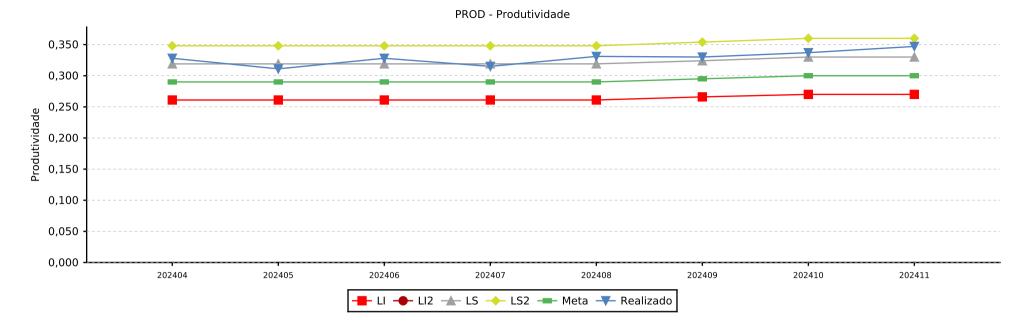


	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
Realizado	0,328	0,311	0,328	0,315	0,331	0,330	0,337	0,347
Meta	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,295	0,300	0,300
LS2	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,354	0,360	0,360
LS	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,324	0,330	0,330
LI2								
LI	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,266	0,270	0,270

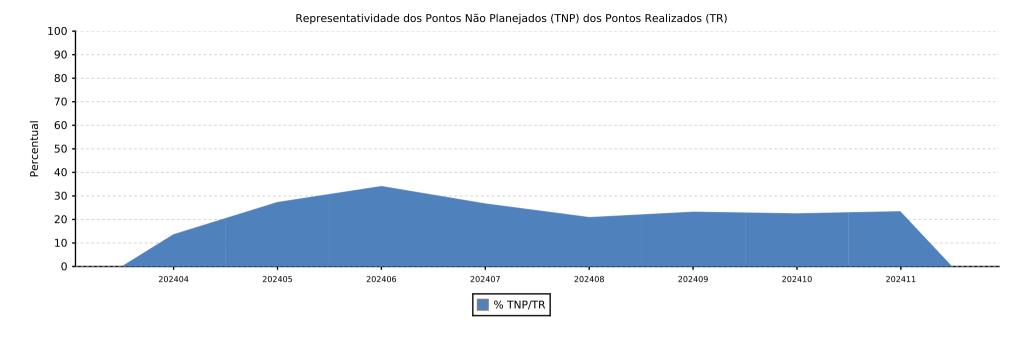


	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
TR - Pontos Realizados	304	234	294.5	321	327.5	358.5	339	311.5
TNP - Pontos Não Planejados	41.5	64	100.5	86	68.5	83.5	76.5	73
% TNP/TR	13,7	27,4	34,2	26,8	21,0	23,3	22,6	23,5

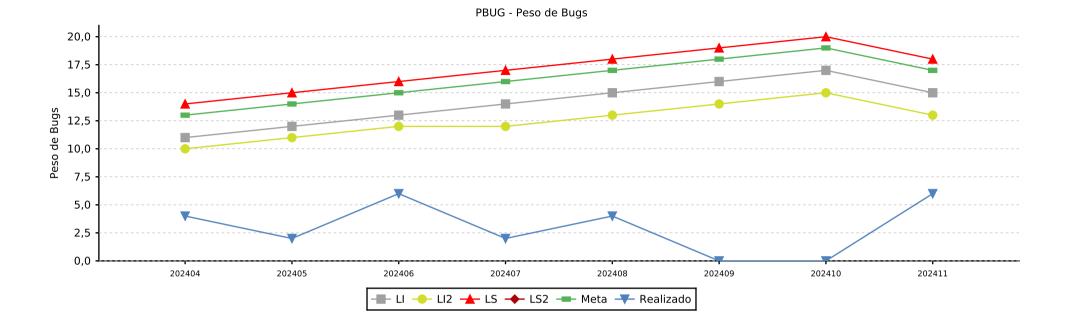


	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
Realizado	4	2	6	2	4	0	0	6
Meta	13	14	15	16	17	18	19	17
LS2								
LS	14	15	16	17	18	19	20	18
LI2	10	11	12	12	13	14	15	13
LI	11	12	13	14	15	16	17	15
Pontos Entregues	304	234	294.5	321	327.5	358.5	339	311.5
% PBUG / TR	1,32	0,86	2,04	0,63	1,23	0,00	0,00	1,93

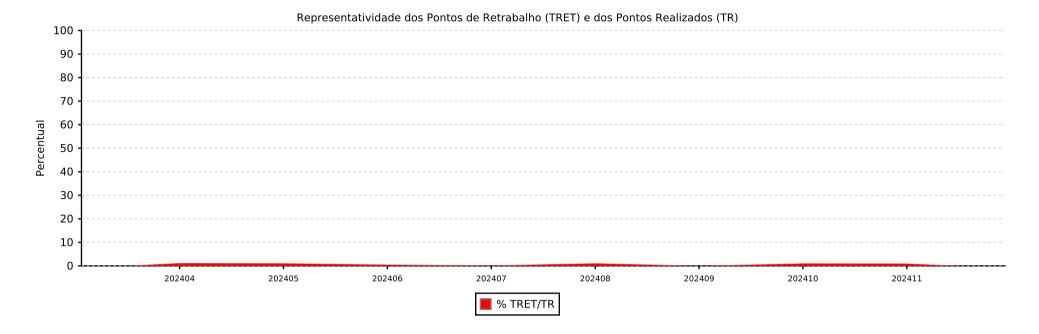


	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
TR - Pontos Realizados	304	234	294.5	321	327.5	358.5	339	311.5
TRET - Pontos de Retrabalho	3.5	2.5	1.5	0.5	3.5	0	3.5	3
% TRET/TR	1,2	1,1	0,5	0,2	1,1	0,0	1,0	1,0

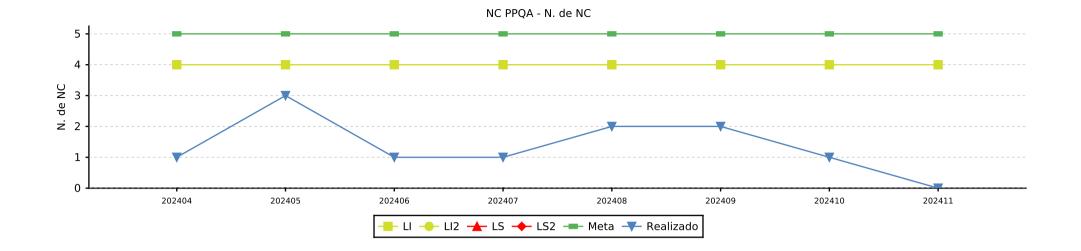


	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
Realizado	1	3	1	1	2	2	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

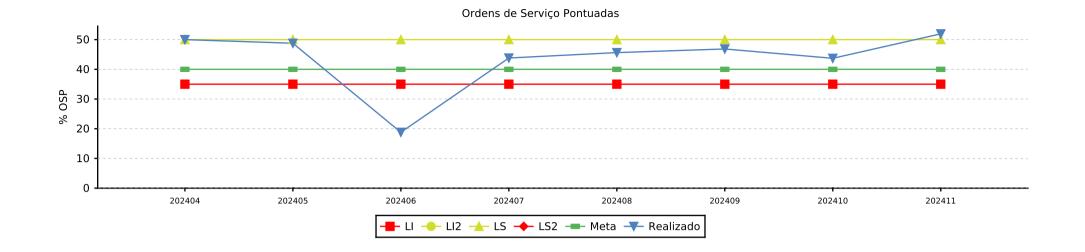

	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
Realizado	50	48.78	18.8	43.81	45.63	46.85	43.71	51.94
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

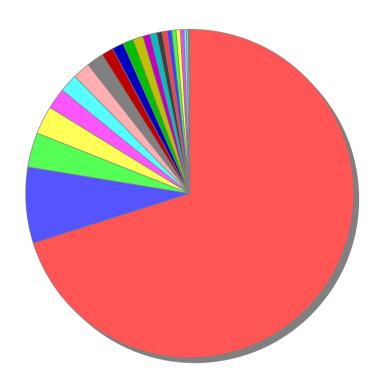

- Desenvolvimento [70.11%]
- Analise de Sistema [7.48%]
- Daily Scrum [3.41%]
- Cafe [2.78%]
- Sprint Planning 1 [2.05%]
- Ausencia [1.82%]
- Retrospectiva [1.71%]
- Reuniao [1.68%]
- Ginastica Laboral [1.15%]
- Particular [1.13%]
- Compilacao de sistemas [1.03%]
- Code Review [1.02%]
- Sprint Planning 2 [0.71%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.65%]
- Verificando apontamento [0.55%]
- Outros [0.49%]
- Clean Code [0.46%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.42%]
- Sizing [0.41%]
- Atestado [0.35%]
- Atraso / Saida antecipada [0.25%]
- Planejamento de Projeto [0.18%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.07%]
- Correcao de Erros Externo [0.06%]

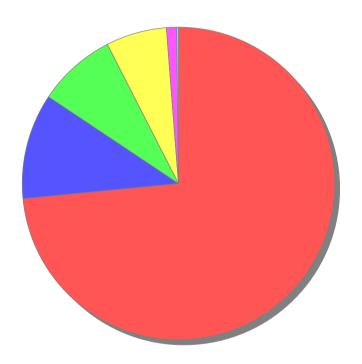

- Desenvolvimento de Requisitos [71.78%]
- Gestao de Requisitos [10.65%]
- Diversos* [7.93%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.14%]
- Gerencia de Configuracao [1.03%]
- Planejamento de Projeto [0.18%]
