

INDICADORES DA SPRINT

| | | 202 | 310 | | | 202 | 311 | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01. Horas planejadas de todas atividades | 176h00m | 176h00m | 176h00m | 176h00m | 140h00m | 132h00m | 132h00m | 140h00m |
| 02. Horas realizadas de todas atividades | 181h47m | 181h31m | 184h03m | 181h45m | 143h36m | 142h00m | 139h51m | 109h13m |
| 03. Horas planejadas de desenvolvimento | 146h10m | 146h10m | 146h10m | 146h10m | 112h15m | 108h55m | 108h55m | 112h15m |
| 04. Horas realizadas de desenvolvimento | 150h26m | 152h37m | 137h24m | 141h35m | 102h42m | 109h52m | 101h55m | 89h59m |
| 05. Pontos planejados | 47,0 | 55,0 | 39,5 | 32,5 | 38,0 | 34,0 | 33,0 | 32,5 |
| 06. Pontos entregues | 46,5 | 58 | 47,5 | 53,5 | 35,5 | 39,5 | 25 | 34 |
| 07. Pontos entregues (apenas Tarefa) | 32,00 | 53,50 | 40,00 | 32,00 | 25,50 | 25,50 | 21,50 | 29,50 |
| 08. Pontos entregues (apenas NP) | 14,50 | 4,50 | 7,50 | 21,50 | 10,00 | 14,00 | 3,50 | 4,50 |
| 09. Pontos entregues (apenas Erro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa) | 8 | 8 | 9 | 9 | 17 | 14 | 7 | 11 |
| 11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP) | 9 | 5 | 6 | 19 | 12 | 14 | 6 | 5 |
| 12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13. Horas de correção de bug | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 2h50m | 0h00m | 0h00m | 0h41m |
| 14. Pontos de retrabalho | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 4 | 0 | 0,5 |
| 15. Produtividade planejada | 0,322 | 0,377 | 0,271 | 0,223 | 0,339 | 0,313 | 0,303 | 0,290 |
| 16. Produtividade realizada | 0,310 | 0,381 | 0,346 | 0,378 | 0,346 | 0,360 | 0,246 | 0,378 |
| 17. % Pontos NP / Pontos entregues | 31,2 | 7,8 | 15,8 | 40,2 | 28,2 | 35,5 | 14 | 13,3 |

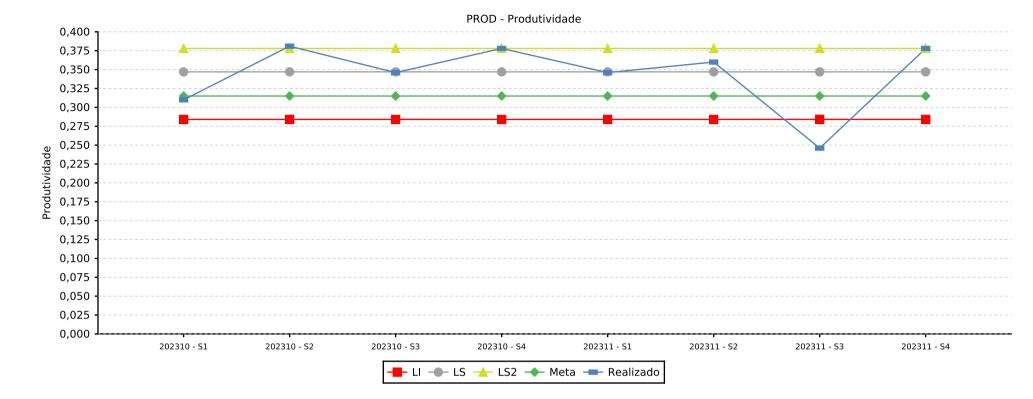


| | | 202 | 310 | | | 202 | 311 | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Realizado | 0,310 | 0,381 | 0,346 | 0,378 | 0,346 | 0,360 | 0,246 | 0,378 |
| Meta | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| LS2 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| LS | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| LI | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |

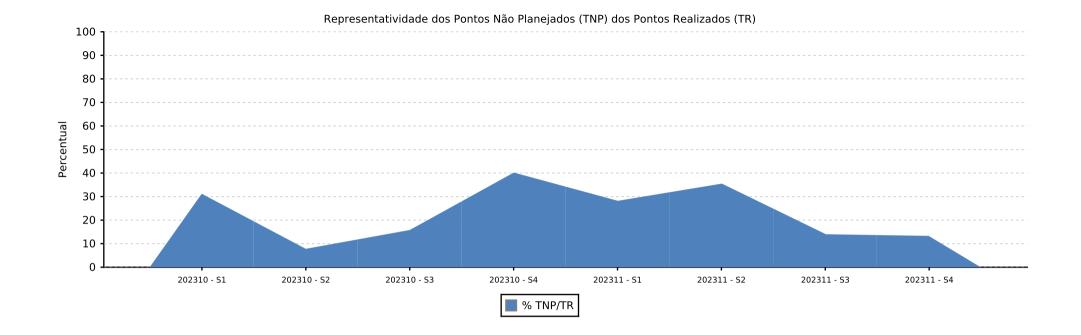


| | | 202 | 310 | | | 202 | 311 | |
|-----------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TR - Pontos Realizados | 46.5 | 58 | 47.5 | 53.5 | 35.5 | 39.5 | 25 | 34 |
| TNP - Pontos Não Planejados | 14.5 | 4.5 | 7.5 | 21.5 | 10 | 14 | 3.5 | 4.5 |
| % TNP/TR | 31,2 | 7,8 | 15,8 | 40,2 | 28,2 | 35,5 | 14,0 | 13,3 |

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

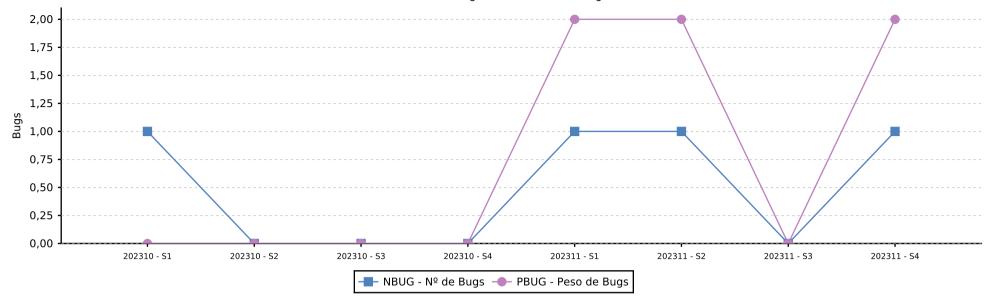

| | | 202 | 310 | | | 202 | 311 | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| NBUG - Nº de Bugs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PBUG - Peso de Bugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pontos Entregues | 46.5 | 58 | 47.5 | 53.5 | 35.5 | 39.5 | 25 | 34 |
| % PBUG / TR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 5,07 | 0,00 | 5,89 |

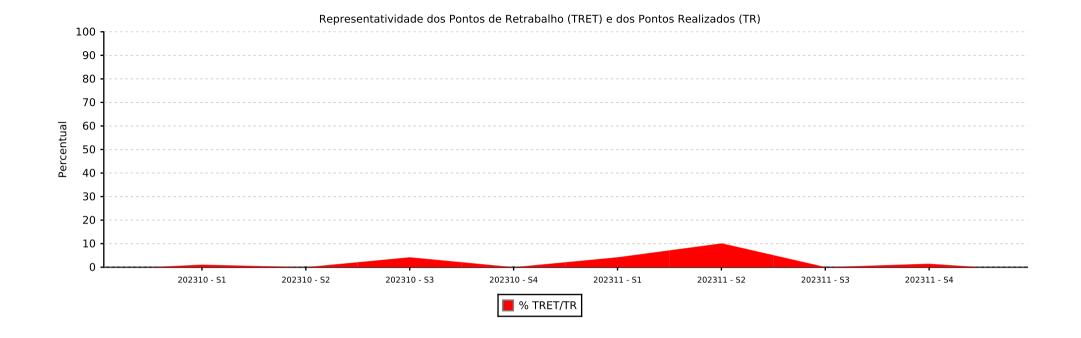


| | | 202 | 310 | | | 202 | 311 | |
|-----------------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TR - Pontos Realizados | 46.5 | 58 | 47.5 | 53.5 | 35.5 | 39.5 | 25 | 34 |
| TRET - Pontos de Retrabalho | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0.5 |
| % TRET/TR | 1,1 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 10,1 | 0,0 | 1,5 |

HORAS POR ATIVIDADE

| | Spri | int 1 | Spr | int 2 | Spri | int 3 | Spri | nt 4 | То | tal | % HP/HR |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Atividade | Planejado | Realizado | Total |
| Desenvolvimento | 92,25 | 84,68 | 92,92 | 100,65 | 92,92 | 93,02 | 94 | 81,65 | 372,09 | 360 | 96,8 % |
| Analise de Sistema | 13 | 10,18 | 9 | 6,4 | 9 | 15,37 | 13 | 4,67 | 44 | 36,62 | 83,2 % |
| Reuniao | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 3,17 | 4 | 6,17 | 154,2 % |
| Code Review | 3 | 6,73 | 2,5 | 1,28 | 2,5 | 1,78 | 3 | 2,92 | 11 | 12,71 | 115,5 % |
| Cafe | 3,75 | 3,25 | 3,75 | 3,42 | 3,75 | 3,83 | 3,75 | 2,83 | 15 | 13,33 | 88,9 % |
| Ausencia | 0 | 12,42 | 0 | 7,33 | 0 | 6,35 | 0 | 2,42 | 0 | 28,52 | 0,0 % |
| Retrospectiva | 4 | 4,43 | 3 | 1,5 | 3 | 3,42 | 3 | 2,25 | 13 | 11,6 | 89,2 % |
| Daily Scrum | 2,75 | 2,25 | 3 | 3,12 | 3 | 1,82 | 2,75 | 1,88 | 11,5 | 9,07 | 78,9 % |
| Sprint Planning 1 | 6 | 5,75 | 4,5 | 2,02 | 4,5 | 2,42 | 4,5 | 1,68 | 19,5 | 11,87 | 60,9 % |
| Ginastica Laboral | 2 | 1,33 | 2 | 1,28 | 2 | 2,05 | 2 | 1,53 | 8 | 6,19 | 77,4 % |
| Sprint Planning 2 | 4 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 0,75 | 3 | 1 | 13 | 5,25 | 40,4 % |
| Preparando ambiente | 0 | 1,42 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 3,12 | 0,0 % |
| Planejamento de Projeto | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 1,5 | 0,83 | 2,25 | 0,83 | 36,9 % |
| Compilacao de sistemas | 1 | 1,98 | 1 | 3,83 | 1 | 3,55 | 1 | 0,75 | 4 | 10,11 | 252,8 % |
| Correcao de Erros Externo | 0,75 | 2,83 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,75 | 0,68 | 2,5 | 3,51 | 140,4 % |
| Folga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Checklist dos Backups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atendimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Recesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atestado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Correção de Erros Interno | 1 | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 | 0,5 | 14,3 % |
| Auxilio ao Suporte e Implantacao | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1 | 2,5 | 250,0 % |
| Clean Code | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,33 | 0,75 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1,08 | 30,9 % |
| Teste Automatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Zabbix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sizing | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2,5 | 3 | 0 | 12 | 8,5 | 70,8 % |
| Auditoria da Garantia da Qualidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Férias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Manutenção Preventiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Geração de Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atividades Gerenciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Release Notes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atraso / Saida antecipada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Levantamento de Requisito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |


| Atualizacao de Versao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
|---------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| Feriado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Organização sala / equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Teste | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 0,68 | 0 | 0,0 % |
| Treinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Manutenção de Servidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Analise Retorno O.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Analise de O.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Recursos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Integrações de sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Geracao de Baseline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,0 % |
| Atividade Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio suporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Análise de Sistemas H/FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Instrutor Treinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atendimento GBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Fazendo manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Curso/Palestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Banheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria de Gerencia de Configuracao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Criacao de Ambiente de Desenv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxílio Desenv. Outras Equipes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Abrir o.s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio ao Desenvolvimento | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 1 | 0,75 | 75,0 % |
| Particular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio Comercial / Backoffice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Solicitar merge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Outros | 0,58 | 1,88 | 0,42 | 0 | 0,42 | 0 | 0,58 | 0 | 2 | 1,88 | 94,0 % |
| Check List | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Verificando apontamento | 0 | 0,2 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,0 % |
| Merge O.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria de DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Pre-teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Verificar o.s no nome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Documentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Gerenciamento de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Total Geral | 140 | 143,58 | 132,01 | 141,99 | 132,01 | 139,86 | 140 | 109,21 | 544,02 | 534,64 | 98,3 % |

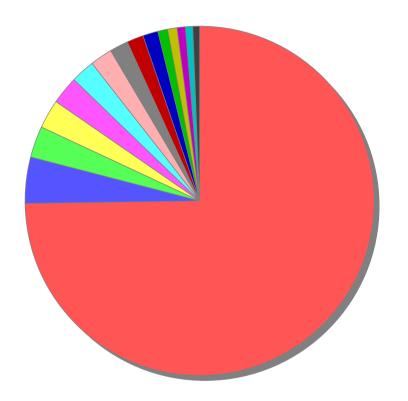

- Desenvolvimento [74.76%]
- Analise de Sistema [4.28%]
- Reuniao [2.9%]
- Code Review [2.67%]
- Cafe [2.59%]
- Ausencia [2.22%]
- Retrospectiva [2.06%]
- Daily Scrum [1.72%]
- Sprint Planning 1 [1.54%]
- Ginastica Laboral [1.4%]
- Sprint Planning 2 [0.92%]
- Preparando ambiente [0.87%]
- Planejamento de Projeto [0.76%]
- Compilacao de sistemas [0.69%]
- Correcao de Erros Externo [0.62%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


| | | Spri | nt 1 | Spri | nt 2 | Spri | int 3 | Spri | nt 4 | То | tal | % HP/HR |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Area CMMI | | Planejado | Realizado | Total |
| RD - Desenvolvimento de Requisitos | 3 | 95,42 | 88,27 | 95,33 | 101,73 | 95,33 | 93,52 | 97,17 | 82,33 | 383,25 | 365,85 | 95,5 % |
| DIV - Diversos* | | 7,58 | 20,38 | 7,42 | 13,53 | 7,42 | 14,73 | 7,58 | 9,95 | 30 | 58,59 | 195,3 % |
| REQM - Gestao de Requisitos | | 26 | 19,35 | 19,5 | 16,67 | 19,5 | 21,03 | 23,5 | 8,3 | 88,5 | 65,35 | 73,8 % |
| PMC - Monitoramento e Controle de | Projeto | 9,75 | 13,42 | 8,5 | 5,9 | 8,5 | 7,02 | 8,75 | 7,05 | 35,5 | 33,39 | 94,1 % |
| PP - Planejamento de Projeto | | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 1,5 | 0,83 | 2,25 | 0,83 | 36,9 % |
| CM - Gerencia de Configuracao | | 1 | 1,98 | 1 | 3,83 | 1 | 3,55 | 1,5 | 0,75 | 4,5 | 10,11 | 224,7 % |
| OT - Treinamento na Organizacao | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| PI - Integracao de Produto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| PPQA - Garantia da Qualidade de P | rocesso e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | Total Geral | 140 | 143,4 | 132 | 141,66 | 132 | 139,85 | 140 | 109,21 | 544 | 534,12 | 98,2 % |

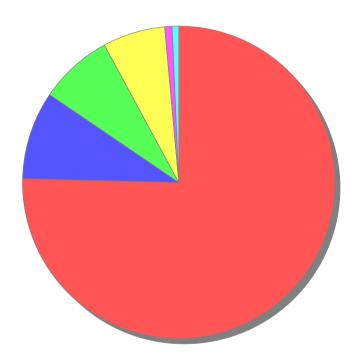


- Desenvolvimento de Requisitos [75.38%]
- Diversos* [9.11%]
- Gestao de Requisitos [7.6%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.45%]
- Planejamento de Projeto [0.76%]
- Gerencia de Configuracao [0.69%]

INDICADORES DO PROJETO


| | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01. Horas planejadas de todas atividades | 638h24m | 552h00m | 504h00m | 704h00m | 704h00m | 638h24m | 704h00m | 544h00m |
| 02. Horas realizadas de todas atividades | 649h09m | 661h21m | 589h41m | 734h32m | 729h31m | 648h01m | 729h06m | 534h40m |
| 03. Horas planejadas de desenvolvimento | 539h24m | 455h05m | 415h35m | 592h40m | 588h40m | 524h14m | 584h40m | 442h20m |
| 04. Horas realizadas de desenvolvimento | 516h13m | 555h13m | 510h27m | 556h18m | 559h52m | 490h48m | 582h02m | 404h28m |
| 05. Pontos planejados para o projeto | 177,0 | 160,0 | 0,0 | 181,0 | 180,0 | 163,0 | 184,0 | 140,0 |
| 06. Pontos planejados | 152,0 | 208,0 | 139,5 | 179,0 | 170,5 | 159,0 | 174,0 | 137,5 |
| 07. Pontos entregues | 166 | 176,5 | 171 | 175,5 | 180 | 162,5 | 205,5 | 134 |
| 08. Pontos entregues (apenas Tarefa) | 122,00 | 146,50 | 145,00 | 148,50 | 115,50 | 96,00 | 157,50 | 102,00 |
| 09. Pontos entregues (apenas NP) | 44,00 | 30,00 | 26,00 | 27,00 | 64,50 | 66,50 | 48,00 | 32,00 |
| 10. Pontos entregues (apenas Erro) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa) | 42 | 32 | 35 | 40 | 41 | 34 | 34 | 49 |
| 12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP) | 25 | 22 | 10 | 16 | 40 | 44 | 39 | 37 |
| 13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14. Horas de correção de bug | 0h59m | 0h00m | 0h15m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 3h31m |
| 15. Pontos de retrabalho | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 6 |
| 16. Produtividade planejada | 0,282 | 0,458 | 0,336 | 0,303 | 0,290 | 0,304 | 0,298 | 0,311 |
| 17. Produtividade realizada | 0,322 | 0,318 | 0,335 | 0,316 | 0,322 | 0,332 | 0,354 | 0,332 |
| 18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto | 93,8 | 110,4 | 0 | 97 | 100 | 99,7 | 111,7 | 95,8 |
| 19. % Pontos NP / Pontos entregues | 26,6 | 17 | 15,3 | 15,4 | 35,9 | 41 | 23,4 | 23,9 |

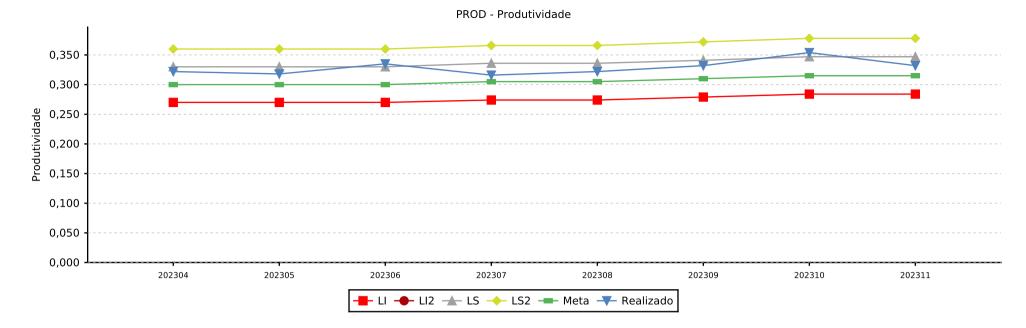


| | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 0,322 | 0,318 | 0,335 | 0,316 | 0,322 | 0,332 | 0,354 | 0,332 |
| Meta | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,305 | 0,305 | 0,310 | 0,315 | 0,315 |
| LS2 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,366 | 0,366 | 0,372 | 0,378 | 0,378 |
| LS | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,336 | 0,336 | 0,341 | 0,347 | 0,347 |
| LI2 | | | | | | | | |
| LI | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,274 | 0,274 | 0,279 | 0,284 | 0,284 |

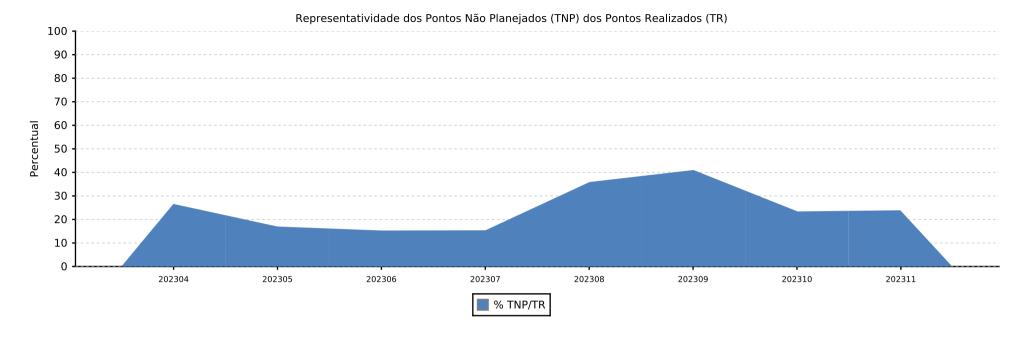


| | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TR - Pontos Realizados | 166 | 176.5 | 171 | 175.5 | 180 | 162.5 | 205.5 | 134 |
| TNP - Pontos Não Planejados | 44 | 30 | 26 | 27 | 64.5 | 66.5 | 48 | 32 |
| % TNP/TR | 26,6 | 17,0 | 15,3 | 15,4 | 35,9 | 41,0 | 23,4 | 23,9 |

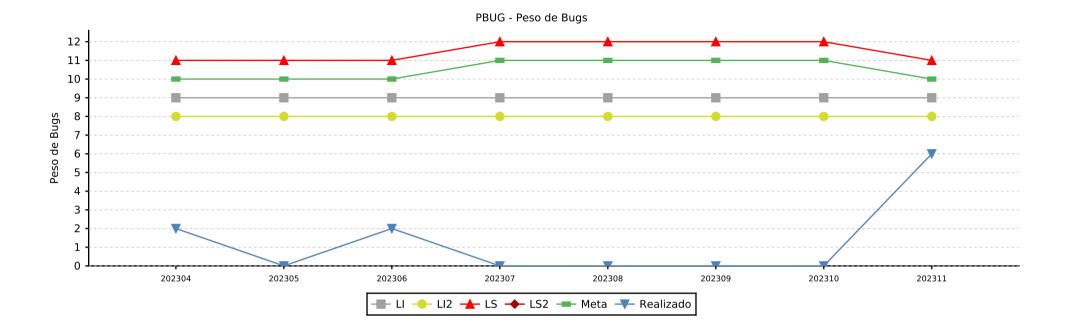


| | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Meta | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| LS2 | | | | | | | | |
| LS | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| LI2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| LI | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Pontos Entregues | 166 | 176.5 | 171 | 175.5 | 180 | 162.5 | 205.5 | 134 |
| % PBUG / TR | 1,21 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 |

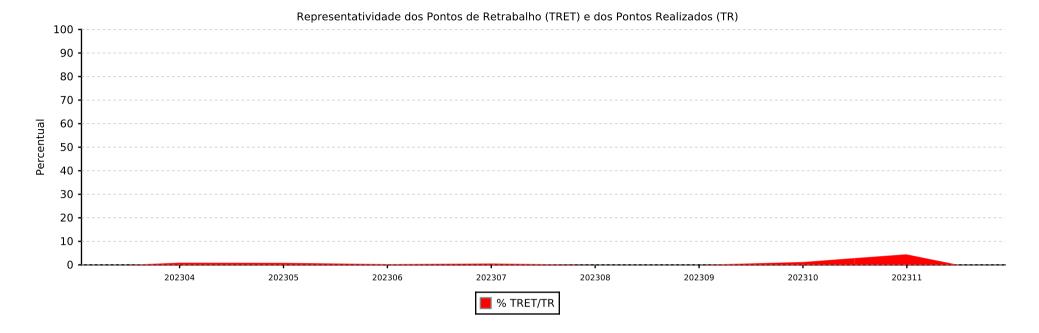


| | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TR - Pontos Realizados | 166 | 176.5 | 171 | 175.5 | 180 | 162.5 | 205.5 | 134 |
| TRET - Pontos de Retrabalho | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 |
| % TRET/TR | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 4,5 |

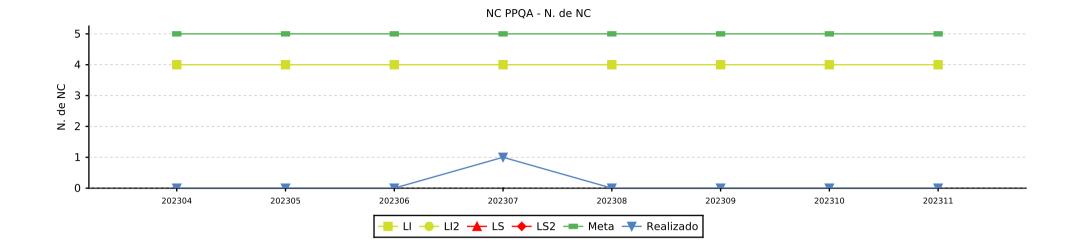


| | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LS2 | | | | | | | | |
| LS | | | | | | | | |
| LI2 | | | | | | | | |
| LI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

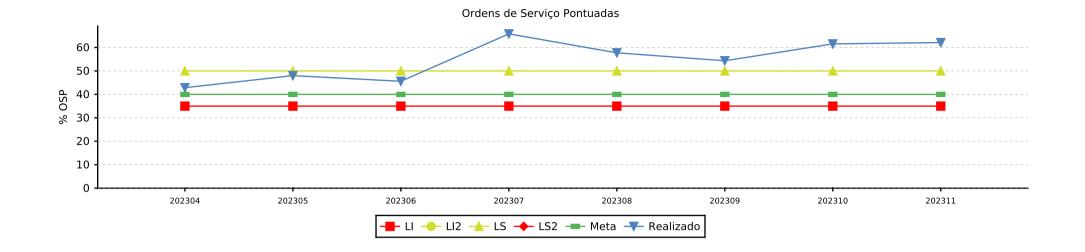

| | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 42.86 | 48 | 45.59 | 65.82 | 57.73 | 54.35 | 61.54 | 62.11 |
| Meta | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| LS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| LI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

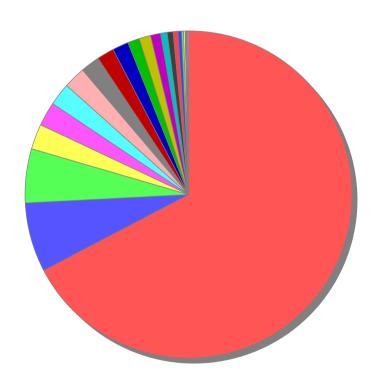

- Desenvolvimento [67.33%]
- Analise de Sistema [6.85%]
- Ausencia [5.33%]
- Cafe [2.49%]
- Code Review [2.38%]
- Sprint Planning 1 [2.22%]
- Retrospectiva [2.17%]
- Compilacao de sistemas [1.89%]
- Daily Scrum [1.7%]
- Sizing [1.59%]
- Ginastica Laboral [1.16%]
- Reuniao [1.15%]
- Sprint Planning 2 [0.98%]
- Correcao de Erros Externo [0.66%]
- Preparando ambiente [0.58%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.47%]
- Outros [0.35%]
- Clean Code [0.2%]
- Planejamento de Projeto [0.16%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.14%]
- Verificando apontamento [0.1%]
- Correção de Erros Interno [0.09%]

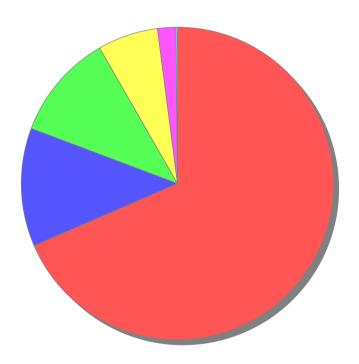

- Desenvolvimento de Requisitos [68.43%]
- Gestao de Requisitos [12.22%]
- Diversos* [10.96%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.24%]
- Gerencia de Configuracao [1.89%]
- Planejamento de Projeto [0.16%]
