

INDICADORES DA SPRINT

		202	409			202	410	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	296h00m	352h00m						
02. Horas realizadas de todas atividades	288h26m	363h53m	356h23m	352h43m	360h02m	339h19m	312h54m	308h55m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	246h40m	300h00m	300h00m	300h00m	299h00m	299h00m	299h00m	299h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	213h58m	300h22m	296h57m	277h36m	252h52m	260h08m	247h57m	247h17m
05. Pontos planejados	53,0	96,5	90,5	76,0	94,0	88,5	69,0	68,5
06. Pontos entregues	71,5	98	92,5	96,5	90	82,5	88,5	78
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	54,00	73,00	74,50	73,50	73,00	57,50	75,50	56,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	17,50	25,00	18,00	23,00	17,00	25,00	13,00	21,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	14	15	12	16	16	11	27	15
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	13	10	11	11	15	13	10	6
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	2	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0	1,5	0	2
15. Produtividade planejada	0,215	0,322	0,302	0,254	0,315	0,296	0,231	0,230
16. Produtividade realizada	0,335	0,327	0,312	0,348	0,356	0,318	0,357	0,316
17. % Pontos NP / Pontos entregues	24,5	25,6	19,5	23,9	18,9	30,4	14,7	27,6

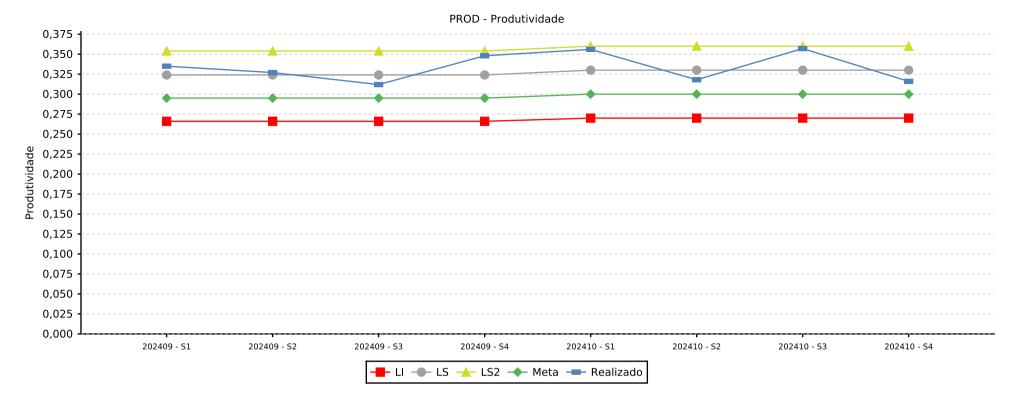


		202	409			202	410	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,335	0,327	0,312	0,348	0,356	0,318	0,357	0,316
Meta	0,295	0,295	0,295	0,295	0,300	0,300	0,300	0,300
LS2	0,354	0,354	0,354	0,354	0,360	0,360	0,360	0,360
LS	0,324	0,324	0,324	0,324	0,330	0,330	0,330	0,330
LI	0,266	0,266	0,266	0,266	0,270	0,270	0,270	0,270

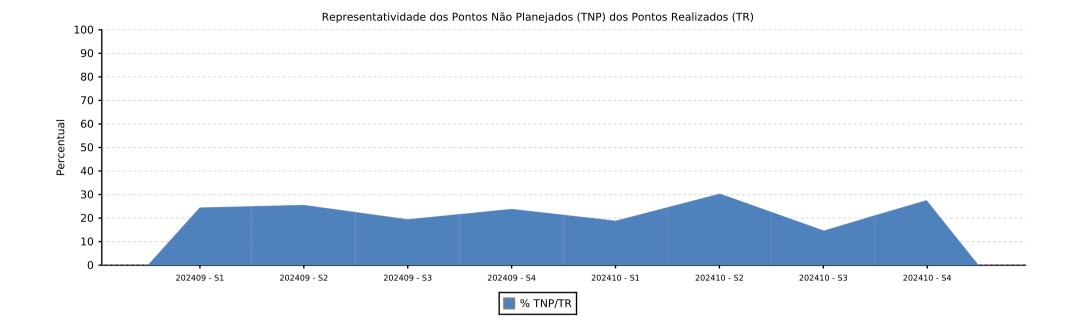


		202	409			202	410	
	1	1 2 3 4 1					3	4
TR - Pontos Realizados	71.5	98	92.5	96.5	90	82.5	88.5	78
TNP - Pontos Não Planejados	17.5	25	18	23	17	25	13	21.5
% TNP/TR	24,5	25,6	19,5	23,9	18,9	30,4	14,7	27,6

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

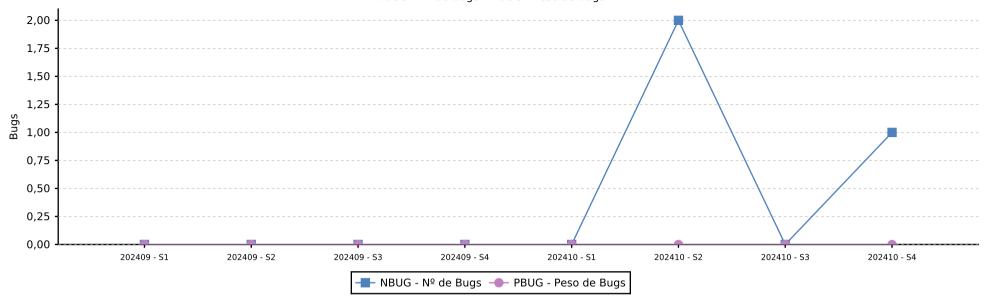

		202	409	-		202	410	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	2	0	1
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	71.5	98	92.5	96.5	90	82.5	88.5	78
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

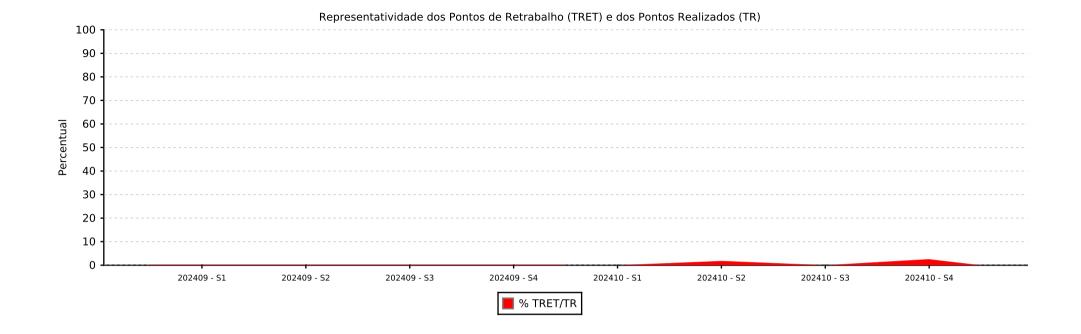


		202	409			202	410	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	71.5	98	92.5	96.5	90	82.5	88.5	78
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	0	1.5	0	2
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	2,6

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	247,67	222,17	247,17	226,87	247,17	220,58	244,5	209,67	986,51	879,29	89,1 %
Analise de Sistema	23,5	26,22	23,5	29,28	23,5	29,5	23,5	24,15	94	109,15	116,1 %
Sprint Planning 1	12	8	12	2,67	12	2,33	12	9,33	48	22,33	46,5 %
Daily Scrum	15,5	8,23	16	10,28	16	9,78	16	9,25	63,5	37,54	59,1 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	2,45	0,5	1,87	0,5	1,95	0,5	8,47	2	14,74	737,0 %
Reuniao	1	9,92	1	6,82	1	6,83	1	8,08	4	31,65	791,2 %
Cafe	10	9,08	10	8,5	10	8	10	8	40	33,58	83,9 %
Code Review	5,25	8,63	5,25	5,52	5,25	2,82	5,25	6,52	21	23,49	111,9 %
Correção de Erros Interno	3,42	0,6	3,42	9,05	3,42	5,25	3,42	5,57	13,68	20,47	149,6 %
Ginastica Laboral	5,5	4,07	5,5	3,47	5,5	3,72	5,5	4	22	15,26	69,4 %
Ausencia	0	16,12	0	8,65	0	7,6	0	3,97	0	36,34	0,0 %
Retrospectiva	8	6,67	8	6,93	8	5,33	8	2,92	32	21,85	68,3 %
Compilacao de sistemas	3,5	5,1	3,5	0,78	3,5	1,75	3,5	2,25	14	9,88	70,6 %
Sprint Planning 2	8	4	8	1,33	8	2,22	8	1,75	32	9,3	29,1 %
Sizing	2	3,53	2	1,75	2	0	2	1,75	8	7,03	87,9 %
Verificando apontamento	0,42	1,82	0,42	1,75	0,42	1,67	0,42	1,67	1,68	6,91	411,3 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	1,25	0	1,25	0,0 %
Clean Code	2	0,75	2	1,13	2	0,5	2	0,33	8	2,71	33,9 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		1,67	0	1,67	0	1,67	0	1,67	0	6,68	0	0,0 %
Particular		0	4	0	2,87	0	0	0	0	0	6,87	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros		1,17	0,75	1,17	0,42	1,17	1,42	1,17	0	4,68	2,59	55,3 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	2,42	0	3,17	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado		0	17	0	9,08	0	0	0	0	0	26,08	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada		0	0,93	0	0,3	0	1,65	0	0	0	2,88	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Manutenção de Servidores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	352,02	360,04	352,02	339,32	352,02	312,9	352,02	308,93	1.408,08	1.321,19	93,8 %

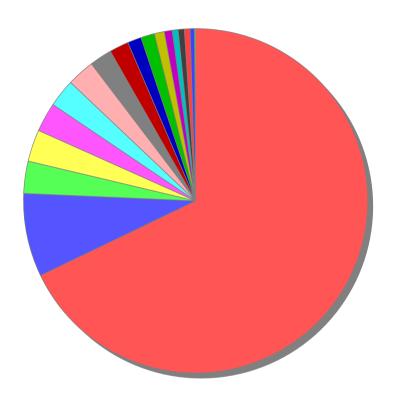

- Desenvolvimento [67.87%]
- Analise de Sistema [7.82%]
- Sprint Planning 1 [3.02%]
- Daily Scrum [2.99%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [2.74%]
- Reuniao [2.62%]
- Cafe [2.59%]
- Code Review [2.11%]
- Correção de Erros Interno [1.8%]
- Ginastica Laboral [1.29%]
- Ausencia [1.29%]
- Retrospectiva [0.95%]
- Compilacao de sistemas [0.73%]
- Sprint Planning 2 [0.57%]
- Sizing [0.57%]
- Verificando apontamento [0.54%]
- Treinamento [0.4%]
- Clean Code [0.11%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	255,92	225,97	255,42	238,92	255,42	228,28	252,75	224,03	1.019,51	917,2	90,0 %
REQM - Gestao de Requisitos		45,5	41,75	45,5	35,03	45,5	34,05	45,5	36,98	182	147,81	81,2 %
DIV - Diversos*		17,67	39,93	17,67	27,85	17,67	27,57	17,67	24,05	70,68	119,4	168,9 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	28,75	23,53	29,25	22,73	29,25	17,93	29,25	18,68	116,5	82,87	71,1 %
CM - Gerencia de Configuração		3,5	5,1	3,5	0,78	3,5	1,75	4	2,25	14,5	9,88	68,1 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	2,42	0	3,17	0	0,0 %
	Total Geral	351,59	336,28	351,59	325,31	351,59	309,58	351,59	305,99	1.406,36	1.277,16	90,8 %

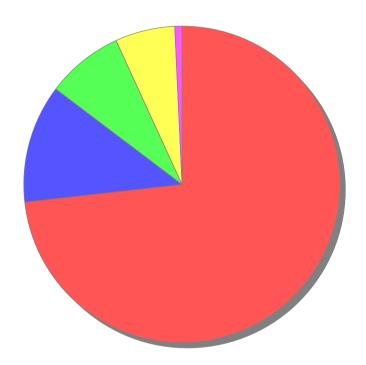


- Desenvolvimento de Requisitos [73.21%]
- Gestao de Requisitos [12.08%]
- Diversos* [7.86%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.1%]
- Gerencia de Configuração [0.74%]

INDICADORES DO PROJETO


	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
01. Horas planejadas de todas atividades	704h00m	1176h00m	1002h24m	1008h00m	1232h00m	1232h00m	1352h00m	1408h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	778h03m	1138h29m	996h30m	1183h00m	1273h03m	1258h14m	1361h25m	1321h10m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	621h00m	1001h20m	848h04m	851h40m	1051h00m	1049h00m	1146h40m	1196h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	539h30m	927h28m	752h37m	898h34m	1021h36m	991h50m	1088h53m	1008h14m
05. Pontos planejados para o projeto	191,0	207,0	245,0	247,0	305,0	305,0	336,0	359,0
06. Pontos planejados	197,5	247,0	192,5	209,5	296,0	290,0	316,0	320,0
07. Pontos entregues	178	304	234	294,5	321	327,5	358,5	339
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	112,50	262,50	170,00	194,00	235,00	259,00	275,00	262,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	65,50	41,50	64,00	100,50	86,00	68,50	83,50	76,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	3	4	2	6	2	4	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	24	50	42	51	47	50	57	69
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	38	25	34	53	40	30	45	44
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	2	1	3	1	2	0	3
14. Horas de correção de bug	1h10m	0h00m	0h00m	1h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	8	3,5	2,5	1,5	0,5	3,5	0	3,5
16. Produtividade planejada	0,319	0,247	0,227	0,246	0,282	0,277	0,276	0,268
17. Produtividade realizada	0,330	0,328	0,311	0,328	0,315	0,331	0,330	0,337
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	93,2	146,9	95,6	119,3	105,3	107,4	106,7	94,5
19. % Pontos NP / Pontos entregues	36,8	13,7	27,4	34,2	26,8	21	23,3	22,6

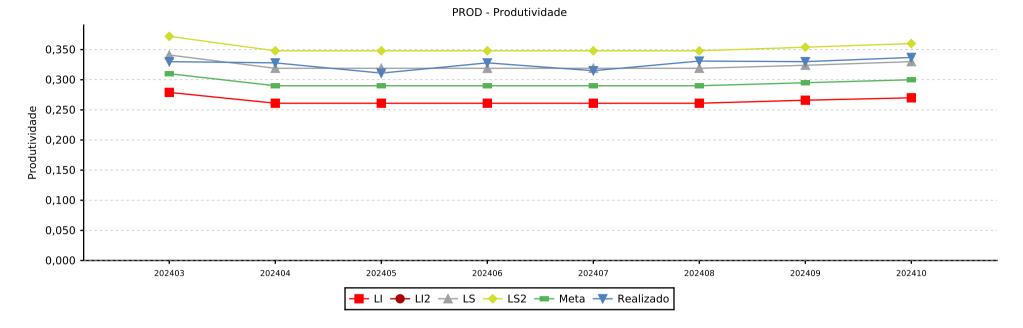


	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
Realizado	0,330	0,328	0,311	0,328	0,315	0,331	0,330	0,337
Meta	0,310	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,295	0,300
LS2	0,372	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,354	0,360
LS	0,341	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,324	0,330
LI2								
LI	0,279	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,266	0,270

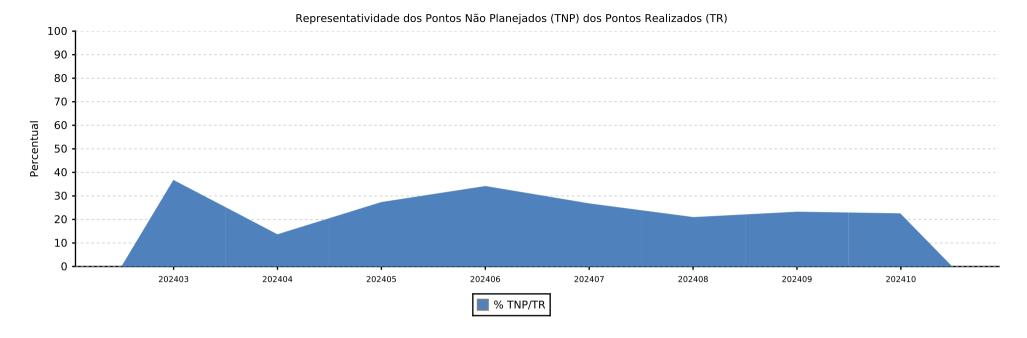


	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
TR - Pontos Realizados	178	304	234	294.5	321	327.5	358.5	339
TNP - Pontos Não Planejados	65.5	41.5	64	100.5	86	68.5	83.5	76.5
% TNP/TR	36,8	13,7	27,4	34,2	26,8	21,0	23,3	22,6

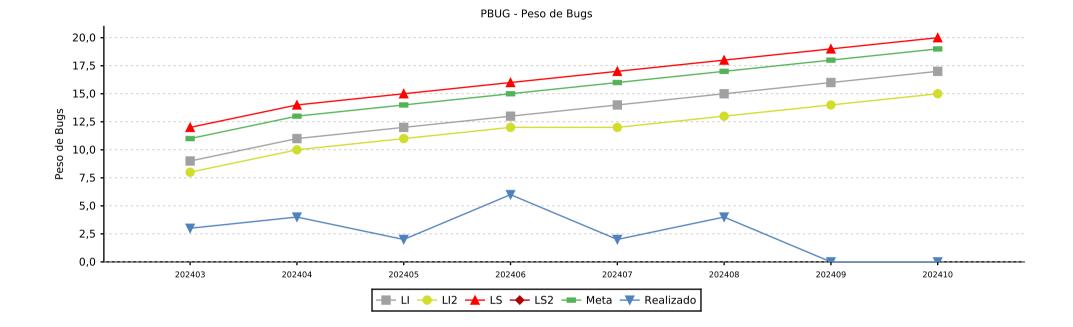


	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
Realizado	3	4	2	6	2	4	0	0
Meta	11	13	14	15	16	17	18	19
LS2								
LS	12	14	15	16	17	18	19	20
LI2	8	10	11	12	12	13	14	15
LI	9	11	12	13	14	15	16	17
Pontos Entregues	178	304	234	294.5	321	327.5	358.5	339
% PBUG / TR	1,69	1,32	0,86	2,04	0,63	1,23	0,00	0,00

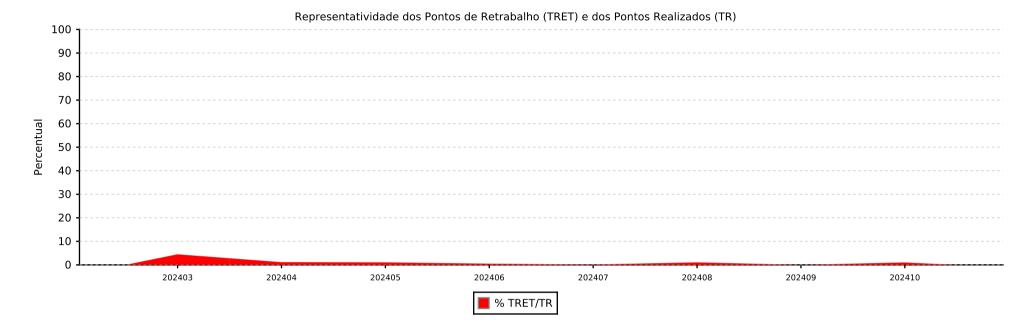


	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
TR - Pontos Realizados	178	304	234	294.5	321	327.5	358.5	339
TRET - Pontos de Retrabalho	8	3.5	2.5	1.5	0.5	3.5	0	3.5
% TRET/TR	4,5	1,2	1,1	0,5	0,2	1,1	0,0	1,0

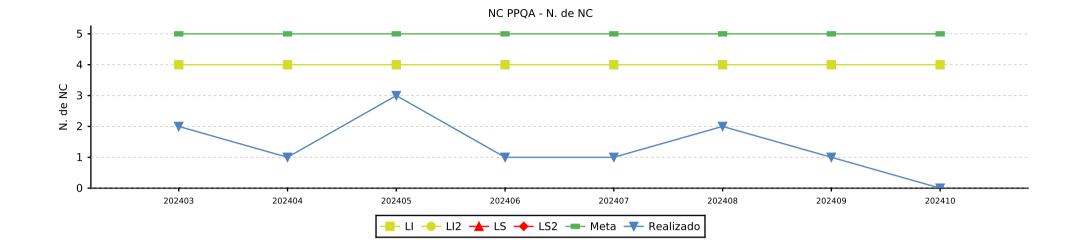


	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
Realizado	2	1	3	1	1	2	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

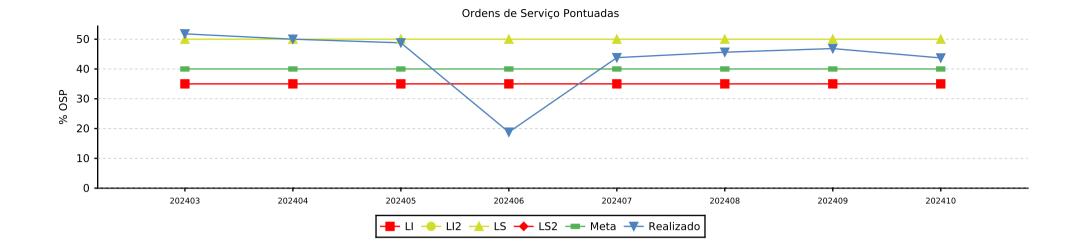

	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
Realizado	51.79	50	48.78	18.8	43.81	45.63	46.85	43.71
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

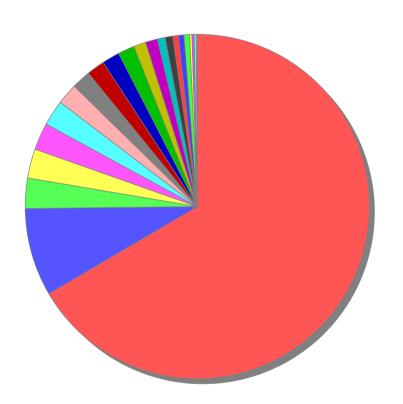

- Desenvolvimento [66.55%]
- Analise de Sistema [8.26%]
- Daily Scrum [2.84%]
- Ausencia [2.75%]
- Cafe [2.54%]
- Reuniao [2.4%]
- Atestado [1.97%]
- Code Review [1.78%]
- Sprint Planning 1 [1.69%]
- Retrospectiva [1.65%]
- Correção de Erros Interno [1.55%]
- Ginastica Laboral [1.15%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.11%]
- Compilacao de sistemas [0.75%]
- Sprint Planning 2 [0.7%]
- Sizing [0.53%]
- Verificando apontamento [0.52%]
- Particular [0.52%]
- Atraso / Saida antecipada [0.22%]
- Clean Code [0.21%]
- Outros [0.2%]
- Treinamento [0.09%]

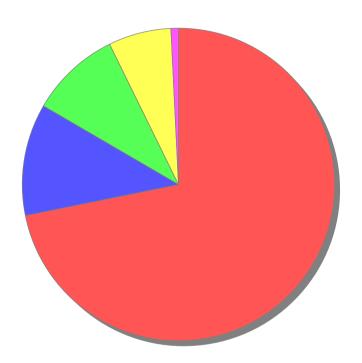

- Desenvolvimento de Requisitos [69.42%]
- Gestao de Requisitos [11.19%]
- Diversos* [9.04%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.27%]
- Gerencia de Configuracao [0.75%]
