

INDICADORES DA SPRINT

		202	304			202	305	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	176h00m	143h12m	176h00m	143h12m	132h00m	108h00m	136h00m	176h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	178h48m	144h36m	184h46m	140h59m	177h34m	145h32m	145h42m	192h33m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	150h35m	119h02m	150h35m	119h12m	109h45m	87h00m	110h15m	148h05m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	148h01m	109h54m	143h42m	114h36m	156h59m	116h21m	126h45m	155h08m
05. Pontos planejados	42,0	33,5	43,5	33,0	51,0	50,0	52,0	55,0
06. Pontos entregues	33,5	44	49,5	39	46	34	46	50,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	24,00	32,50	37,50	28,00	38,00	24,00	38,00	46,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	9,50	11,50	12,00	11,00	8,00	10,00	8,00	4,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	2	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	8	12	14	8	8	4	8	12
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	5	10	3	7	5	5	7	5
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h59m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0,5	0,5	0,5	0	1	0	0,5
15. Produtividade planejada	0,279	0,282	0,289	0,277	0,465	0,575	0,472	0,372
16. Produtividade realizada	0,227	0,401	0,345	0,341	0,294	0,293	0,363	0,326
17. % Pontos NP / Pontos entregues	28,4	26,2	24,3	28,3	17,4	29,5	17,4	8

PROD - Produtividade

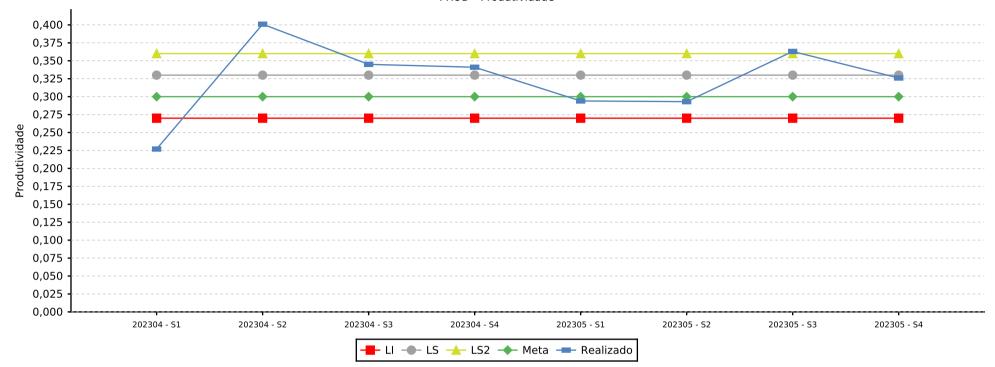


		202	304		202305					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,227	0,401	0,345	0,341	0,294	0,293	0,363	0,326		
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300		
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360		
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330		
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270		

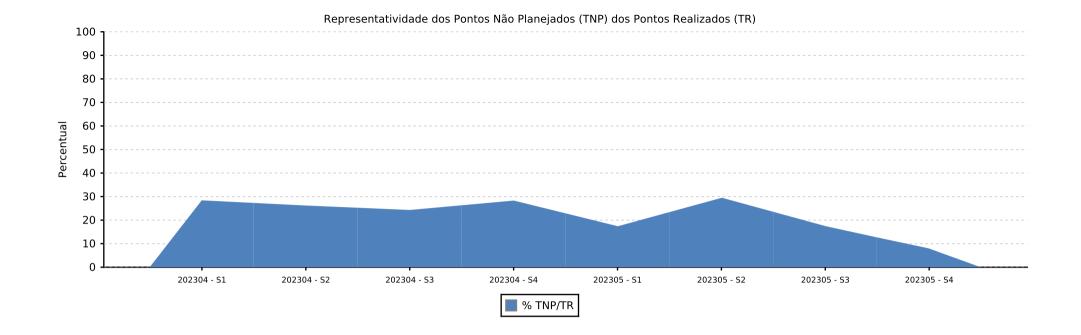


		202	304			202	305	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	33.5	44	49.5	39	46	34	46	50.5
TNP - Pontos Não Planejados	9.5	11.5	12	11	8	10	8	4
% TNP/TR	28,4	26,2	24,3	28,3	17,4	29,5	17,4	8,0

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

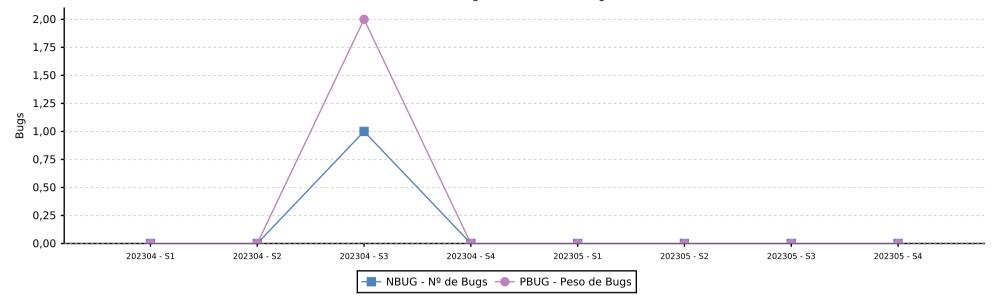

		202	304			202	305	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	1	0	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	2	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	33.5	44	49.5	39	46	34	46	50.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

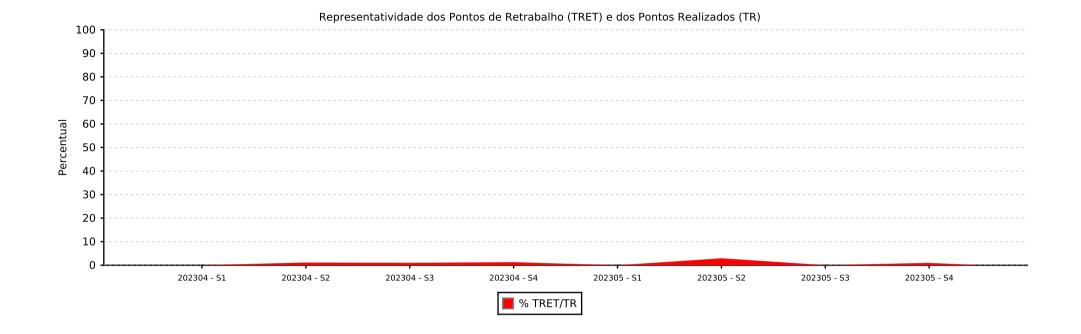


		202	304			202	305	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	33.5	44	49.5	39	46	34	46	50.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0.5	0.5	0.5	0	1	0	0.5
% TRET/TR	0,0	1,1	1,0	1,3	0,0	2,9	0,0	1,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	93,75	142,82	71,75	105,62	93,58	114,17	125,08	128,82	384,16	491,43	127,9 %
Analise de Sistema	11	3,67	11	3,7	13	1,7	13	18,05	48	27,12	56,5 %
Clean Code	0,75	0,5	0,75	0,3	1	0,68	1	12,78	3,5	14,26	407,4 %
Ausencia	0	0,8	0	3,97	0	7,67	0	10,02	0	22,46	0,0 %
Cafe	3,75	4,58	3	2,83	4	3	5	3,75	15,75	14,16	89,9 %
Correção de Erros Interno	0,75	1,02	0,75	0	1	3,65	1	3,17	3,5	7,84	224,0 %
Daily Scrum	3	1,67	2,25	2,52	2,92	2,83	4	3,03	12,17	10,05	82,6 %
Retrospectiva	3	4,17	3	1,92	3	3	4	2,75	13	11,84	91,1 %
Ginastica Laboral	2	2,2	1,5	1,77	2	1,75	2,67	2,67	8,17	8,39	102,7 %
Sprint Planning 1	4,5	3,72	4,5	4	4,5	1	6	2	19,5	10,72	55,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	0,75	0,25	0	0,25	0	1,5	1,58	2,25	2,33	103,6 %
Sprint Planning 2	3	2	3	2	3	1	4	1	13	6	46,2 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0,77	0	0,77	0,0 %
Code Review	0	0,03	0	2,17	0,5	1,07	1	0,75	1,5	4,02	268,0 %
Reuniao	1	0	1	8,67	1	3	1	0,58	4	12,25	306,2 %
Compilacao de sistemas	0,5	2,72	0,5	1,33	1	0,13	1	0,5	3	4,68	156,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,08	0	0	0	0,5	0	0,33	0	0,91	0,0 %
Curso/Palestra	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	3	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	0,35	0	0	0,25	0,42	0,25	0	0,5	0,77	154,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	0,58	0,5	0,58	1,25	0,58	0,13	0,58	0	2,32	1,88	81,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	3	3,25	3	3,5	3	0	3	0	12	6,75	56,2 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0,5	0,25	50,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total	l Geral 132	177,58	108	145,55	136	145,7	176	192,55	552	661,38	119,8 %

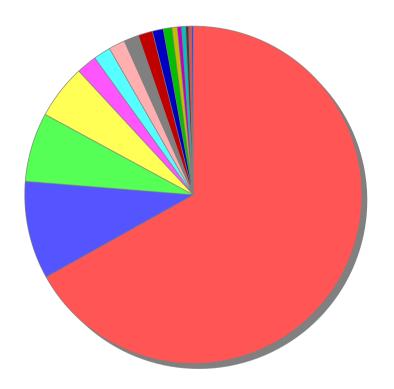

- Desenvolvimento [66.9%]
- Analise de Sistema [9.37%]
- Clean Code [6.64%]
- Ausencia [5.2%]
- Cafe [1.95%]
- Correção de Erros Interno [1.65%]
- Daily Scrum [1.57%]
- Retrospectiva [1.43%]
- Ginastica Laboral [1.39%]
- Sprint Planning 1 [1.04%]
- Planejamento de Projeto [0.82%]
- Sprint Planning 2 [0.52%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.4%]
- Code Review [0.39%]
- Reuniao [0.3%]
- Compilação de sistemas [0.26%]
- Atraso / Saida antecipada [0.17%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	96,17	144,68	74,17	105,92	96,75	118,92	128,25	145,53	395,34	515,05	130,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		21,5	12,63	21,5	13,2	23,5	3,7	26	21,05	92,5	50,58	54,7 %
DIV - Diversos*		7,58	8,08	6,33	18,48	7,83	15,55	9,5	17,02	31,24	59,13	189,3 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	6	5,87	5,25	6,6	6,42	6,9	9	6,53	26,67	25,9	97,1 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0,75	0,25	0	0,25	0	1,5	1,58	2,25	2,33	103,6 %
CM - Gerencia de Configuração		0,5	2,72	0,5	1,33	1	0,13	1,5	0,5	3,5	4,68	133,7 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0,0 %
	Total Geral	132	177,23	108	145,53	135,75	145,2	175,75	192,21	551,5	660,17	119,7 %

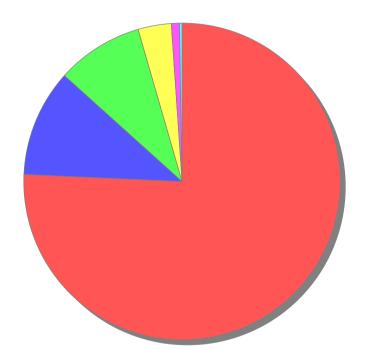


- Desenvolvimento de Requisitos [75.71%]
- Gestao de Requisitos [10.95%]
- Diversos* [8.85%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [3.4%]
- Planejamento de Projeto [0.82%]
- Gerencia de Configuracao [0.26%]

INDICADORES DO PROJETO


	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304	202305
01. Horas planejadas de todas atividades	475h12m	423h24m	336h00m	388h00m	638h30m	704h00m	638h24m	552h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	465h13m	527h22m	459h02m	450h59m	647h06m	718h29m	649h09m	661h21m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	388h32m	344h39m	287h00m	330h35m	542h10m	604h40m	539h24m	455h05m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	289h30m	380h11m	315h48m	284h17m	531h26m	599h12m	516h13m	555h13m
05. Pontos planejados para o projeto	128,0	0,0	0,0	0,0	163,0	200,0	177,0	160,0
06. Pontos planejados	120,0	107,5	101,5	101,0	100,5	126,0	152,0	208,0
07. Pontos entregues	92,5	128	131,5	98,5	189,5	198	166	176,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	48,50	89,50	95,00	90,00	127,00	147,00	122,00	146,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	44,00	38,50	36,50	8,50	62,50	51,00	44,00	30,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	1	0	0	0	2	0	2	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	14	26	22	16	35	46	42	32
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	22	13	28	12	36	34	25	22
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	0	1	0	1	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h59m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1	0	1,5	0	1	2	1,5	1,5
16. Produtividade planejada	0,309	0,312	0,354	0,306	0,186	0,209	0,282	0,458
17. Produtividade realizada	0,320	0,337	0,417	0,347	0,357	0,331	0,322	0,318
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	72,3	0	0	0	116,3	99	93,8	110,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	47,6	30,1	27,8	8,7	33	25,8	26,6	17

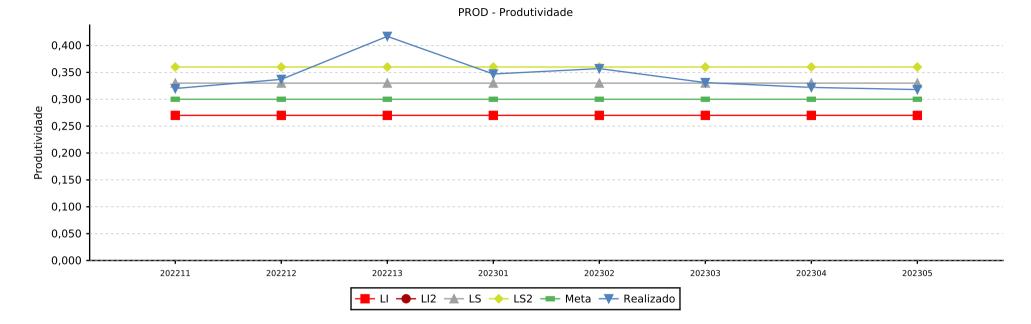


	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304	202305
Realizado	0,320	0,337	0,417	0,347	0,357	0,331	0,322	0,318
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270

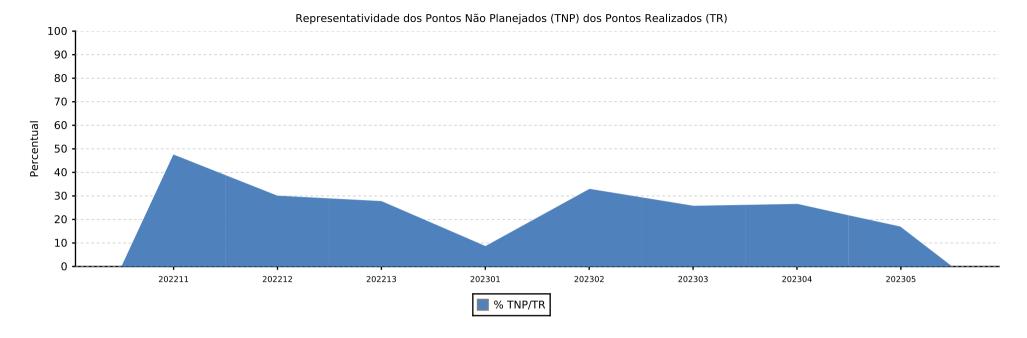


	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304	202305
TR - Pontos Realizados	92.5	128	131.5	98.5	189.5	198	166	176.5
TNP - Pontos Não Planejados	44	38.5	36.5	8.5	62.5	51	44	30
% TNP/TR	47,6	30,1	27,8	8,7	33,0	25,8	26,6	17,0

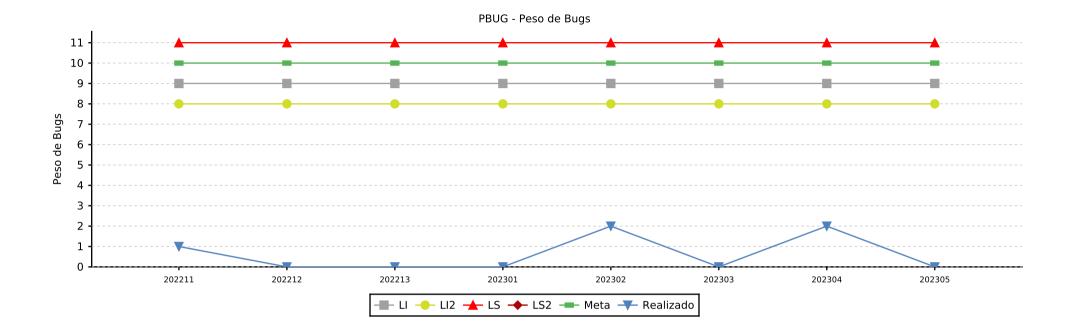


	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304	202305
Realizado	1	0	0	0	2	0	2	0
Meta	10	10	10	10	10	10	10	10
LS2								
LS	11	11	11	11	11	11	11	11
LI2	8	8	8	8	8	8	8	8
LI	9	9	9	9	9	9	9	9
Pontos Entregues	92.5	128	131.5	98.5	189.5	198	166	176.5
% PBUG / TR	1,09	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	1,21	0,00

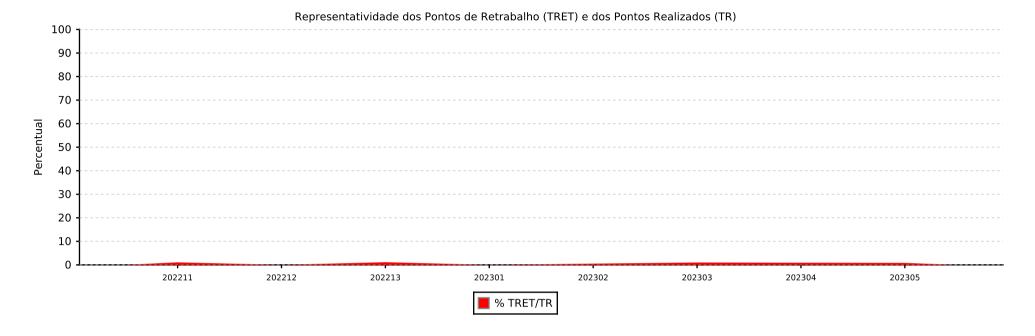


	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304	202305
TR - Pontos Realizados	92.5	128	131.5	98.5	189.5	198	166	176.5
TRET - Pontos de Retrabalho	1	0	1.5	0	1	2	1.5	1.5
% TRET/TR	1,1	0,0	1,1	0,0	0,5	1,0	0,9	0,8

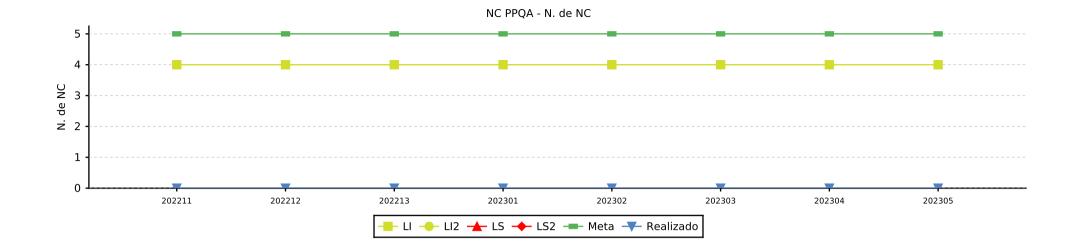


	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304	202305
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

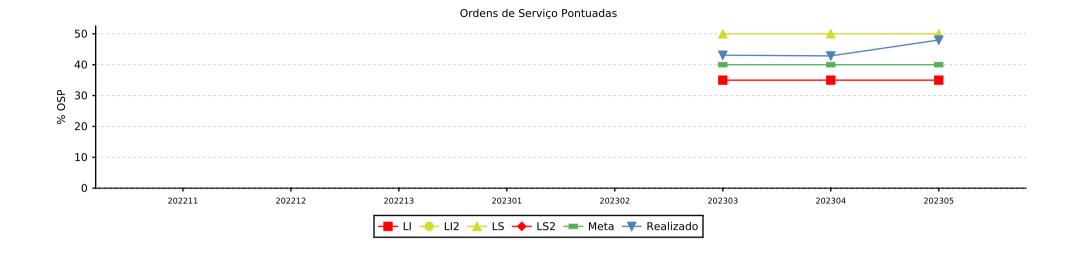

	202211	202212	202213	202301	202302	202303	202304	202305
Realizado	0	0	0	0	0	43.08	42.86	48
Meta	0	0	0	0	0	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	0	0	0	0	0	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	0	0	0	0	0	35	35	35

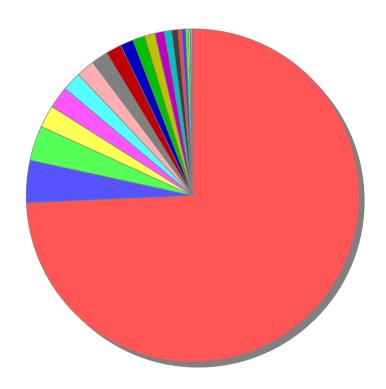

- Desenvolvimento [74.31%]
- Analise de Sistema [4.1%]
- Ausencia [3.39%]
- Clean Code [2.16%]
- Cafe [2.14%]
- Reuniao [1.85%]
- Retrospectiva [1.79%]
- Sprint Planning 1 [1.62%]
- Daily Scrum [1.52%]
- Ginastica Laboral [1.27%]
- Correção de Erros Interno [1.18%]
- Sizing [1.02%]
- Sprint Planning 2 [0.91%]
- Compilacao de sistemas [0.71%]
- Code Review [0.61%]
- Curso/Palestra [0.38%]
- Planejamento de Projeto [0.35%]
- Outros [0.28%]
- Atraso / Saida antecipada [0.14%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.12%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.12%]
- Auxilio suporte [0.04%]

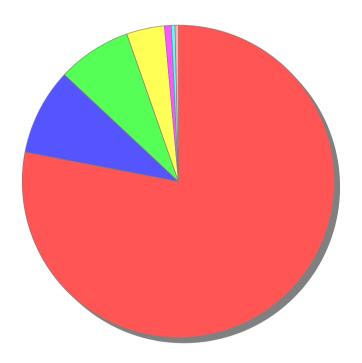

- Desenvolvimento de Requisitos [77.88%]
- Diversos* [8.94%]
- Gestao de Requisitos [7.65%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [3.92%]
- Gerencia de Configuracao [0.71%]
- Treinamento na Organizacao [0.38%]
- Planejamento de Projeto [0.35%]
