

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	307			202	308	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	176h00m							
02. Horas realizadas de todas atividades	185h37m	183h12m	180h53m	184h50m	183h33m	186h07m	179h58m	179h53m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	148h10m	148h10m	148h10m	148h10m	147h10m	147h10m	147h10m	147h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	137h39m	138h28m	146h52m	133h19m	147h11m	139h48m	140h41m	132h12m
05. Pontos planejados	44,0	50,0	44,5	40,5	53,0	44,5	39,0	34,0
06. Pontos entregues	45,5	32,5	50,5	47	50	46,5	43	39,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	37,00	28,50	47,50	35,50	41,00	41,00	24,50	8,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	8,50	4,00	3,00	11,50	9,00	5,50	18,50	31,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	10	8	12	10	11	14	9	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	2	3	3	8	7	3	12	18
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	1	0	0	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,297	0,338	0,301	0,274	0,361	0,303	0,265	0,232
16. Produtividade realizada	0,331	0,235	0,344	0,353	0,340	0,333	0,306	0,299
17. % Pontos NP / Pontos entregues	18,7	12,4	6	24,5	18	11,9	43,1	79,8

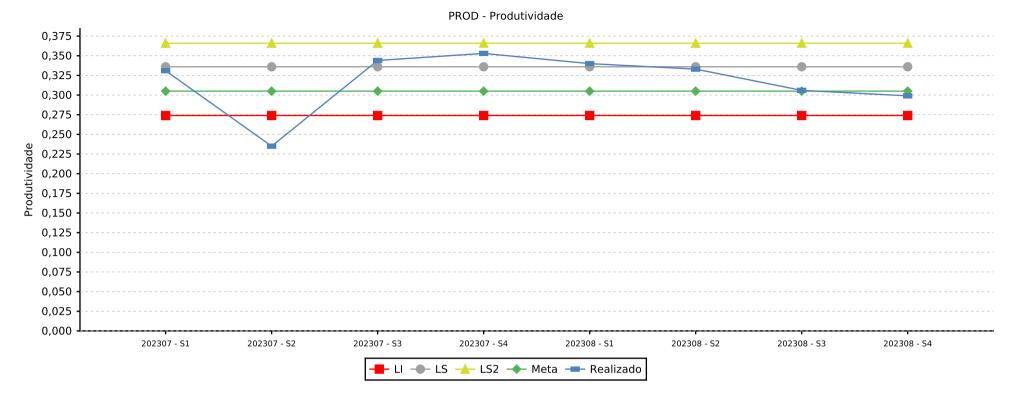


		202	307		202308					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,331	0,235	0,344	0,353	0,340	0,333	0,306	0,299		
Meta	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305		
LS2	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366		
LS	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336		
LI	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274		

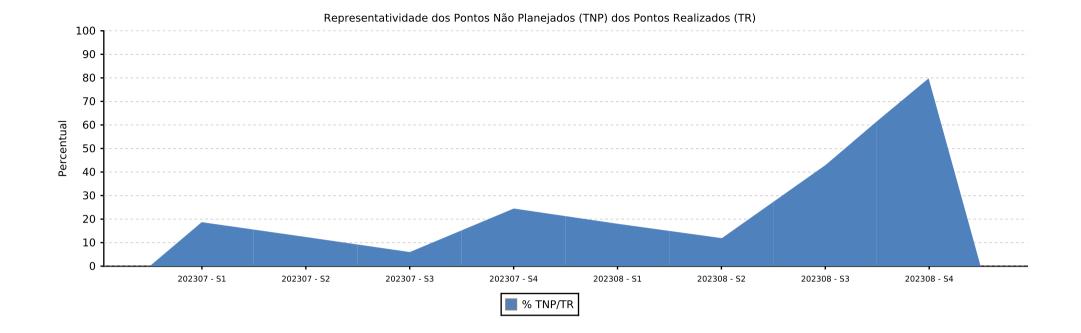


		202	307			202	308	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	45.5	32.5	50.5	47	50	46.5	43	39.5
TNP - Pontos Não Planejados	8.5	4	3	11.5	9	5.5	18.5	31.5
% TNP/TR	18,7	12,4	6,0	24,5	18,0	11,9	43,1	79,8

### NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

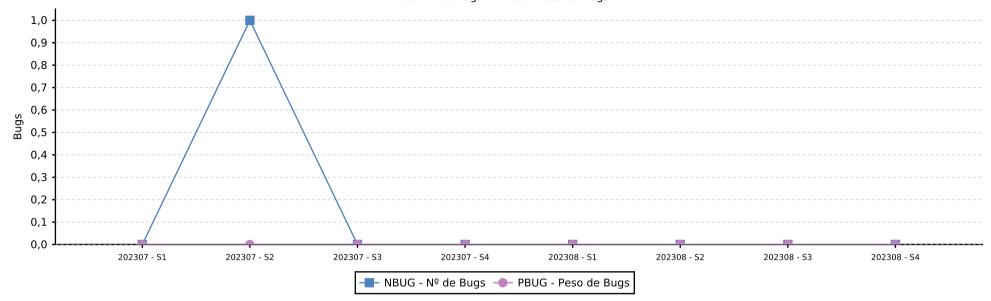

		202	307		202308					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
NBUG - Nº de Bugs	0	1	0	0	0	0	0	0		
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pontos Entregues	45.5	32.5	50.5	47	50	46.5	43	39.5		
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

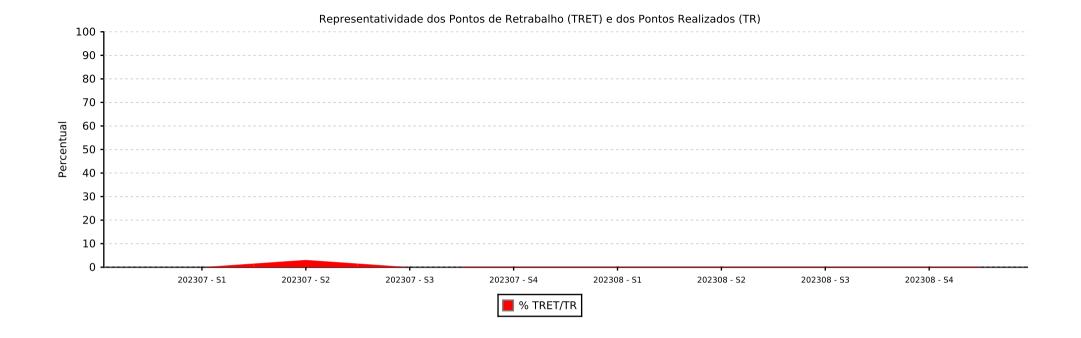


		202	307			202	308	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	45.5	32.5	50.5	47	50	46.5	43	39.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1	0	0	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spr	int 1	Spr	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	125,92	129,67	125,92	118,58	125,92	114,52	124,17	112,95	501,93	475,72	94,8 %
Analise de Sistema	13	12,9	13	16,35	13	12,03	13	16,93	52	58,21	111,9 %
Retrospectiva	4	2,9	4	2,15	4	5,58	4	5,82	16	16,45	102,8 %
Reuniao	1	3,5	1	2,52	1	7,08	1	5,53	4	18,63	465,8 %
Sprint Planning 1	6	7,93	6	2,23	6	5,82	6	5,28	24	21,26	88,6 %
Cafe	5	4,5	5	4,5	5	6,62	5	4,75	20	20,37	101,8 %
Daily Scrum	4	3,33	4	7,17	4	3,37	4	4,53	16	18,4	115,0 %
Code Review	2	1,48	2	5,4	2	1,85	2	3,9	8	12,63	157,9 %
Ausencia	0	6,37	0	2,15	0	1,37	0	3,8	0	13,69	0,0 %
Sizing	3	2,5	3	1,1	3	3,8	3	3,5	12	10,9	90,8 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0,0 %
Treinamento	0	0,58	0	0	0	0	0	2,25	0	2,83	0,0 %
Ginastica Laboral	2,83	1,97	2,83	2,45	2,83	1,88	2,83	2,08	11,32	8,38	74,0 %
Compilacao de sistemas	1	0,98	1	2,73	1	3,95	1	1,68	4	9,34	233,5 %
Sprint Planning 2	4	2	4	9,42	4	2	4	1,67	16	15,09	94,3 %
Planejamento de Projeto	0,25	0,68	0,25	0	0,25	0	1,5	0,67	2,25	1,35	60,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,25	0	0,25	0	0,25	1	0,25	0,67	1	1,67	167,0 %
Clean Code	1	0,67	1	0,25	1	1,08	1	0,62	4	2,62	65,5 %
Outros	0,58	1,58	0,58	0,62	0,58	0,7	0,58	0,25	2,32	3,15	135,8 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	8,5	0	0	0	0	0	8,5	0,0 %
Correção de Erros Interno	1	0	1	0	1	7,32	1	0	4	7,32	183,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Geração de Atas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Manutenção de Servidores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	3	0	0,0 %
Particular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	176	183,54	176	186,12	176	179,97	176	179,88	704	729,51	103,6 %

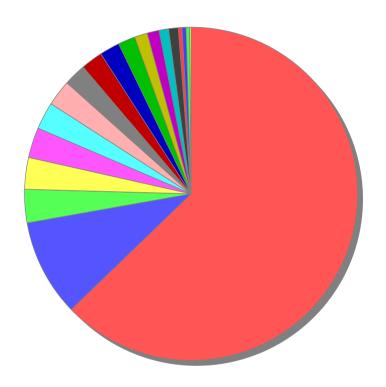

- Desenvolvimento [62.79%]
- Analise de Sistema [9.41%]
- Retrospectiva [3.24%]
- Reuniao [3.07%]
- Sprint Planning 1 [2.94%]
- Cafe [2.64%]
- Daily Scrum [2.52%]
- Code Review [2.17%]
- Ausencia [2.11%]
- Sizing [1.95%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [1.67%]
- Treinamento [1.25%]
- Ginastica Laboral [1.16%]
- Compilacao de sistemas [0.93%]
- Sprint Planning 2 [0.93%]
- Planejamento de Projeto [0.37%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.37%]
- Clean Code [0.34%]
- Outros [0.14%]

# HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	129,08	130,33	129,08	118,83	129,08	123,92	127,33	117,23	514,57	490,31	95,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		26	25,33	26	29,1	26	23,65	26	27,38	104	105,46	101,4 %
DIV - Diversos*		9,67	17,92	9,67	12,23	9,67	17,65	9,67	16,42	38,68	64,22	166,0 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	10	7,72	10	14,72	10	10,8	10	14,25	40	47,49	118,7 %
CM - Gerencia de Configuração		1	0,98	1	2,73	1	3,95	1,5	1,68	4,5	9,34	207,6 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0,68	0,25	0	0,25	0	1,5	0,67	2,25	1,35	60,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	176	182,96	176	177,61	176	179,97	176	177,63	704	718,17	102,0 %

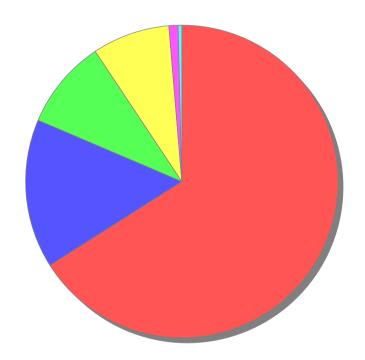


- Desenvolvimento de Requisitos [66%]
- Gestao de Requisitos [15.41%]
- Diversos\* [9.24%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [8.02%]
- Gerencia de Configuracao [0.95%]
- Planejamento de Projeto [0.38%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
01. Horas planejadas de todas atividades	388h00m	638h30m	704h00m	638h24m	552h00m	504h00m	704h00m	704h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	450h59m	647h06m	718h29m	649h09m	661h21m	589h41m	734h32m	729h31m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	330h35m	542h10m	604h40m	539h24m	455h05m	415h35m	592h40m	588h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	284h17m	531h26m	599h12m	516h13m	555h13m	510h27m	556h18m	559h52m
05. Pontos planejados para o projeto	0,0	163,0	200,0	177,0	160,0	0,0	181,0	180,0
06. Pontos planejados	101,0	100,5	126,0	152,0	208,0	139,5	179,0	170,5
07. Pontos entregues	98,5	189,5	198	166	176,5	171	175,5	179
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	90,00	127,00	147,00	122,00	146,50	145,00	148,50	114,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	8,50	62,50	51,00	44,00	30,00	26,00	27,00	64,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	0	2	0	2	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	16	35	46	42	32	35	40	40
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	36	34	25	22	10	16	40
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	1	0	1	1	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h59m	0h00m	0h15m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	1	2	1,5	1,5	0,5	1	0
16. Produtividade planejada	0,306	0,186	0,209	0,282	0,458	0,336	0,303	0,290
17. Produtividade realizada	0,347	0,357	0,331	0,322	0,318	0,335	0,316	0,320
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	0	116,3	99	93,8	110,4	0	97	99,5
19. % Pontos NP / Pontos entregues	8,7	33	25,8	26,6	17	15,3	15,4	36,1

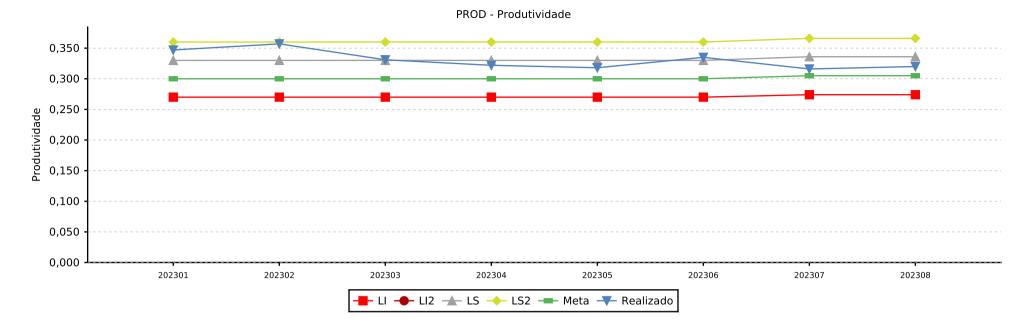


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Realizado	0,347	0,357	0,331	0,322	0,318	0,335	0,316	0,320
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274

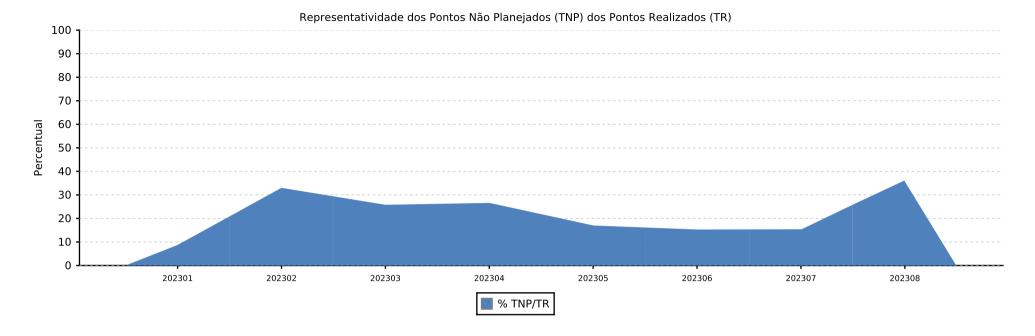


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
TR - Pontos Realizados	98.5	189.5	198	166	176.5	171	175.5	179
TNP - Pontos Não Planejados	8.5	62.5	51	44	30	26	27	64.5
% TNP/TR	8,7	33,0	25,8	26,6	17,0	15,3	15,4	36,1

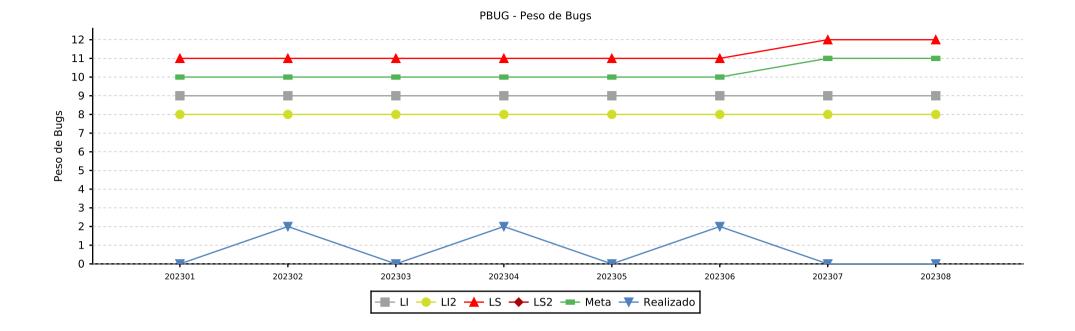


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Realizado	0	2	0	2	0	2	0	0
Meta	10	10	10	10	10	10	11	11
LS2								
LS	11	11	11	11	11	11	12	12
LI2	8	8	8	8	8	8	8	8
LI	9	9	9	9	9	9	9	9
Pontos Entregues	98.5	189.5	198	166	176.5	171	175.5	179
% PBUG / TR	0,00	1,06	0,00	1,21	0,00	1,17	0,00	0,00

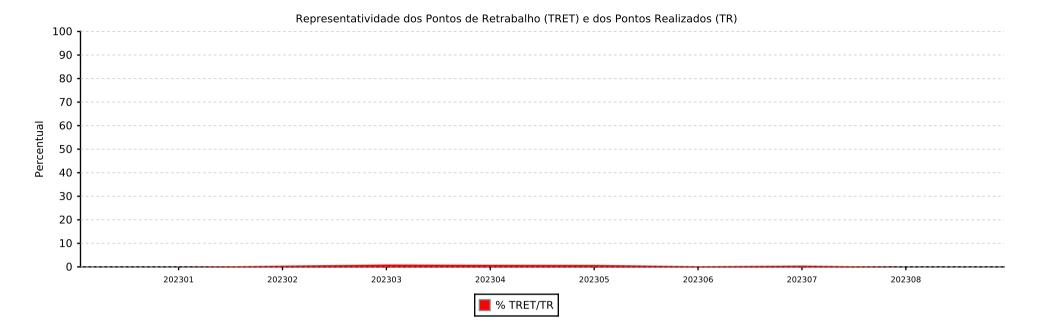


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
TR - Pontos Realizados	98.5	189.5	198	166	176.5	171	175.5	179
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1	2	1.5	1.5	0.5	1	0
% TRET/TR	0,0	0,5	1,0	0,9	0,8	0,3	0,6	0,0

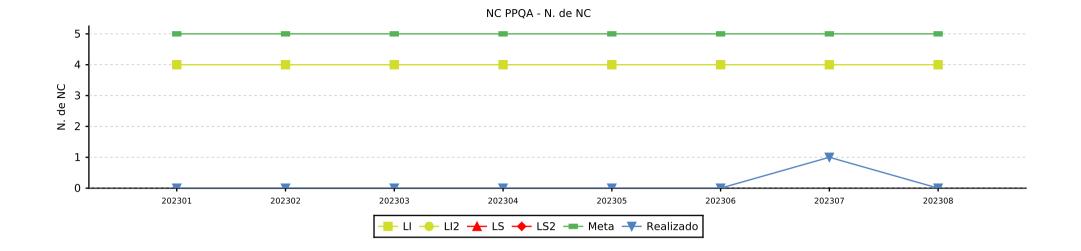


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Realizado	0	0	0	0	0	0	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

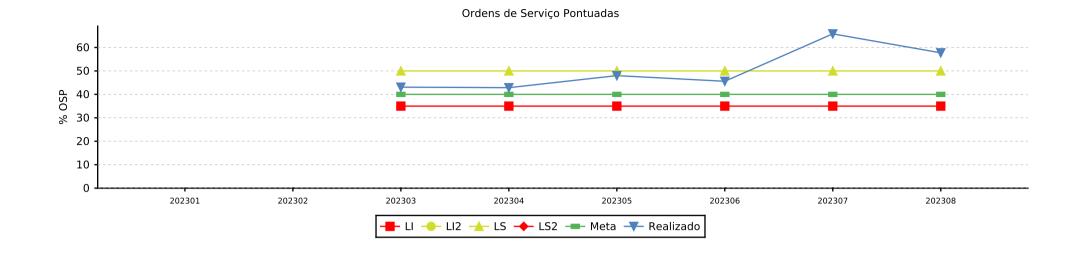

	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Realizado	0	0	43.08	42.86	48	45.59	65.82	57.73
Meta	0	0	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	0	0	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	0	0	35	35	35	35	35	35

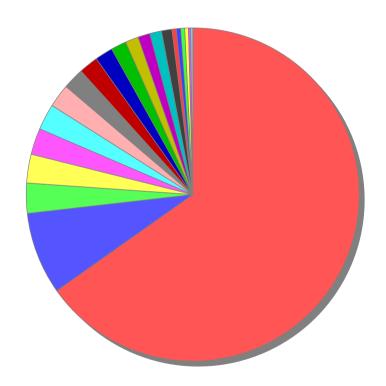

- Desenvolvimento [65.21%]
- Analise de Sistema [7.98%]
- Sprint Planning 1 [2.92%]
- Cafe [2.79%]
- Reuniao [2.55%]
- Daily Scrum [2.52%]
- Retrospectiva [2.25%]
- Sprint Planning 2 [2.07%]
- Ausencia [1.88%]
- Code Review [1.73%]
- Sizing [1.49%]
- Ocupilacao de sistemas [1.28%]
- Atestado [1.17%]
- Ginastica Laboral [1.15%]
- Correção de Erros Interno [1%]
- Outros [0.43%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.41%]
- Treinamento [0.39%]
- Clean Code [0.36%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.23%]
- Planejamento de Projeto [0.19%]



- Desenvolvimento de Requisitos [67.21%]
- Gestao de Requisitos [14.46%]
- Diversos\* [8.8%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.51%]
- Gerencia de Configuracao [1.28%]
- Planejamento de Projeto [0.19%]
