

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	505			202	506	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	216h00m	216h00m	292h00m	216h00m	264h00m	264h00m	264h00m	264h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	214h02m	220h31m	301h32m	249h36m	327h58m	325h19m	317h50m	324h47m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	183h45m	184h35m	250h45m	180h50m	212h05m	212h05m	212h05m	210h50m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	166h34m	174h46m	246h37m	151h06m	213h36m	193h22m	246h34m	225h51m
05. Pontos planejados	56,0	49,0	67,0	54,0	68,5	72,5	69,0	82,0
06. Pontos entregues	54	61	81	51	71	64,5	81,5	77
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	38,00	55,00	73,00	35,00	44,00	47,00	62,50	62,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	16,00	6,00	8,00	16,00	27,00	17,50	19,00	14,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	2	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	12	11	13	8	12	12	17	16
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	6	5	8	6	11	9	6	9
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	1	0	0	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0,5	0	3	0,5	0	0	0,5
15. Produtividade planejada	0,305	0,266	0,268	0,299	0,323	0,342	0,326	0,389
16. Produtividade realizada	0,325	0,350	0,329	0,338	0,333	0,334	0,331	0,341
17. % Pontos NP / Pontos entregues	29,7	9,9	9,9	31,4	38,1	27,2	23,4	18,9

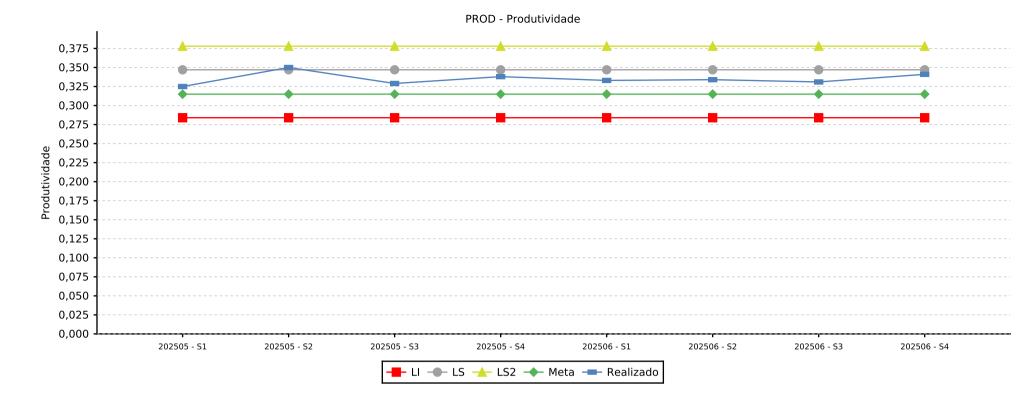


		202	505		202506					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,325	0,350	0,329	0,338	0,333	0,334	0,331	0,341		
Meta	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315		
LS2	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378		
LS	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347		
LI	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284		

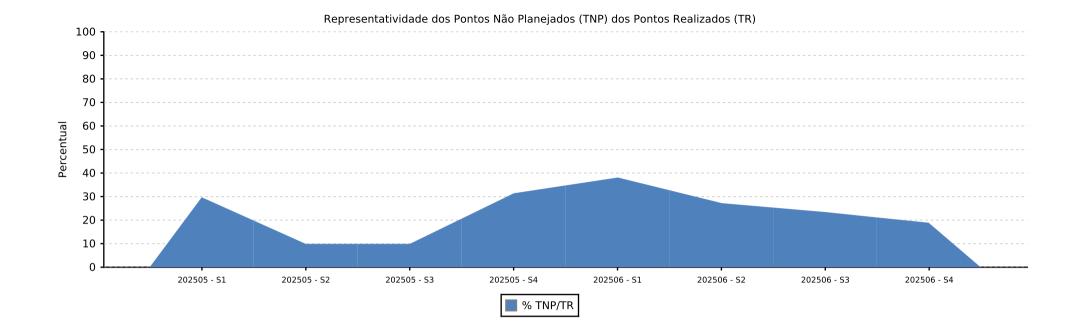


		202	505			202	506	
	1 2				1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	54	61	81	51	71	64.5	81.5	77
TNP - Pontos Não Planejados	16	6	8	16	27	17.5	19	14.5
% TNP/TR	29,7	9,9	9,9	31,4	38,1	27,2	23,4	18,9

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

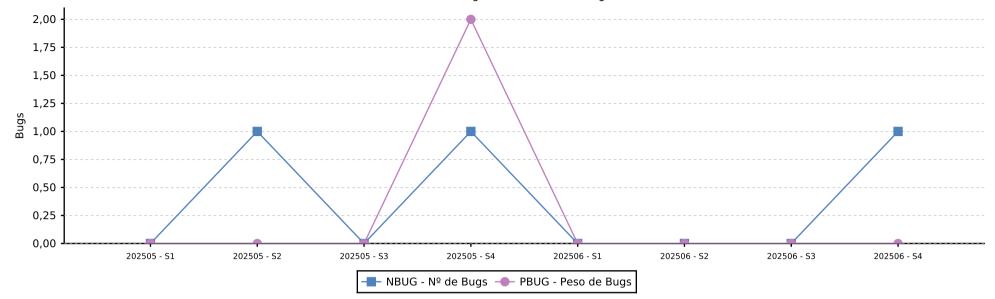

		202	505			202	506	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	1	0	1	0	0	0	1
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	2	0	0	0	0
Pontos Entregues	54	61	81	51	71	64.5	81.5	77
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00

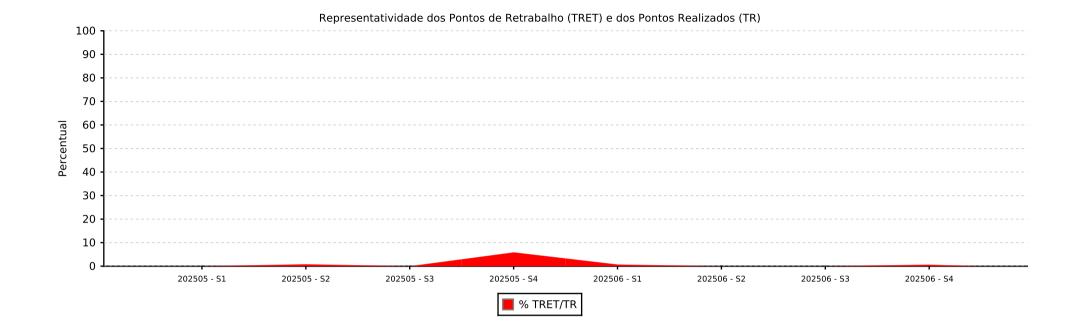


		202	505			202	506	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	54	61	81	51	71	64.5	81.5	77
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0.5	0	3	0.5	0	0	0.5
% TRET/TR	0,0	0,8	0,0	5,9	0,7	0,0	0,0	0,6

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	173	197,12	173	164,55	173	203,07	169,5	195,05	688,5	759,79	110,4 %
Ausencia	0	21,45	0	16,37	0	8,62	0	20,63	0	67,07	0,0 %
Treinamento	15	10,25	15	10,02	15	12,23	15	19	60	51,5	85,8 %
Analise de Sistema	16	11,7	16	38,2	16	31,12	16	17,58	64	98,6	154,1 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0,0 %
Daily Scrum	12	4,75	12	7,67	12	10,08	12	8,5	48	31	64,6 %
Retrospectiva	6	3,5	6	6	6	5,83	6	8	24	23,33	97,2 %
Compilacao de sistemas	2,5	3	2,5	3,17	2,5	1,25	2,5	7,55	10	14,97	149,7 %
Sprint Planning 1	9	4,13	9	3	9	7	9	7	36	21,13	58,7 %
Cafe	7,25	7,5	7,25	6,25	7,25	8,75	7,25	6,73	29	29,23	100,8 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	5,08	0	5,08	0,0 %
Code Review	3,25	1,45	3,25	1,03	3,25	0,63	3,25	4,2	13	7,31	56,2 %
Ginastica Laboral	4	3,17	4	3,33	4	4,17	4	3,4	16	14,07	87,9 %
Sizing	2	0	2	0	2	0	2	2,75	8	2,75	34,4 %
Clean Code	1,5	1,25	1,5	2,25	1,5	2,38	1,5	2,5	6	8,38	139,7 %
Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	0	0,25	0,33	2	2	2,75	2,33	84,7 %
Sprint Planning 2	6	1,5	6	1,1	6	2,33	6	1,8	24	6,73	28,0 %
Verificando apontamento	0,42	1,42	0,42	1,67	0,42	1,67	0,42	1,5	1,68	6,26	372,6 %
Correção de Erros Interno	3	0,75	3	4,42	3	14,7	3	1	12	20,87	173,9 %
Reuniao	1	1	1	1	1	2	1	0,5	4	4,5	112,5 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	48,75	0	46,75	0	0	0	0	0	95,5	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %


Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,33	0	1,33	0	1,33	0	1,33	0	5,32	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	0,6	0	4,38	0	0,83	0	0	0	5,81	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	0,17	4,17	0,17	1,5	0,17	0,83	0,17	0	0,68	6,5	955,9 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	1,25	0	1,25	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,17	0	0,17	1,67	0,17	0	0,17	0	0,68	1,67	245,6 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	264,01	327,98	264,01	325,33	264,01	317,82	264,01	324,77	1.056,04	1.295,9	122,7 %

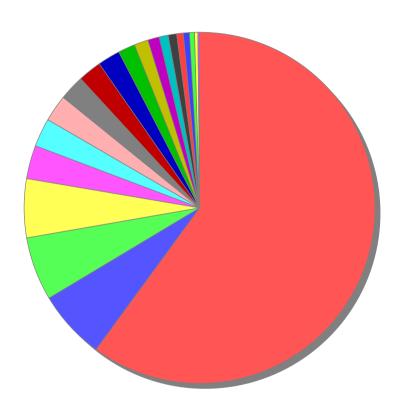

- Desenvolvimento [60.06%]
- Ausencia [6.35%]
- Treinamento [5.85%]
- Analise de Sistema [5.41%]
- Atestado [3.08%]
- Daily Scrum [2.62%]
- Retrospectiva [2.46%]
- Compilacao de sistemas [2.32%]
- Sprint Planning 1 [2.16%]
- Cafe [2.07%]
- Analise de O.S [1.56%]
- Code Review [1.29%]
- Ginastica Laboral [1.05%]
- Sizing [0.85%]
- Clean Code [0.77%]
- Planejamento de Projeto [0.62%]
- Sprint Planning 2 [0.55%]
- Verificando apontamento [0.46%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.31%]
- Reuniao [0.15%]

## HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	179	199,72	179	176,6	179	220,98	175,5	198,55	712,5	795,85	111,7 %
DIV - Diversos*		12,58	37,28	12,58	30,12	12,58	24,37	12,58	31,27	50,32	123,04	244,5 %
REQM - Gestao de Requisitos		33	17,33	33	42,3	33	40,45	33	29,13	132	129,21	97,9 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	21,25	9,7	21,25	14,7	21,25	16,55	21,25	20,7	85	61,65	72,5 %
CM - Gerencia de Configuração		2,5	3	2,5	3,17	2,5	1,25	3	7,55	10,5	14,97	142,6 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0,33	2	2	2,75	2,33	84,7 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	248,58	267,53	248,58	266,89	248,58	303,93	247,33	289,2	993,07	1.127,55	113,5 %

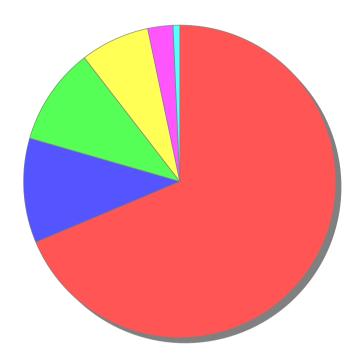


- Desenvolvimento de Requisitos [68.65%]
- Diversos\* [10.81%]
- Gestao de Requisitos [10.07%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.16%]
- Gerencia de Configuracao [2.61%]
- Planejamento de Projeto [0.69%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
01. Horas planejadas de todas atividades	1048h00m	1116h44m	1021h36m	1056h00m	1109h04m	1175h20m	940h00m	1056h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1140h44m	1170h46m	1102h30m	1213h13m	1101h19m	1176h51m	985h41m	1295h54m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	890h00m	946h39m	865h06m	906h35m	945h40m	1011h45m	799h55m	847h05m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	826h05m	814h36m	747h07m	966h31m	900h37m	960h37m	739h03m	879h23m
05. Pontos planejados para o projeto	267,0	289,0	265,0	280,0	292,0	313,0	252,0	267,0
06. Pontos planejados	289,0	274,0	197,0	276,0	319,5	327,0	226,0	292,0
07. Pontos entregues	263	278	239,5	329	295,5	319,5	247	294
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	211,00	232,50	182,00	262,00	231,50	272,50	201,00	216,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	52,00	45,50	57,50	67,00	64,00	47,00	46,00	78,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	3	0	2	2	2	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	55	76	56	77	52	65	44	57
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	24	28	31	40	38	37	25	35
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	2	2	0	1	1	2	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	3h00m	0h00m	0h00m	0h35m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	2,5	2	1	3,5	4,5	0,5	3,5	1
16. Produtividade planejada	0,325	0,290	0,228	0,305	0,338	0,324	0,283	0,345
17. Produtividade realizada	0,319	0,342	0,321	0,341	0,329	0,333	0,335	0,335
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	98,6	96,2	90,4	117,5	101,2	102,1	98,1	110,2
19. % Pontos NP / Pontos entregues	19,8	16,4	24,1	20,4	21,7	14,8	18,7	26,6

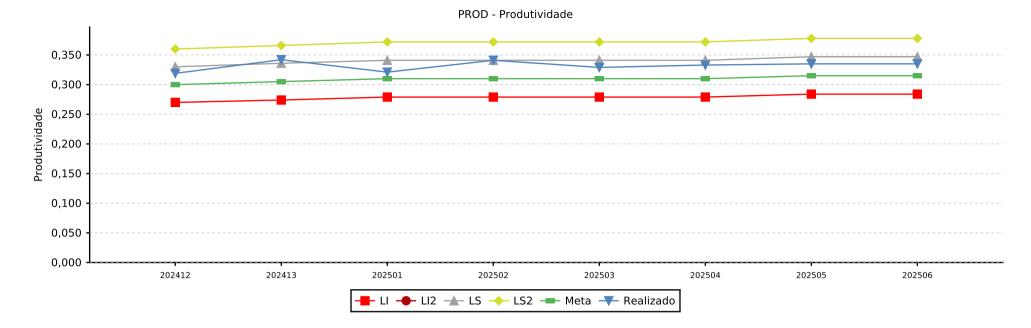


	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
Realizado	0,319	0,342	0,321	0,341	0,329	0,333	0,335	0,335
Meta	0,300	0,305	0,310	0,310	0,310	0,310	0,315	0,315
LS2	0,360	0,366	0,372	0,372	0,372	0,372	0,378	0,378
LS	0,330	0,336	0,341	0,341	0,341	0,341	0,347	0,347
LI2								
LI	0,270	0,274	0,279	0,279	0,279	0,279	0,284	0,284

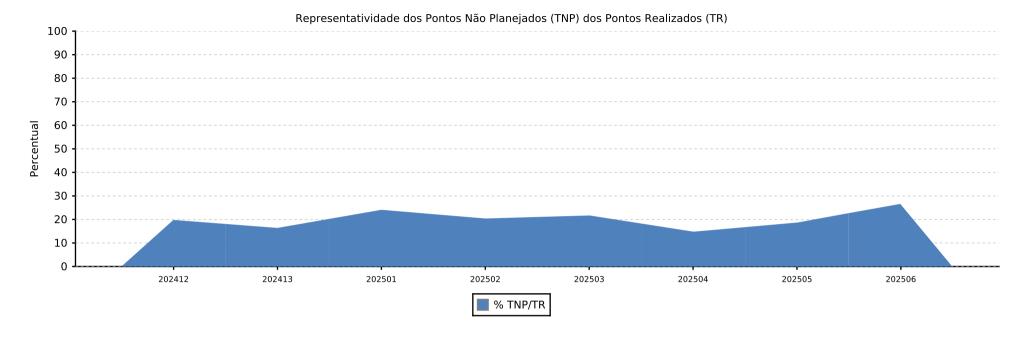


	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
TR - Pontos Realizados	263	278	239.5	329	295.5	319.5	247	294
TNP - Pontos Não Planejados	52	45.5	57.5	67	64	47	46	78
% TNP/TR	19,8	16,4	24,1	20,4	21,7	14,8	18,7	26,6

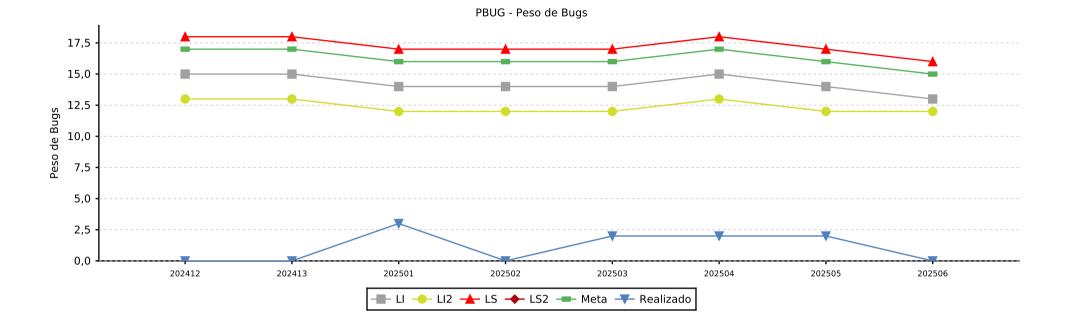


	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
Realizado	0	0	3	0	2	2	2	0
Meta	17	17	16	16	16	17	16	15
LS2								
LS	18	18	17	17	17	18	17	16
LI2	13	13	12	12	12	13	12	12
LI	15	15	14	14	14	15	14	13
Pontos Entregues	263	278	239.5	329	295.5	319.5	247	294
% PBUG / TR	0,00	0,00	1,26	0,00	0,68	0,63	0,81	0,00




	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
TR - Pontos Realizados	263	278	239.5	329	295.5	319.5	247	294
TRET - Pontos de Retrabalho	2.5	2	1	3.5	4.5	0.5	3.5	1
% TRET/TR	1,0	0,7	0,4	1,1	1,5	0,2	1,4	0,3

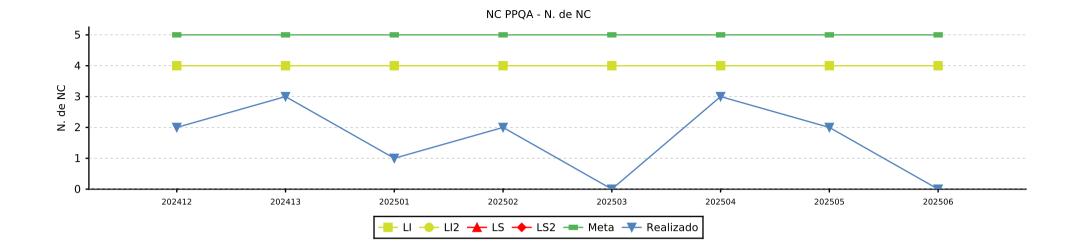


	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
Realizado	2	3	1	2	0	3	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

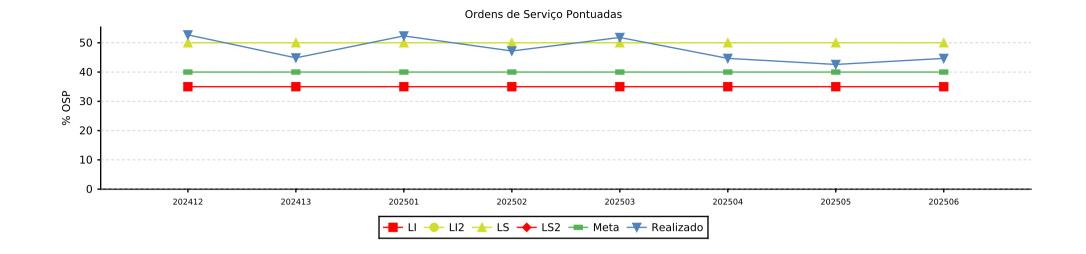

	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
Realizado	52.71	44.85	52.35	47.2	51.82	44.68	42.6	44.67
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

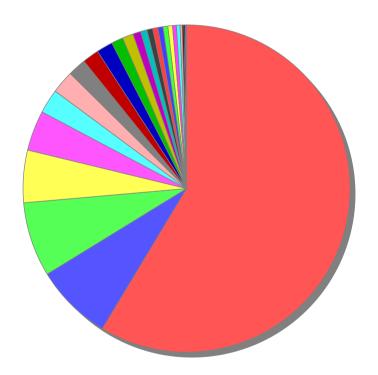

- Desenvolvimento [58.63%]
- Analise de Sistema [7.61%]
- Férias [7.37%]
- Ausencia [5.18%]
- Treinamento [3.97%]
- Daily Scrum [2.39%]
- Cafe [2.26%]
- Retrospectiva [1.8%]
- Sprint Planning 1 [1.63%]
- Ocrreção de Erros Interno [1.61%]
- Compilacao de sistemas [1.16%]
- Ginastica Laboral [1.09%]
- Atestado [0.77%]
- Clean Code [0.65%]
- Code Review [0.56%]
- Sprint Planning 2 [0.52%]
- Outros [0.5%]
- Verificando apontamento [0.48%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.45%]
- Analise de O.S [0.39%]
- Reuniao [0.35%]
- Sizing [0.21%]
- Planejamento de Projeto [0.18%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.13%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.08%]
- Curso/Palestra [0.04%]
- Atraso / Saida antecipada [0%]

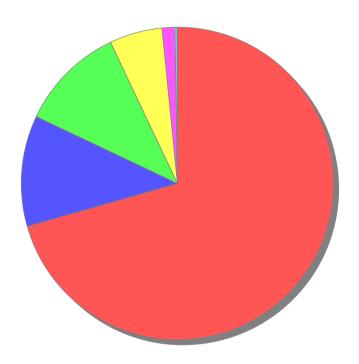

- Desenvolvimento de Requisitos [61.41%]
- Gestao de Requisitos [9.97%]
- Diversos\* [9.49%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [4.76%]
- Gerencia de Configuracao [1.16%]
- Planejamento de Projeto [0.18%]
- Treinamento na Organizacao [0.04%]
