
INDICADORES DA SPRINT

		202	308			202	309	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	176h00m	176h00m	176h00m	176h00m	143h12m	176h00m	176h00m	143h12m
02. Horas realizadas de todas atividades	183h33m	186h07m	179h58m	179h53m	140h09m	175h59m	185h20m	146h33m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	147h10m	147h10m	147h10m	147h10m	115h32m	146h40m	146h40m	115h22m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	147h11m	139h48m	140h41m	132h12m	104h31m	147h28m	116h56m	121h53m
05. Pontos planejados	53,0	44,5	39,0	34,0	49,5	38,5	27,0	44,0
06. Pontos entregues	50	46,5	43	39,5	32,5	53	29	47,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	41,00	41,00	24,50	8,00	21,00	23,00	10,00	42,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	9,00	5,50	18,50	31,50	11,50	30,00	19,00	5,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	11	14	9	6	8	10	6	10
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	7	3	12	18	8	18	13	4
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,361	0,303	0,265	0,232	0,429	0,263	0,185	0,382
16. Produtividade realizada	0,340	0,333	0,306	0,299	0,311	0,360	0,249	0,390
17. % Pontos NP / Pontos entregues	18	11,9	43,1	79,8	35,4	56,7	65,6	11,6

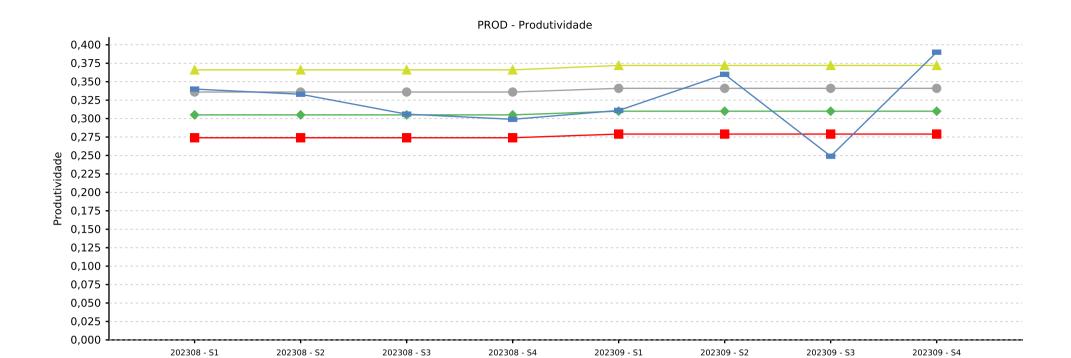

 LI
 → LS
 → Meta
 → Realizado

202309 - S3


202309 - S4

		202	308		202309					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,340	0,333	0,306	0,299	0,311	0,360	0,249	0,390		
Meta	0,305	0,305	0,305	0,305	0,310	0,310	0,310	0,310		
LS2	0,366	0,366	0,366	0,366	0,372	0,372	0,372	0,372		
LS	0,336	0,336	0,336	0,336	0,341	0,341	0,341	0,341		
LI	0,274	0,274	0,274	0,274	0,279	0,279	0,279	0,279		

202308 - S2


202308 - S3

202308 - S1

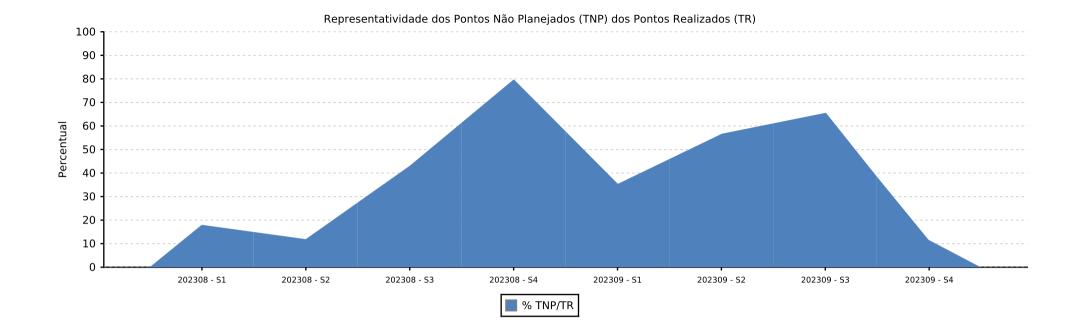


		202	308			202	309	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	50	46.5	43	39.5	32.5	53	29	47.5
TNP - Pontos Não Planejados	9	5.5	18.5	31.5	11.5	30	19	5.5
% TNP/TR	18,0	11,9	43,1	79,8	35,4	56,7	65,6	11,6

NBUG - № de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

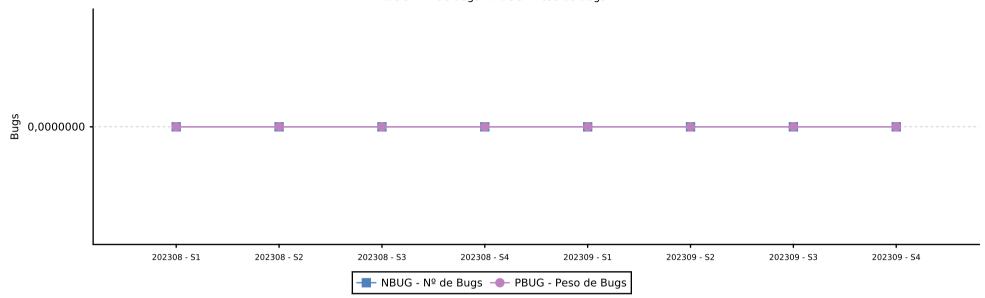

		202	308	-	202309					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0		
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pontos Entregues	50	46.5	43	39.5	32.5	53	29	47.5		
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		




		202	308			202	309	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	50	46.5	43	39.5	32.5	53	29	47.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	95,28	86,8	125,42	133,87	125,42	102,18	93,37	106,48	439,49	429,33	97,7 %
Analise de Sistema	13	16,7	13	15,72	13	26,75	13	5,73	52	64,9	124,8 %
Code Review	2,5	2,68	2,5	2,77	2,5	4,3	2,5	5,68	10	15,43	154,3 %
Ausencia	0	1,33	0	1,77	0	19,35	0	4,57	0	27,02	0,0 %
Sprint Planning 1	6	7,42	6	2,67	6	7,8	6	3,78	24	21,67	90,3 %
Cafe	4	3,25	5	3,75	5	4,08	4	3,75	18	14,83	82,4 %
Daily Scrum	3	2,47	4	4,22	4	2,78	3	3,53	14	13	92,9 %
Sprint Planning 2	4	2,33	4	1,33	4	2,75	4	3,33	16	9,74	60,9 %
Retrospectiva	4	4	4	2,58	4	1,17	4	3	16	10,75	67,2 %
Reuniao	1	1	1	1	1	7,9	1	1,75	4	11,65	291,2 %
Ginastica Laboral	2,17	1,65	2,83	2,15	2,83	1,97	2,33	1,67	10,16	7,44	73,2 %
Compilacao de sistemas	1	0,35	1	0,5	1	0,72	1	1,17	4	2,74	68,5 %
Planejamento de Projeto	0,25	1,5	0,25	0	0,25	0	1,5	1	2,25	2,5	111,1 %
Clean Code	1	0	1	1,75	1	0,25	1	0,75	4	2,75	68,8 %
Outros	0,58	2,08	0,58	0,37	0,58	0,25	0,58	0,35	2,32	3,05	131,5 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	3	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0,58	0	0	0	0,5	0	0	0	1,08	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0,0 %
Correção de Erros Interno	1	0	1	1,05	1	0	1	0	4	1,05	26,2 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,25	0	0,25	0	0,25	2,33	0,25	0	1	2,33	233,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0,5	0	0,25	0	0	0	0,75	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Total Geral	143,2	140,14	176	176	176	185,33	143,2	146,54	638,4	648,01	101,5 %

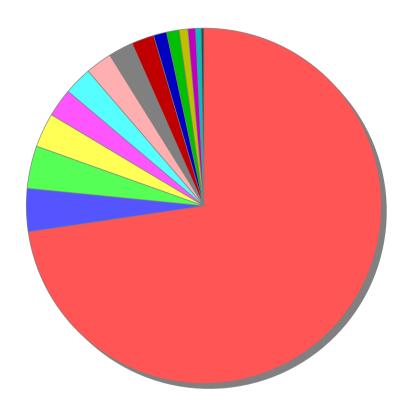

- Desenvolvimento [72.66%]
- Analise de Sistema [3.91%]
- Code Review [3.88%]
- O Ausencia [3.12%]
- Sprint Planning 1 [2.58%]
- Cafe [2.56%]
- Daily Scrum [2.41%]
- Sprint Planning 2 [2.27%]
- Retrospectiva [2.05%]
- Reuniao [1.19%]
- Ginastica Laboral [1.14%]
- Compilacao de sistemas [0.8%]
- Planejamento de Projeto [0.68%]
- Clean Code [0.51%]
- Outros [0.24%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	98,45	86,8	128,58	136,67	128,58	102,43	96,53	107,23	452,14	433,13	95,8 %
REQM - Gestao de Requisitos		26	27,03	26	19,72	26	37,8	26	12,85	104	97,4	93,7 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	9,5	9,15	10,5	9,57	10,5	8,25	9,5	12,22	40	39,19	98,0 %
DIV - Diversos*		8	9,32	9,67	9,03	9,67	35,88	8,17	12,08	35,51	66,31	186,7 %
CM - Gerencia de Configuração		1	0,35	1	0,5	1	0,72	1,5	1,17	4,5	2,74	60,9 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	1,5	0,25	0	0,25	0	1,5	1	2,25	2,5	111,1 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	143,2	134,15	176	175,49	176	185,08	143,2	146,55	638,4	641,27	100,4 %

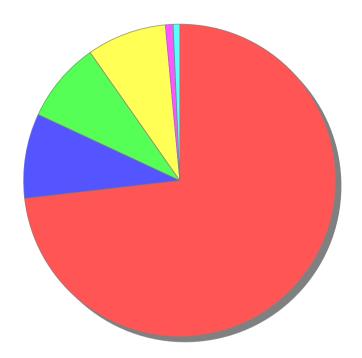


- Desenvolvimento de Requisitos [73.17%]
- Gestao de Requisitos [8.77%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [8.34%]
- Diversos* [8.24%]
- Gerencia de Configuracao [0.8%]
- Planejamento de Projeto [0.68%]

INDICADORES DO PROJETO


	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
01. Horas planejadas de todas atividades	638h30m	704h00m	638h24m	552h00m	504h00m	704h00m	704h00m	638h24m
02. Horas realizadas de todas atividades	647h06m	718h29m	649h09m	661h21m	589h41m	734h32m	729h31m	648h01m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	542h10m	604h40m	539h24m	455h05m	415h35m	592h40m	588h40m	524h14m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	531h26m	599h12m	516h13m	555h13m	510h27m	556h18m	559h52m	490h48m
05. Pontos planejados para o projeto	163,0	200,0	177,0	160,0	0,0	181,0	180,0	163,0
06. Pontos planejados	100,5	126,0	152,0	208,0	139,5	179,0	170,5	159,0
07. Pontos entregues	189,5	198	166	176,5	171	175,5	179	162
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	127,00	147,00	122,00	146,50	145,00	148,50	114,50	96,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	62,50	51,00	44,00	30,00	26,00	27,00	64,50	66,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	2	0	2	0	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	35	46	42	32	35	40	40	34
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	36	34	25	22	10	16	40	43
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	1	0	1	1	0	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h59m	0h00m	0h15m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1	2	1,5	1,5	0,5	1	0	0
16. Produtividade planejada	0,186	0,209	0,282	0,458	0,336	0,303	0,290	0,304
17. Produtividade realizada	0,357	0,331	0,322	0,318	0,335	0,316	0,320	0,331
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	116,3	99	93,8	110,4	0	97	99,5	99,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	33	25,8	26,6	17	15,3	15,4	36,1	40,8

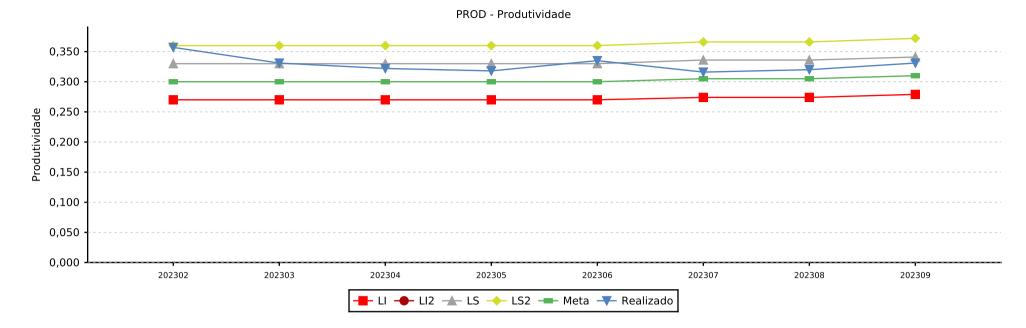


	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
Realizado	0,357	0,331	0,322	0,318	0,335	0,316	0,320	0,331
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305	0,310
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366	0,372
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336	0,341
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274	0,279

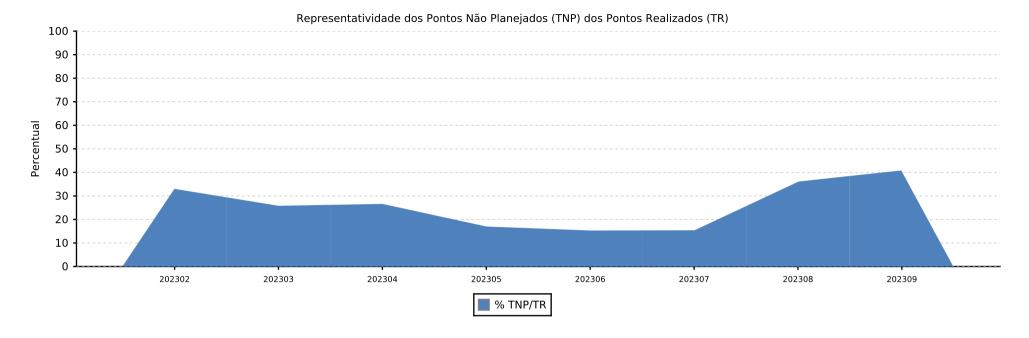


	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
TR - Pontos Realizados	189.5	198	166	176.5	171	175.5	179	162
TNP - Pontos Não Planejados	62.5	51	44	30	26	27	64.5	66
% TNP/TR	33,0	25,8	26,6	17,0	15,3	15,4	36,1	40,8

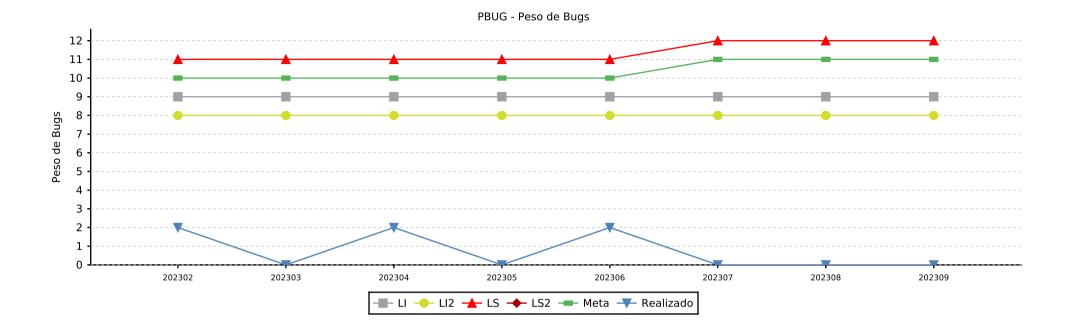


	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
Realizado	2	0	2	0	2	0	0	0
Meta	10	10	10	10	10	11	11	11
LS2								
LS	11	11	11	11	11	12	12	12
LI2	8	8	8	8	8	8	8	8
LI	9	9	9	9	9	9	9	9
Pontos Entregues	189.5	198	166	176.5	171	175.5	179	162
% PBUG / TR	1,06	0,00	1,21	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00




	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
TR - Pontos Realizados	189.5	198	166	176.5	171	175.5	179	162
TRET - Pontos de Retrabalho	1	2	1.5	1.5	0.5	1	0	0
% TRET/TR	0,5	1,0	0,9	0,8	0,3	0,6	0,0	0,0

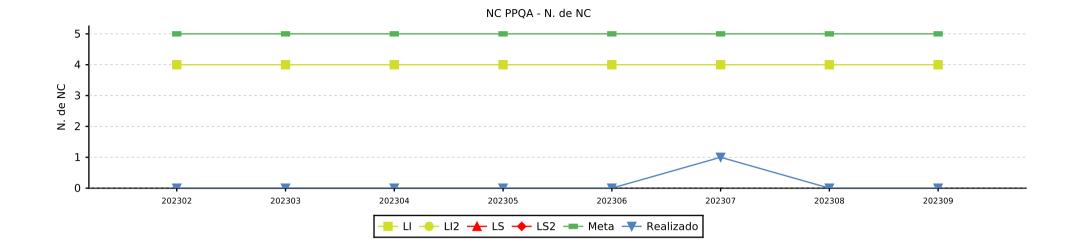


	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
Realizado	0	0	0	0	0	1	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

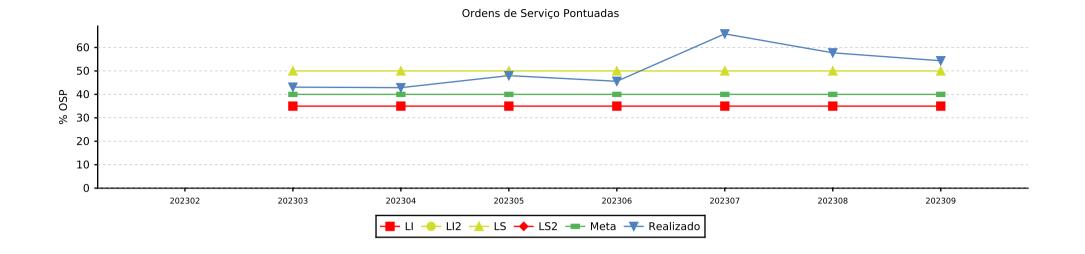

	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
Realizado	0	43.08	42.86	48	45.59	65.82	57.73	54.35
Meta	0	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	0	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	0	35	35	35	35	35	35	35

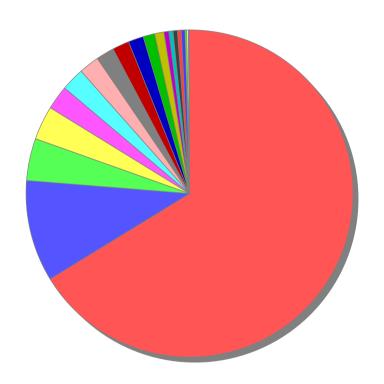

- Desenvolvimento [66.25%]
- Analise de Sistema [10.02%]
- Ausencia [4.17%]
- Sprint Planning 1 [3.34%]
- Code Review [2.38%]
- Ocafe [2.29%]
- Daily Scrum [2.01%]
- Reuniao [1.8%]
- Retrospectiva [1.66%]
- Sprint Planning 2 [1.5%]
- Ginastica Laboral [1.15%]
- Atestado [0.93%]
- Outros [0.47%]
- Clean Code [0.42%]
- Compilacao de sistemas [0.42%]
- Planejamento de Projeto [0.39%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.36%]
- Preparando ambiente [0.17%]
- O Correção de Erros Interno [0.16%]
- Atraso / Saida antecipada [0.12%]

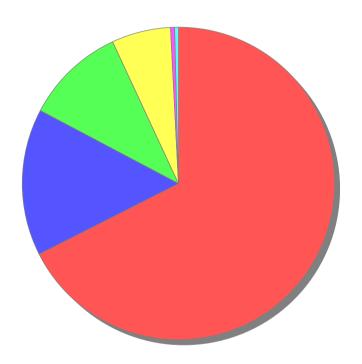

- Desenvolvimento de Requisitos [66.84%]
- Gestao de Requisitos [15.03%]
- Diversos* [10.23%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.05%]
- Gerencia de Configuracao [0.42%]
- Planejamento de Projeto [0.39%]
