
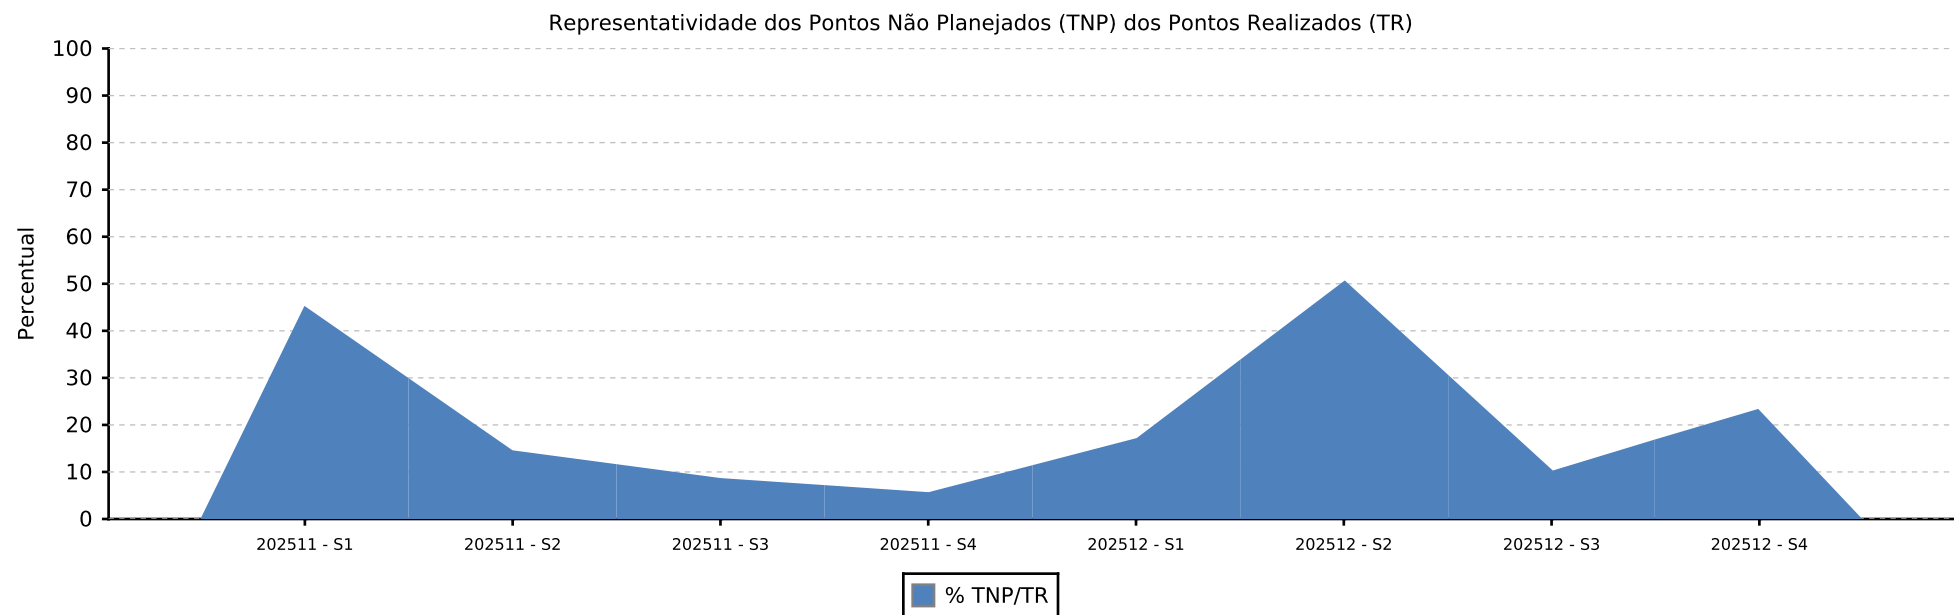


INDICADORES DA SPRINT

	202511				202512			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m	176h00m	144h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	256h57m	225h30m	227h14m	220h11m	218h34m	171h19m	137h48m	187h41m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	188h00m	187h10m	188h00m	187h10m	185h10m	147h25m	117h35m	186h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	183h21m	178h44m	195h38m	184h48m	164h27m	121h32m	113h17m	150h40m
05. Pontos planejados	43,5	38,5	57,5	60,0	66,0	55,5	62,0	68,0
06. Pontos entregues	63	62	69,5	61,5	55,5	38,5	39	51,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	34,50	53,00	63,50	58,00	46,00	19,00	35,00	39,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	28,50	9,00	6,00	3,50	9,50	19,50	4,00	12,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	12	15	13	15	10	6	7	10
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	15	10	6	5	5	9	5	3
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0	0	0	3
15. Produtividade planejada	0,232	0,206	0,306	0,321	0,357	0,377	0,528	0,366
16. Produtividade realizada	0,344	0,347	0,356	0,333	0,338	0,317	0,345	0,342
17. % Pontos NP / Pontos entregues	45,3	14,6	8,7	5,7	17,2	50,7	10,3	23,4

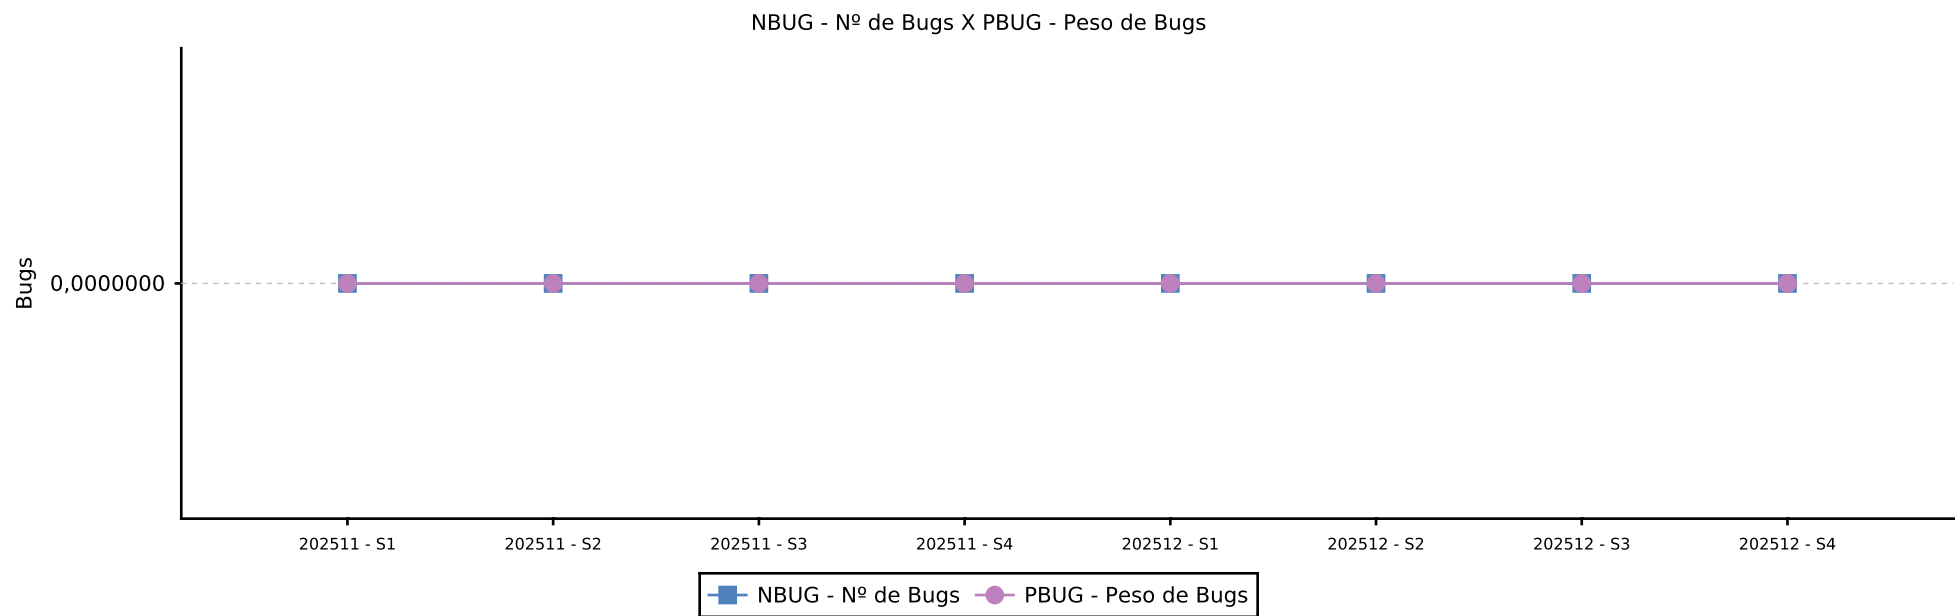

	202511				202512			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	63	62	69.5	61.5	55.5	38.5	39	51.5
TNP - Pontos Não Planejados	28.5	9	6	3.5	9.5	19.5	4	12
% TNP/TR	45,3	14,6	8,7	5,7	17,2	50,7	10,3	23,4


[illegible]

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	2	0,5	1,5	5,58	1,5	1	2	0	7	7,08	101,1 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	0	0,5	3,92	0,5	0	0,5	0	2	3,92	196,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,67	0	0,42	0	0,42	0	0,67	0	2,18	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,0 %
Total Geral	220,01	218,56	176,02	171,32	144,01	137,81	220,01	187,69	760,05	715,38	94,1 %


% de Horas por Atividade

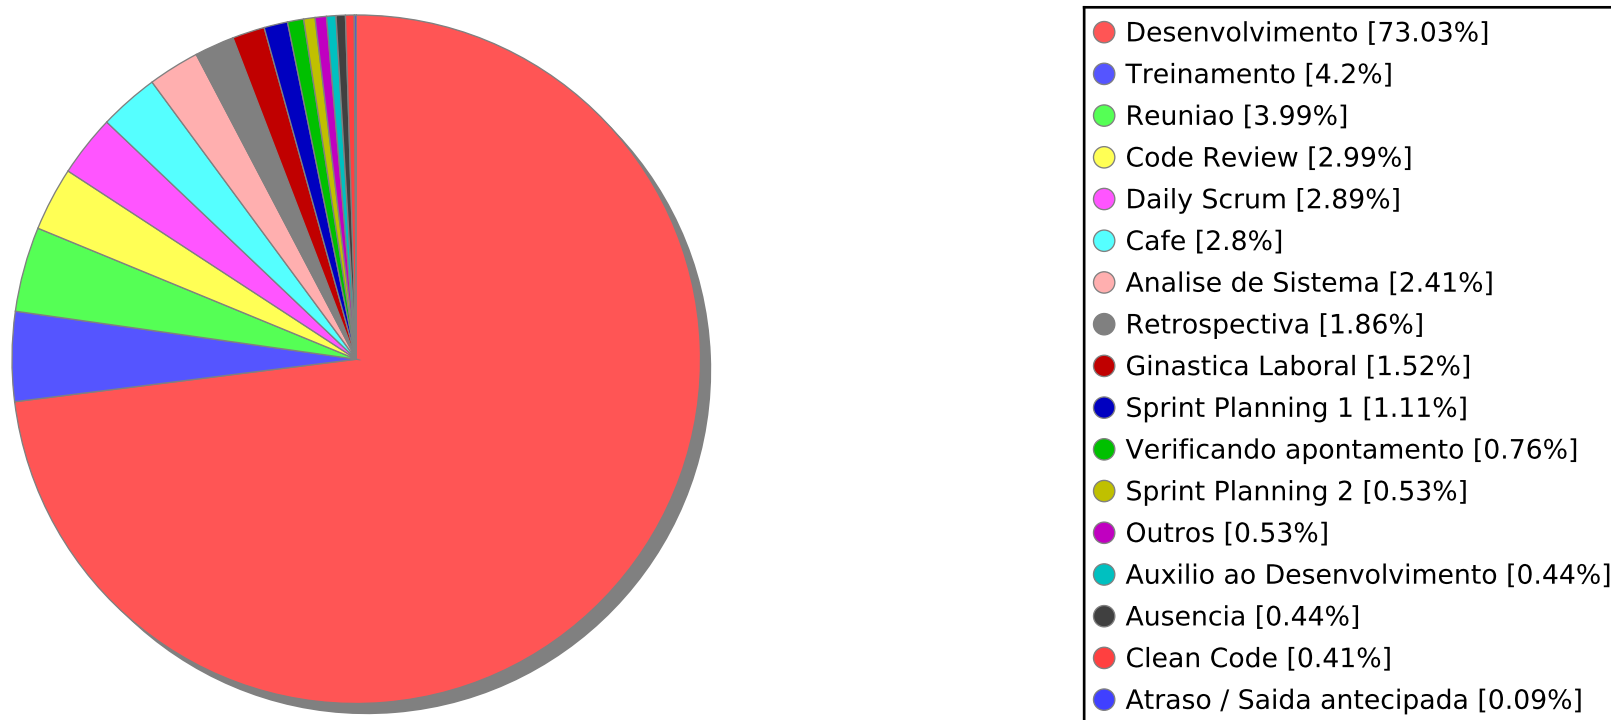

HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	159,08	148,6	125,83	114,78	98	101,95	158,17	138,67	541,08	504	93,1 %
DIV - Diversos*	11,75	10,07	9	19,72	8,17	7,28	10,92	17,4	39,84	54,47	136,7 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	19,25	13,12	14,75	7,33	12,75	10,17	19,25	14,53	66	45,15	68,4 %
REQM - Gestao de Requisitos	25,25	13,08	22,25	17,85	21,5	15,18	25,25	7,62	94,25	53,73	57,0 %
CM - Gerencia de Configuracao	2	0,5	1,5	5,58	1,5	1	2,5	0	7,5	7,08	94,4 %
PP - Planejamento de Projeto	0,25	0,52	0,25	0	0,25	0	1,5	0	2,25	0,52	23,1 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0,0 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	217,58	202,89	173,58	165,26	142,17	135,58	217,59	178,22	750,92	681,95	90,8 %

% de Horas por Área do CMMI

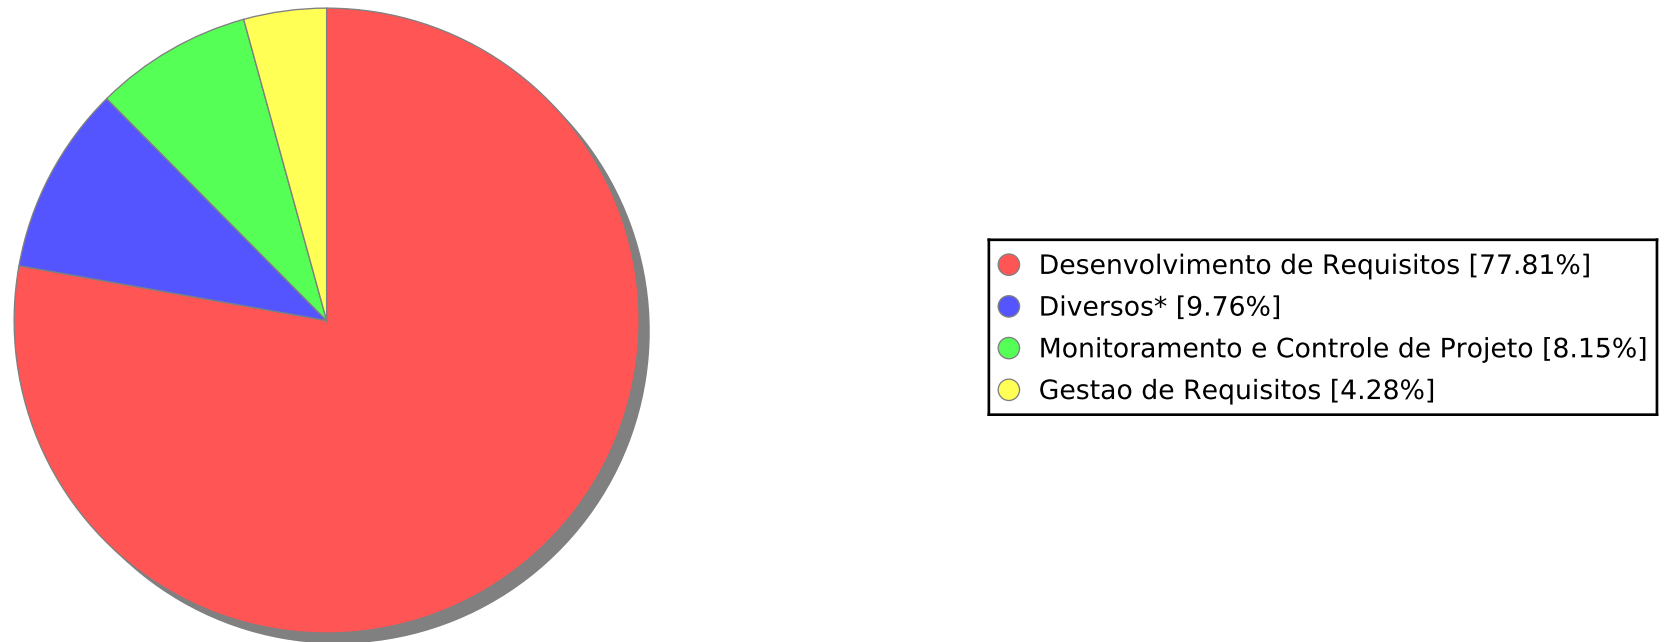


INDICADORES DO PROJETO


	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
01. Horas planejadas de todas atividades	940h00m	1056h00m	936h00m	784h00m	1008h04m	896h00m	880h00m	760h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	985h41m	1295h54m	966h57m	925h30m	1031h42m	1019h12m	929h52m	715h22m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	799h55m	847h05m	752h40m	636h35m	834h25m	764h55m	750h20m	636h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	739h03m	879h23m	710h18m	702h06m	859h55m	760h44m	742h31m	549h56m
05. Pontos planejados para o projeto	252,0	267,0	238,0	200,0	0,0	240,0	240,0	204,0
06. Pontos planejados	226,0	292,0	246,5	239,5	286,0	244,0	199,5	251,5
07. Pontos entregues	247	294	225,5	229	283	257	256	184,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	201,00	216,00	147,50	186,50	244,00	205,00	209,00	139,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	46,00	78,00	78,00	42,50	39,00	52,00	47,00	45,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	0	2	2	2	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	44	57	55	35	48	45	55	33
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	25	35	43	28	34	33	36	22
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	1	1	1	1	1	0	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	1h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	3,5	1	7	2	1,5	0,5	0	3
16. Produtividade planejada	0,283	0,345	0,328	0,377	0,343	0,319	0,266	0,396
17. Produtividade realizada	0,335	0,335	0,318	0,327	0,330	0,338	0,345	0,336
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	98,1	110,2	94,8	114,5	0	107,1	106,7	90,5
19. % Pontos NP / Pontos entregues	18,7	26,6	34,6	18,6	13,8	20,3	18,4	24,4

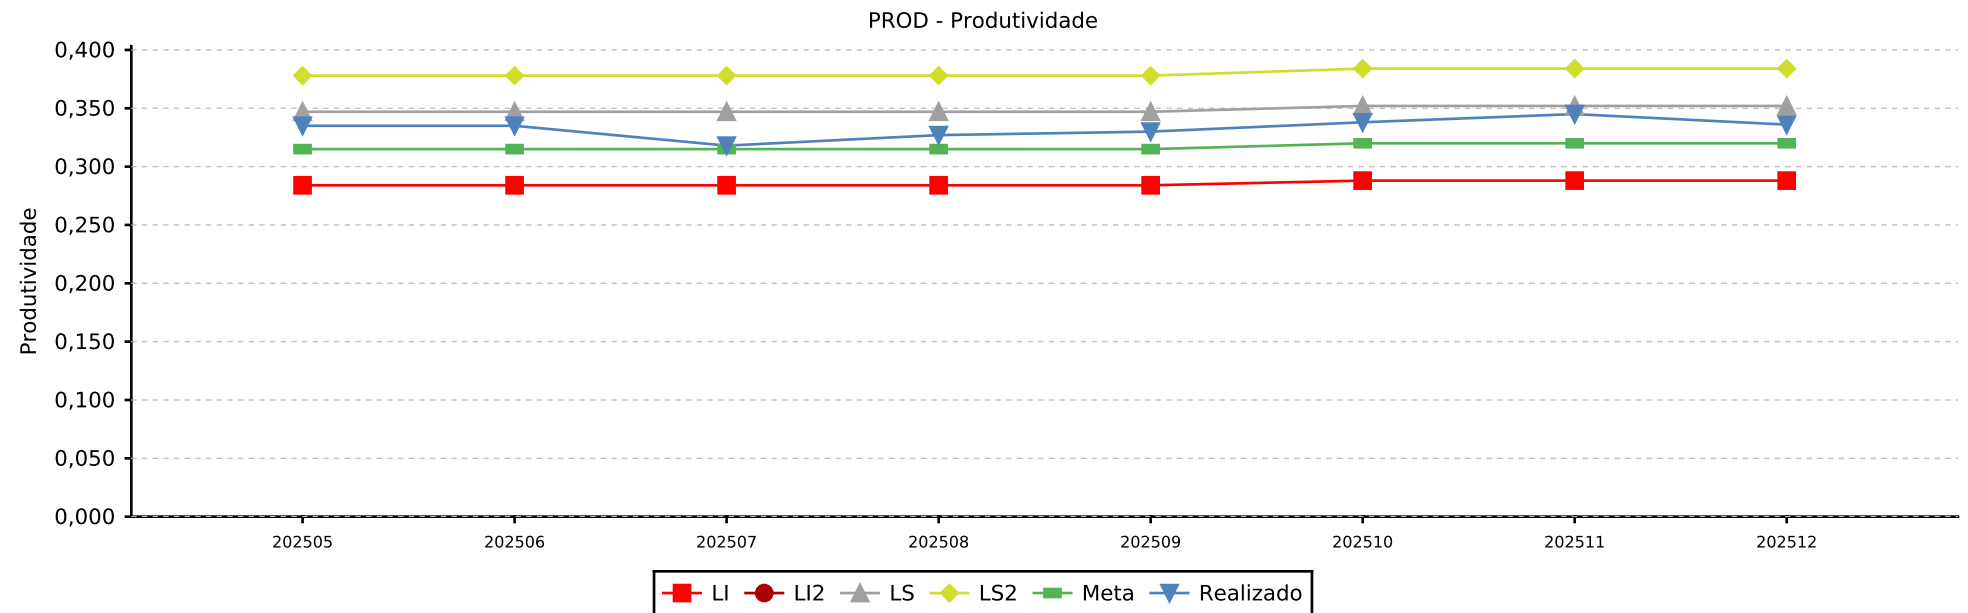


	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
Realizado	0,335	0,335	0,318	0,327	0,330	0,338	0,345	0,336
Meta	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,320	0,320	0,320
LS2	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,384	0,384	0,384
LS	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,352	0,352	0,352
LI2								
LI	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,288	0,288	0,288

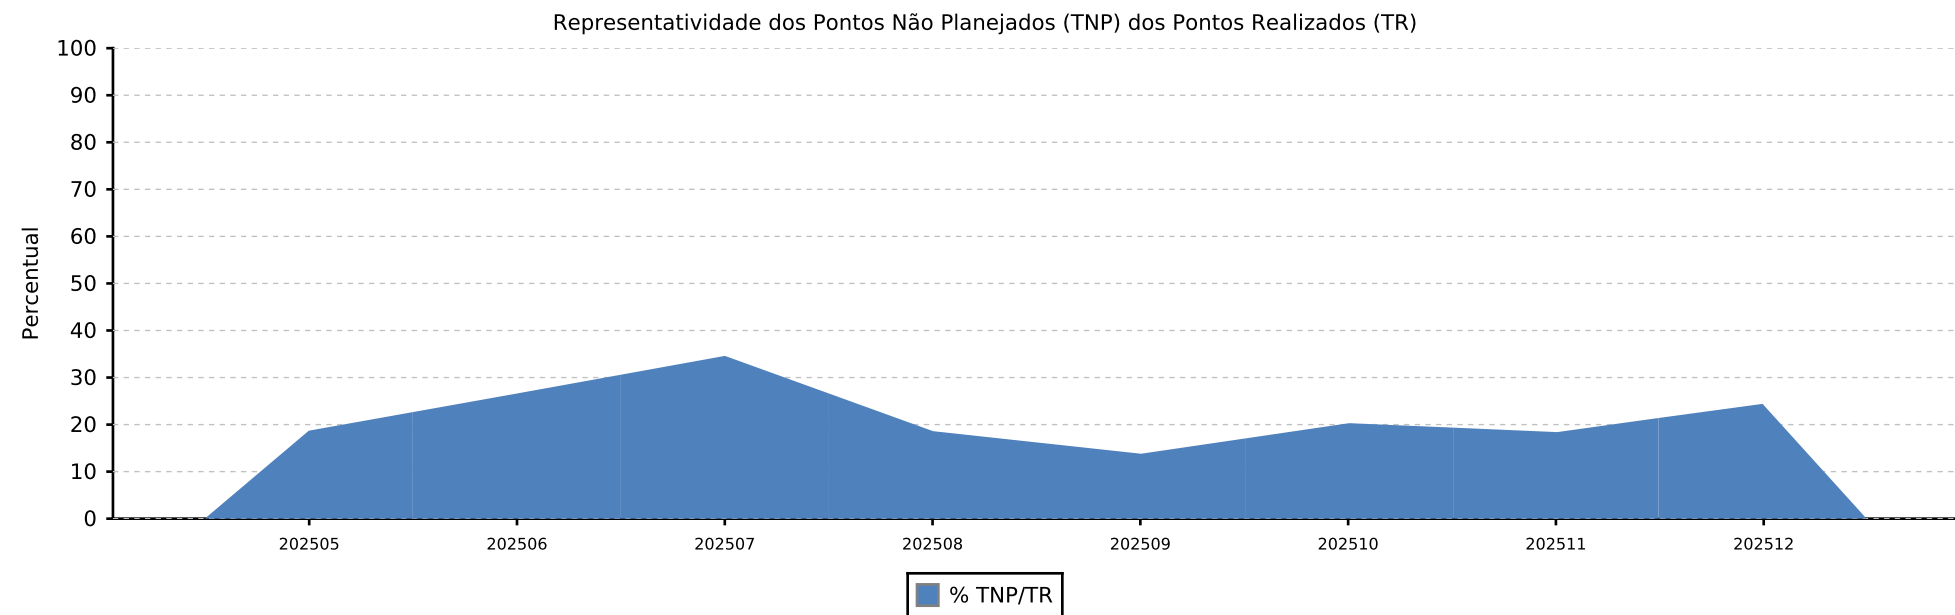


	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
TR - Pontos Realizados	247	294	225.5	229	283	257	256	184.5
TNP - Pontos Não Planejados	46	78	78	42.5	39	52	47	45
% TNP/TR	18,7	26,6	34,6	18,6	13,8	20,3	18,4	24,4

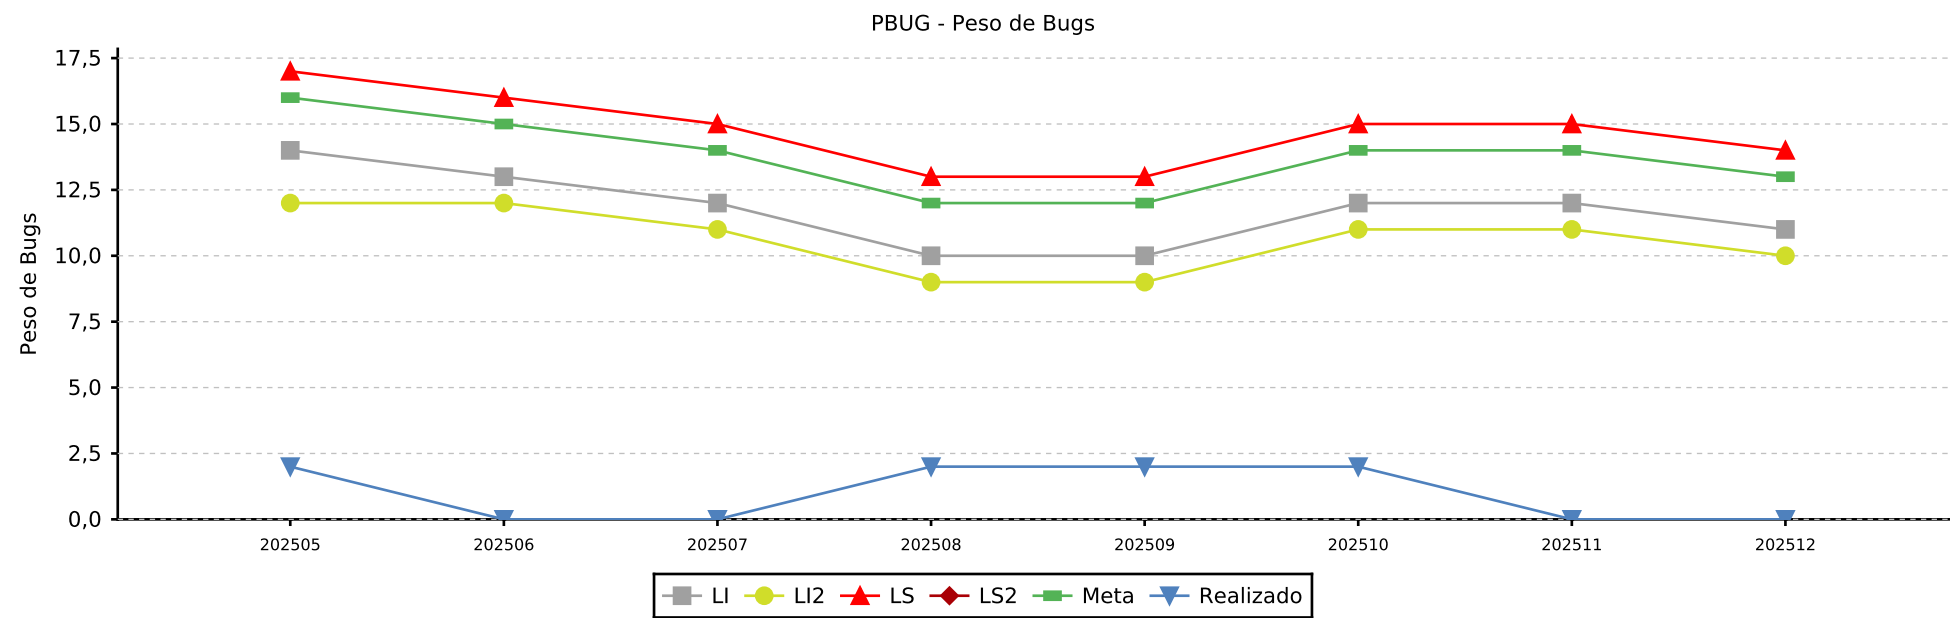

	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
Realizado	2	0	0	2	2	2	0	0
Meta	16	15	14	12	12	14	14	13
LS2								
LS	17	16	15	13	13	15	15	14
LI2	12	12	11	9	9	11	11	10
LI	14	13	12	10	10	12	12	11
Pontos Entregues	247	294	225.5	229	283	257	256	184.5
% PBUG / TR	0,81	0,00	0,00	0,88	0,71	0,78	0,00	0,00

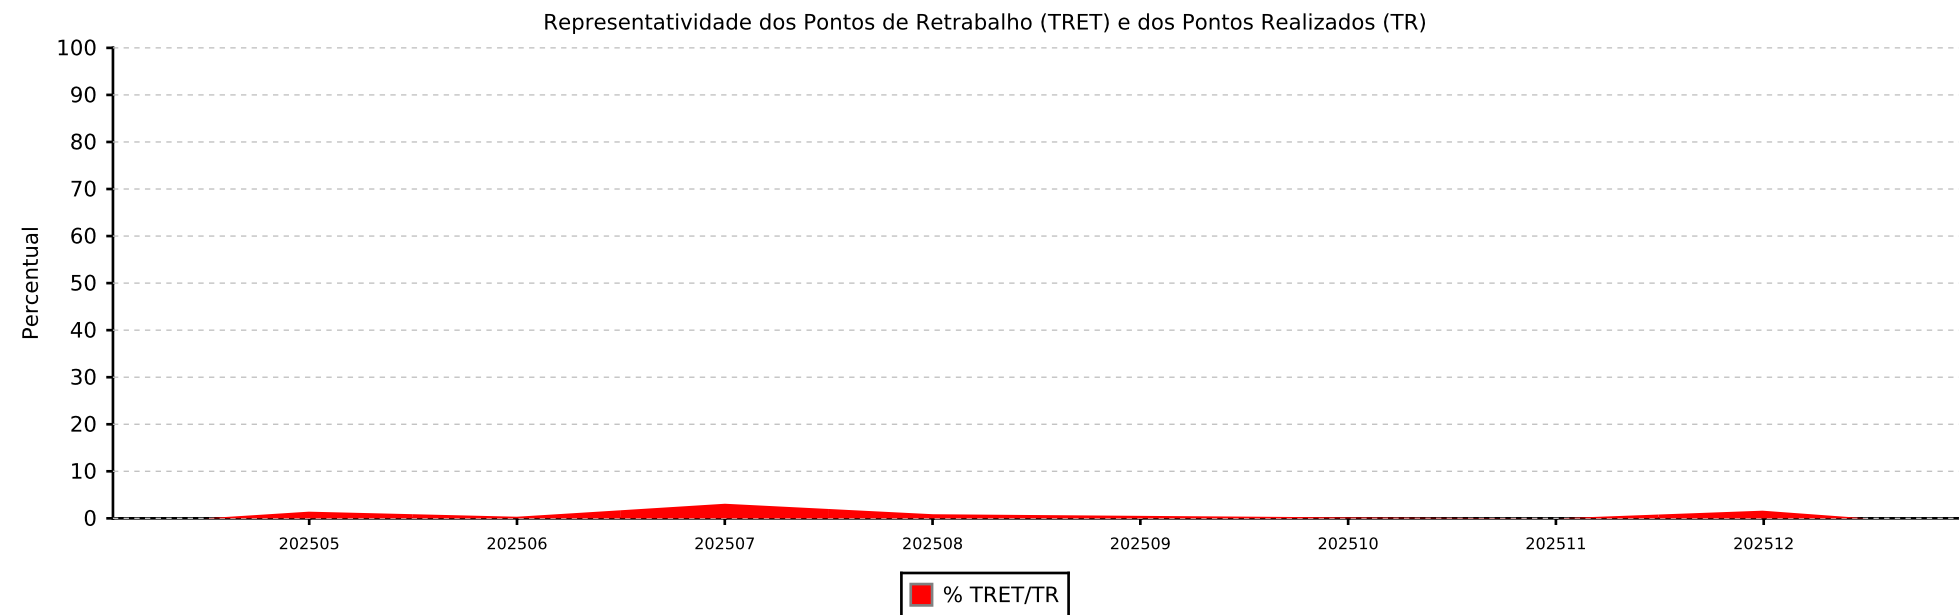


	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
TR - Pontos Realizados	247	294	225.5	229	283	257	256	184.5
TRET - Pontos de Retrabalho	3.5	1	7	2	1.5	0.5	0	3
% TRET/TR	1,4	0,3	3,1	0,9	0,5	0,2	0,0	1,6

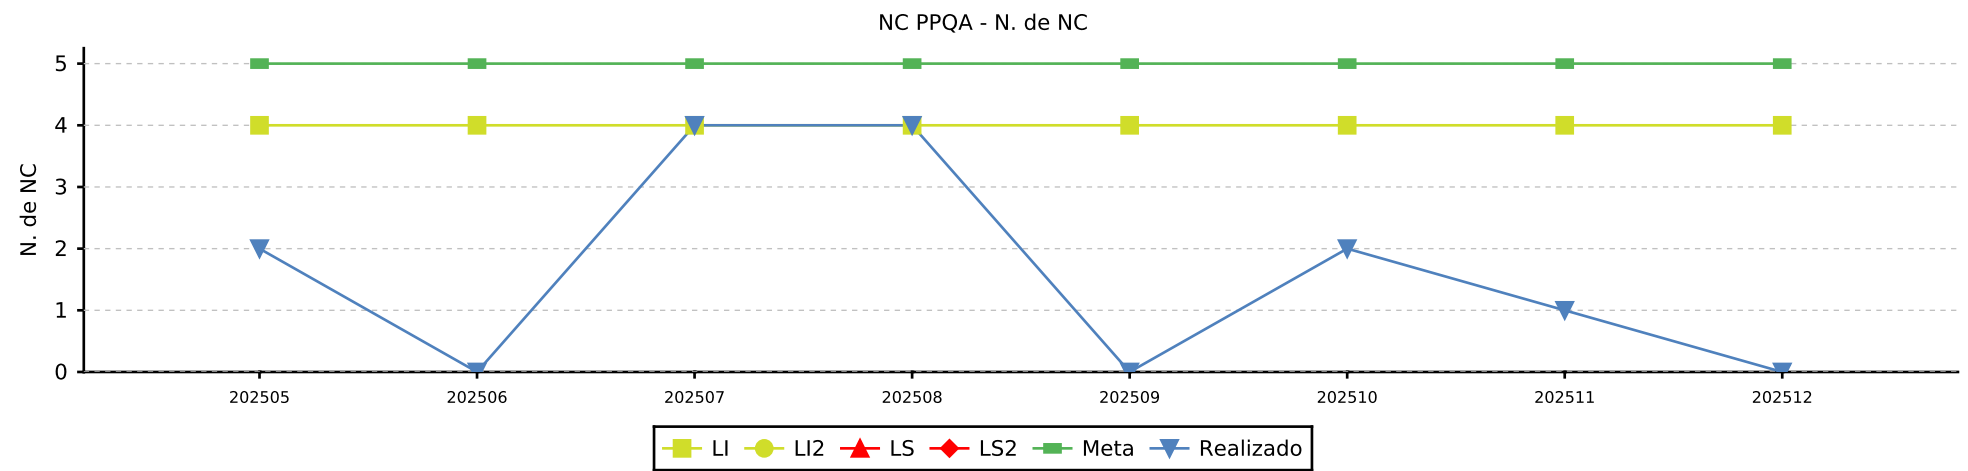


	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
Realizado	2	0	4	4	0	2	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

Ordens de Serviço Pontuadas

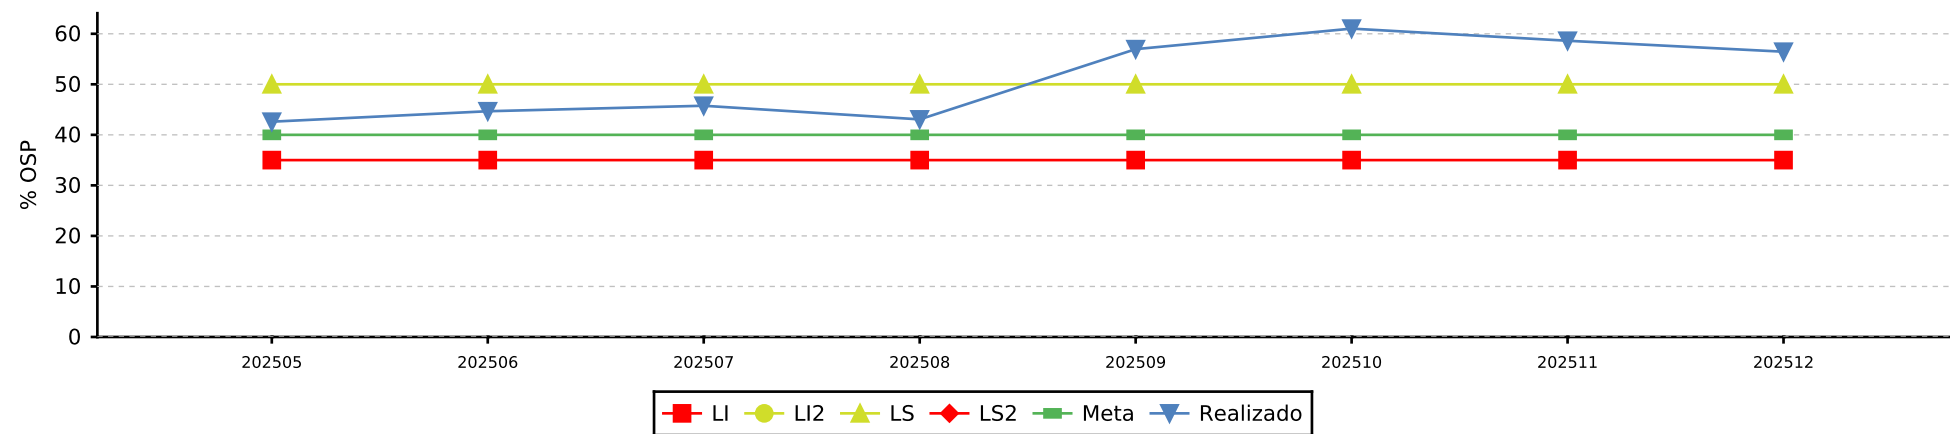

	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
Realizado	42.6	44.67	45.76	43.06	56.96	61.02	58.62	56.45
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

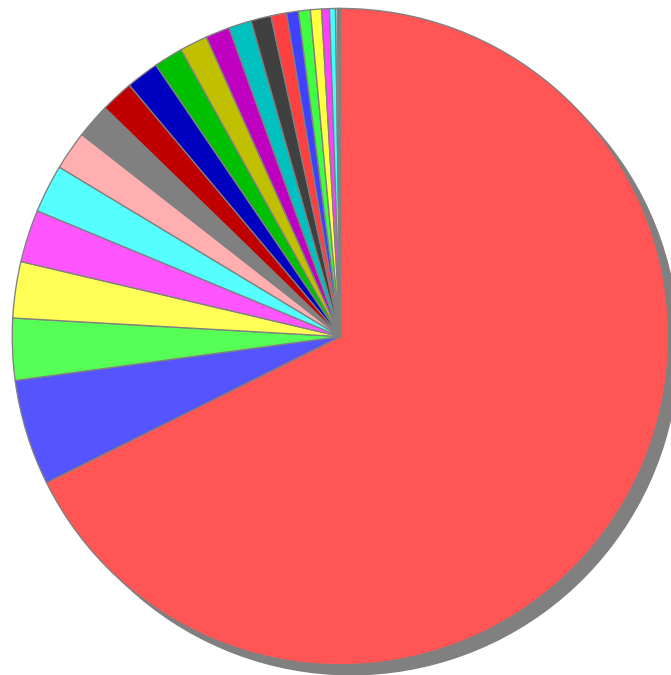

- Desenvolvimento [67.66%]
- Analise de Sistema [5.2%]
- Treinamento [3.04%]
- Daily Scrum [2.77%]
- Cafe [2.59%]
- Curso/Palestra [2.38%]
- Retrospectiva [1.92%]
- Reuniao [1.71%]
- Sprint Planning 1 [1.62%]
- Code Review [1.62%]
- Ginastica Laboral [1.43%]
- Correção de Erros Interno [1.37%]
- Atestado [1.19%]
- Ausencia [1.12%]
- Compilacao de sistemas [0.99%]
- Outros [0.77%]
- Clean Code [0.58%]
- Sprint Planning 2 [0.58%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.55%]
- Verificando apontamento [0.38%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.29%]
- Preparando ambiente [0.1%]
- Planejamento de Projeto [0.07%]
- Atraso / Saida antecipada [0.06%]

% de Horas por Área do CMMI

