

INDICADORES DA SPRINT

		202	406			202	407	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	256h00m	224h00m	264h00m	264h00m	308h00m	308h00m	308h00m	308h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	269h45m	271h45m	316h58m	324h32m	329h57m	318h57m	314h13m	309h56m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	216h40m	186h30m	224h15m	224h15m	262h45m	262h45m	262h45m	262h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	206h23m	182h43m	251h00m	258h28m	267h54m	247h55m	249h06m	256h41m
05. Pontos planejados	57,5	41,5	47,0	63,5	66,5	64,5	79,5	85,5
06. Pontos entregues	71	57	79,5	87	80,5	71,5	76	91
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	54,50	34,00	48,00	57,50	69,50	52,00	46,00	67,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	16,50	23,00	31,50	29,50	11,00	19,50	30,00	23,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	4	0	0	0	0	2
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	15	9	16	11	17	9	8	13
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	9	11	21	12	9	6	13	11
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	2	0	0	0	0	1
13. Horas de correção de bug	0h15m	0h00m	0h45m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	1	0	0	0	0	0,5
15. Produtividade planejada	0,266	0,223	0,210	0,284	0,254	0,246	0,303	0,326
16. Produtividade realizada	0,345	0,312	0,317	0,337	0,301	0,289	0,306	0,355
17. % Pontos NP / Pontos entregues	23,3	40,4	39,7	34	13,7	27,3	39,5	25,9

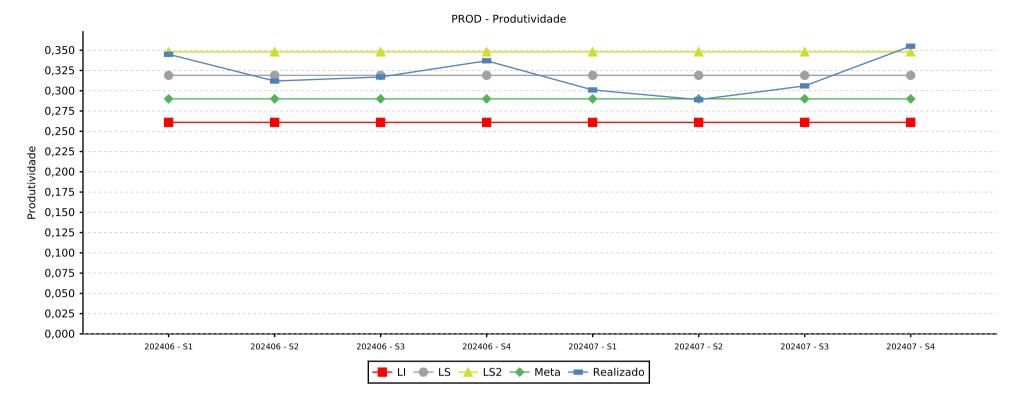


		202	406			202	407	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,345	0,312	0,317	0,337	0,301	0,289	0,306	0,355
Meta	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
LS2	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348
LS	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319
LI	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261

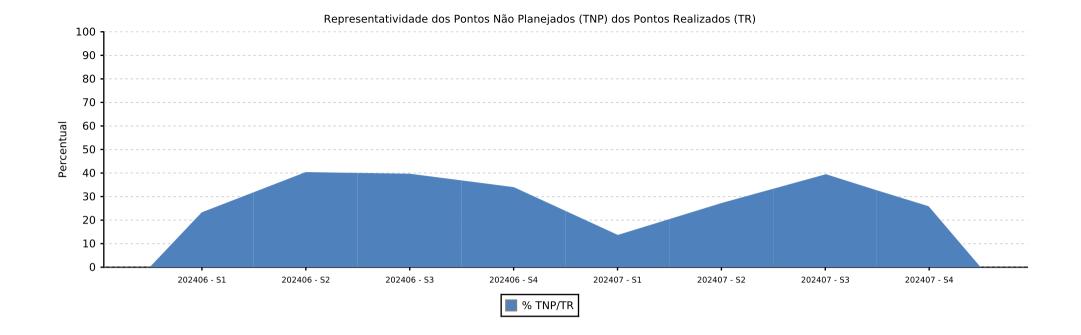


		202	406			202	407	
	1 2 3 4 1 2 3					3	4	
TR - Pontos Realizados	71	57	79.5	87	80.5	71.5	76	91
TNP - Pontos Não Planejados	16.5	23	31.5	29.5	11	19.5	30	23.5
% TNP/TR	23,3	40,4	39,7	34,0	13,7	27,3	39,5	25,9

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

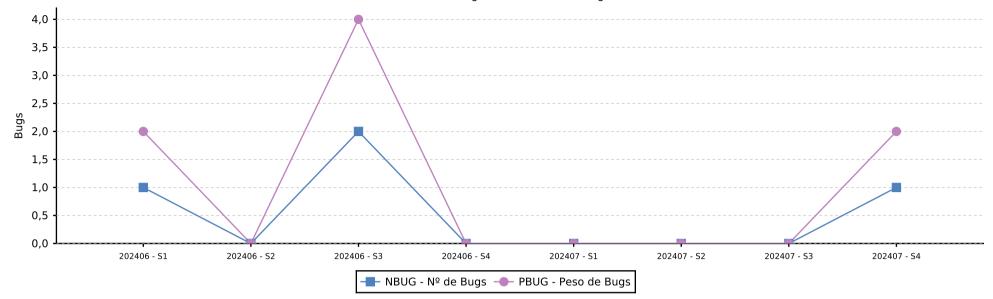

		202	406		202407				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	1	0	2	0	0	0	0	1	
PBUG - Peso de Bugs	2	0	4	0	0	0	0	2	
Pontos Entregues	71	57	79.5	87	80.5	71.5	76	91	
% PBUG / TR	2,82	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	

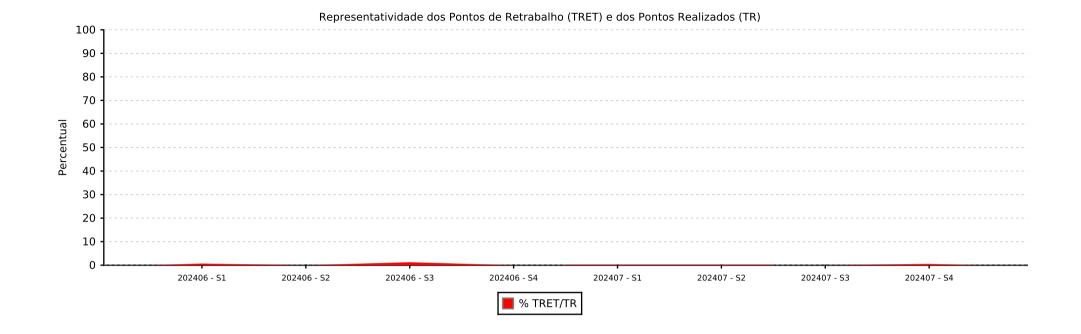


		202	406			202	407	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	71	57	79.5	87	80.5	71.5	76	91
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	1	0	0	0	0	0.5
% TRET/TR	0,7	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	217,67	233,68	217,67	214,17	217,67	220,2	215,25	219,13	868,26	887,18	102,2 %
Daily Scrum	14	10,87	14	7,52	14	11,52	14	13,17	56	43,08	76,9 %
Analise de Sistema	18,5	21,57	18,5	21,42	18,5	31,68	18,5	12,13	74	86,8	117,3 %
Correção de Erros Interno	2,75	1,08	2,75	0	2,75	0	2,75	11,03	11	12,11	110,1 %
Ausencia	0	13	0	15,83	0	6,33	0	9,87	0	45,03	0,0 %
Cafe	8,75	8,17	8,75	8,25	8,75	8,5	8,75	9,43	35	34,35	98,1 %
Code Review	5,25	2,13	5,25	4,13	5,25	1	5,25	7,57	21	14,83	70,6 %
Retrospectiva	7	5,83	7	5,17	7	2,33	7	6,42	28	19,75	70,5 %
Ginastica Laboral	5	4,5	5	4,17	5	4,58	5	4,12	20	17,37	86,9 %
Compilacao de sistemas	2,5	3,42	2,5	2,83	2,5	2,68	2,5	4,03	10	12,96	129,6 %
Reuniao	1	1	1	3,42	1	5	1	2,42	4	11,84	296,0 %
Sprint Planning 2	7	5,88	7	1,17	7	5,25	7	2,33	28	14,63	52,3 %
Planejamento de Projeto	0,25	1,07	0,25	0	0,25	0	2,17	2,1	2,92	3,17	108,6 %
Sprint Planning 1	10,5	8,17	10,5	4,67	10,5	7	10,5	2	42	21,84	52,0 %
Verificando apontamento	0,42	1,65	0,42	1,67	0,42	1,82	0,42	1,85	1,68	6,99	416,1 %
Atraso / Saida antecipada	0	4,7	0	2,3	0	0,6	0	0,92	0	8,52	0,0 %
Outros	1,17	1,33	1,17	1,07	1,17	1,17	1,17	0,67	4,68	4,24	90,6 %
Clean Code	1,75	0,92	1,75	0,33	1,75	0,5	1,75	0,5	7	2,25	32,1 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	0	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,25	2	1,75	87,5 %
Curso/Palestra	0	0	0	2,75	0	0	0	0	0	2,75	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0,2	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,33	0	1,33	0	1,33	0	1,33	0	5,32	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	0,4	0,5	14,9	0,5	2,3	0,5	0	2	17,6	880,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0,58	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	2	0	2	2	2	1,25	2	0	8	3,25	40,6 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	308,01	329,95	308,01	318,97	308,01	314,21	308,01	309,94	1.232,04	1.273,07	103,3 %

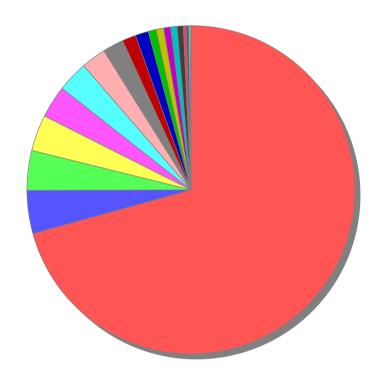

- Desenvolvimento [70.7%]
- Daily Scrum [4.25%]
- Analise de Sistema [3.91%]
- O Correção de Erros Interno [3.56%]
- Ausencia [3.18%]
- Cafe [3.04%]
- Code Review [2.44%]
- Retrospectiva [2.07%]
- Ginastica Laboral [1.33%]
- Compilacao de sistemas [1.3%]
- Reuniao [0.78%]
- Sprint Planning 2 [0.75%]
- Planejamento de Projeto [0.68%]
- Sprint Planning 1 [0.65%]
- Verificando apontamento [0.6%]
- Atraso / Saida antecipada [0.3%]
- Outros [0.22%]
- Clean Code [0.16%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [0.08%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	224,67	236,08	224,67	230,6	224,67	223,5	222,25	230,92	896,26	921,1	102,8 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	26,25	18,83	26,25	16,82	26,25	14,85	26,25	27,15	105	77,65	74,0 %
DIV - Diversos*		15,92	28	15,92	32,73	15,92	25,58	15,92	26,5	63,68	112,81	177,2 %
REQM - Gestao de Requisitos		38	36,2	38	29,25	38	45,18	38	16,47	152	127,1	83,6 %
CM - Gerencia de Configuração		2,5	3,42	2,5	2,83	2,5	2,68	3	4,03	10,5	12,96	123,4 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	1,07	0,25	0	0,25	0	2,17	2,1	2,92	3,17	108,6 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	2,75	0	0	0	0	0	2,75	0,0 %
	Total Geral	307,59	323,6	307,59	314,98	307,59	311,79	307,59	307,17	1.230,36	1.257,54	102,2 %

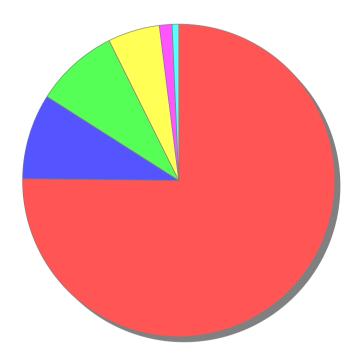


- Desenvolvimento de Requisitos [75.18%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [8.84%]
- Diversos* [8.63%]
- Gestao de Requisitos [5.36%]
- Gerencia de Configuracao [1.31%]
- Planejamento de Projeto [0.68%]

INDICADORES DO PROJETO


	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
01. Horas planejadas de todas atividades	442h24m	545h36m	591h12m	704h00m	1176h00m	1002h24m	1008h00m	1232h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	496h21m	560h42m	673h10m	778h03m	1138h29m	996h30m	1183h00m	1273h03m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	363h19m	471h46m	509h07m	621h00m	1001h20m	848h04m	851h40m	1051h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	375h49m	461h52m	477h30m	539h30m	927h28m	752h37m	898h34m	1021h36m
05. Pontos planejados para o projeto	117,0	146,0	158,0	191,0	207,0	245,0	247,0	305,0
06. Pontos planejados	123,5	161,0	179,0	197,5	247,0	192,5	209,5	296,0
07. Pontos entregues	133	151,5	153,5	178	304	234	294,5	319
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	91,50	131,50	117,50	112,50	262,50	170,00	194,00	235,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	41,50	20,00	36,00	65,50	41,50	64,00	100,50	84,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	8	3	4	2	6	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	24	35	35	24	50	42	51	47
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	28	14	22	38	25	34	53	39
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	4	2	2	1	3	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	3h22m	1h10m	0h00m	0h00m	1h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	0	3	8	3,5	2,5	1,5	0,5
16. Produtividade planejada	0,340	0,342	0,352	0,319	0,247	0,227	0,246	0,282
17. Produtividade realizada	0,354	0,329	0,322	0,330	0,328	0,311	0,328	0,313
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	113,7	103,8	97,2	93,2	146,9	95,6	119,3	104,6
19. % Pontos NP / Pontos entregues	31,3	13,3	23,5	36,8	13,7	27,4	34,2	26,4

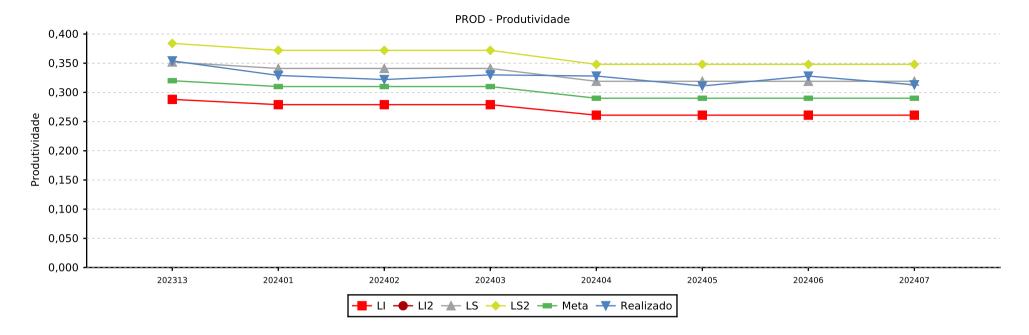


	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
Realizado	0,354	0,329	0,322	0,330	0,328	0,311	0,328	0,313
Meta	0,320	0,310	0,310	0,310	0,290	0,290	0,290	0,290
LS2	0,384	0,372	0,372	0,372	0,348	0,348	0,348	0,348
LS	0,352	0,341	0,341	0,341	0,319	0,319	0,319	0,319
LI2								
LI	0,288	0,279	0,279	0,279	0,261	0,261	0,261	0,261

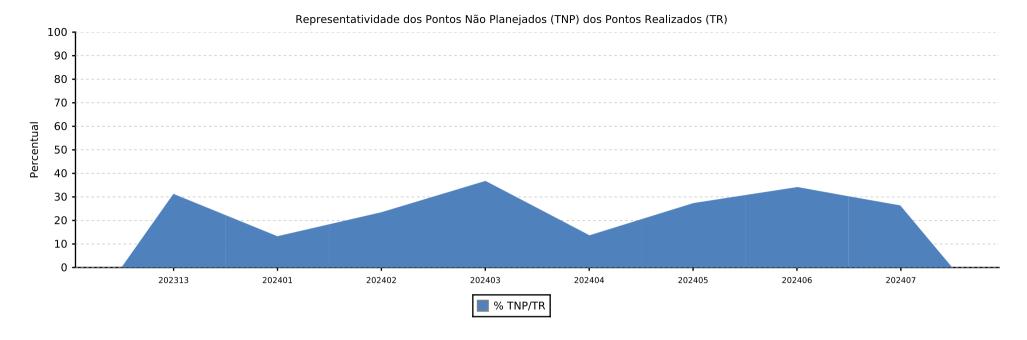


	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
TR - Pontos Realizados	133	151.5	153.5	178	304	234	294.5	319
TNP - Pontos Não Planejados	41.5	20	36	65.5	41.5	64	100.5	84
% TNP/TR	31,3	13,3	23,5	36,8	13,7	27,4	34,2	26,4

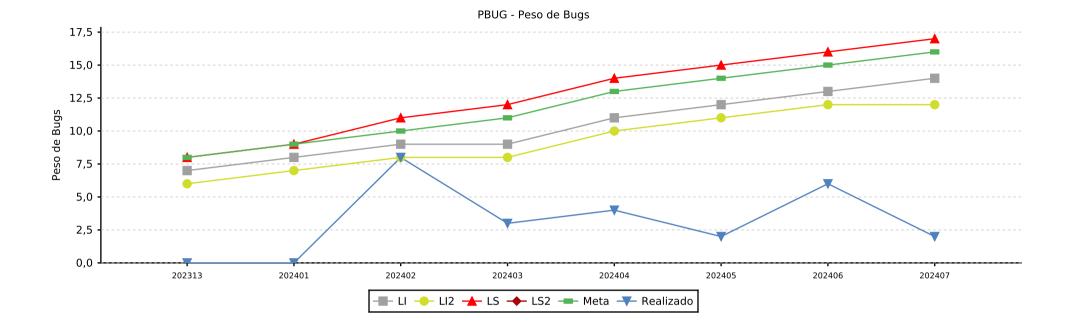


	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
Realizado	0	0	8	3	4	2	6	2
Meta	8	9	10	11	13	14	15	16
LS2								
LS	8	9	11	12	14	15	16	17
LI2	6	7	8	8	10	11	12	12
LI	7	8	9	9	11	12	13	14
Pontos Entregues	133	151.5	153.5	178	304	234	294.5	319
% PBUG / TR	0,00	0,00	5,22	1,69	1,32	0,86	2,04	0,63

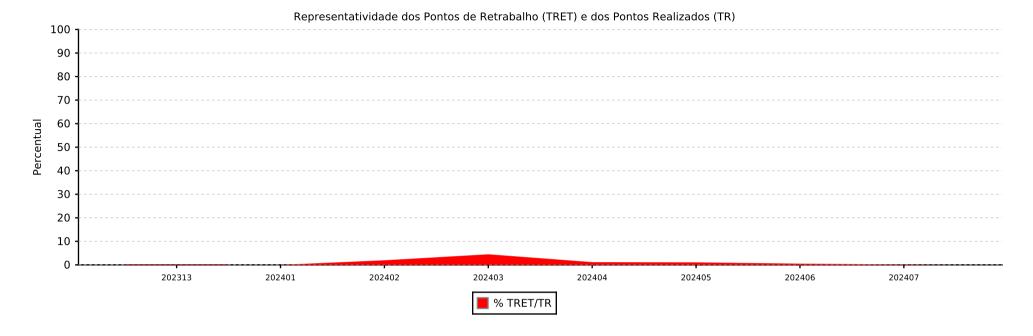


	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
TR - Pontos Realizados	133	151.5	153.5	178	304	234	294.5	319
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	3	8	3.5	2.5	1.5	0.5
% TRET/TR	0,0	0,0	2,0	4,5	1,2	1,1	0,5	0,2

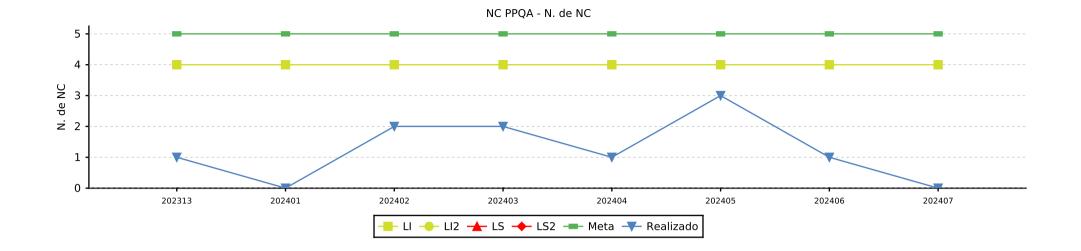


	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
Realizado	1	0	2	2	1	3	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

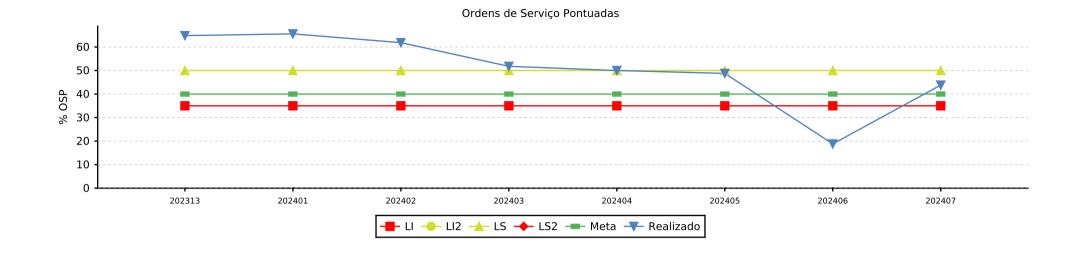

	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
Realizado	64.84	65.59	61.86	51.79	50	48.78	18.8	43.81
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

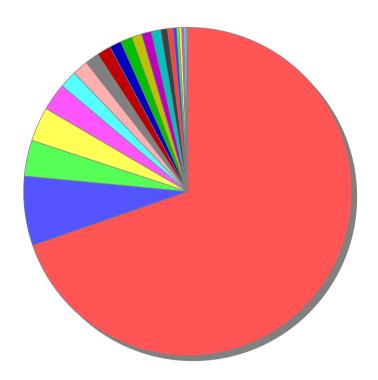

- Desenvolvimento [69.69%]
- Analise de Sistema [6.82%]
- Ausencia [3.54%]
- Daily Scrum [3.38%]
- Cafe [2.7%]
- Sprint Planning 1 [1.71%]
- Retrospectiva [1.55%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.38%]
- Ginastica Laboral [1.36%]
- Code Review [1.16%]
- Sprint Planning 2 [1.15%]
- Compilacao de sistemas [1.02%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.95%]
- Reuniao [0.93%]
- Atraso / Saida antecipada [0.67%]
- Verificando apontamento [0.55%]
- Outros [0.33%]
- Sizing [0.26%]
- Planejamento de Projeto [0.25%]
- Curso/Palestra [0.22%]
- Clean Code [0.18%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.14%]
- Preparando ambiente [0.05%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.02%]

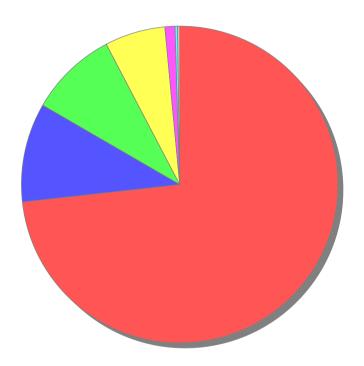

- Desenvolvimento de Requisitos [72.35%]
- Gestao de Requisitos [9.98%]
- Diversos* [8.86%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.1%]
- Gerencia de Configuracao [1.02%]
- Planejamento de Projeto [0.25%]
- Treinamento na Organizacao [0.22%]
