



INDICADORES DA SPRINT


	202512				202513			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	176h00m	144h00m	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m	156h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	218h34m	171h19m	137h48m	227h41m	222h51m	218h10m	216h58m	195h35m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	185h10m	147h25m	117h35m	186h00m	185h10m	186h00m	185h10m	129h50m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	164h27m	121h32m	113h17m	150h40m	172h00m	180h08m	160h54m	108h10m
05. Pontos planejados	66,0	55,5	62,0	68,0	65,0	53,5	37,5	58,0
06. Pontos entregues	55,5	38,5	39	52	55,5	58	53,5	37,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	46,00	19,00	35,00	40,00	43,00	41,50	41,00	33,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	9,50	19,50	4,00	12,00	12,50	16,50	12,50	4,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	2	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	10	6	7	11	11	14	12	17
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	5	9	5	3	9	16	8	4
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	1	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	3	1	1	0	0
15. Produtividade planejada	0,357	0,377	0,528	0,366	0,352	0,288	0,203	0,447
16. Produtividade realizada	0,338	0,317	0,345	0,346	0,323	0,322	0,333	0,347
17. % Pontos NP / Pontos entregues	17,2	50,7	10,3	23,1	22,6	28,5	23,4	10,7

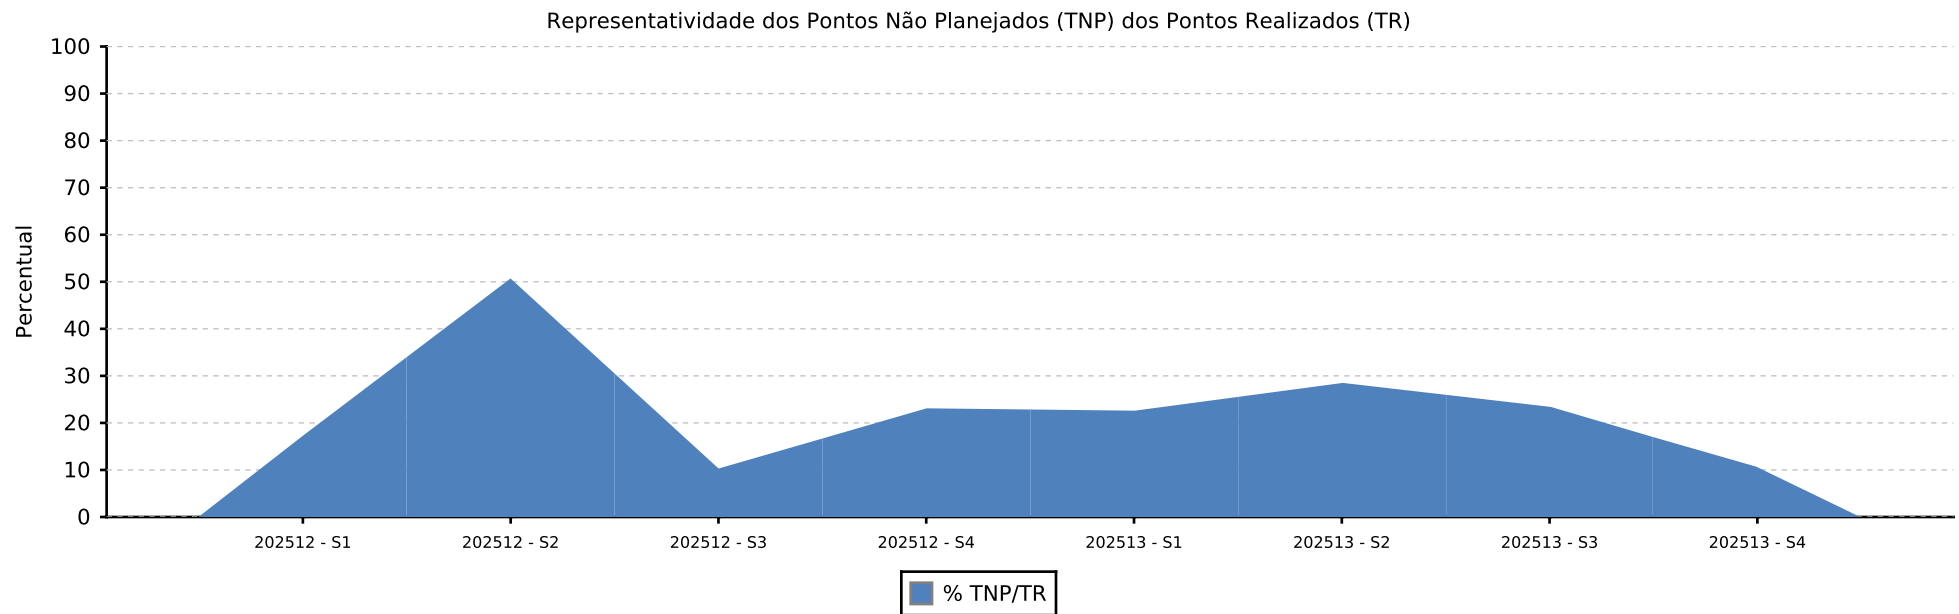

	202512				202513			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	55.5	38.5	39	52	55.5	58	53.5	37.5
TNP - Pontos Não Planejados	9.5	19.5	4	12	12.5	16.5	12.5	4
% TNP/TR	17,2	50,7	10,3	23,1	22,6	28,5	23,4	10,7

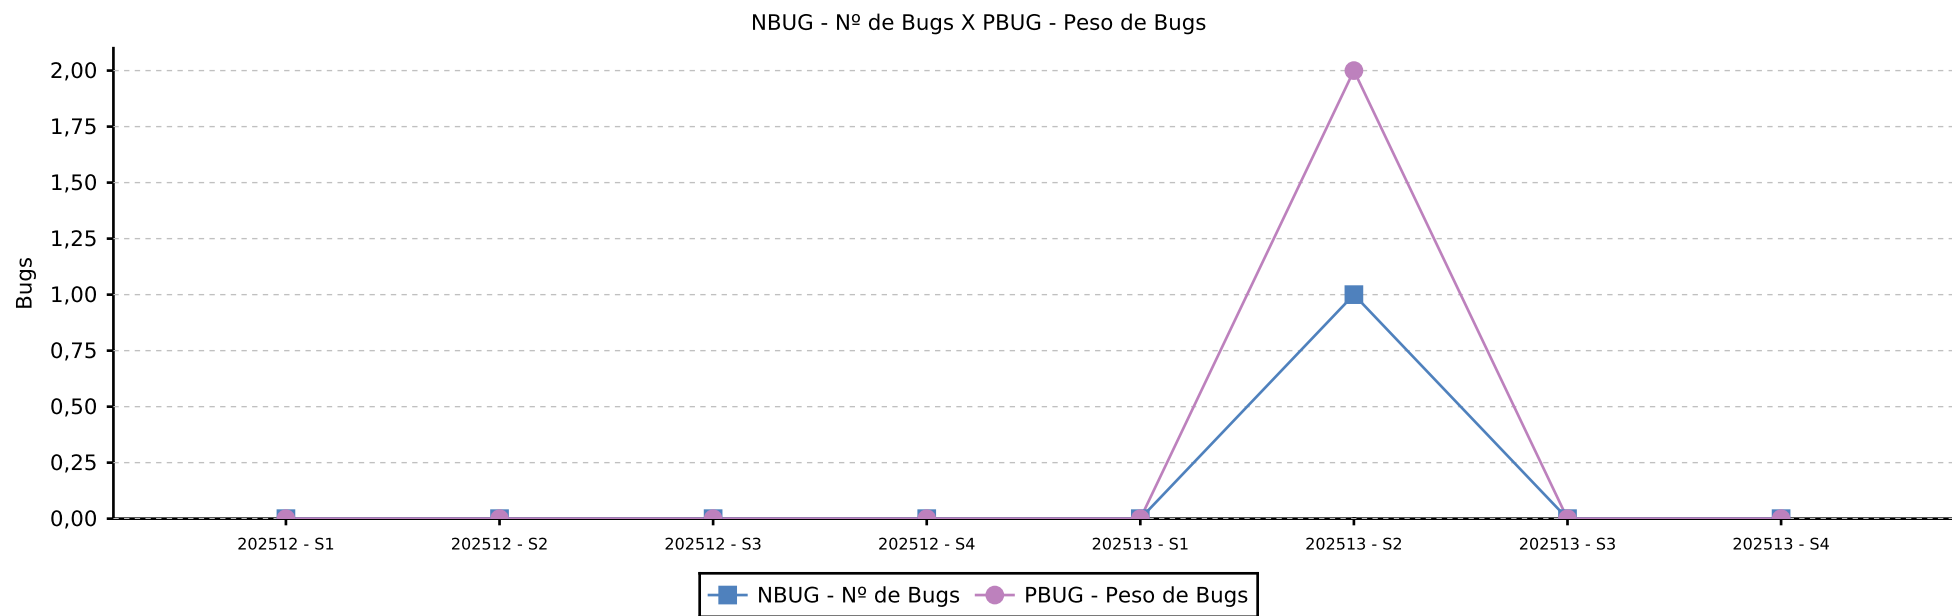

	202512				202513			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	1	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	2	0	0
Pontos Entregues	55.5	38.5	39	52	55.5	58	53.5	37.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00

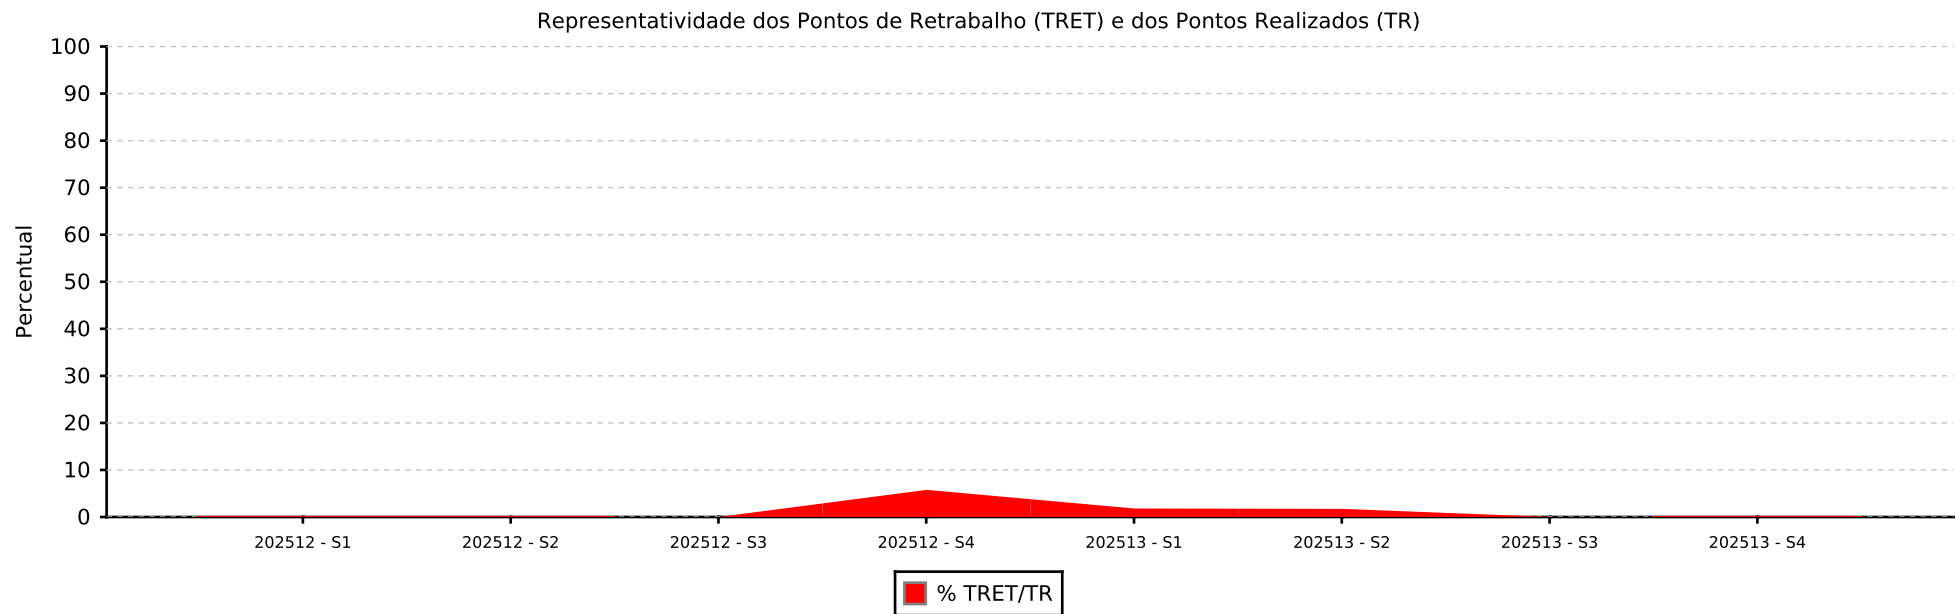



	202512				202513			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	55.5	38.5	39	52	55.5	58	53.5	37.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	3	1	1	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	5,8	1,8	1,7	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

Atividade	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
Desenvolvimento	153	156,42	153,83	157,63	153	138,23	100,58	94,5	560,41	546,78	97,6 %
Análise de Sistema	11,75	9,75	11,75	15	11,75	11,17	9	30,23	44,25	66,15	149,5 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26	0,0 %
Ausencia	0	5	0	3,15	0	3,3	0	9,92	0	21,37	0,0 %
Daily Scrum	10	7,25	10	8,5	10	7,33	6	5	36	28,08	78,0 %
Code Review	4,25	5,38	4,25	3,5	4,25	8,83	3,25	4,83	16	22,54	140,9 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	0	0,5	0	0,5	1,92	0,5	4	2	5,92	296,0 %
Cafe	6,25	4,75	6,25	5,5	6,25	6	4,25	3,75	23	20	87,0 %
Retrospectiva	5	3,33	5	6	5	5	5	2,92	20	17,25	86,2 %
Sprint Planning 1	7	2,67	7	3,75	7	4,17	7	2,58	28	13,17	47,0 %
Ginastica Laboral	3,33	3,18	3,33	3,5	3,33	3,35	2,33	2,5	12,32	12,53	101,7 %
Compilacao de sistemas	2	5,67	2	1,62	2	6,17	2	2,5	8	15,96	199,5 %
Sprint Planning 2	4,5	0,75	4,5	2,92	4,5	2,5	4,5	1,67	18	7,84	43,6 %
Preparando ambiente	0	0	0	0,25	0	2,5	0	1,35	0	4,1	0,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	1	0,25	0	0,25	0	1,5	1,33	2,25	2,33	103,6 %
Treinamento	2	4,92	2	1,5	2	4,08	1	1,17	7	11,67	166,7 %
Reuniao	1	0	1	2,5	1	3,5	1	1	4	7	175,0 %
Verificando apontamento	0,42	0,33	0,42	0,42	0,42	0,42	0,33	0,17	1,59	1,34	84,3 %
Clean Code	1,25	0,58	1,25	1,33	1,25	3,67	1,25	0,17	5	5,75	115,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,67	0	0,67	0	0,67	0	0,67	0	2,68	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	0	1	0	1	0	0,33	0	3,33	0	0,0 %

Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	1	0	0,17	1	1	2	0,17	0	2,34	3	128,2 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0 %
Correção de Erros Interno	2,5	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0	10	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,17	1,17	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	1,17	172,1 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	2	0	2	0	2	2,5	2	0	8	2,5	31,2 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,7	0	0,1	0	0,33	0	0	0	1,13	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220,01	222,85	220,01	218,17	220,01	216,97	156	195,59	816,03	853,58	104,6 %


% de Horas por Atividade

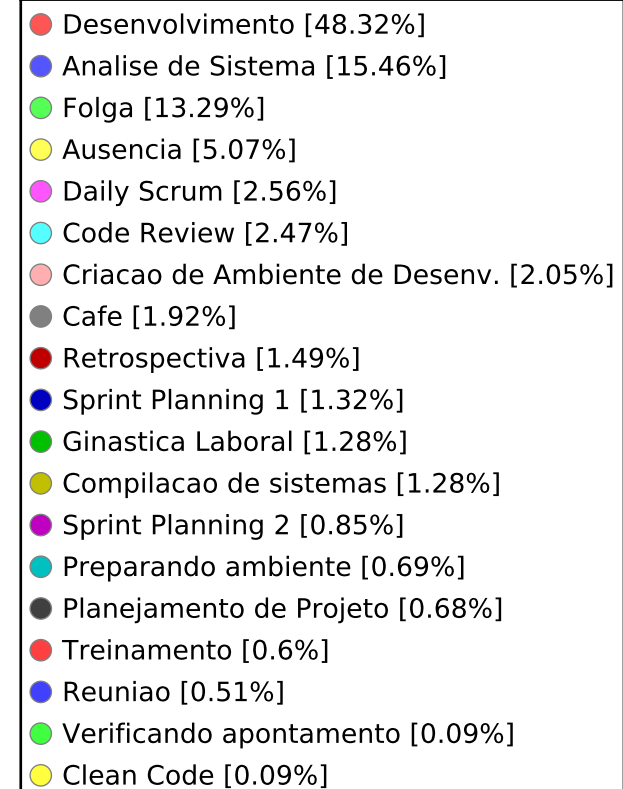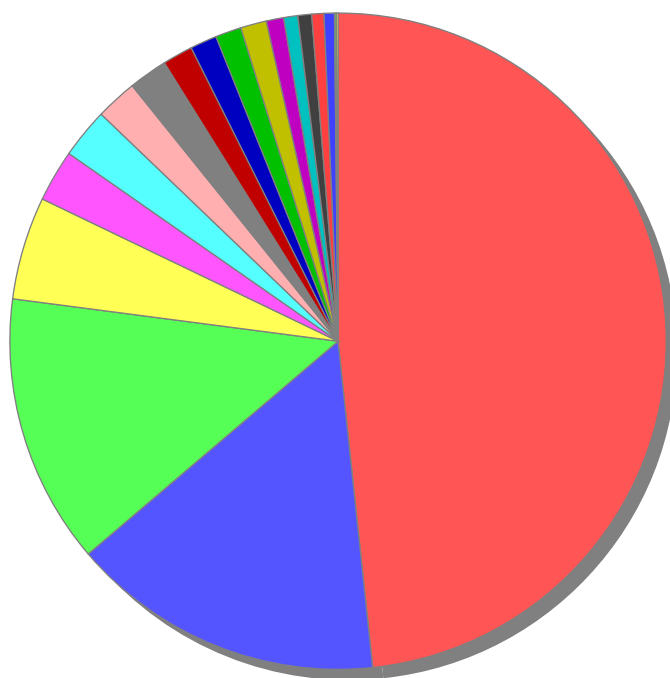

HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	159,08	157	159,92	158,97	159,08	143,82	106	98,67	584,08	558,46	95,6 %
REQM - Gestao de Requisitos	25,25	13,17	25,25	21,92	25,25	22,83	22,5	35,83	98,25	93,75	95,4 %
DIV - Diversos*	11,75	14,1	10,92	15,65	11,75	18,15	7,92	17,17	42,34	65,07	153,7 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	19,25	15,97	19,25	18	19,25	21,17	14,25	12,75	72	67,89	94,3 %
CM - Gerencia de Configuracao	2	5,67	2	1,62	2	6,17	2,5	2,5	8,5	15,96	187,8 %
PP - Planejamento de Projeto	0,25	1	0,25	0	0,25	0	1,5	1,33	2,25	2,33	103,6 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	217,58	206,91	217,59	216,16	217,58	212,14	154,67	168,25	807,42	803,46	99,5 %

% de Horas por Área do CMMI

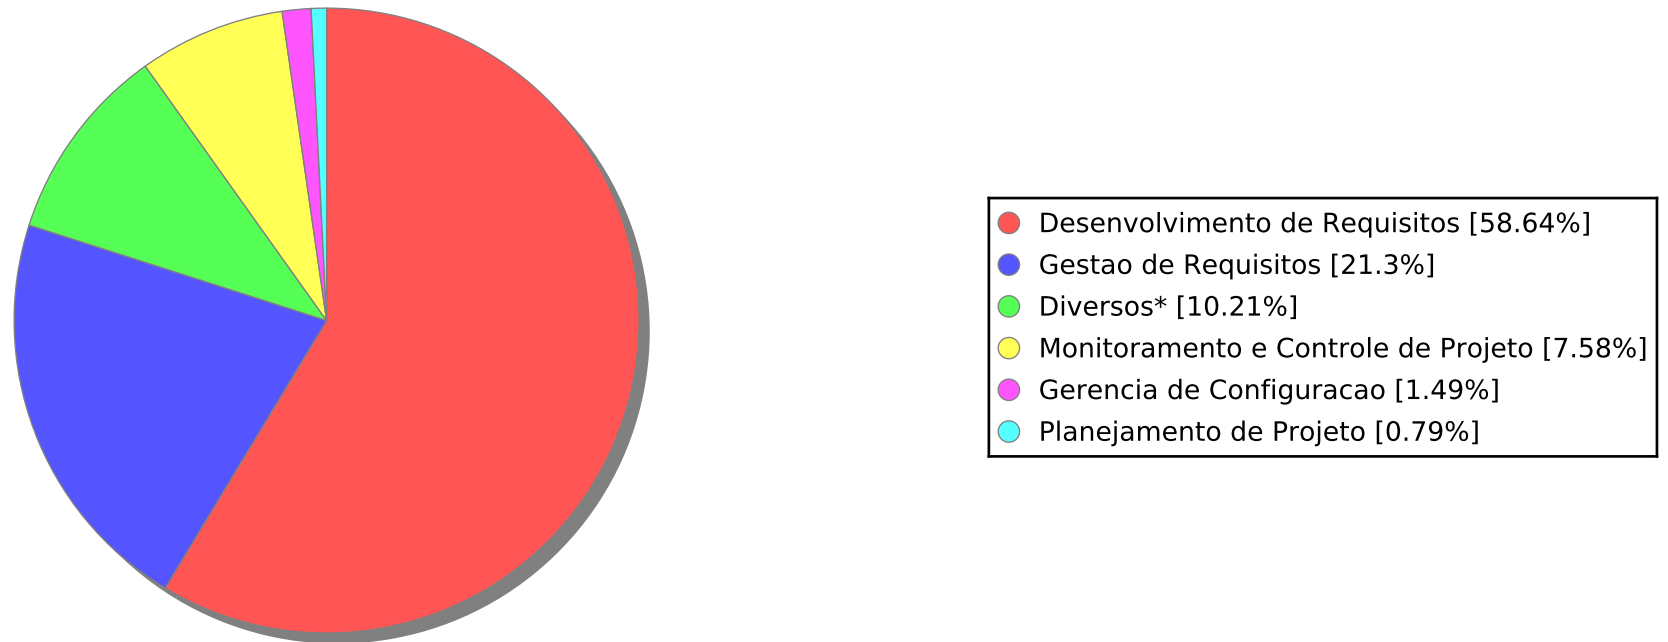


INDICADORES DO PROJETO


	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
01. Horas planejadas de todas atividades	1056h00m	936h00m	784h00m	1008h04m	896h00m	880h00m	760h00m	816h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1295h54m	966h57m	925h30m	1031h42m	1019h12m	929h52m	755h22m	853h34m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	847h05m	752h40m	636h35m	834h25m	764h55m	750h20m	636h10m	686h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	879h23m	710h18m	702h06m	859h55m	760h44m	742h31m	549h56m	621h12m
05. Pontos planejados para o projeto	267,0	238,0	200,0	0,0	240,0	240,0	204,0	220,0
06. Pontos planejados	292,0	246,5	239,5	286,0	244,0	199,5	251,5	214,0
07. Pontos entregues	294	225,5	229	283	257	256	185	204,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	216,00	147,50	186,50	244,00	205,00	209,00	140,00	159,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	78,00	78,00	42,50	39,00	52,00	47,00	45,00	45,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	2	2	2	0	0	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	57	55	35	48	45	55	34	54
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	35	43	28	34	33	36	22	37
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	1	1	1	1	0	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	1h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1	7	2	1,5	0,5	0	3	2
16. Produtividade planejada	0,345	0,328	0,377	0,343	0,319	0,266	0,396	0,312
17. Produtividade realizada	0,335	0,318	0,327	0,330	0,338	0,345	0,337	0,330
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	110,2	94,8	114,5	0	107,1	106,7	90,7	93
19. % Pontos NP / Pontos entregues	26,6	34,6	18,6	13,8	20,3	18,4	24,4	22,3

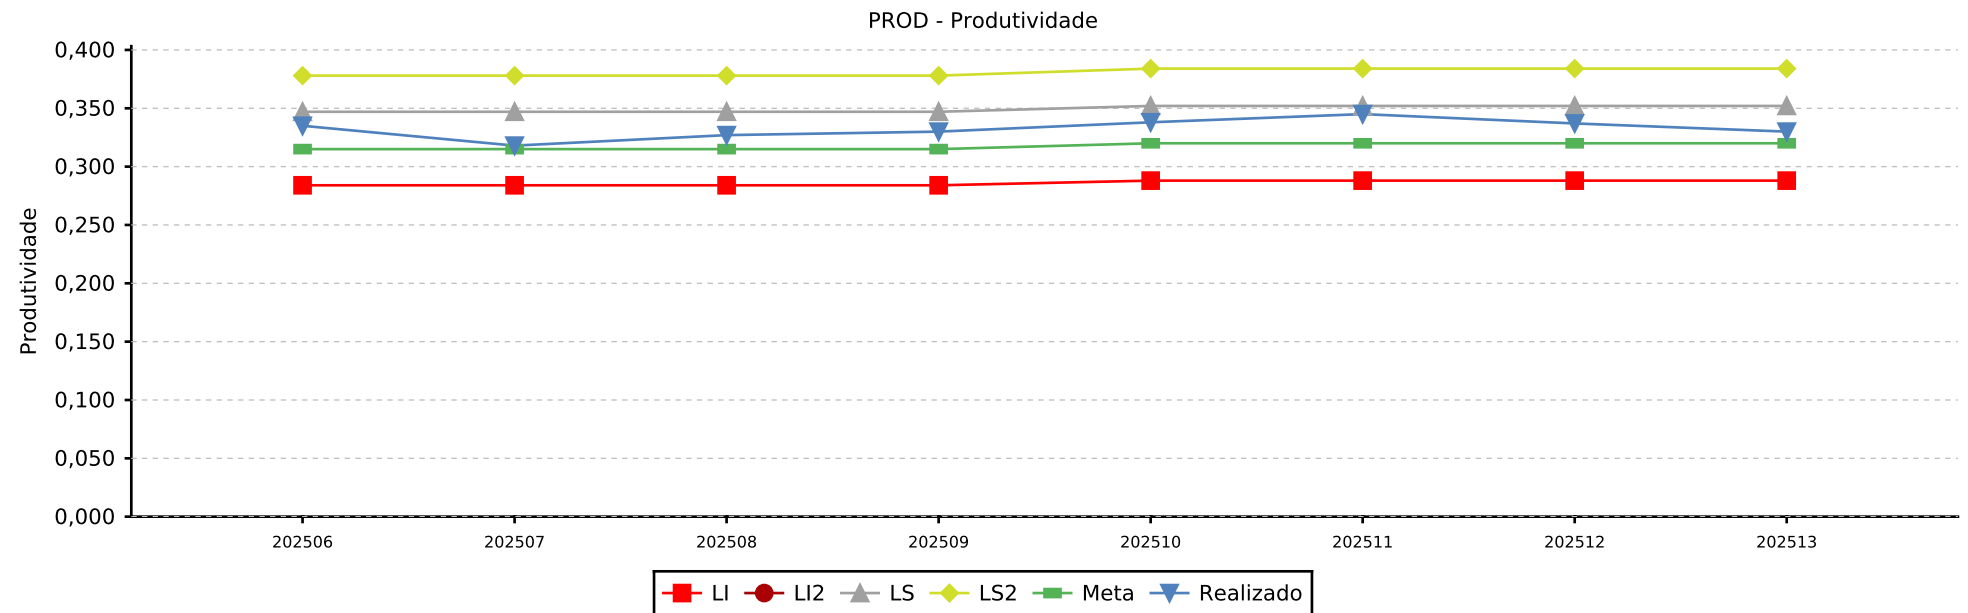


	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
Realizado	0,335	0,318	0,327	0,330	0,338	0,345	0,337	0,330
Meta	0,315	0,315	0,315	0,315	0,320	0,320	0,320	0,320
LS2	0,378	0,378	0,378	0,378	0,384	0,384	0,384	0,384
LS	0,347	0,347	0,347	0,347	0,352	0,352	0,352	0,352
LI2								
LI	0,284	0,284	0,284	0,284	0,288	0,288	0,288	0,288

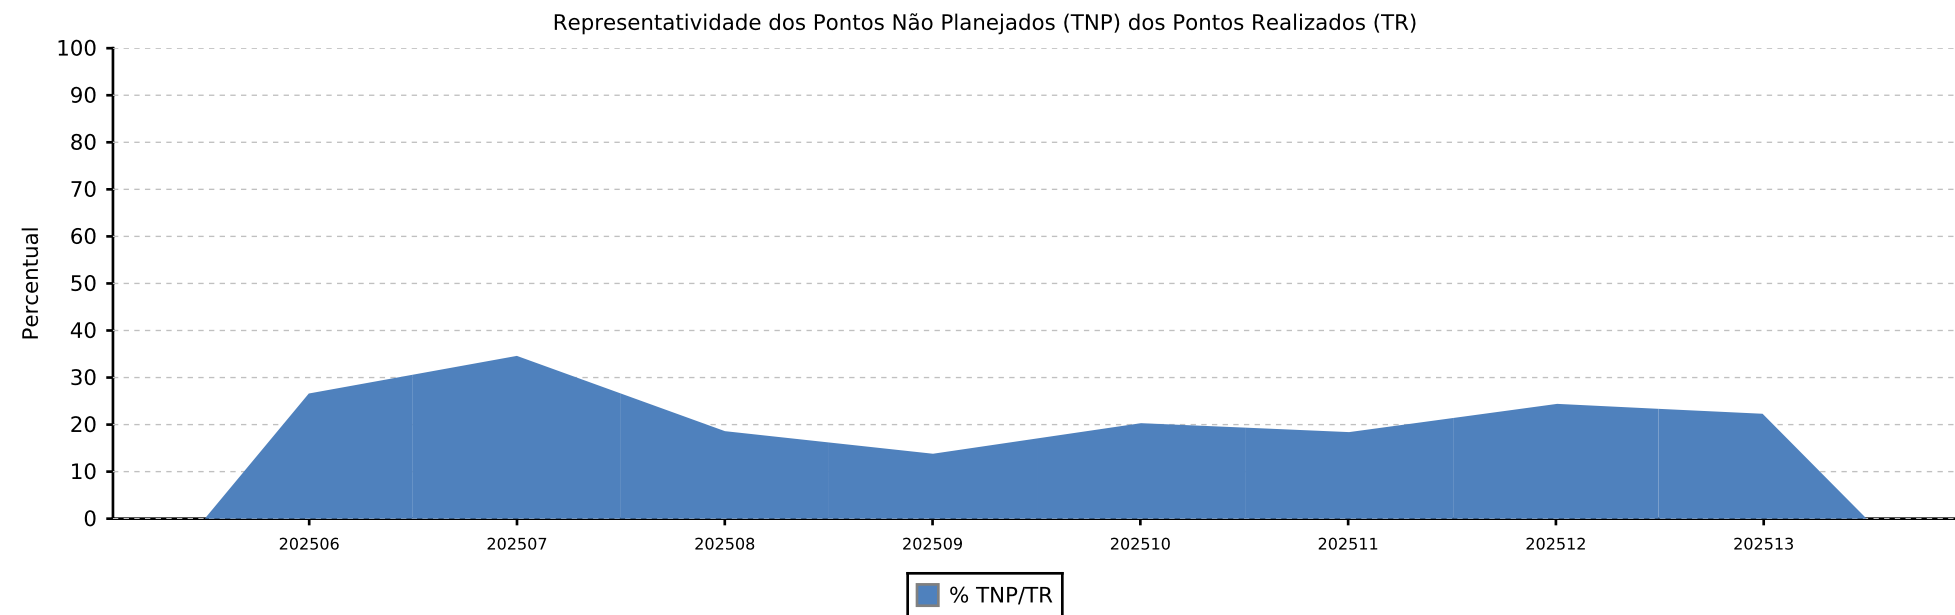


	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
TR - Pontos Realizados	294	225.5	229	283	257	256	185	204.5
TNP - Pontos Não Planejados	78	78	42.5	39	52	47	45	45.5
% TNP/TR	26,6	34,6	18,6	13,8	20,3	18,4	24,4	22,3

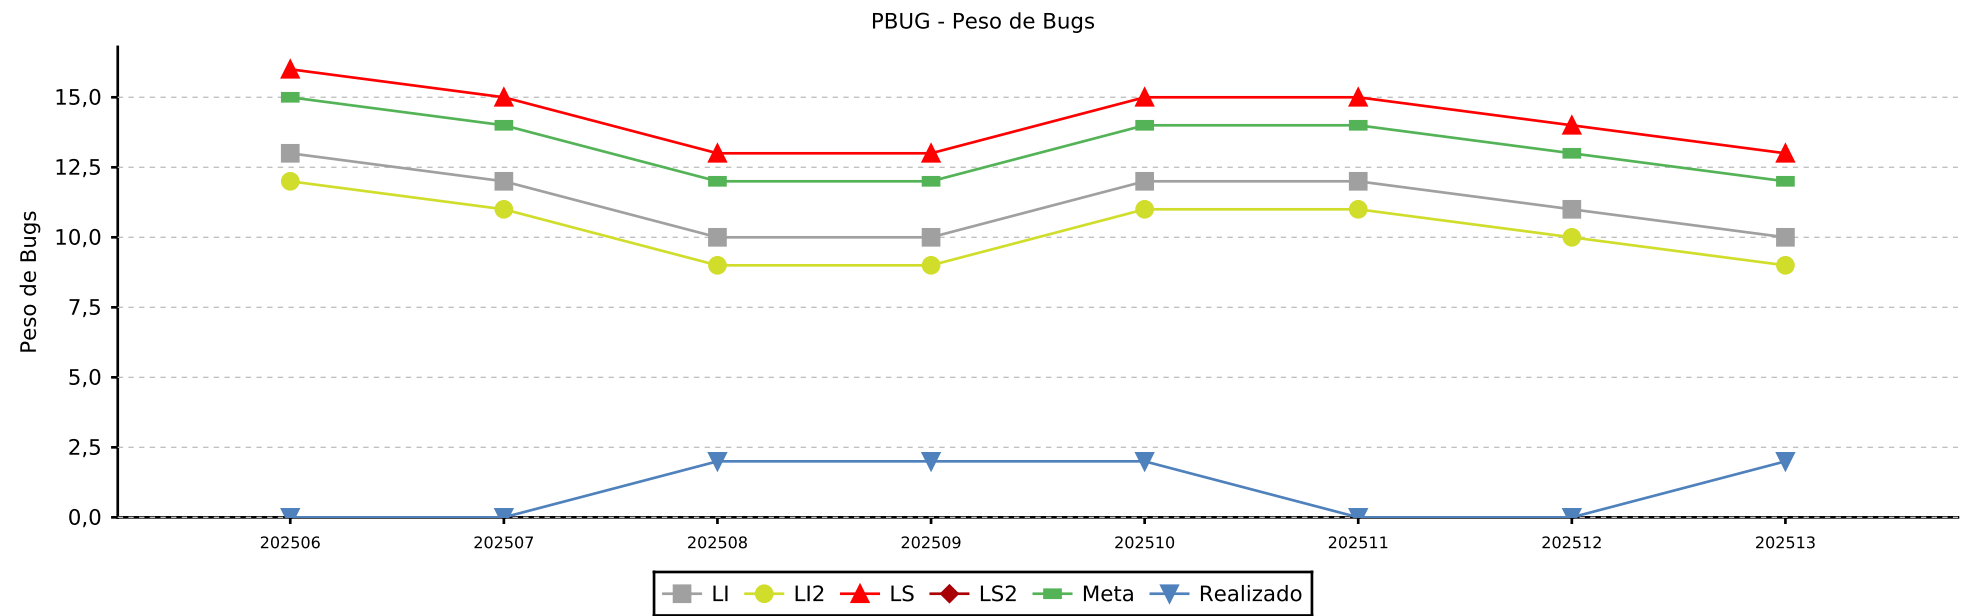


	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
Realizado	0	0	2	2	2	0	0	2
Meta	15	14	12	12	14	14	13	12
LS2								
LS	16	15	13	13	15	15	14	13
LI2	12	11	9	9	11	11	10	9
LI	13	12	10	10	12	12	11	10
Pontos Entregues	294	225.5	229	283	257	256	185	204.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,88	0,71	0,78	0,00	0,00	0,98

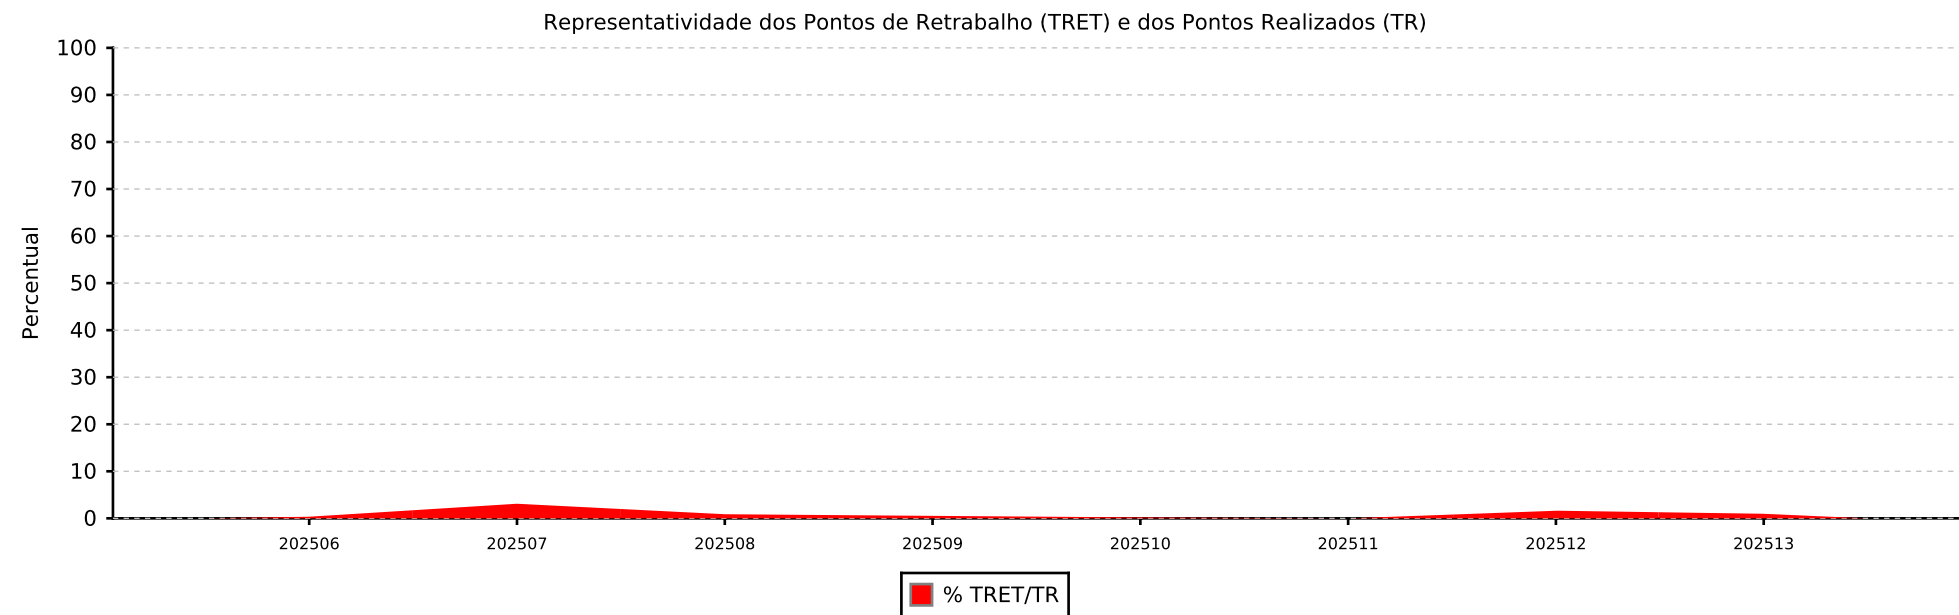

	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
TR - Pontos Realizados	294	225.5	229	283	257	256	185	204.5
TRET - Pontos de Retrabalho	1	7	2	1.5	0.5	0	3	2
% TRET/TR	0,3	3,1	0,9	0,5	0,2	0,0	1,6	1,0

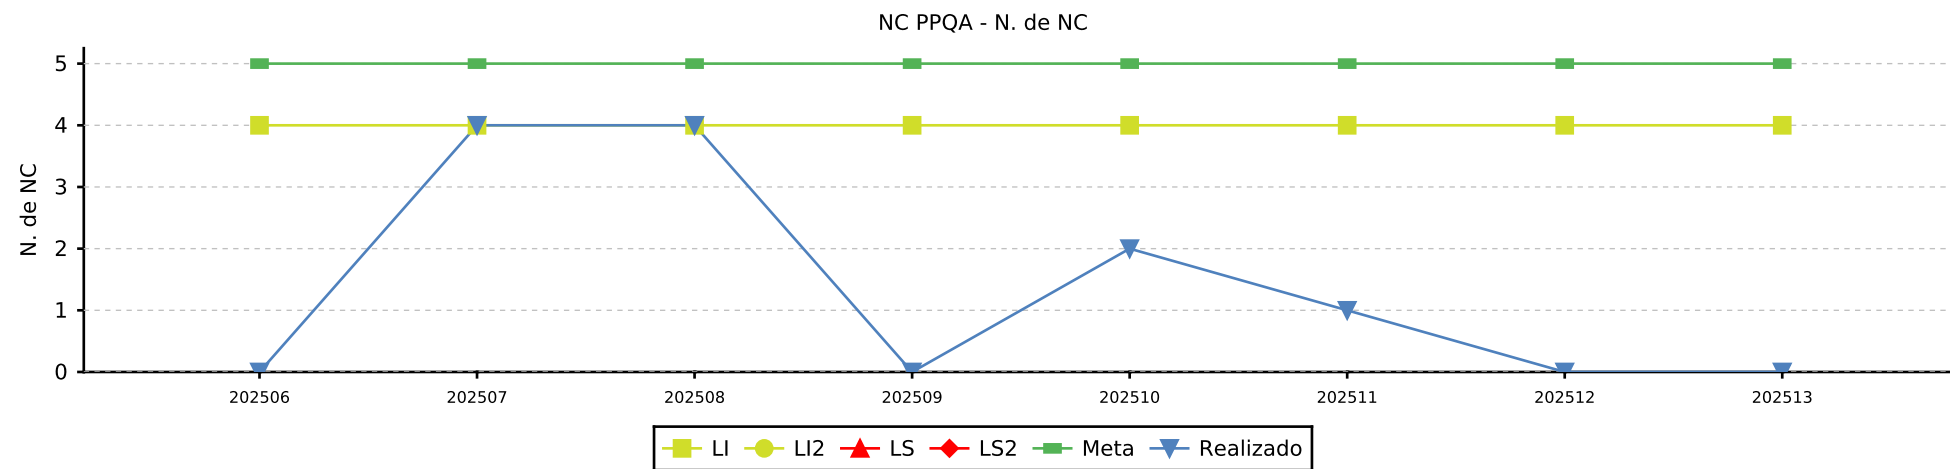


	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
Realizado	0	4	4	0	2	1	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

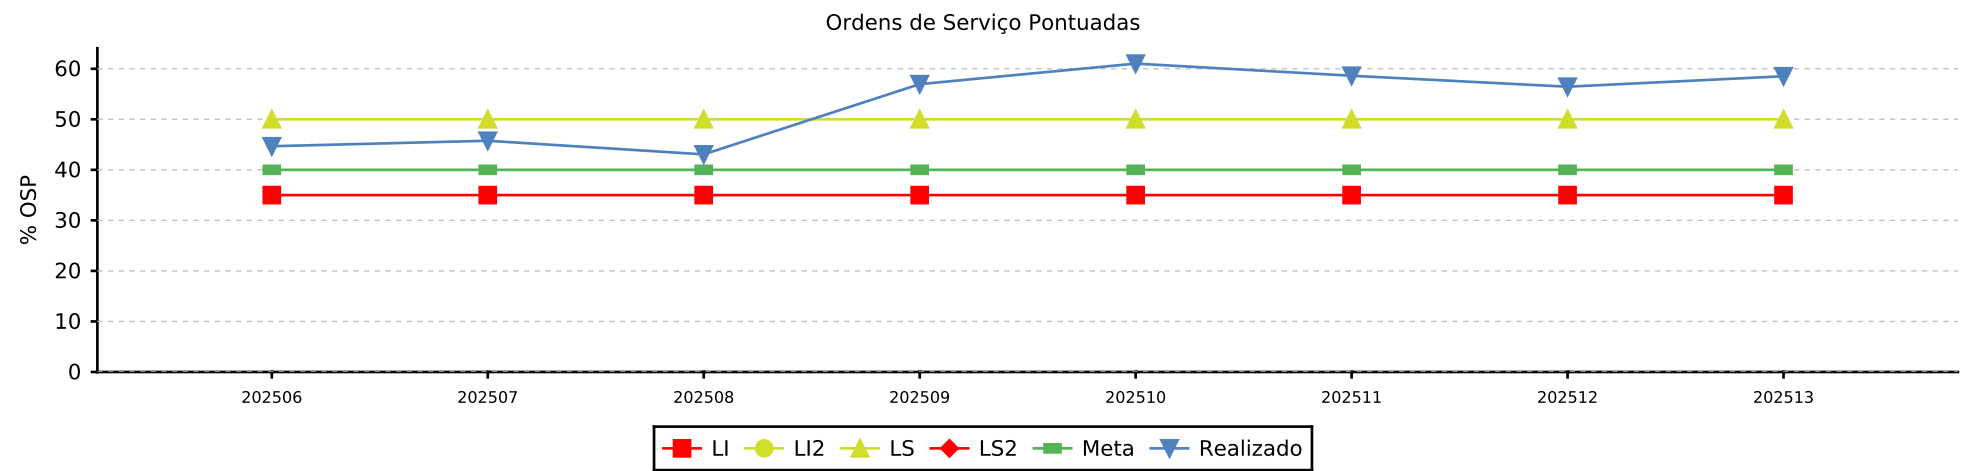

	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
Realizado	44.67	45.76	43.06	56.96	61.02	58.62	56.45	58.52
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

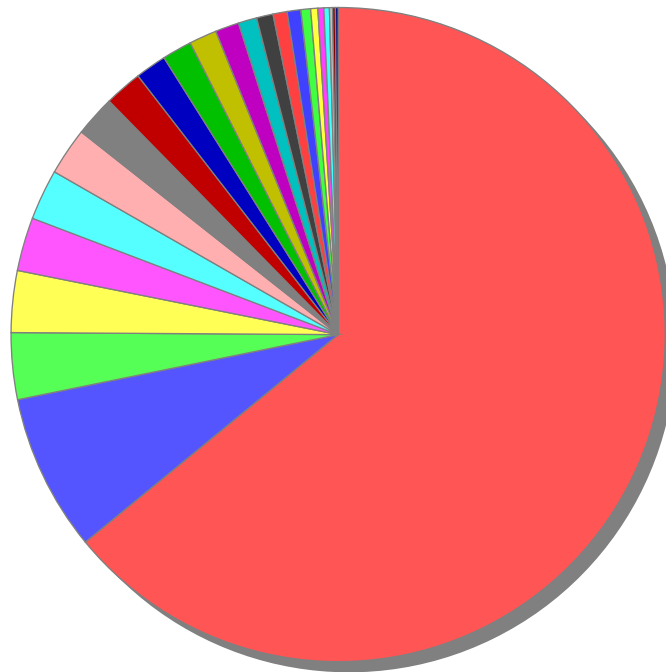

- Desenvolvimento [64.06%]
- Analise de Sistema [7.75%]
- Daily Scrum [3.29%]
- Folga [3.05%]
- Code Review [2.64%]
- Ausencia [2.5%]
- Cafe [2.34%]
- Retrospectiva [2.02%]
- Compilacao de sistemas [1.87%]
- Sprint Planning 1 [1.54%]
- Ginastica Laboral [1.47%]
- Treinamento [1.37%]
- Atestado [1.17%]
- Sprint Planning 2 [0.92%]
- Reuniao [0.82%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.69%]
- Clean Code [0.67%]
- Preparando ambiente [0.48%]
- Outros [0.35%]
- Sizing [0.29%]
- Planejamento de Projeto [0.27%]
- Verificando apontamento [0.16%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.14%]
- Atraso / Saida antecipada [0.13%]

% de Horas por Área do CMMI

