



INDICADORES DA SPRINT


	202509				202510			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	216h00m	264h04m	264h00m	264h00m	244h00m	200h00m	188h00m	264h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	219h57m	271h24m	268h30m	271h51m	273h14m	234h52m	241h01m	270h05m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	176h25m	219h20m	219h20m	219h20m	208h50m	170h50m	159h55m	225h20m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	173h23m	231h26m	221h49m	233h17m	204h35m	172h37m	150h00m	233h32m
05. Pontos planejados	61,0	87,0	72,5	65,5	65,0	62,5	40,5	76,0
06. Pontos entregues	65,5	73	72	72,5	70,5	57	49	80,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	54,00	63,00	66,00	61,00	52,00	46,50	36,00	70,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	11,50	10,00	6,00	11,50	18,50	10,50	13,00	10,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	0	0	0	0	2	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	8	8	21	11	13	10	7	15
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	13	11	4	6	12	5	6	10
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	0	0	1	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0,5	1	0	0	0	0	0,5	0
15. Produtividade planejada	0,346	0,397	0,331	0,299	0,312	0,366	0,254	0,338
16. Produtividade realizada	0,378	0,316	0,325	0,311	0,345	0,331	0,327	0,345
17. % Pontos NP / Pontos entregues	17,6	13,7	8,4	15,9	26,3	18,5	26,6	12,5

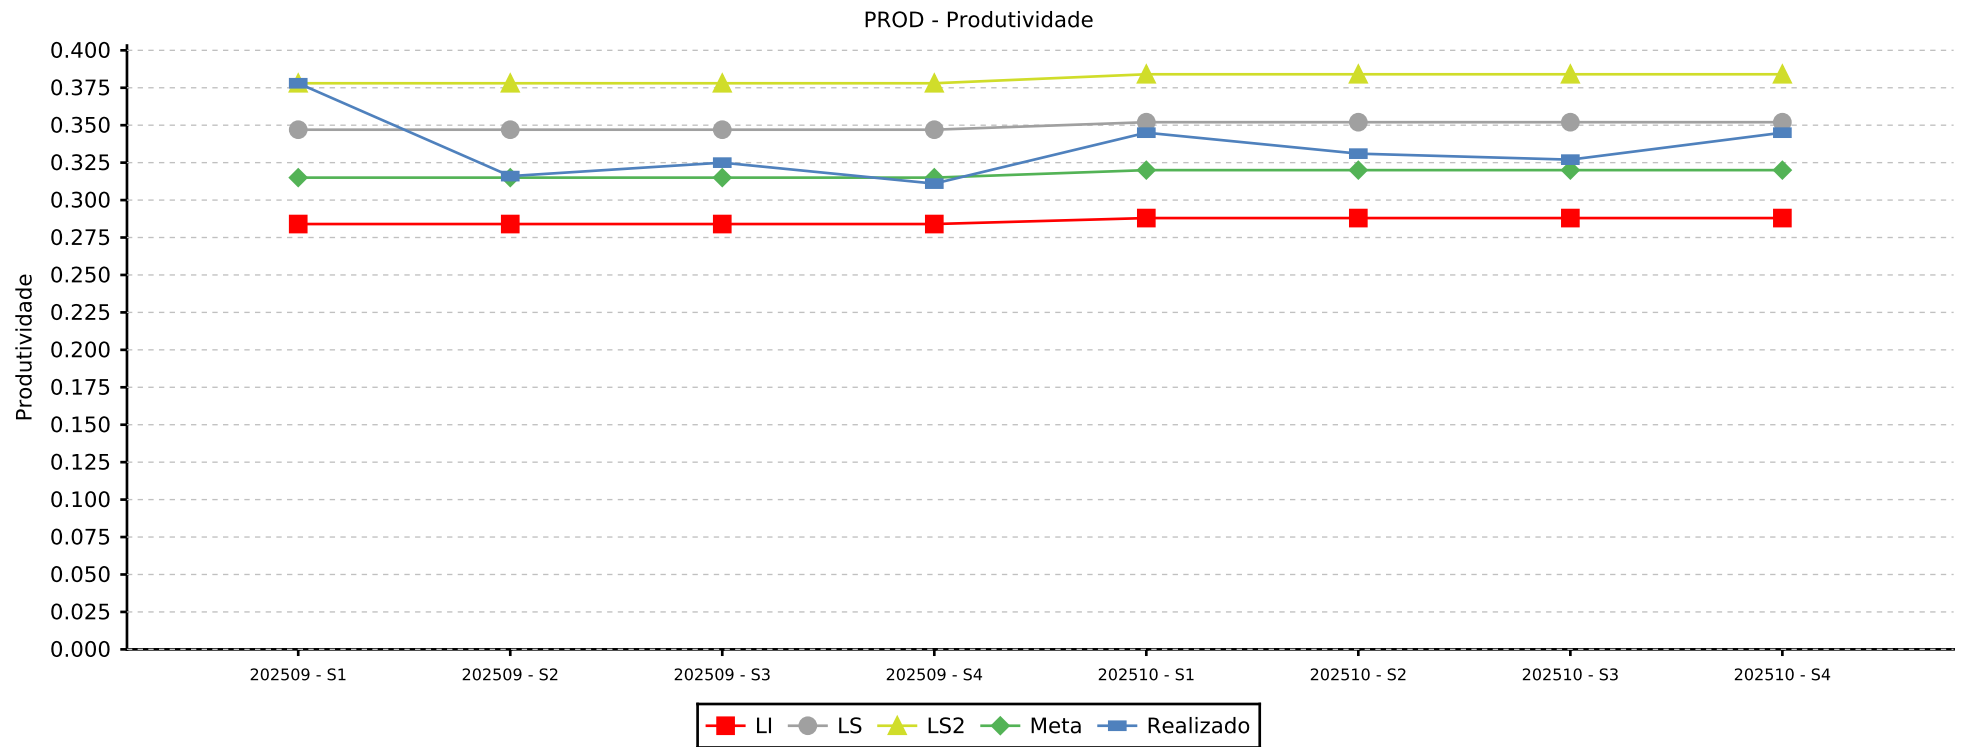


	202509				202510			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,378	0,316	0,325	0,311	0,345	0,331	0,327	0,345
Meta	0,315	0,315	0,315	0,315	0,320	0,320	0,320	0,320
LS2	0,378	0,378	0,378	0,378	0,384	0,384	0,384	0,384
LS	0,347	0,347	0,347	0,347	0,352	0,352	0,352	0,352
LI	0,284	0,284	0,284	0,284	0,288	0,288	0,288	0,288

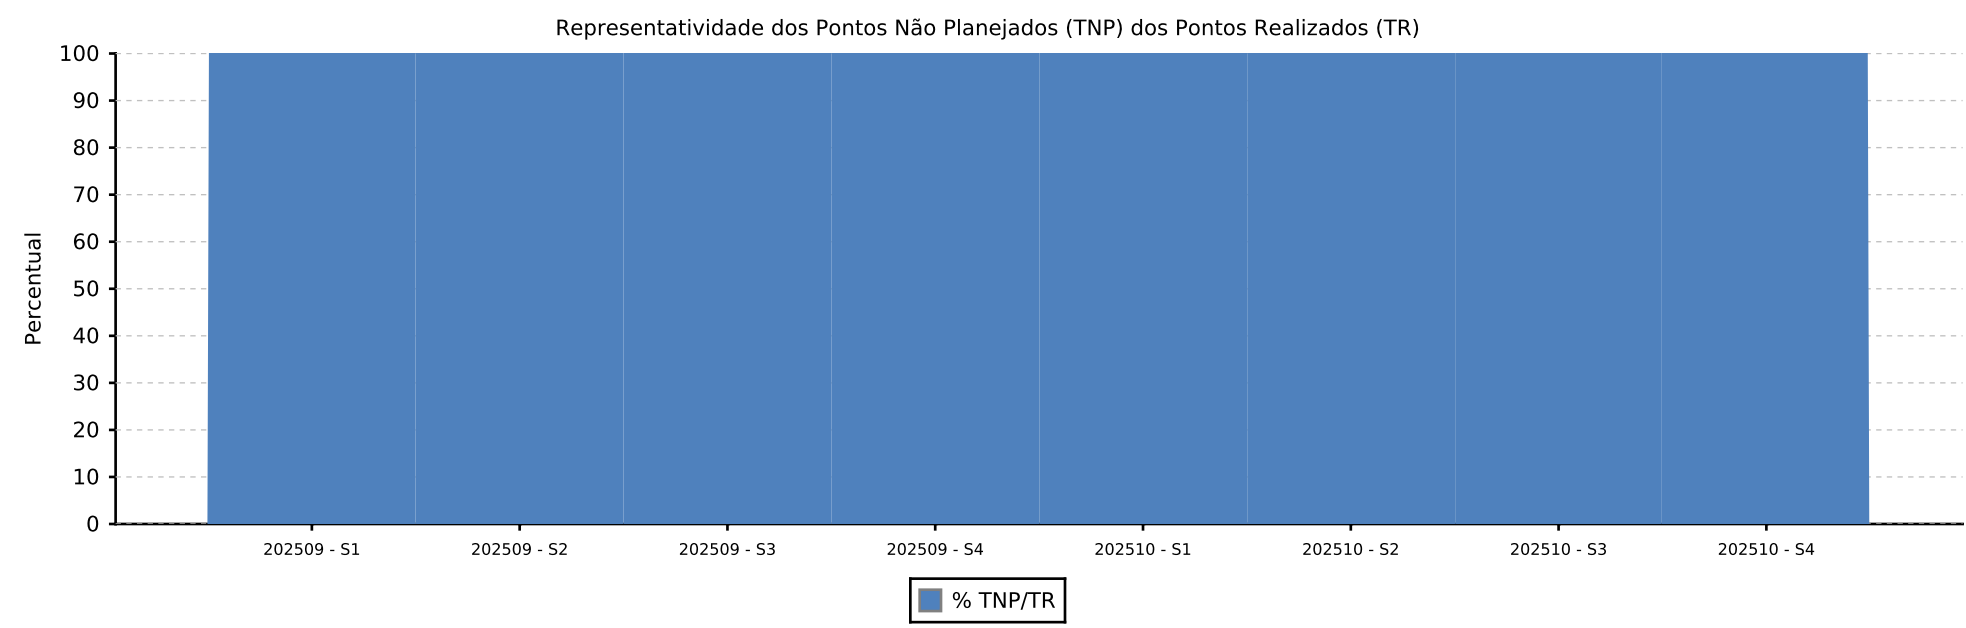

	202509				202510			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	655	73	72	725	705	57	49	805
TNP - Pontos Não Planejados	1150	1000	600	1150	1850	1050	1300	1000
% TNP/TR	17600.0	13700.0	8400.0	15900.0	26300.0	18500.0	26600.0	12500.0

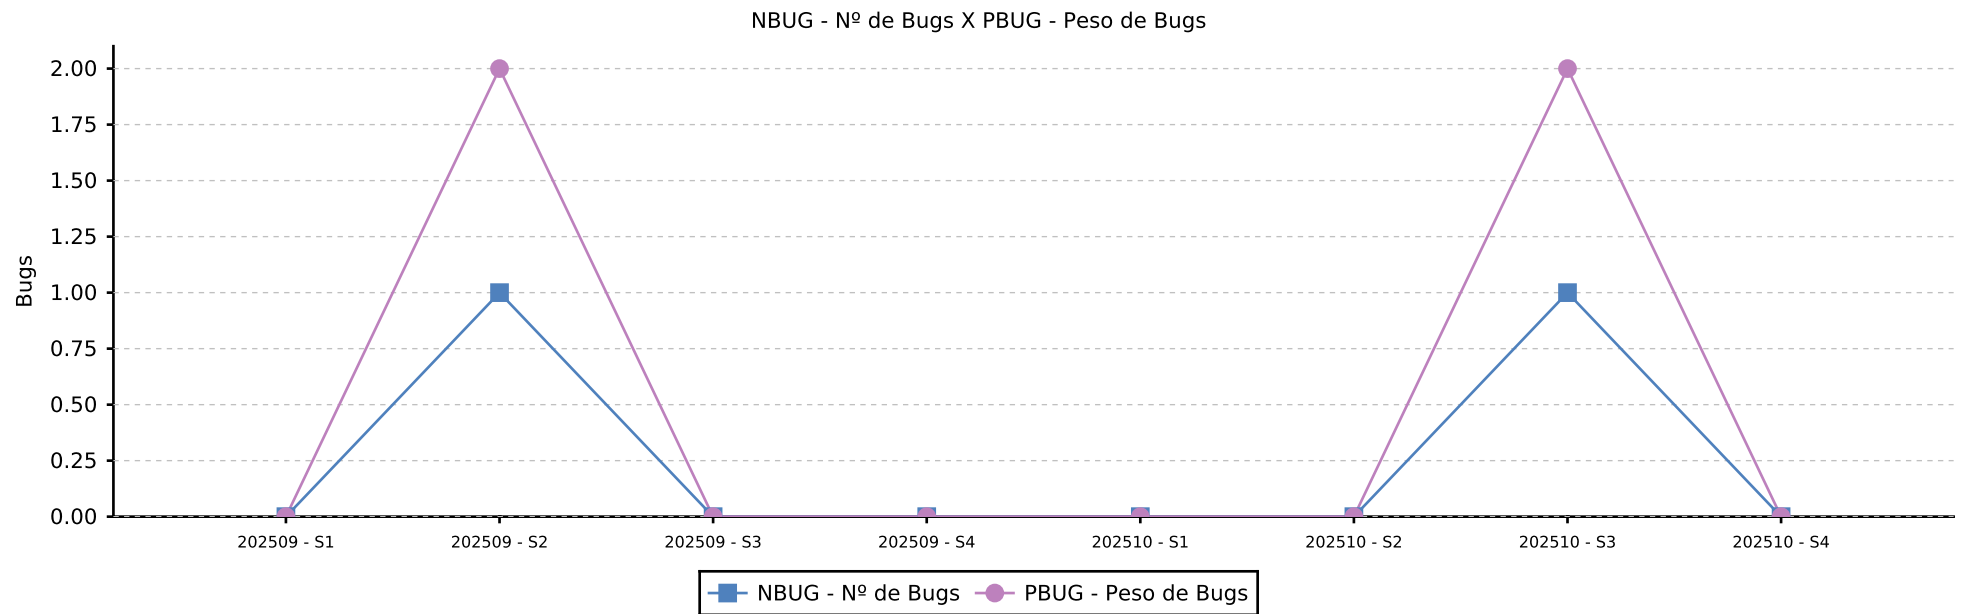

	202509				202510			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	1	0	0	0	0	1	0
PBUG - Peso de Bugs	0	2	0	0	0	0	2	0
Pontos Entregues	655	73	72	725	705	57	49	805
% PBUG / TR	0.00	27400.	0.00	0.00	0.00	0.00	40900.	0.00

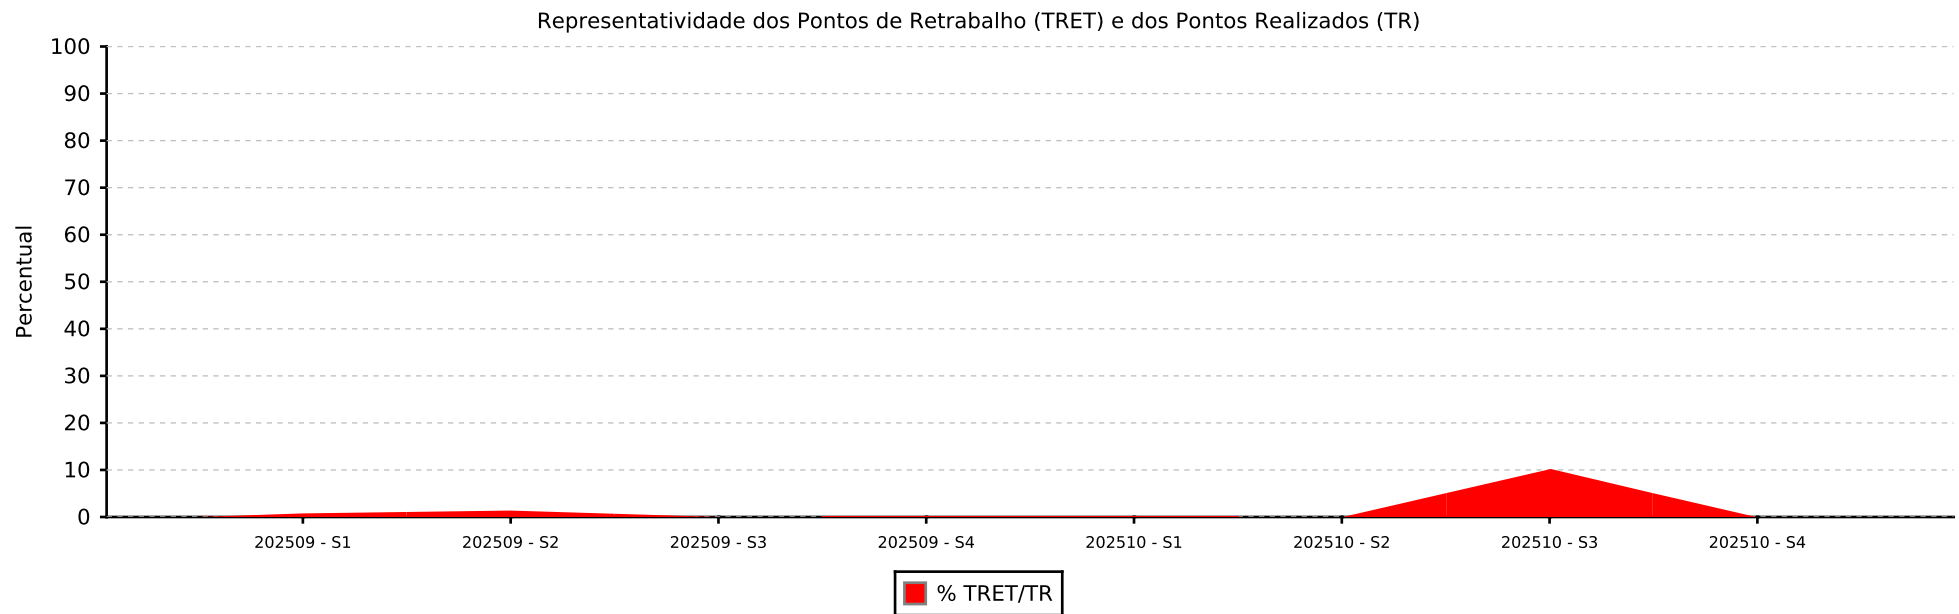


	202509				202510			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	655	73	72	725	705	57	49	805
TRET - Pontos de Retrabalho	5	1	0	0	0	0	5	0
% TRET/TR	0.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Sizing	200	263	200	0	200	350	200	0	800	613	76.6 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Férias	0	1,700	0	2,060	0	5,150	0	0	0	8,910	0.0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Teste	17	0	17	0	17	0	17	0	68	0	0.0 %
Treinamento	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0.0 %
Manutenção de Servidores	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0.0 %
Análise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Análise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0.0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	50	0	0	0	50	150	50	0	150	150	100.0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Correcao de Erros Externo	100	0	100	0	100	0	100	0	400	0	0.0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Total Geral	24,400	27,320	20,001	23,486	18,801	24,103	26,401	27,010	89,603	101,919	113.7 %

% de Horas por Atividade

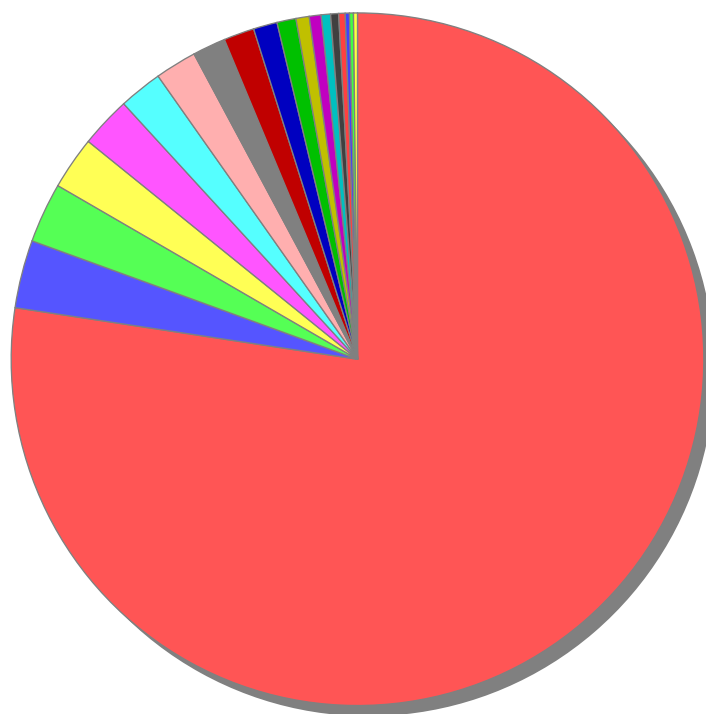


- Desenvolvimento [77.38%]
- Analise de Sistema [3.17%]
- Daily Scrum [2.81%]
- Cafe [2.47%]
- Retrospectiva [2.38%]
- Reuniao [2.03%]
- Outros [1.94%]
- Ginastica Laboral [1.54%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.43%]
- Sprint Planning 1 [1.11%]
- Ausencia [0.89%]
- Verificando apontamento [0.62%]
- Sprint Planning 2 [0.56%]
- Clean Code [0.43%]
- Compilacao de sistemas [0.37%]
- Atraso / Saida antecipada [0.30%]
- Code Review [0.20%]
- Planejamento de Projeto [0.19%]
- Correção de Erros Interno [0.19%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	17,825	18,658	14,525	15,742	13,883	14,068	19,175	21,453	65,408	69,921	106.9 %
DIV - Diversos*	1,300	1,917	1,025	1,970	958	1,108	1,383	2,397	4,666	7,392	158.4 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	1,975	2,082	1,575	903	1,475	1,250	2,225	1,453	7,250	5,688	78.5 %
REQM - Gestao de Requisitos	3,050	2,518	2,650	2,095	2,250	1,995	3,150	1,307	11,100	7,915	71.3 %
CM - Gerencia de Configuracao	200	223	200	383	200	430	250	100	850	1,136	133.6 %
PP - Planejamento de Projeto	25	83	25	33	25	0	175	50	250	166	66.4 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Total Geral	24,375	25,481	20,000	21,126	18,791	18,851	26,358	26,760	89,524	92,218	103.0 %

% de Horas por Área do CMMI

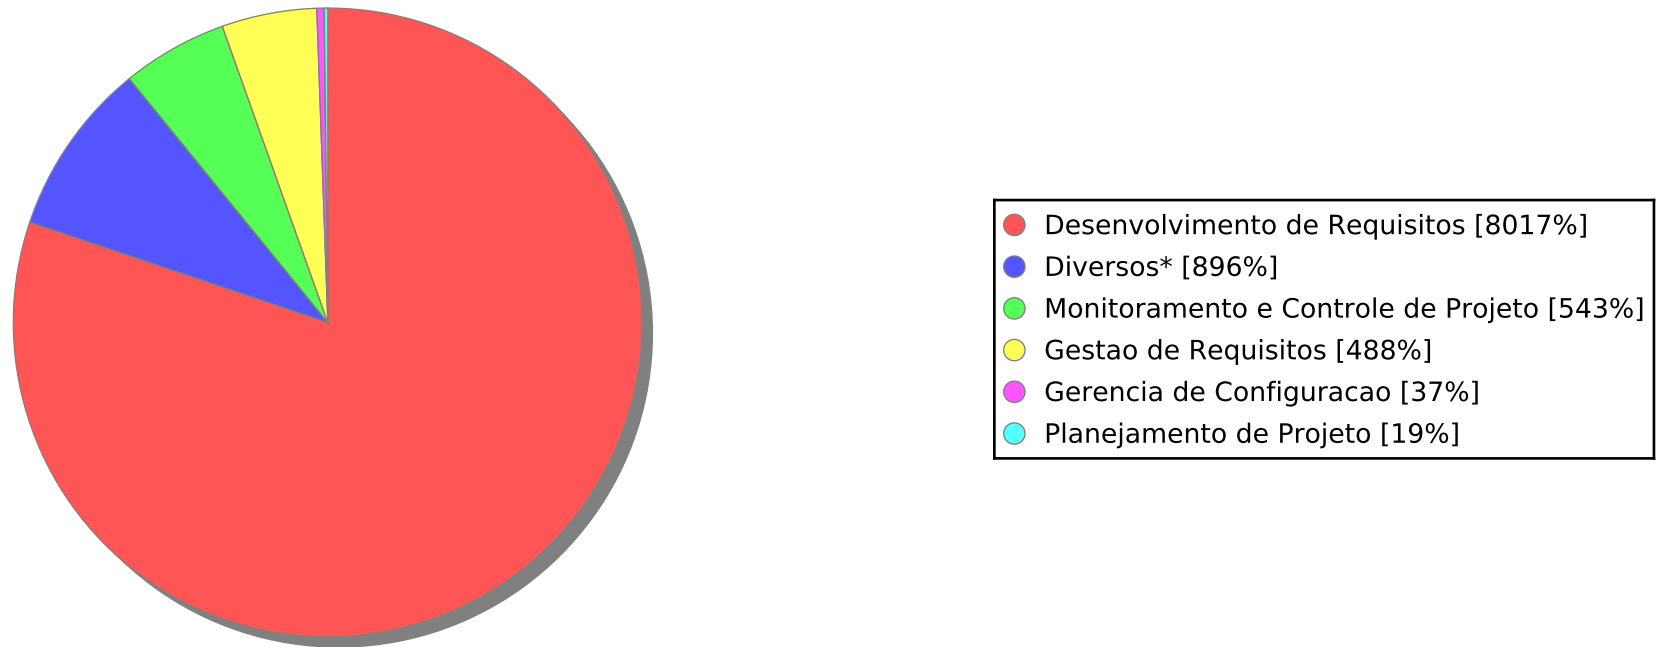


INDICADORES DO PROJETO


	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
01. Horas planejadas de todas atividades	1109h04m	1175h20m	940h00m	1056h00m	936h00m	784h00m	1008h04m	896h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1101h19m	1176h51m	985h41m	1295h54m	966h57m	925h30m	1031h42m	1019h12m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	945h40m	1011h45m	799h55m	847h05m	752h40m	636h35m	834h25m	764h55m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	900h37m	960h37m	739h03m	879h23m	710h18m	702h06m	859h55m	760h44m
05. Pontos planejados para o projeto	292,0	313,0	252,0	267,0	238,0	200,0	0,0	240,0
06. Pontos planejados	319,5	327,0	226,0	292,0	246,5	239,5	286,0	244,0
07. Pontos entregues	295,5	319,5	247	294	225,5	229	283	257
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	231,50	272,50	201,00	216,00	147,50	186,50	244,00	205,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	64,00	47,00	46,00	78,00	78,00	42,50	39,00	52,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	2	2	0	0	2	2	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	52	65	44	57	55	35	48	45
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	38	37	25	35	43	28	34	33
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	1	2	1	1	1	1	1
14. Horas de correção de bug	0h35m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	1h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	4,5	0,5	3,5	1	7	2	1,5	0,5
16. Produtividade planejada	0,338	0,324	0,283	0,345	0,328	0,377	0,343	0,319
17. Produtividade realizada	0,329	0,333	0,335	0,335	0,318	0,327	0,330	0,338
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	101,2	102,1	98,1	110,2	94,8	114,5	0	107,1
19. % Pontos NP / Pontos entregues	21,7	14,8	18,7	26,6	34,6	18,6	13,8	20,3

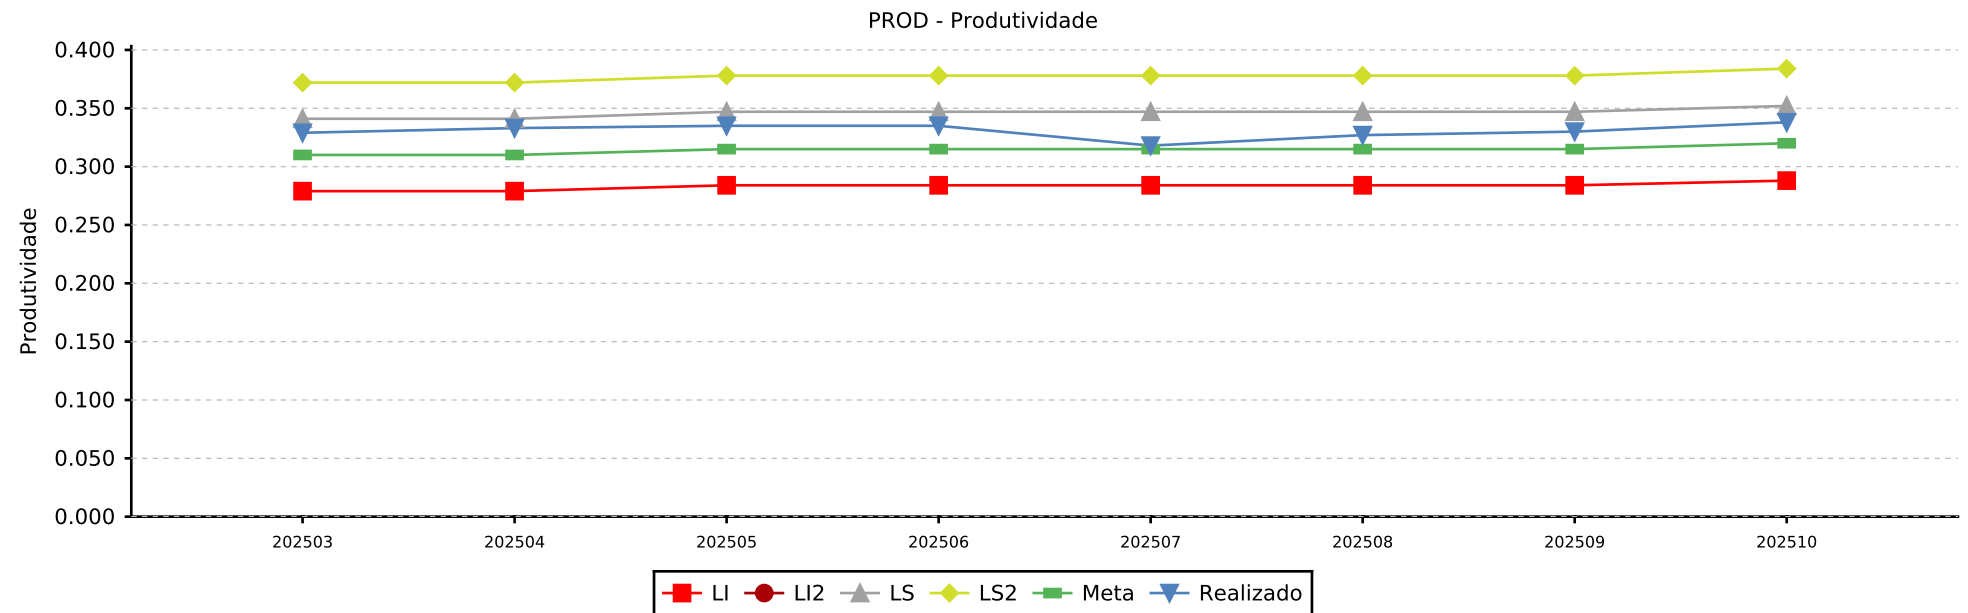


	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
Realizado	0,329	0,333	0,335	0,335	0,318	0,327	0,330	0,338
Meta	0,310	0,310	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,320
LS2	0,372	0,372	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,384
LS	0,341	0,341	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,352
LI2								
LI	0,279	0,279	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,288

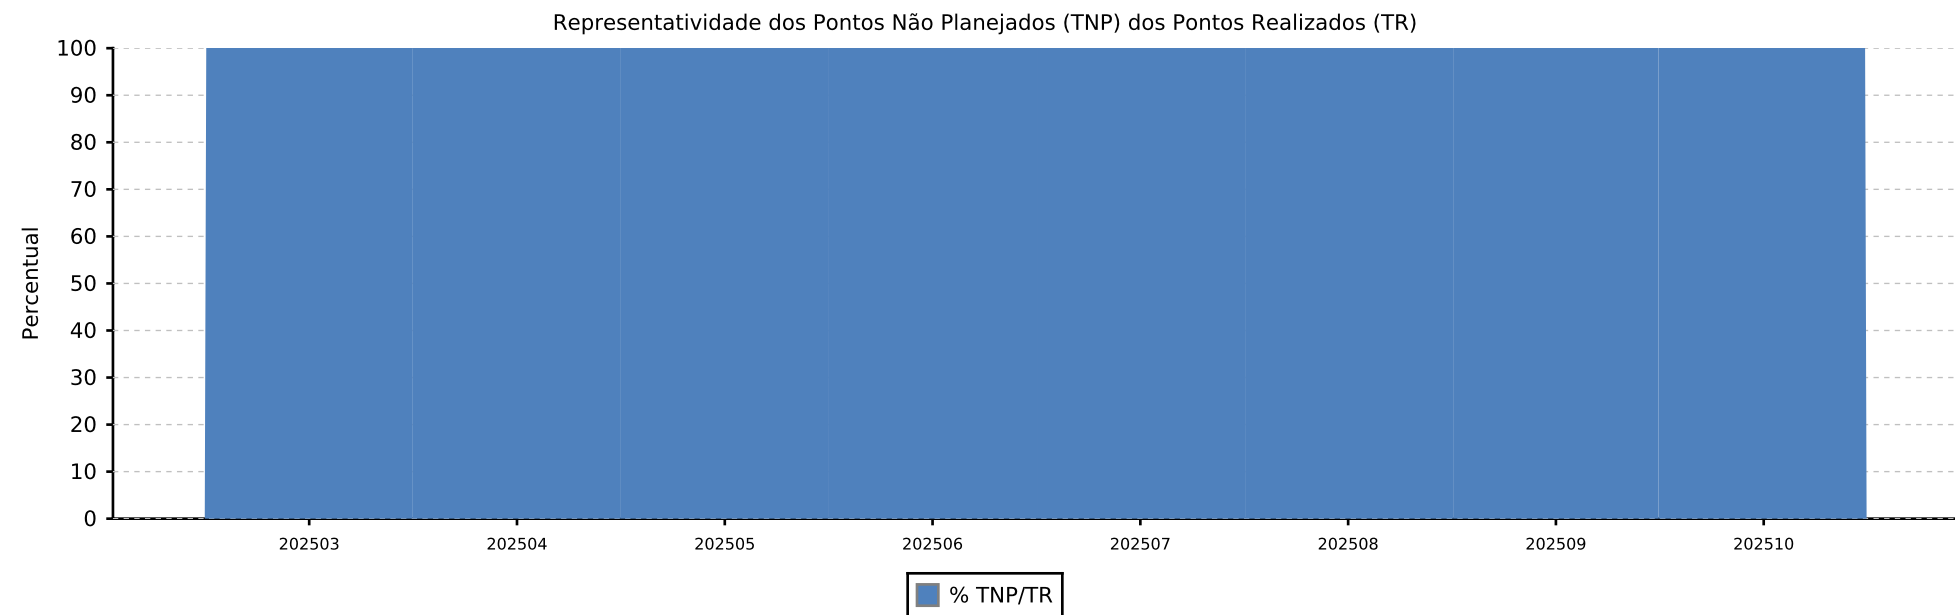

	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
TR - Pontos Realizados	2955	3195	247	294	2255	229	283	257
TNP - Pontos Não Planejados	6400	4700	4600	7800	7800	4250	3900	5200
% TNP/TR	21700.0	14800.0	18700.0	26600.0	34600.0	18600.0	13800.0	20300.0

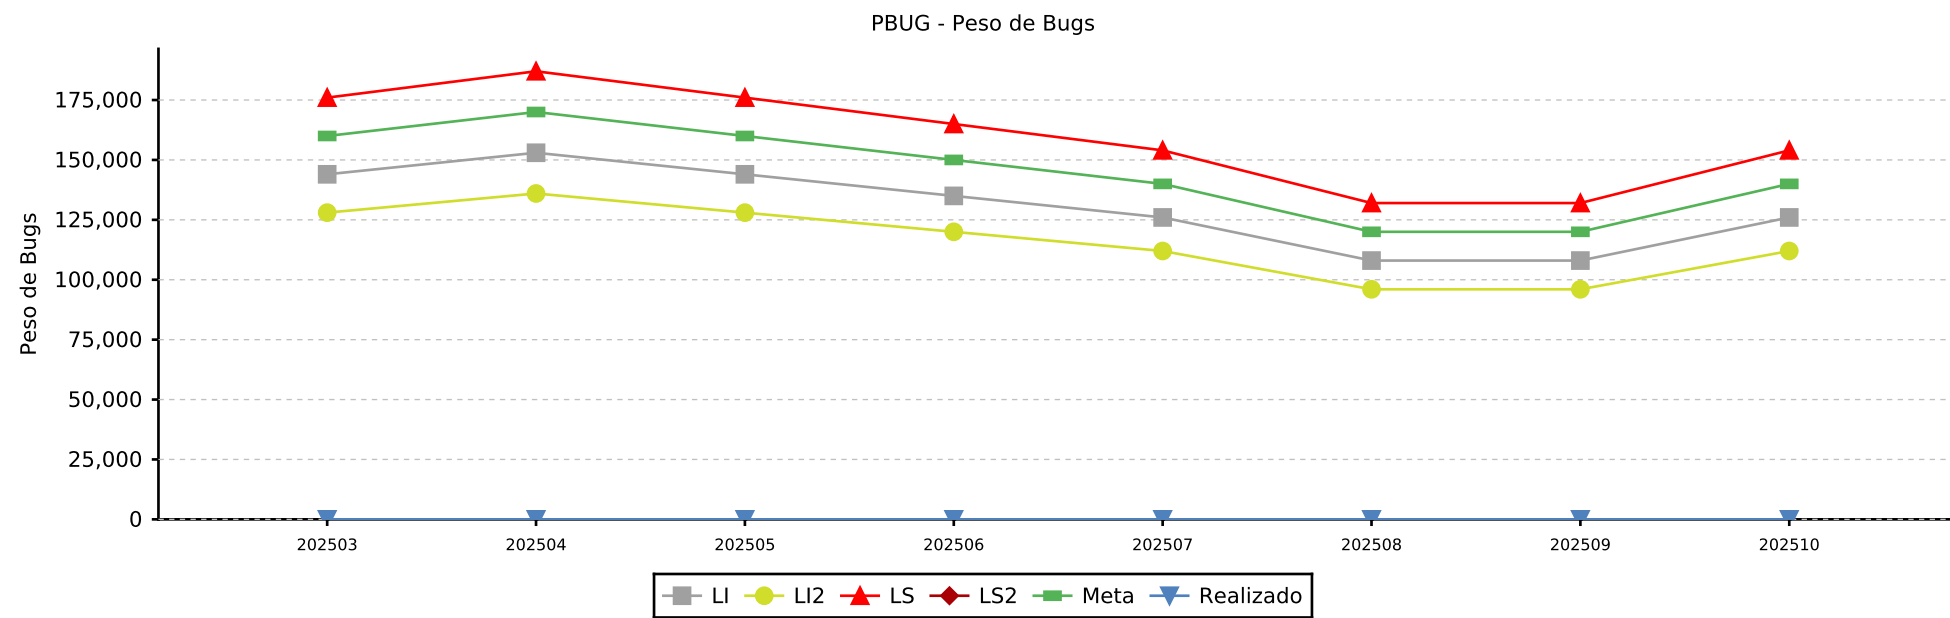


	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
Realizado	2	2	2	0	0	2	2	2
Meta	160000	170000	160000	150000	140000	120000	120000	140000
LS2								
LS	176000	187000	176000	165000	154000	132000	132000	154000
LI2	128000	136000	128000	120000	112000	96000	96000	112000
LI	144000	153000	144000	135000	126000	108000	108000	126000
Pontos Entregues	2955	3195	247	294	2255	229	283	257
% PBUG / TR	6800.0	6300.0	8100.0	0.00	0.00	8800.0	7100.0	7800.0

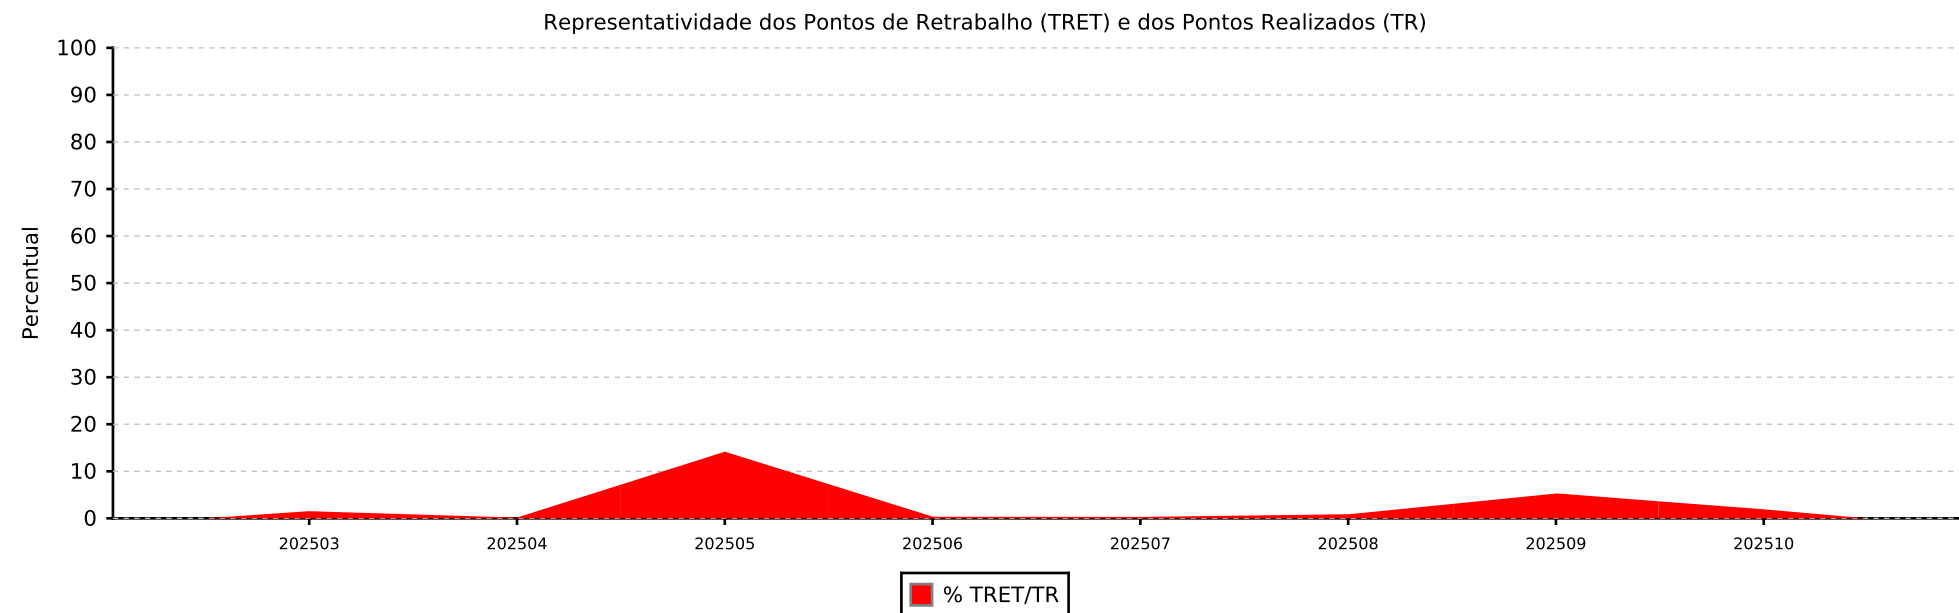

	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
TR - Pontos Realizados	2955	3195	247	294	2255	229	283	257
TRET - Pontos de Retrabalho	45	5	35	1	7	2	15	5
% TRET/TR	1.5	0.2	14.2	0.3	0.3	0.9	5.3	1.9

% de Horas por Atividade

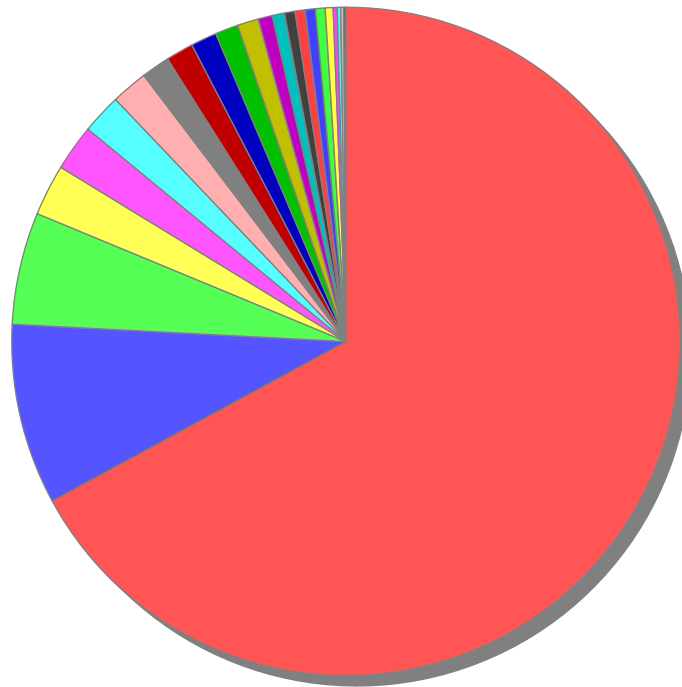

- Desenvolvimento [67.08%]
- Férias [8.74%]
- Analise de Sistema [5.42%]
- Daily Scrum [2.48%]
- Cafe [2.23%]
- Ausencia [1.93%]
- Retrospectiva [1.77%]
- Ginastica Laboral [1.38%]
- Code Review [1.34%]
- Sprint Planning 1 [1.25%]
- Compilacao de sistemas [1.12%]
- Reuniao [1.03%]
- Outros [0.68%]
- Sizing [0.60%]
- Clean Code [0.50%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.49%]
- Sprint Planning 2 [0.49%]
- Verificando apontamento [0.47%]
- Correção de Erros Interno [0.38%]
- Treinamento [0.20%]
- Planejamento de Projeto [0.16%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.15%]
- Atraso / Saida antecipada [0.08%]
- Manutenção de Servidores [0.03%]

% de Horas por Área do CMMI

