

INDICADORES DA SPRINT

	202207		202	208	
	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	0h00m	176h00m	176h00m	132h00m	132h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	33h38m	181h40m	184h27m	134h17m	132h59m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	0h00m	138h35m	139h35m	105h05m	105h05m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	20h04m	153h33m	111h25m	118h35m	71h57m
05. Pontos planejados	0,0	41,0	44,0	29,0	28,5
06. Pontos entregues	36	41	25	36,5	21
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	0	33,00	24,50	25,00	19,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	36,00	8,00	0,50	11,50	1,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	0	5	8	6	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	4	1	1	4	3
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0,5	0,5	0
15. Produtividade planejada	0	0,296	0,316	0,276	0,272
16. Produtividade realizada	1,794	0,268	0,225	0,308	0,292
17. % Pontos NP / Pontos entregues	100	19,6	2	31,6	7,2

PROD - Produtividade

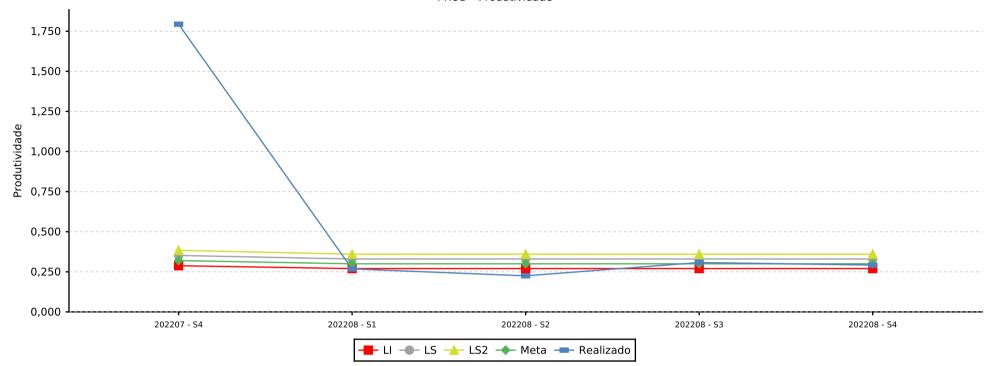


	202207	202208					
	4	1	2	3	4		
Realizado	1,794	0,268	0,225	0,308	0,292		
Meta	0,320	0,300	0,300	0,300	0,300		
LS2	0,384	0,360	0,360	0,360	0,360		
LS	0,352	0,330	0,330	0,330	0,330		
LI	0,288	0,270	0,270	0,270	0,270		

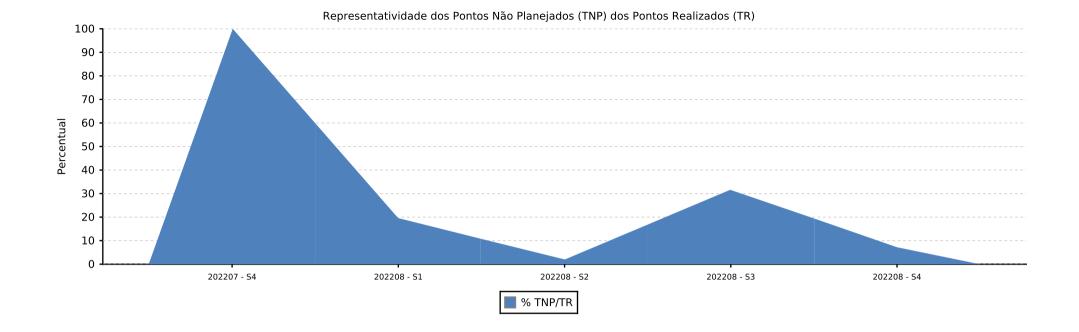


	202207	202208				
	4	1	2	3	4	
TR - Pontos Realizados	36	41	25	36.5	21	
TNP - Pontos Não Planejados	36	8	0.5	11.5	1.5	
% TNP/TR	100,0	19,6	2,0	31,6	7,2	

NBUG - № de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



	202207	202208				
	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	0	0	1	0	0	
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	
Pontos Entregues	36	41	25	36.5	21	
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

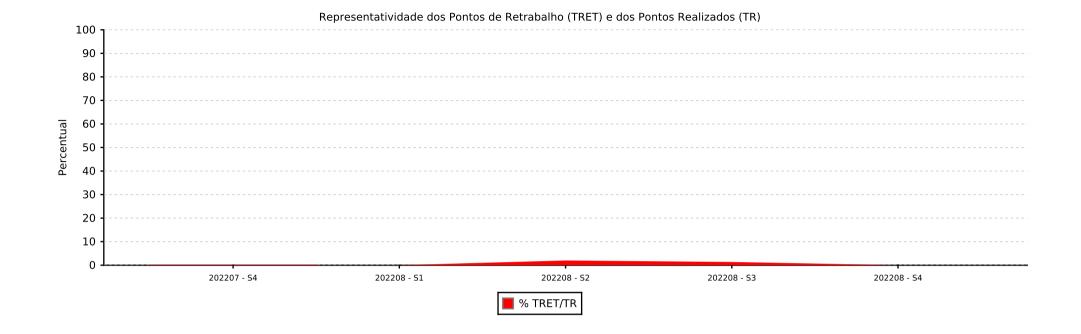

	202207	202208				
	4	1	2	3	4	
TR - Pontos Realizados	36	41	25	36.5	21	
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0.5	0.5	0	
% TRET/TR	0,0	0,0	2,0	1,4	0,0	


HORAS POR ATIVIDADE

	Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3		int 3	t 3 Sprint 4			Total				
Atividade	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
Desenvolvimento	114,58	120,9	115,58	78,88	86,83	104,28	85,83	51,32	402,82	355,38	88,2 %
Analise de Sistema	13	2,33	13	24,77	10	9,73	10	41,8	46	78,63	170,9 %
Correção de Erros Interno	0	6,47	0	2,52	0	0	0	7,92	0	16,91	0,0 %
Ausencia	0	5,83	0	8,67	0	1,02	0	4,3	0	19,82	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	3,53	0	1,17	0	0	0	4,25	0	8,95	0,0 %
Curso/Palestra	6	2,67	6	8,98	6	0	6	4,15	24	15,8	65,8 %
Daily Scrum	5,33	5	5,33	5,6	4	4,22	4	3,55	18,66	18,37	98,4 %
Outros	0,5	1,92	0,5	5,92	0,5	1,03	0,5	2,2	2	11,07	553,5 %
Code Review	0,67	3,67	0,67	7,68	0,33	0	0,33	2,17	2	13,52	676,0 %
Cafe	5	3,25	5	3,5	3,75	2	3,75	2,08	17,5	10,83	61,9 %
Sprint Planning 2	6	12	6	10,07	4,5	6,25	4,5	1,75	21	30,07	143,2 %
Sprint Planning 1	6	3,98	6	6	4,5	1,75	4,5	1,67	21	13,4	63,8 %
Reuniao	1	0,5	0	2,75	0	0,42	0	1,67	1	5,34	534,0 %
Retrospectiva	2,67	1	2,67	3	2	1,67	2	1,5	9,34	7,17	76,8 %
Compilacao de sistemas	0	4	0	0	0	0	0	1,08	0	5,08	0,0 %
Sizing	8	0,83	8	3,83	4	0	4	1	24	5,66	23,6 %
Ginastica Laboral	2,67	1,78	2,67	1,42	2	1,5	2	0,58	9,34	5,28	56,5 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	1,23	0	0	0	0	0	1,23	0,0 %
Preparando Ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Café da Tarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Planejamento de Projeto	1	0,67	1	0	1	0,42	1,5	0	4,5	1,09	24,2 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	1,17	0	4,12	0	0	0	0	0	5,29	0,0 %

Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Clean Code	1	0	1	4,18	0,75	0	0,75	0	3,5	4,18	119,4 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0,17	0	0,17	0	0	0	0	0	0,34	0,0 %
Sizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0,25	0	0,25	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
S.P.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	2	0	2	0	1,5	0	1,5	0	7	0	0,0 %

Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	176	181,67	176	184,46	131,99	134,29	131,99	132,99	615,98	633,41	102,8 %


% de Horas por Atividade

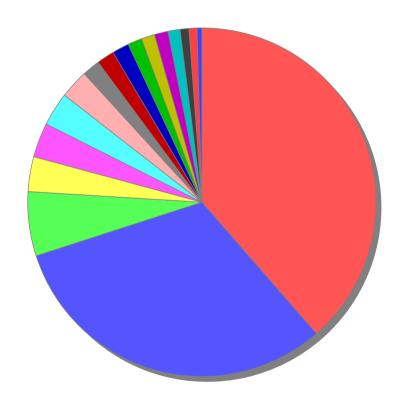

- Desenvolvimento [38.59%]
- Analise de Sistema [31.43%]
- Ocrreção de Erros Interno [5.96%]
- Ausencia [3.23%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [3.2%]
- Curso/Palestra [3.12%]
- Daily Scrum [2.67%]
- Outros [1.65%]
- Code Review [1.63%]
- Cafe [1.56%]
- Sprint Planning 2 [1.32%]
- Sprint Planning 1 [1.26%]
- Reuniao [1.26%]
- Retrospectiva [1.13%]
- Compilacao de sistemas [0.81%]
- Sizing [0.75%]
- Ginastica Laboral [0.44%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Sprint 1 S		Spri	rint 2 Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR	
Area CMMI		Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	117,92	130,9	118,92	86,75	89,42	104,28	88,42	63,48	414,68	385,41	92,9 %
REQM - Gestao de Requisitos		33	20,32	33	48,78	23	17,73	23	46,22	112	133,05	118,8 %
DIV - Diversos*		9,42	13,45	8,42	22,42	6,25	5,97	6,25	10,83	30,34	52,67	173,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de	PMC - Monitoramento e Controle de Projeto		9,67	8,67	16,28	6,33	5,88	6,33	7,22	30	39,05	130,2 %
OT - Treinamento na Organizacao		6	2,67	6	8,98	6	0	6	4,15	24	15,8	65,8 %
CM - Gerencia de Configuração		0	4	0	0	0	0	0,5	1,08	0,5	5,08	1.016,0
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PP - Planejamento de Projeto	PP - Planejamento de Projeto		0,67	1	0	1	0,42	1,5	0	4,5	1,09	24,2 %
	Total Geral	176,01	181,68	176,01	183,21	132	134,28	132	132,98	616,02	632,15	102,6 %

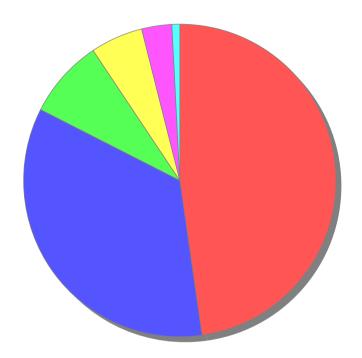


- Desenvolvimento de Requisitos [47.74%]
- Gestao de Requisitos [34.76%]
- Diversos* [8.14%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.43%]
- Treinamento na Organizacao [3.12%]
- Gerencia de Configuracao [0.81%]

INDICADORES DO PROJETO


	202207	202208
01. Horas planejadas de todas atividades	0h00m	616h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	33h38m	633h23m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	0h00m	488h20m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	20h04m	455h30m
05. Pontos planejados para o projeto	0,0	146,0
06. Pontos planejados	0,0	142,5
07. Pontos entregues	64	123,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	0,50	102,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	63,50	21,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	1	25
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	9
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	1
16. Produtividade planejada	0	0,292
17. Produtividade realizada	3,189	0,272
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	0	84,6
19. % Pontos NP / Pontos entregues	99,3	17,5

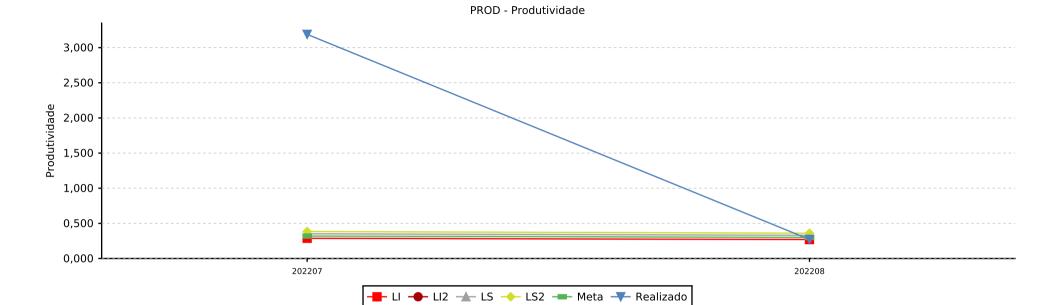


	202207	202208
Realizado	3,189	0,272
Meta	0,320	0,300
LS2	0,384	0,360
LS	0,352	0,330
LI2		
LI	0,288	0,270

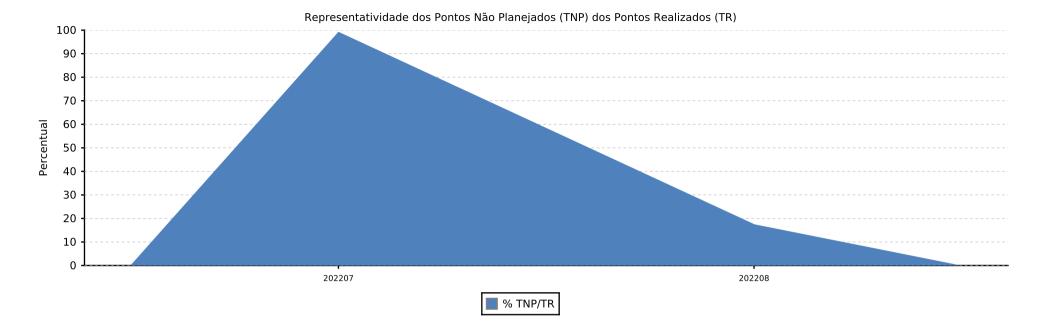

	202207	202208
TR - Pontos Realizados	64	123.5
TNP - Pontos Não Planejados	63.5	21.5
% TNP/TR	99,3	17,5

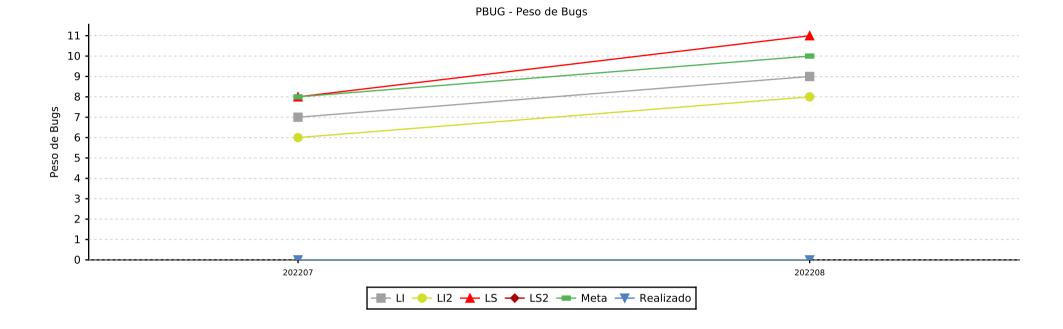


	202207	202208
Realizado	0	0
Meta	8	10
LS2		
LS	8	11
LI2	6	8
LI	7	9
Pontos Entregues	64	123.5
% PBUG / TR	0,00	0,00




	202207	202208
TR - Pontos Realizados	64	123.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1
% TRET/TR	0,0	0,8


NC PPQA - N. de NC



	202207	202208
Realizado	0	0
Meta	5	5
LS2		
LS		
LI2		
LI	4	4

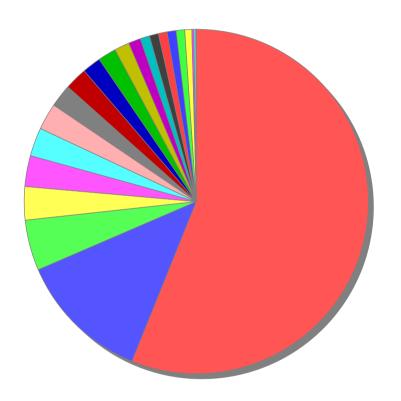

- Desenvolvimento [56.11%]
- Analise de Sistema [12.41%]
- Sprint Planning 2 [4.75%]
- Ausencia [3.13%]
- Daily Scrum [2.9%]
- O Correção de Erros Interno [2.67%]
- Curso/Palestra [2.49%]
- Code Review [2.13%]
- Sprint Planning 1 [2.12%]
- Outros [1.75%]
- Cafe [1.71%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.41%]
- Retrospectiva [1.13%]
- Sizing [0.9%]
- Reuniao [0.84%]
- Ginastica Laboral [0.83%]
- Analise Retorno O.S. [0.83%]
- Compilacao de sistemas [0.8%]
- Clean Code [0.66%]
- Analise de O.S [0.19%]
- Planejamento de Projeto [0.17%]
- Atividades Gerenciais [0.05%]

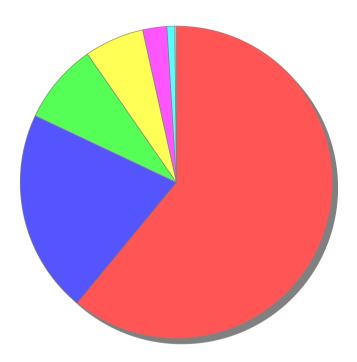

- Desenvolvimento de Requisitos [60.85%]
- Gestao de Requisitos [21.01%]
- Diversos* [8.32%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.17%]
- Treinamento na Organizacao [2.49%]
- Gerencia de Configuracao [0.8%]
- Planejamento de Projeto [0.17%]
