

INDICADORES DA SPRINT

		202	312			202	313	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	132h00m	108h00m	132h00m	132h00m	132h00m	132h00m	132h00m	46h24m
02. Horas realizadas de todas atividades	134h52m	107h03m	132h55m	139h50m	136h53m	144h24m	137h54m	77h10m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	108h55m	86h10m	108h55m	108h55m	109h10m	109h45m	109h10m	35h14m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	87h49m	84h24m	109h24m	121h53m	108h39m	113h58m	111h49m	41h23m
05. Pontos planejados	40,0	38,0	27,5	31,5	36,5	32,5	39,5	15,0
06. Pontos entregues	26	34	32,5	41	36	40,5	41	15,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	8,00	30,50	22,00	35,00	19,00	34,50	27,00	11,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	18,00	3,50	10,50	6,00	17,00	6,00	14,00	4,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	4	9	6	4	5	7	7	5
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	3	7	4	5	9	11	3
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m						
14. Pontos de retrabalho	0	1	0	0	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,368	0,441	0,253	0,290	0,335	0,297	0,362	0,426
16. Produtividade realizada	0,297	0,403	0,298	0,337	0,332	0,356	0,367	0,375
17. % Pontos NP / Pontos entregues	69,3	10,3	32,4	14,7	47,3	14,9	34,2	29,1

PROD - Produtividade

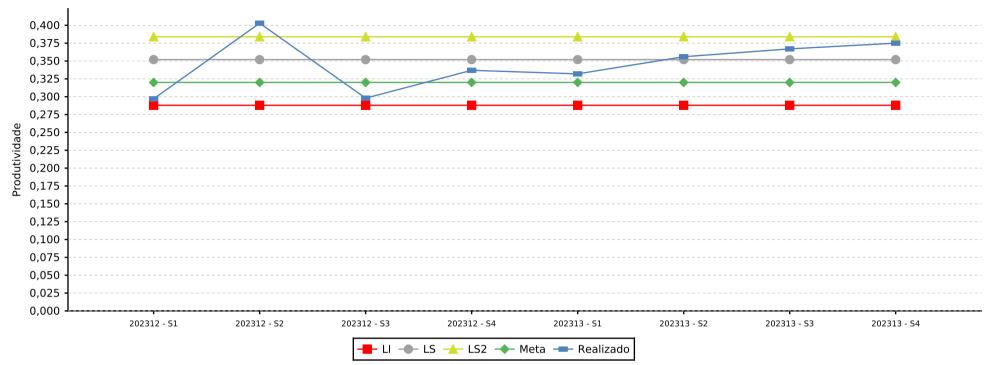


		202	312		202313					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,297	0,403	0,298	0,337	0,332	0,356	0,367	0,375		
Meta	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320		
LS2	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384		
LS	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352		
LI	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288		

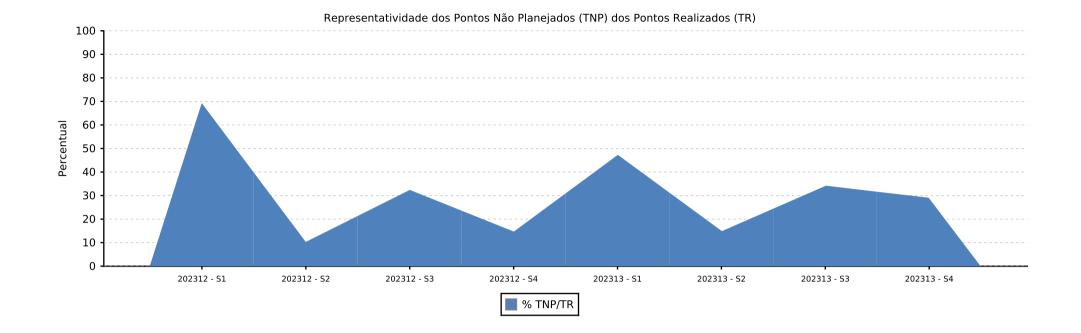


		202	312			202	313	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	26	34	32.5	41	36	40.5	41	15.5
TNP - Pontos Não Planejados	18	3.5	10.5	6	17	6	14	4.5
% TNP/TR	69,3	10,3	32,4	14,7	47,3	14,9	34,2	29,1

NBUG - № de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

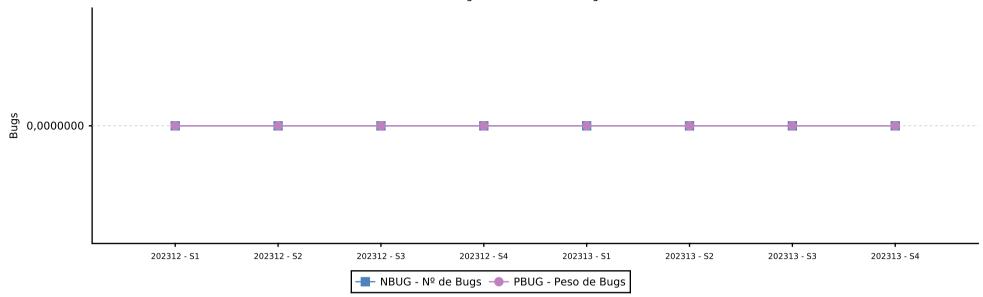

		202	312			202	313	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	26	34	32.5	41	36	40.5	41	15.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

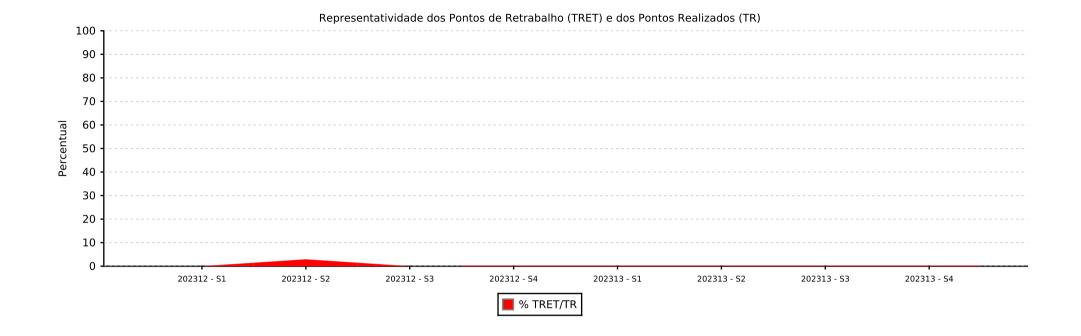


		202	312			202	313	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	26	34	32.5	41	36	40.5	41	15.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1	0	0	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	93,17	96,87	93,75	106,05	93,17	99,27	23,4	38,88	303,49	341,07	112,4 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	0,0 %
Analise de Sistema	9	7,42	9	15,78	9	7,2	4,5	10,67	31,5	41,07	130,4 %
Ausencia	0	10,52	0	5,13	0	6,88	0	3,43	0	25,96	0,0 %
Compilacao de sistemas	1	0,55	1	2,03	1	1,07	1	2,02	4	5,67	141,8 %
Cafe	3,75	2,83	3,5	2,5	3,75	3,25	1,5	1,5	12,5	10,08	80,6 %
Ginastica Laboral	2	1,52	1,67	2,13	2	1,7	0,83	0,83	6,5	6,18	95,1 %
Retrospectiva	3	2	3	2	3	2,92	2	0,83	11	7,75	70,5 %
Sprint Planning 1	4,5	2,7	4,5	1,5	4,5	3,98	3	0,5	16,5	8,68	52,6 %
Planejamento de Projeto	0,25	1,78	0,25	0	0,25	0	1	0,5	1,75	2,28	130,3 %
Sprint Planning 2	3	1,5	3	0,75	3	1,25	2	0,33	11	3,83	34,8 %
Daily Scrum	3	1,8	3	2,58	3	0,85	1,08	0,33	10,08	5,56	55,2 %
Code Review	2,5	2,47	2,5	1,5	2,5	3,48	1,5	0,33	9	7,78	86,4 %
Correcao de Erros Externo	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,25	2	0,25	0,83	0,25	3,55	0,25	0	1	6,38	638,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	0,42	1,47	0,42	0	0,42	0	0,17	0	1,43	1,47	102,8 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	3	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0,27	0	0	0	0	0	0,27	0,0 %


Clean Code	0,75	0	0,75	0,25	0,75	0	0,75	0	3	0,25	8,3 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	3	0	3	0	3	0	0,5	0	9,5	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Reuniao	1	1,47	1	1,08	1	1	1	0	4	3,55	88,8 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	132,01	136,9	132,01	144,38	132,01	137,9	46,4	77,15	442,43	496,33	112,2 %

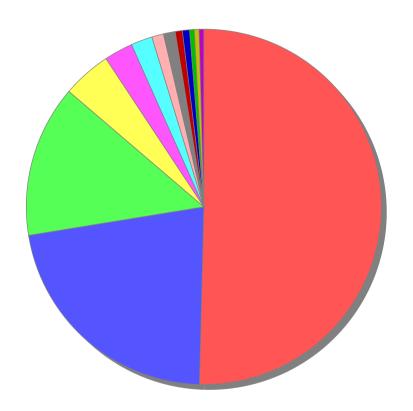

- Desenvolvimento [50.38%]
- Folga [22.03%]
- Analise de Sistema [13.83%]
- O Ausencia [4.44%]
- Compilacao de sistemas [2.62%]
- Cafe [1.94%]
- Ginastica Laboral [1.08%]
- Retrospectiva [1.08%]
- Sprint Planning 1 [0.65%]
- Planejamento de Projeto [0.65%]
- Sprint Planning 2 [0.43%]
- Daily Scrum [0.43%]
- Code Review [0.43%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	95,58	98,87	96,17	107,13	95,58	102,82	25,82	38,88	313,15	347,7	111,0 %
REQM - Gestao de Requisitos		19,5	11,62	19,5	18,03	19,5	13,93	10	11,5	68,5	55,08	80,4 %
DIV - Diversos*		7,17	17,8	6,58	11,12	7,17	12,83	3,5	5,77	24,42	47,52	194,6 %
CM - Gerencia de Configuracao		1	0,55	1	2,03	1	1,07	1,5	2,02	4,5	5,67	126,0 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	8,5	6,27	8,5	6,08	8,5	7,25	4,58	1,5	30,08	21,1	70,1 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	1,78	0,25	0	0,25	0	1	0,5	1,75	2,28	130,3 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	132	136,89	132	144,39	132	137,9	46,4	60,17	442,4	479,35	108,4 %

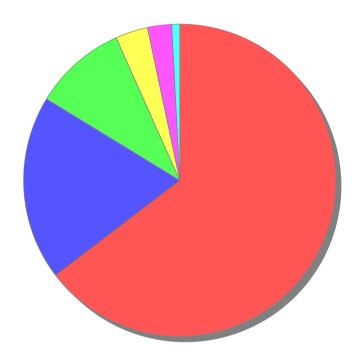


- Desenvolvimento de Requisitos [64.62%]
- Gestao de Requisitos [19.11%]
- Diversos* [9.59%]
- O Gerencia de Configuracao [3.36%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [2.49%]
- Planejamento de Projeto [0.83%]

INDICADORES DO PROJETO


	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
01. Horas planejadas de todas atividades	504h00m	704h00m	704h00m	638h24m	704h00m	544h00m	504h00m	442h24m
02. Horas realizadas de todas atividades	589h41m	734h32m	729h31m	648h01m	729h06m	534h40m	514h40m	496h21m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	415h35m	592h40m	588h40m	524h14m	584h40m	442h20m	412h55m	363h19m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	510h27m	556h18m	559h52m	490h48m	582h02m	404h28m	403h30m	375h49m
05. Pontos planejados para o projeto	0,0	181,0	180,0	163,0	184,0	140,0	132,0	117,0
06. Pontos planejados	139,5	179,0	170,5	159,0	174,0	137,5	137,0	123,5
07. Pontos entregues	171	175,5	180	162,5	205,5	134	133,5	133
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	145,00	148,50	115,50	96,00	157,50	102,00	95,50	91,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	26,00	27,00	64,50	66,50	48,00	32,00	38,00	41,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	0	0	0	6	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	35	40	41	34	34	49	23	24
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	10	16	40	44	38	37	26	28
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	1	0	0	1	3	0	0
14. Horas de correção de bug	0h15m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	3h31m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0,5	1	0	0	2,5	6	1	0
16. Produtividade planejada	0,336	0,303	0,290	0,304	0,298	0,311	0,332	0,340
17. Produtividade realizada	0,335	0,316	0,322	0,332	0,354	0,332	0,331	0,354
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	0	97	100	99,7	111,7	95,8	101,2	113,7
19. % Pontos NP / Pontos entregues	15,3	15,4	35,9	41	23,4	23,9	28,5	31,3

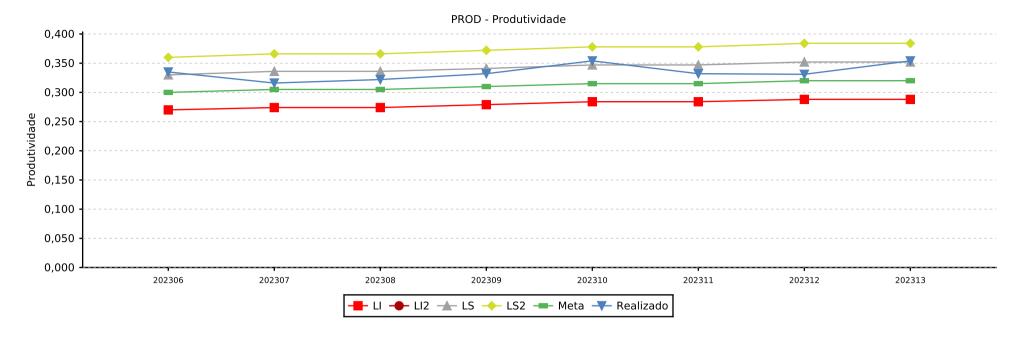


	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
Realizado	0,335	0,316	0,322	0,332	0,354	0,332	0,331	0,354
Meta	0,300	0,305	0,305	0,310	0,315	0,315	0,320	0,320
LS2	0,360	0,366	0,366	0,372	0,378	0,378	0,384	0,384
LS	0,330	0,336	0,336	0,341	0,347	0,347	0,352	0,352
LI2								
LI	0,270	0,274	0,274	0,279	0,284	0,284	0,288	0,288

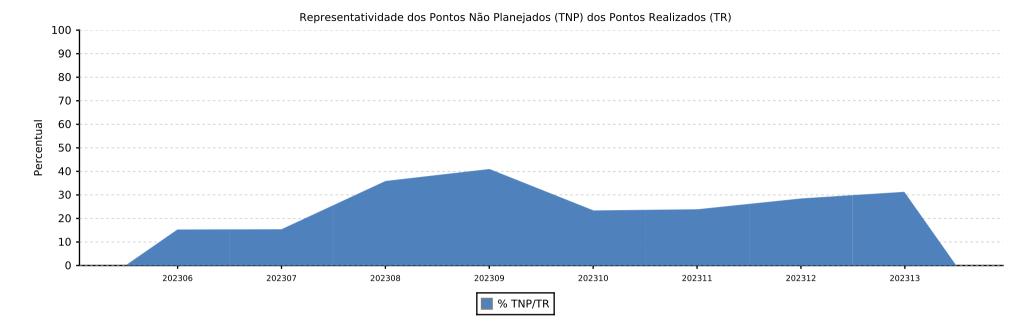


	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
TR - Pontos Realizados	171	175.5	180	162.5	205.5	134	133.5	133
TNP - Pontos Não Planejados	26	27	64.5	66.5	48	32	38	41.5
% TNP/TR	15,3	15,4	35,9	41,0	23,4	23,9	28,5	31,3

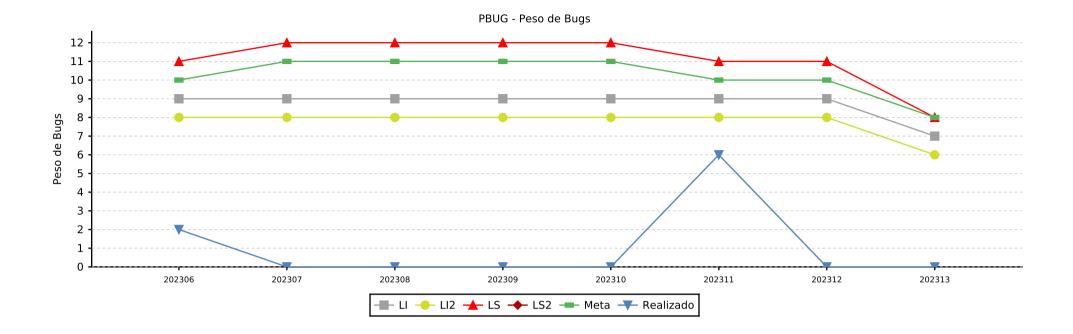


	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
Realizado	2	0	0	0	0	6	0	0
Meta	10	11	11	11	11	10	10	8
LS2								
LS	11	12	12	12	12	11	11	8
LI2	8	8	8	8	8	8	8	6
LI	9	9	9	9	9	9	9	7
Pontos Entregues	171	175.5	180	162.5	205.5	134	133.5	133
% PBUG / TR	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00

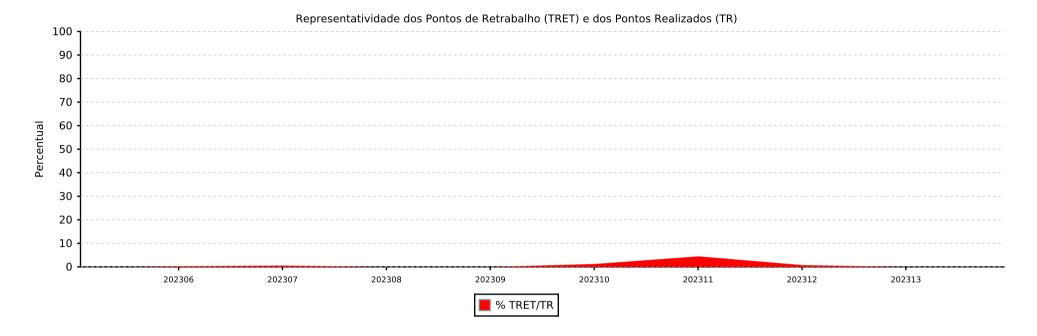


	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
TR - Pontos Realizados	171	175.5	180	162.5	205.5	134	133.5	133
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	1	0	0	2.5	6	1	0
% TRET/TR	0,3	0,6	0,0	0,0	1,2	4,5	0,7	0,0

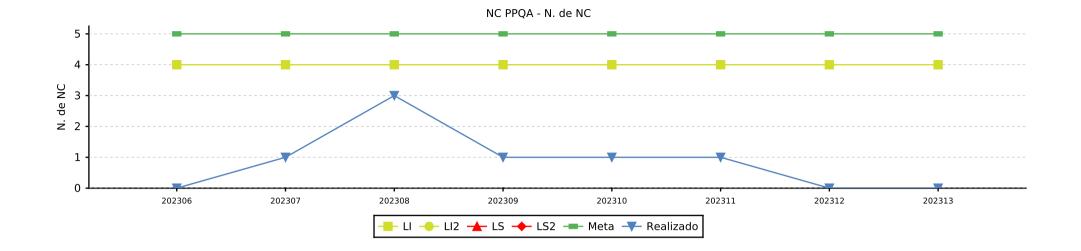


	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
Realizado	0	1	3	1	1	1	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

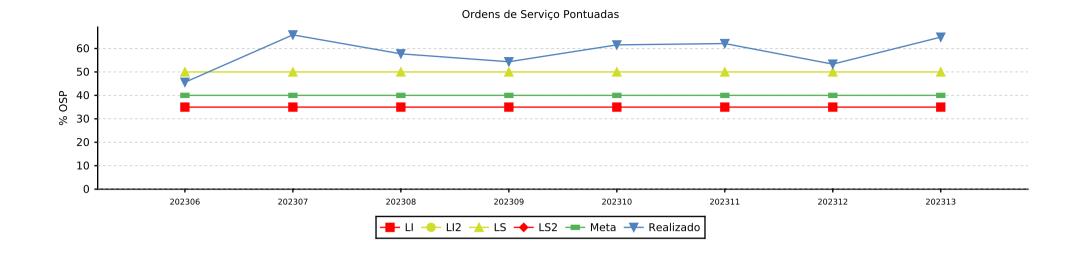

	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
Realizado	45.59	65.82	57.73	54.35	61.54	62.11	53.33	64.84
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

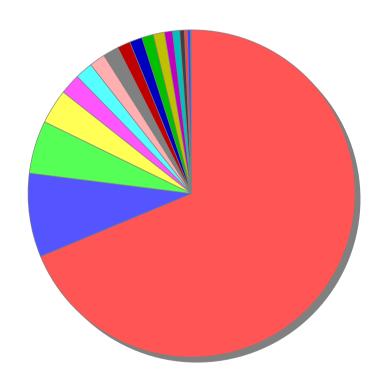

- Desenvolvimento [68.72%]
- Analise de Sistema [8.27%]
- Ausencia [5.23%]
- Folga [3.43%]
- Cafe [2.03%]
- Sprint Planning 1 [1.75%]
- Code Review [1.57%]
- Retrospectiva [1.56%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.29%]
- Ginastica Laboral [1.25%]
- Compilacao de sistemas [1.14%]
- Daily Scrum [1.12%]
- Sprint Planning 2 [0.77%]
- Reuniao [0.72%]
- Planejamento de Projeto [0.46%]
- Preparando ambiente [0.3%]
- Outros [0.3%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.05%]
- Clean Code [0.05%]

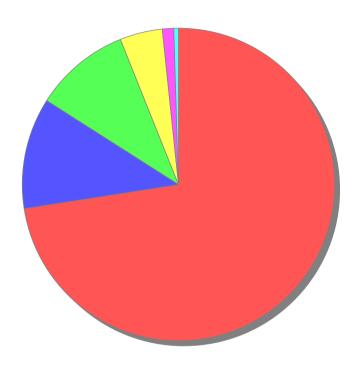

- Desenvolvimento de Requisitos [70.05%]
- Gestao de Requisitos [11.1%]
- Diversos* [9.57%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [4.25%]
- Gerencia de Configuracao [1.14%]
- Planejamento de Projeto [0.46%]
