

INDICADORES DA SPRINT

| | | 202 | 305 | | | 202 | 306 | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01. Horas planejadas de todas atividades | 132h00m | 108h00m | 136h00m | 176h00m | 132h00m | 132h00m | 108h00m | 132h00m |
| 02. Horas realizadas de todas atividades | 177h34m | 145h32m | 145h42m | 192h33m | 132h44m | 133h01m | 150h29m | 173h27m |
| 03. Horas planejadas de desenvolvimento | 109h45m | 87h00m | 110h15m | 148h05m | 109h35m | 109h35m | 86h50m | 109h35m |
| 04. Horas realizadas de desenvolvimento | 156h59m | 116h21m | 126h45m | 155h08m | 117h22m | 119h38m | 129h50m | 143h37m |
| 05. Pontos planejados | 51,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 36,0 | 34,5 | 23,5 | 45,5 |
| 06. Pontos entregues | 46 | 34 | 46 | 50,5 | 36 | 46 | 42 | 47 |
| 07. Pontos entregues (apenas Tarefa) | 38,00 | 24,00 | 38,00 | 46,50 | 28,00 | 40,50 | 33,50 | 43,00 |
| 08. Pontos entregues (apenas NP) | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 5,50 | 8,50 | 4,00 |
| 09. Pontos entregues (apenas Erro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa) | 8 | 4 | 8 | 12 | 7 | 8 | 7 | 13 |
| 11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP) | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13. Horas de correção de bug | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h15m | 0h00m | 0h00m |
| 14. Pontos de retrabalho | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 15. Produtividade planejada | 0,465 | 0,575 | 0,472 | 0,372 | 0,329 | 0,315 | 0,271 | 0,416 |
| 16. Produtividade realizada | 0,294 | 0,293 | 0,363 | 0,326 | 0,307 | 0,385 | 0,324 | 0,328 |
| 17. % Pontos NP / Pontos entregues | 17,4 | 29,5 | 17,4 | 8 | 22,3 | 12 | 20,3 | 8,6 |

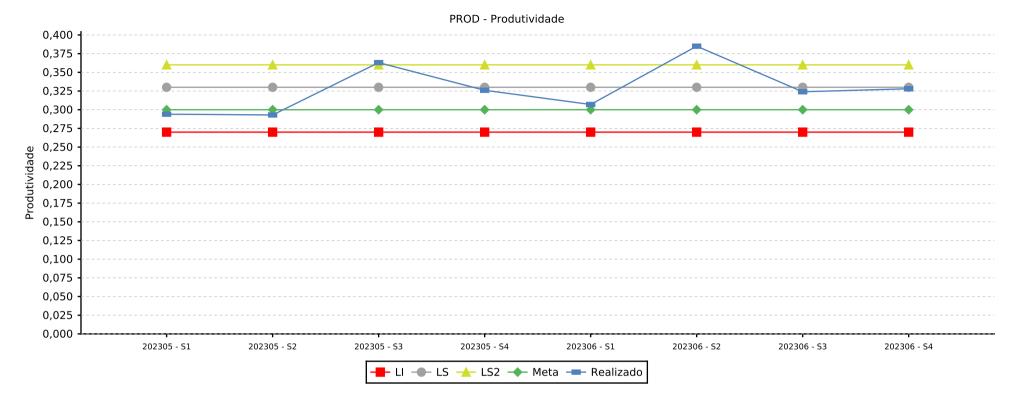


| | | 202 | 305 | | 202306 | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Realizado | 0,294 | 0,293 | 0,363 | 0,326 | 0,307 | 0,385 | 0,324 | 0,328 | | |
| Meta | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | | |
| LS2 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | | |
| LS | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | | |
| LI | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | | |

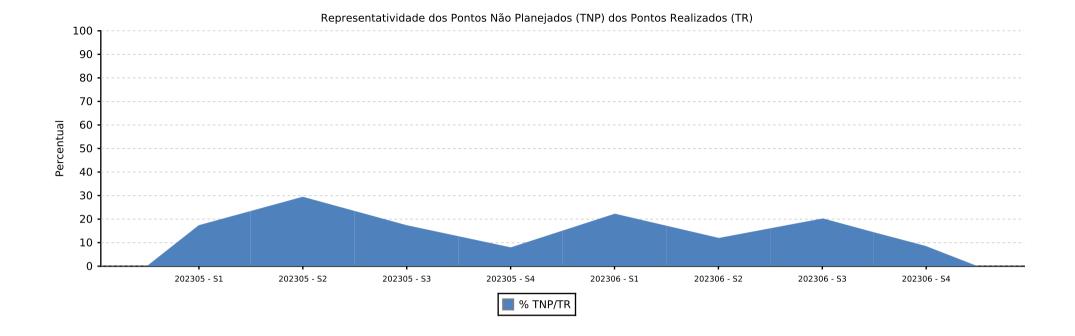


| | | 202 | 305 | | | 202 | 306 | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TR - Pontos Realizados | 46 | 34 | 46 | 50.5 | 36 | 46 | 42 | 47 |
| TNP - Pontos Não Planejados | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 5.5 | 8.5 | 4 |
| % TNP/TR | 17,4 | 29,5 | 17,4 | 8,0 | 22,3 | 12,0 | 20,3 | 8,6 |

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

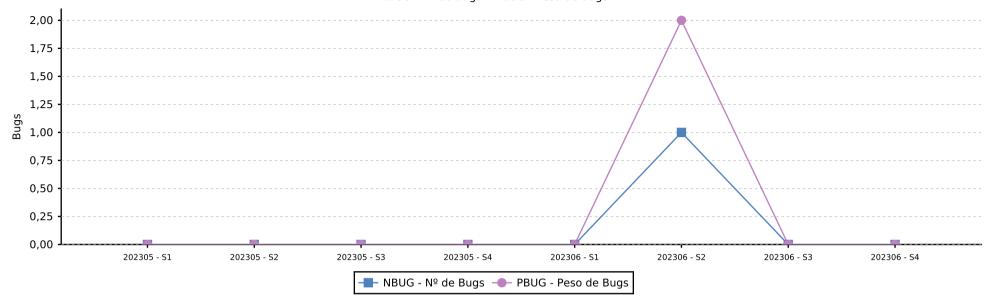

| | | 202 | 305 | | | 202 | 306 | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| NBUG - Nº de Bugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PBUG - Peso de Bugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pontos Entregues | 46 | 34 | 46 | 50.5 | 36 | 46 | 42 | 47 |
| % PBUG / TR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 |

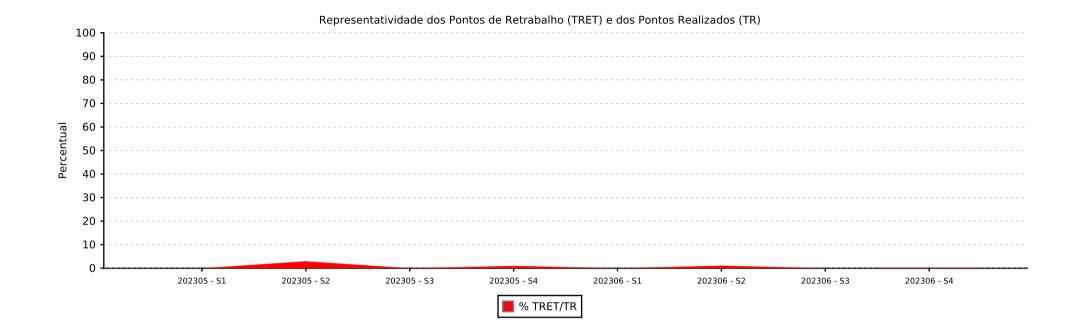


| | | 202 | 305 | | | 202 | 306 | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TR - Pontos Realizados | 46 | 34 | 46 | 50.5 | 36 | 46 | 42 | 47 |
| TRET - Pontos de Retrabalho | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| % TRET/TR | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |

HORAS POR ATIVIDADE

| | Spri | int 1 | Spr | nt 2 | Spri | int 3 | Spri | nt 4 | То | tal | % HP/HR |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Atividade | Planejado | Realizado | Total |
| Desenvolvimento | 93,58 | 105,53 | 93,58 | 109,22 | 71,58 | 116,9 | 92,33 | 125,47 | 351,07 | 457,12 | 130,2 % |
| Analise de Sistema | 11 | 5,13 | 11 | 3,03 | 11 | 2,08 | 11 | 8,75 | 44 | 18,99 | 43,2 % |
| Sprint Planning 1 | 4,5 | 3 | 4,5 | 2,33 | 4,5 | 4,58 | 4,5 | 6,67 | 18 | 16,58 | 92,1 % |
| Ausencia | 0 | 1,33 | 0 | 1 | 0 | 6,48 | 0 | 5,62 | 0 | 14,43 | 0,0 % |
| Atestado | 0 | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,63 | 0,0 % |
| Cafe | 3,75 | 2,58 | 3,75 | 3,5 | 3 | 3,75 | 3,75 | 4 | 14,25 | 13,83 | 97,1 % |
| Retrospectiva | 3 | 2,25 | 3 | 1,83 | 3 | 3,75 | 3 | 3,75 | 12 | 11,58 | 96,5 % |
| Daily Scrum | 3 | 3 | 3 | 3,65 | 2,25 | 2,42 | 3 | 2,97 | 11,25 | 12,04 | 107,0 % |
| Clean Code | 0,75 | 0,33 | 0,75 | 1,43 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 2,68 | 3 | 5,21 | 173,7 % |
| Ginastica Laboral | 2,17 | 2 | 2,17 | 2,17 | 1,67 | 2,03 | 2,17 | 2,52 | 8,18 | 8,72 | 106,6 % |
| Sizing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,5 | 3 | 1,88 | 12 | 2,38 | 19,8 % |
| Sprint Planning 2 | 3 | 2,25 | 3 | 0,92 | 3 | 1,42 | 3 | 1,58 | 12 | 6,17 | 51,4 % |
| Code Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 1,52 | 0 | 2,25 | 0,0 % |
| Reuniao | 1 | 1,5 | 1 | 3,33 | 1 | 0,33 | 1 | 0,83 | 4 | 5,99 | 149,8 % |
| Planejamento de Projeto | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 1 | 0,5 | 1,75 | 1,5 | 85,7 % |
| Compilacao de sistemas | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,47 | 0,5 | 0,47 | 2 | 0,94 | 47,0 % |
| Outros | 0,58 | 0,18 | 0,58 | 0,35 | 0,58 | 0,1 | 0,58 | 0,25 | 2,32 | 0,88 | 37,9 % |
| Curso/Palestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Banheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria de Gerencia de Configuração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Criacao de Ambiente de Desenv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxílio Desenv. Outras Equipes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Abrir o.s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Correcao de Erros Externo | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | 3 | 0,25 | 8,3 % |
| Auxilio ao Desenvolvimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Particular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio Comercial / Backoffice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Solicitar merge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Check List | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Verificando apontamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Merge O.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria de DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Pre-teste Pre-teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |


| Verificar o.s no nome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
|------------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|---------|
| Documentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Gerenciamento de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Preparando ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 3,02 | 0,0 % |
| Folga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Checklist dos Backups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atendimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Recesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Correção de Erros Interno | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | 3 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio ao Suporte e Implantacao | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Teste Automatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Zabbix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria da Garantia da Qualidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Férias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Manutenção Preventiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Geração de Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atividades Gerenciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Release Notes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atraso / Saida antecipada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0,0 % |
| Levantamento de Requisito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atualizacao de Versao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Feriado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Organização sala / equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Teste | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 0,68 | 0 | 0,0 % |
| Treinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Manutenção de Servidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Analise Retorno O.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Analise de O.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Recursos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Integrações de sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Geracao de Baseline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,0 % |
| Atividade Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio suporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Análise de Sistemas H/FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Instrutor Treinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atendimento GBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Fazendo manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Total Geral | 132 | 132,71 | 132 | 133,01 | 108 | 150,48 | 132 | 173,46 | 504 | 589,66 | 117,0 % |

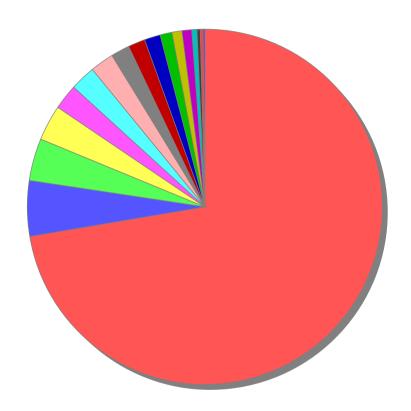

- Desenvolvimento [72.34%]
- Analise de Sistema [5.04%]
- Sprint Planning 1 [3.85%]
- Ausencia [3.24%]
- Atestado [2.31%]
- Cafe [2.31%]
- Retrospectiva [2.16%]
- Daily Scrum [1.71%]
- Clean Code [1.55%]
- Ginastica Laboral [1.45%]
- Sizing [1.08%]
- Sprint Planning 2 [0.91%]
- Code Review [0.88%]
- Reuniao [0.48%]
- Planejamento de Projeto [0.29%]
- Compilacao de sistemas [0.27%]
- Outros [0.14%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI

| | | Spri | nt 1 | Spri | nt 2 | Spri | int 3 | Spri | nt 4 | То | tal | % HP/HR |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Area CMMI | | Planejado | Realizado | Total |
| RD - Desenvolvimento de Requisitos | 3 | 96 | 105,87 | 96 | 110,9 | 74 | 117,67 | 94,75 | 128,15 | 360,75 | 462,59 | 128,2 % |
| REQM - Gestao de Requisitos | | 21,5 | 10,38 | 21,5 | 6,28 | 21,5 | 11,6 | 21,5 | 18,88 | 86 | 47,14 | 54,8 % |
| DIV - Diversos* | | 7,75 | 7,6 | 7,75 | 10,35 | 6,5 | 12,7 | 7,75 | 13,22 | 29,75 | 43,87 | 147,5 % |
| PMC - Monitoramento e Controle de | Projeto | 6 | 5,25 | 6 | 5,48 | 5,25 | 6,9 | 6 | 8,23 | 23,25 | 25,86 | 111,2 % |
| PP - Planejamento de Projeto | | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 1 | 0,5 | 1,75 | 1,5 | 85,7 % |
| CM - Gerencia de Configuração | | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,47 | 1 | 0,47 | 2,5 | 0,94 | 37,6 % |
| PI - Integracao de Produto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| PPQA - Garantia da Qualidade de P | rocesso e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| OT - Treinamento na Organizacao | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | Total Geral | 132 | 130,1 | 132 | 133,01 | 108 | 149,34 | 132 | 169,45 | 504 | 581,9 | 115,5 % |

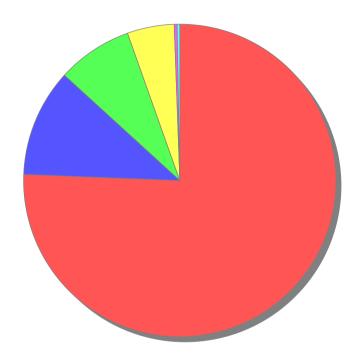


- Desenvolvimento de Requisitos [75.63%]
- Gestao de Requisitos [11.14%]
- Diversos* [7.8%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [4.86%]
- Planejamento de Projeto [0.3%]
- Gerencia de Configuracao [0.28%]


INDICADORES DO PROJETO

| | 202212 | 202213 | 202301 | 202302 | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01. Horas planejadas de todas atividades | 423h24m | 336h00m | 388h00m | 638h30m | 704h00m | 638h24m | 552h00m | 504h00m |
| 02. Horas realizadas de todas atividades | 527h22m | 459h02m | 450h59m | 647h06m | 718h29m | 649h09m | 661h21m | 589h41m |
| 03. Horas planejadas de desenvolvimento | 344h39m | 287h00m | 330h35m | 542h10m | 604h40m | 539h24m | 455h05m | 415h35m |
| 04. Horas realizadas de desenvolvimento | 380h11m | 315h48m | 284h17m | 531h26m | 599h12m | 516h13m | 555h13m | 510h27m |
| 05. Pontos planejados para o projeto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,0 | 200,0 | 177,0 | 160,0 | 0,0 |
| 06. Pontos planejados | 107,5 | 101,5 | 101,0 | 100,5 | 126,0 | 152,0 | 208,0 | 139,5 |
| 07. Pontos entregues | 128 | 131,5 | 98,5 | 189,5 | 198 | 166 | 176,5 | 171 |
| 08. Pontos entregues (apenas Tarefa) | 89,50 | 95,00 | 90,00 | 127,00 | 147,00 | 122,00 | 146,50 | 145,00 |
| 09. Pontos entregues (apenas NP) | 38,50 | 36,50 | 8,50 | 62,50 | 51,00 | 44,00 | 30,00 | 26,00 |
| 10. Pontos entregues (apenas Erro) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa) | 26 | 22 | 16 | 35 | 46 | 42 | 32 | 35 |
| 12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP) | 13 | 28 | 12 | 36 | 34 | 25 | 22 | 10 |
| 13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. Horas de correção de bug | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h59m | 0h00m | 0h15m |
| 15. Pontos de retrabalho | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |
| 16. Produtividade planejada | 0,312 | 0,354 | 0,306 | 0,186 | 0,209 | 0,282 | 0,458 | 0,336 |
| 17. Produtividade realizada | 0,337 | 0,417 | 0,347 | 0,357 | 0,331 | 0,322 | 0,318 | 0,335 |
| 18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto | 0 | 0 | 0 | 116,3 | 99 | 93,8 | 110,4 | 0 |
| 19. % Pontos NP / Pontos entregues | 30,1 | 27,8 | 8,7 | 33 | 25,8 | 26,6 | 17 | 15,3 |




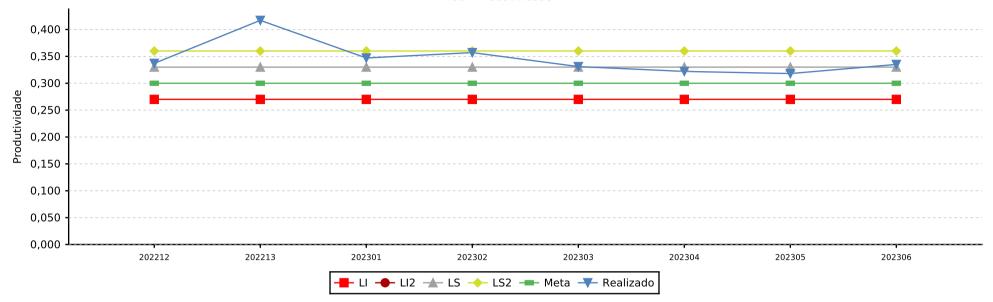


| | 202212 | 202213 | 202301 | 202302 | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 0,337 | 0,417 | 0,347 | 0,357 | 0,331 | 0,322 | 0,318 | 0,335 |
| Meta | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| LS2 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| LS | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| LI2 | | | | | | | | |
| LI | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |

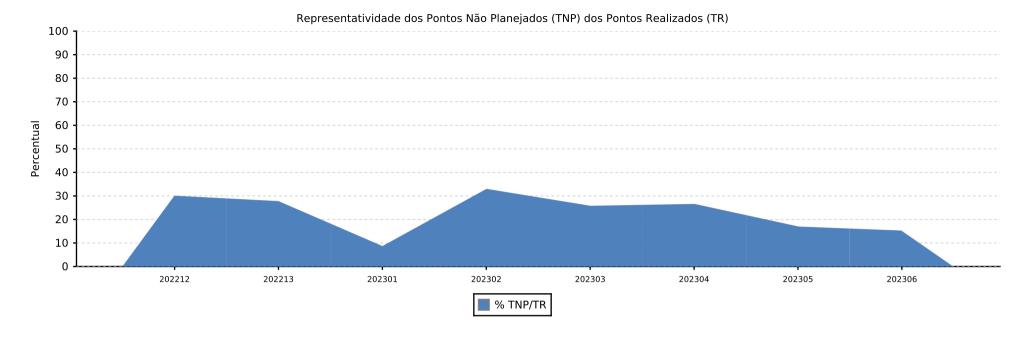


| | 202212 | 202213 | 202301 | 202302 | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TR - Pontos Realizados | 128 | 131.5 | 98.5 | 189.5 | 198 | 166 | 176.5 | 171 |
| TNP - Pontos Não Planejados | 38.5 | 36.5 | 8.5 | 62.5 | 51 | 44 | 30 | 26 |
| % TNP/TR | 30,1 | 27,8 | 8,7 | 33,0 | 25,8 | 26,6 | 17,0 | 15,3 |

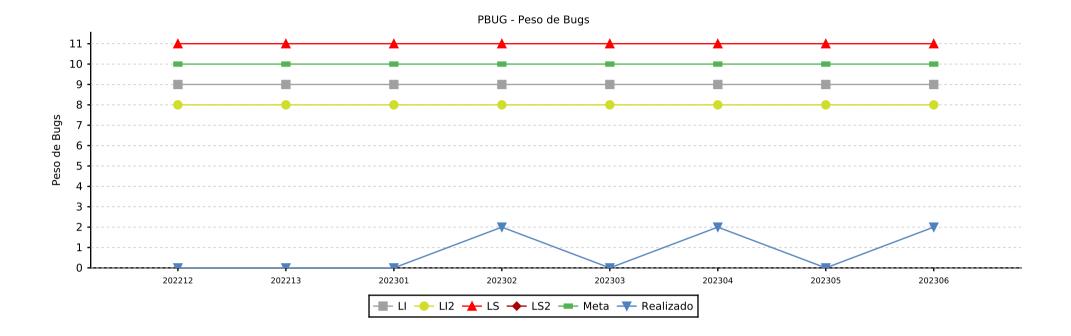


| | 202212 | 202213 | 202301 | 202302 | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Meta | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| LS2 | | | | | | | | |
| LS | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| LI2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| LI | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Pontos Entregues | 128 | 131.5 | 98.5 | 189.5 | 198 | 166 | 176.5 | 171 |
| % PBUG / TR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,17 |

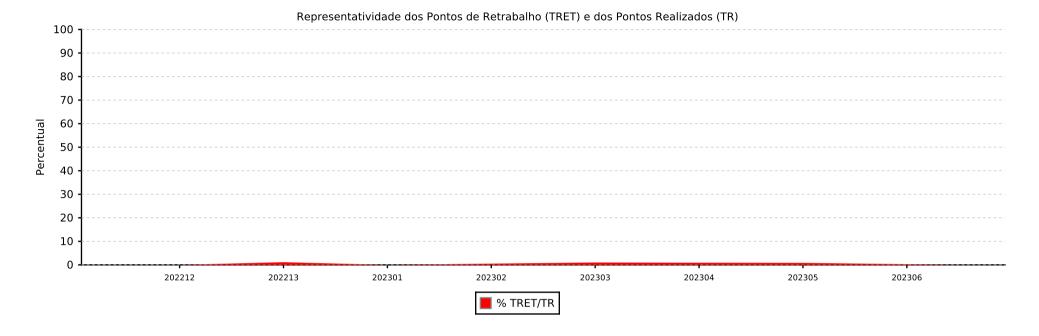


| | 202212 | 202213 | 202301 | 202302 | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TR - Pontos Realizados | 128 | 131.5 | 98.5 | 189.5 | 198 | 166 | 176.5 | 171 |
| TRET - Pontos de Retrabalho | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
| % TRET/TR | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,3 |

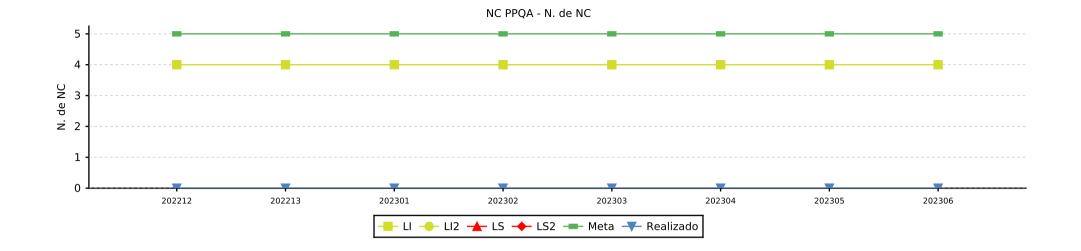


| | 202212 | 202213 | 202301 | 202302 | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LS2 | | | | | | | | |
| LS | | | | | | | | |
| LI2 | | | | | | | | |
| LI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

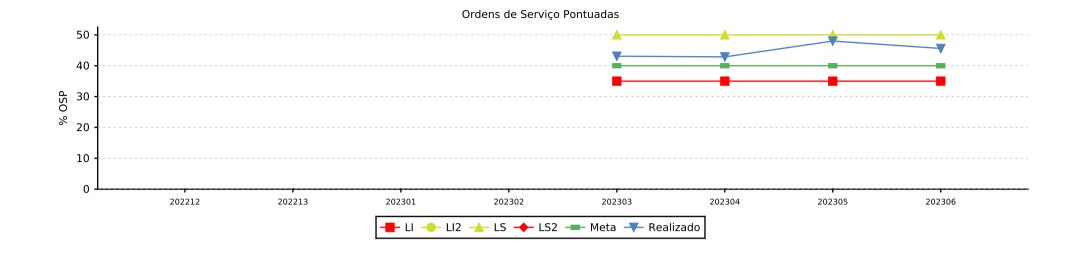

| | 202212 | 202213 | 202301 | 202302 | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 42.86 | 48 | 45.59 |
| Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| LS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| LI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |

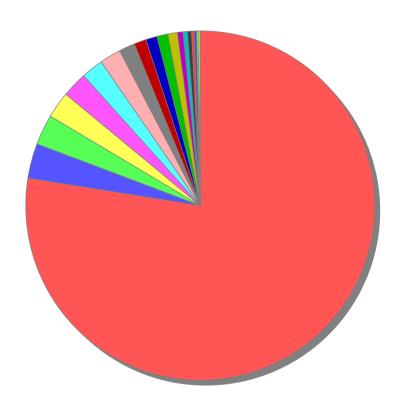

- Desenvolvimento [77.52%]
- Analise de Sistema [3.22%]
- Sprint Planning 1 [2.81%]
- Ausencia [2.45%]
- Cafe [2.35%]
- Daily Scrum [2.04%]
- Retrospectiva [1.96%]
- Ginastica Laboral [1.48%]
- Atestado [1.12%]
- Sprint Planning 2 [1.05%]
- Reuniao [1.02%]
- Clean Code [0.89%]
- Preparando ambiente [0.51%]
- Sizing [0.4%]
- Code Review [0.38%]
- Planejamento de Projeto [0.25%]
- Atraso / Saida antecipada [0.2%]
- Compilacao de sistemas [0.16%]
- Outros [0.15%]
- Correcao de Erros Externo [0.04%]



- Desenvolvimento de Requisitos [78.45%]
- Gestao de Requisitos [8%]
- Diversos* [7.44%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [4.39%]
- Planejamento de Projeto [0.25%]
- Gerencia de Configuracao [0.16%]
