

INDICADORES DA SPRINT

		202	507			202	508	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	224h00m	264h00m	228h00m	220h00m	176h00m	176h00m	212h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	254h41m	264h23m	229h55m	217h58m	179h05m	224h38m	260h04m	261h43m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	177h00m	214h05m	184h35m	177h00m	142h05m	142h05m	172h25m	180h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	179h57m	193h46m	169h32m	167h03m	122h25m	188h51m	193h53m	196h57m
05. Pontos planejados	64,0	58,0	72,5	52,0	63,0	56,5	69,5	50,5
06. Pontos entregues	51	63	56,5	55	39	61	64	65
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	34,50	36,00	41,00	36,00	26,50	55,50	48,50	56,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	16,50	27,00	15,50	19,00	12,50	5,50	15,50	9,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	2	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	9	16	15	15	11	6	7	11
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	6	13	11	13	9	3	8	8
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	0	0	1	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	1h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	6	0	0,5	0,5	0	1	0	1
15. Produtividade planejada	0,362	0,271	0,393	0,294	0,444	0,398	0,404	0,281
16. Produtividade realizada	0,284	0,326	0,334	0,330	0,319	0,324	0,331	0,331
17. % Pontos NP / Pontos entregues	32,4	42,9	27,5	34,6	32,1	9,1	24,3	13,9

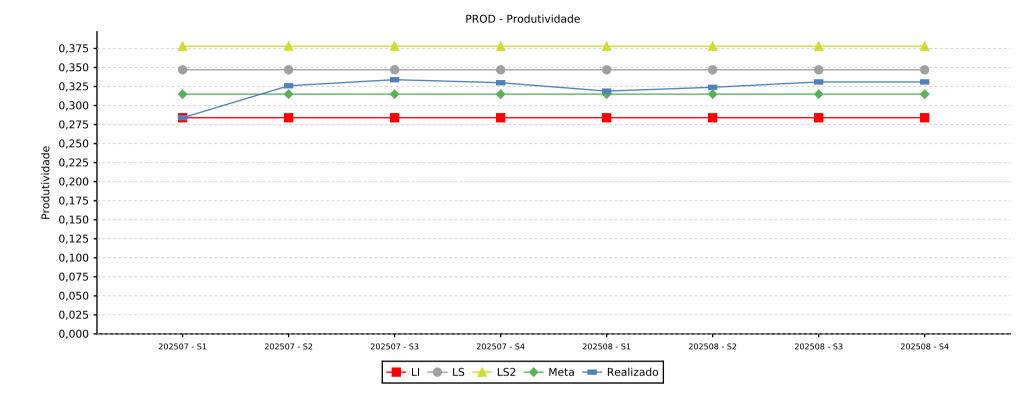


		202	507		202508					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,284	0,326	0,334	0,330	0,319	0,324	0,331	0,331		
Meta	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315		
LS2	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378		
LS	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347		
LI	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284		

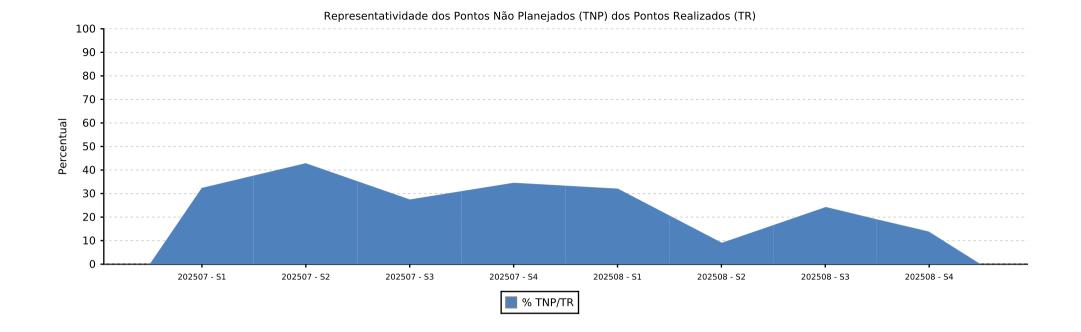


		202	507			202	508	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	51	63	56.5	55	39	61	64	65
TNP - Pontos Não Planejados	16.5	27	15.5	19	12.5	5.5	15.5	9
% TNP/TR	32,4	42,9	27,5	34,6	32,1	9,1	24,3	13,9

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

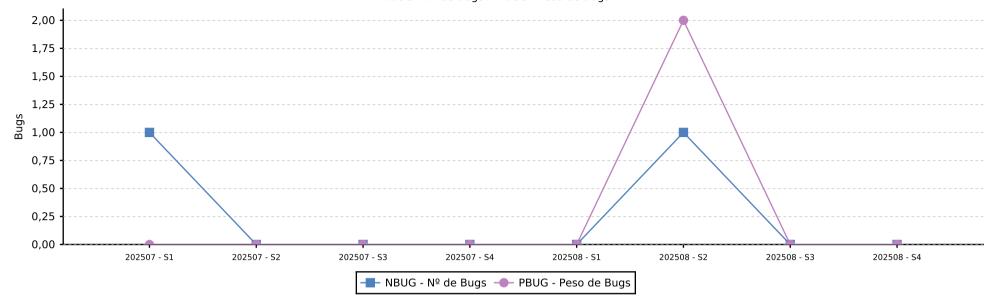

		202	507		202508				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	1	0	0	0	0	1	0	0	
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	2	0	0	
Pontos Entregues	51	63	56.5	55	39	61	64	65	
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	

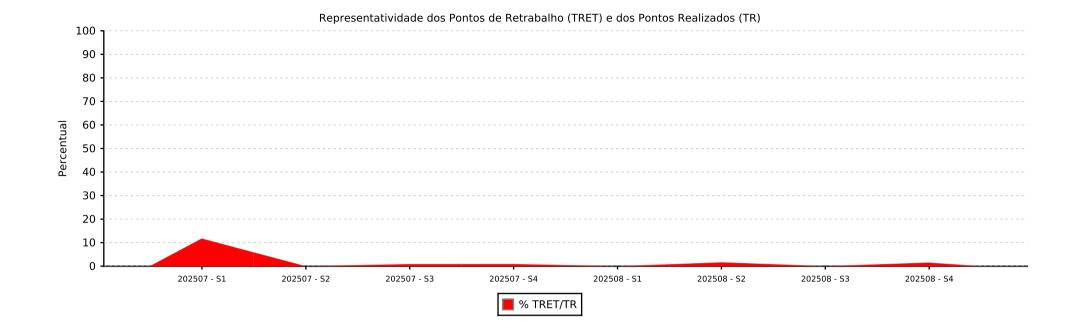


		202	507			202	508	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	51	63	56.5	55	39	61	64	65
TRET - Pontos de Retrabalho	6	0	0.5	0.5	0	1	0	1
% TRET/TR	11,8	0,0	0,9	0,9	0,0	1,6	0,0	1,5

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	116,5	101,07	116,5	158,28	144,08	169,53	145,83	177,28	522,91	606,16	115,9 %
Atestado	0	0	0	0	0	0,83	0	25,5	0	26,33	0,0 %
Analise de Sistema	7,5	10,03	7,5	7,87	11,5	15,42	11,5	13,03	38	46,35	122,0 %
Daily Scrum	8	7,08	8	7,33	9,67	10,77	10	7,25	35,67	32,43	90,9 %
Ausencia	0	0,43	0	5,73	0	10,18	0	6,85	0	23,19	0,0 %
Cafe	4,75	4,5	4,75	6,25	5,75	7,33	6	5,75	21,25	23,83	112,1 %
Ginastica Laboral	2,67	2,83	2,67	3,47	3,33	3,75	3,5	3,52	12,17	13,57	111,5 %
Sizing	2	0	2	0	2	0	2	3,33	8	3,33	41,6 %
Correção de Erros Interno	2	0	2	1,25	2,5	6	2,5	3,17	9	10,42	115,8 %
Code Review	4,25	2,32	4,25	2,92	4,25	5,13	4,25	3,12	17	13,49	79,4 %
Retrospectiva	4	3,33	4	6,08	4	4	5	3	17	16,41	96,5 %
Verificando apontamento	0,42	0,42	0,42	0,33	0,42	1,17	0,42	2	1,68	3,92	233,3 %
Sprint Planning 1	6	6,67	6	7,5	6	1,67	7,5	1,83	25,5	17,67	69,3 %
Clean Code	1	0,58	1	2,4	1,25	0,67	1,25	1,75	4,5	5,4	120,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	1,6	0	2,5	0	0	0	1,33	0	5,43	0,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,75	0,83	2,5	0,83	33,2 %
Treinamento	8	17,72	8	4,3	8	16,12	8	0,83	32	38,97	121,8 %
Sprint Planning 2	4	2,08	4	2,5	4	1,25	5	0,5	17	6,33	37,2 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,0 %
Compilacao de sistemas	1,5	1,5	1,5	1,25	1,5	2,92	1,5	0,33	6	6	100,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	1,08	0	0	0	1,08	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,17	0	0,17	0,5	0,17	0	0,17	0	0,68	0,5	73,5 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Reuniao	1	6,75	1	1,5	1	0	1	0	4	8,25	206,2 %
Analise de O.S	0	1	0	1,17	0	0	0	0	0	2,17	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	7,33	0	0	0	2,25	0	0	0	9,58	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	1	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	1	50,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,33	0	0,33	1	0,67	0	0,67	0	2	1	50,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	1	0,83	1	0,5	1	0	1	0	4	1,33	33,2 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	176,01	179,07	176,01	224,63	212,01	260,07	220,01	261,7	784,04	925,47	118,0 %

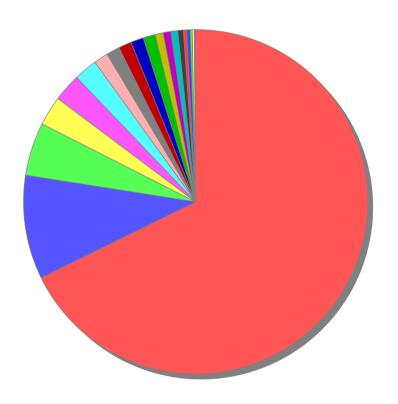

- Desenvolvimento [67.74%]
- Atestado [9.74%]
- Analise de Sistema [4.98%]
- Daily Scrum [2.77%]
- Ausencia [2.62%]
- Cafe [2.2%]
- Ginastica Laboral [1.34%]
- Sizing [1.27%]
- Correção de Erros Interno [1.21%]
- Code Review [1.19%]
- Retrospectiva [1.15%]
- Verificando apontamento [0.76%]
- Sprint Planning 1 [0.7%]
- Clean Code [0.67%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.51%]
- Planejamento de Projeto [0.32%]
- Treinamento [0.32%]
- Sprint Planning 2 [0.19%]
- Atraso / Saida antecipada [0.19%]
- Compilacao de sistemas [0.13%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	120,5	104,25	120,5	165,43	149,17	176,2	150,92	183,53	541,09	629,41	116,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		19,5	18,78	19,5	17,87	23,5	19,42	26	18,7	88,5	74,77	84,5 %
DIV - Diversos*		9,58	15,35	9,58	17,95	11,25	21,27	11,67	16,12	42,08	70,69	168,0 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	16,25	12,73	16,25	16,33	17,92	19,9	19,25	13,37	69,67	62,33	89,5 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,75	0,83	2,5	0,83	33,2 %
CM - Gerencia de Configuração		1,5	1,5	1,5	1,25	1,5	2,92	2	0,33	6,5	6	92,3 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	7,33	0	0	0	2,25	0	0	0	9,58	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	167,58	159,94	167,58	218,83	203,59	241,96	211,59	232,88	750,34	853,61	113,8 %

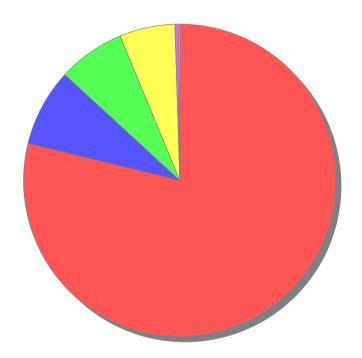


- Desenvolvimento de Requisitos [78.81%]
- Gestao de Requisitos [8.03%]
- Diversos* [6.92%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.74%]
- Planejamento de Projeto [0.36%]
- Gerencia de Configuracao [0.14%]

INDICADORES DO PROJETO


	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
01. Horas planejadas de todas atividades	1021h36m	1056h00m	1109h04m	1175h20m	940h00m	1056h00m	936h00m	784h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1102h30m	1213h13m	1101h19m	1176h51m	985h41m	1295h54m	966h57m	925h30m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	865h06m	906h35m	945h40m	1011h45m	799h55m	847h05m	752h40m	636h35m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	747h07m	966h31m	900h37m	960h37m	739h03m	879h23m	710h18m	702h06m
05. Pontos planejados para o projeto	265,0	280,0	292,0	313,0	252,0	267,0	238,0	200,0
06. Pontos planejados	197,0	276,0	319,5	327,0	226,0	292,0	246,5	239,5
07. Pontos entregues	239,5	329	295,5	319,5	247	294	225,5	229
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	182,00	262,00	231,50	272,50	201,00	216,00	147,50	186,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	57,50	67,00	64,00	47,00	46,00	78,00	78,00	42,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	3	0	2	2	2	0	0	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	56	77	52	65	44	57	55	35
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	31	40	38	37	25	35	43	28
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	0	1	1	2	1	1	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h35m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	1h00m
15. Pontos de retrabalho	1	3,5	4,5	0,5	3,5	1	7	2
16. Produtividade planejada	0,228	0,305	0,338	0,324	0,283	0,345	0,328	0,377
17. Produtividade realizada	0,321	0,341	0,329	0,333	0,335	0,335	0,318	0,327
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	90,4	117,5	101,2	102,1	98,1	110,2	94,8	114,5
19. % Pontos NP / Pontos entregues	24,1	20,4	21,7	14,8	18,7	26,6	34,6	18,6

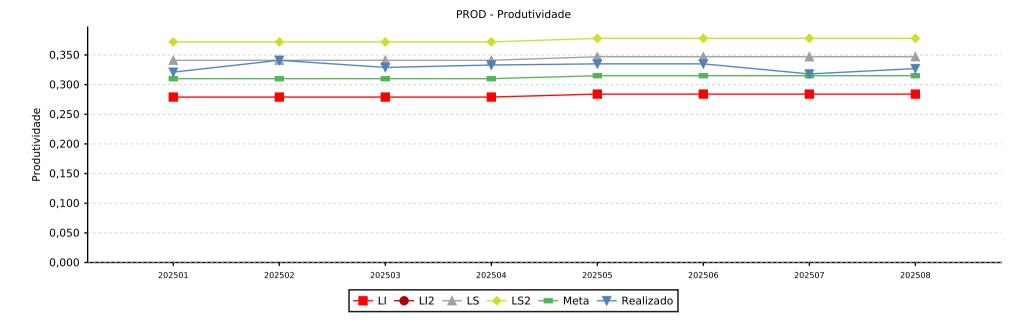


	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
Realizado	0,321	0,341	0,329	0,333	0,335	0,335	0,318	0,327
Meta	0,310	0,310	0,310	0,310	0,315	0,315	0,315	0,315
LS2	0,372	0,372	0,372	0,372	0,378	0,378	0,378	0,378
LS	0,341	0,341	0,341	0,341	0,347	0,347	0,347	0,347
LI2								
LI	0,279	0,279	0,279	0,279	0,284	0,284	0,284	0,284

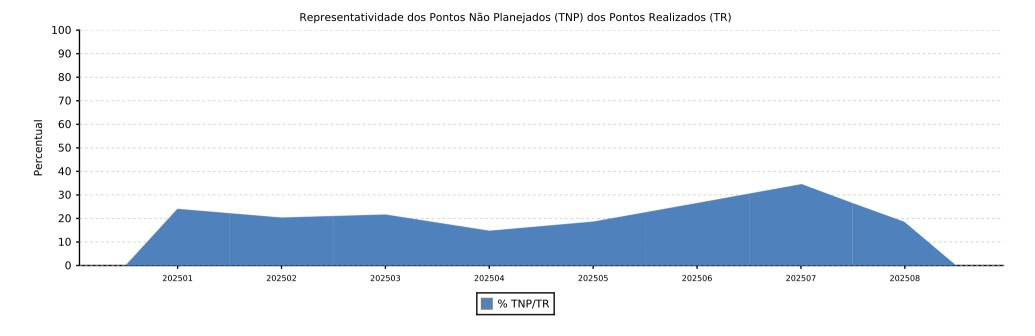


	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
TR - Pontos Realizados	239.5	329	295.5	319.5	247	294	225.5	229
TNP - Pontos Não Planejados	57.5	67	64	47	46	78	78	42.5
% TNP/TR	24,1	20,4	21,7	14,8	18,7	26,6	34,6	18,6

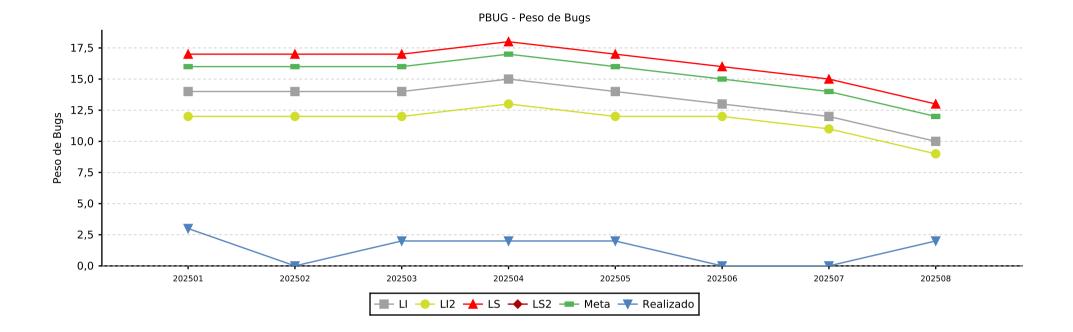


	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
Realizado	3	0	2	2	2	0	0	2
Meta	16	16	16	17	16	15	14	12
LS2								
LS	17	17	17	18	17	16	15	13
LI2	12	12	12	13	12	12	11	9
LI	14	14	14	15	14	13	12	10
Pontos Entregues	239.5	329	295.5	319.5	247	294	225.5	229
% PBUG / TR	1,26	0,00	0,68	0,63	0,81	0,00	0,00	0,88

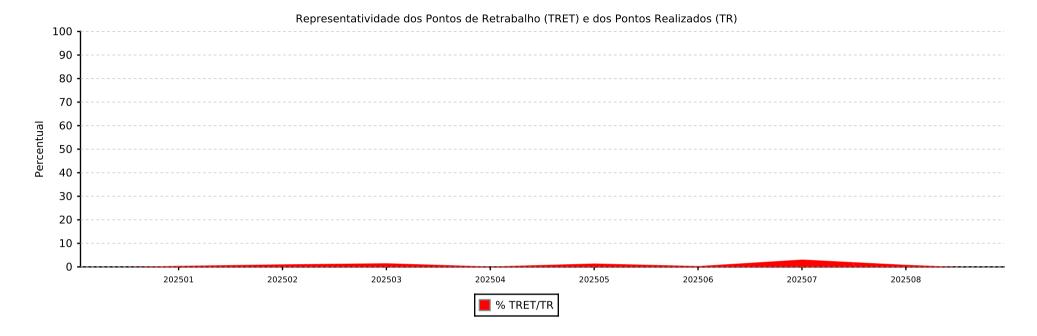


	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
TR - Pontos Realizados	239.5	329	295.5	319.5	247	294	225.5	229
TRET - Pontos de Retrabalho	1	3.5	4.5	0.5	3.5	1	7	2
% TRET/TR	0,4	1,1	1,5	0,2	1,4	0,3	3,1	0,9

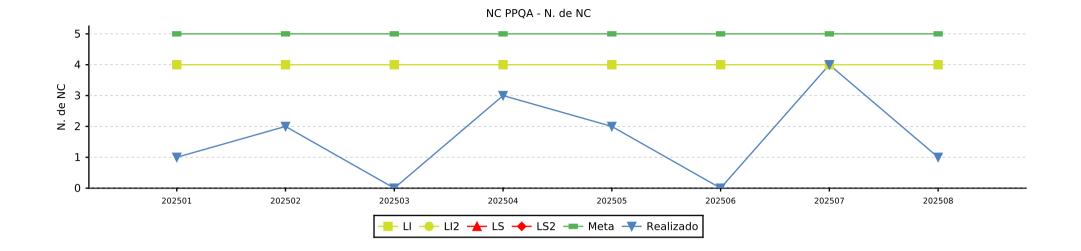


	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
Realizado	1	2	0	3	2	0	4	1
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

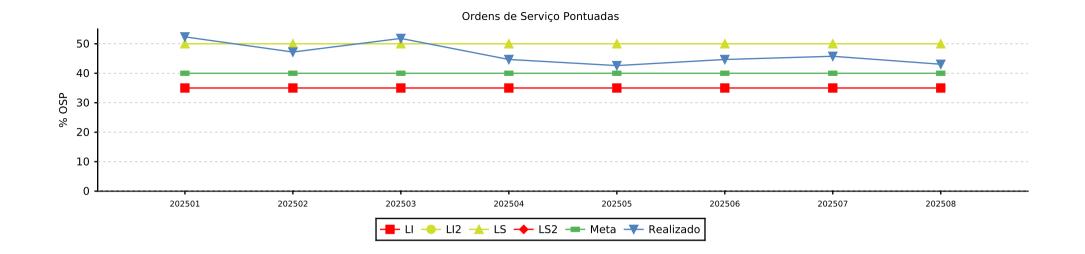

	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
Realizado	52.35	47.2	51.82	44.68	42.6	44.67	45.76	43.06
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

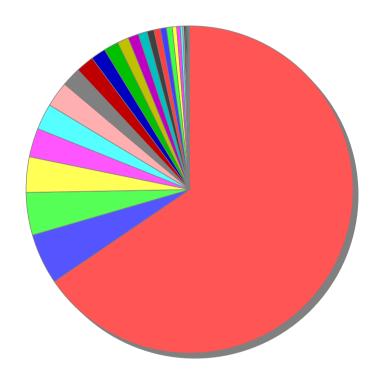

- Desenvolvimento [65.5%]
- Analise de Sistema [5.01%]
- Treinamento [4.21%]
- Opaily Scrum [3.5%]
- Atestado [2.84%]
- Ocafe [2.57%]
- Ausencia [2.51%]
- Sprint Planning 1 [1.91%]
- Retrospectiva [1.77%]
- Ginastica Laboral [1.47%]
- Code Review [1.46%]
- Correção de Erros Interno [1.13%]
- Curso/Palestra [1.04%]
- Reuniao [0.89%]
- Sprint Planning 2 [0.68%]
- Compilação de sistemas [0.65%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.59%]
- Clean Code [0.58%]
- Verificando apontamento [0.42%]
- Sizing [0.36%]
- Analise de O.S [0.23%]
- Outros [0.14%]
- Preparando ambiente [0.12%]
- Correcao de Erros Externo [0.11%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.11%]
- Planejamento de Projeto [0.09%]
- Atraso / Saida antecipada [0.05%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.05%]

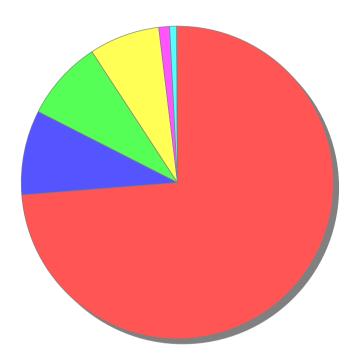

- Desenvolvimento de Requisitos [68.01%]
- Gestao de Requisitos [8.08%]
- Diversos* [7.64%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.73%]
- Treinamento na Organizacao [1.04%]
- Gerencia de Configuracao [0.65%]
- Planejamento de Projeto [0.09%]
