



INDICADORES DA SPRINT


	202411				202412			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	240h00m	264h00m	300h00m	280h00m	308h00m	216h00m	216h00m	308h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	260h25m	260h28m	300h16m	306h58m	315h06m	258h57m	254h31m	312h10m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	202h10m	226h10m	256h35m	235h55m	264h45m	180h15m	180h15m	264h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	206h15m	202h17m	240h45m	250h35m	238h56m	163h24m	167h39m	256h06m
05. Pontos planejados	73,0	74,0	93,5	69,0	86,0	62,5	62,0	78,5
06. Pontos entregues	77,5	64	85,5	85,5	80,5	44	56	82,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	49,00	44,00	71,00	70,50	61,00	34,50	41,00	79,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	28,50	20,00	14,50	15,00	19,50	9,50	15,00	3,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	2	4	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	15	13	19	21	15	11	12	19
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	13	7	10	10	7	5	7	3
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	2	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h40m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0,5	1	0,5	2	0,5	0	2	0
15. Produtividade planejada	0,362	0,328	0,365	0,293	0,325	0,347	0,344	0,297
16. Produtividade realizada	0,376	0,317	0,356	0,342	0,337	0,270	0,335	0,323
17. % Pontos NP / Pontos entregues	36,8	31,3	17	17,6	24,3	21,6	26,8	3,7

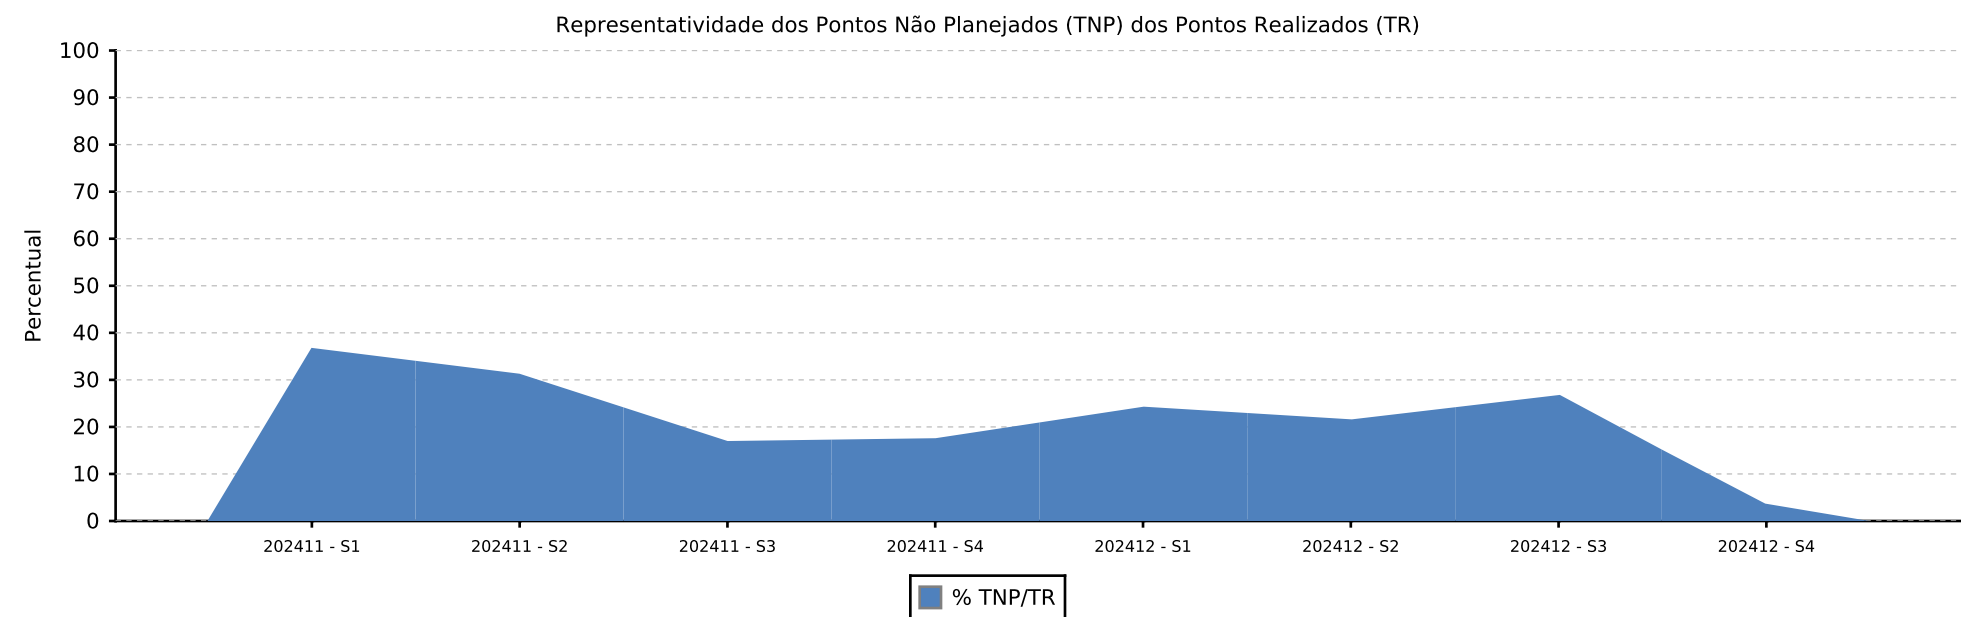

	202411				202412			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	77.5	64	85.5	85.5	80.5	44	56	82.5
TNP - Pontos Não Planejados	28.5	20	14.5	15	19.5	9.5	15	3
% TNP/TR	36,8	31,3	17,0	17,6	24,3	21,6	26,8	3,7

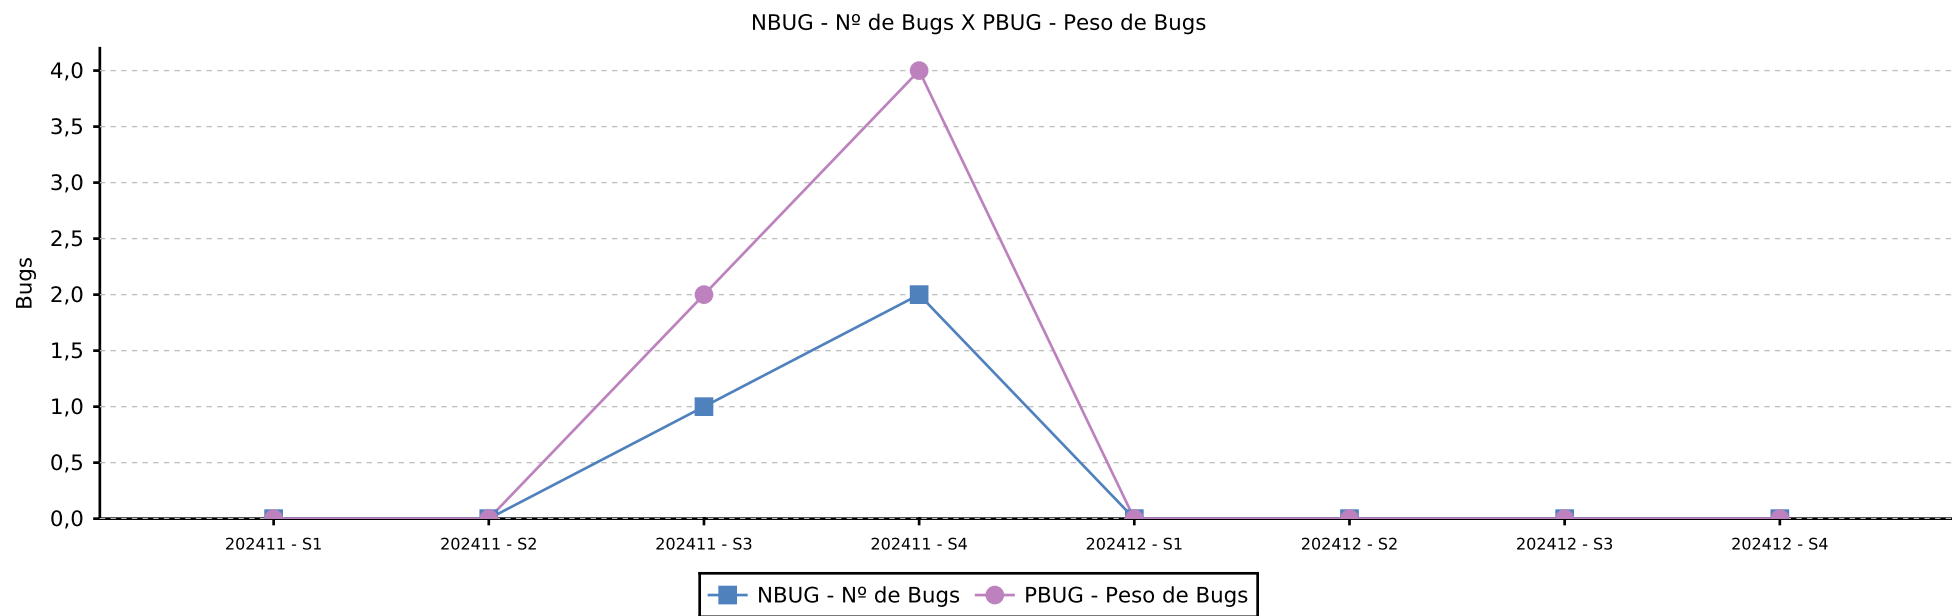

	202411				202412			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	1	2	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	2	4	0	0	0	0
Pontos Entregues	77.5	64	85.5	85.5	80.5	44	56	82.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	2,34	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00

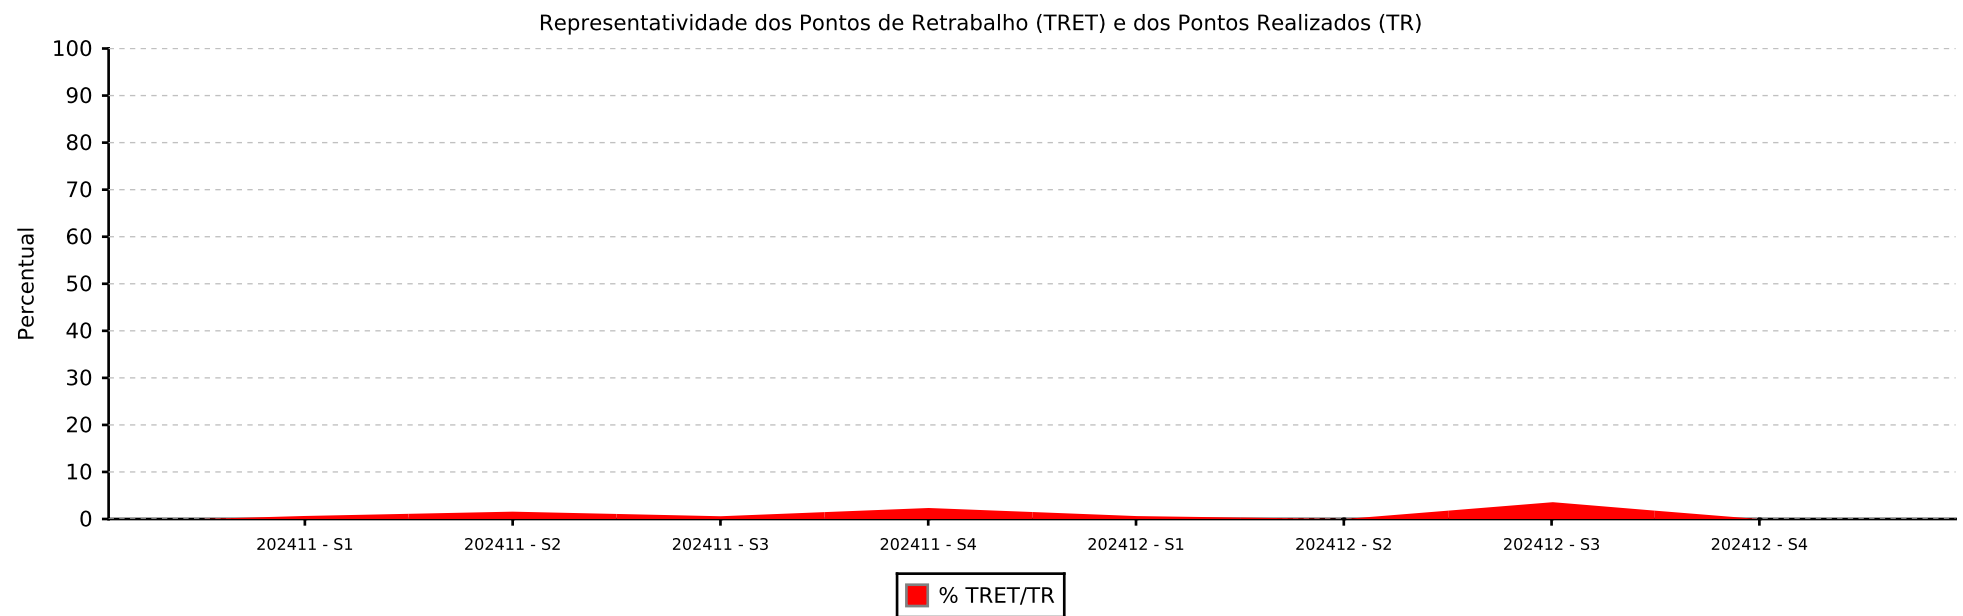


	202411				202412			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	77.5	64	85.5	85.5	80.5	44	56	82.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	1	0.5	2	0.5	0	2	0
% TRET/TR	0,6	1,6	0,6	2,3	0,6	0,0	3,6	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	5,17	0	0	0	4	0	0	0	9,17	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	40	0	40	0	0	0	80	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	308,01	315,09	216,01	258,94	216,01	254,51	308,01	312,16	1.048,04	1.140,7	108,8 %

% de Horas por Atividade

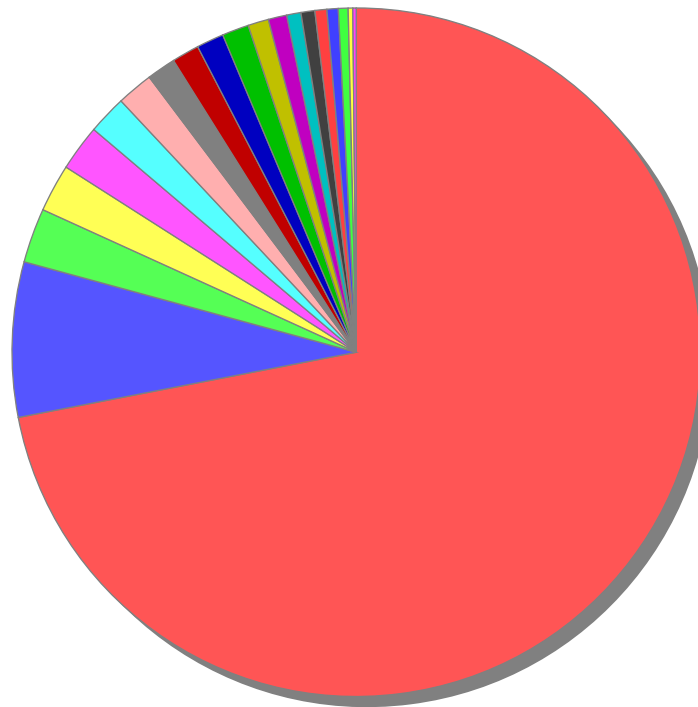


- Desenvolvimento [71.96%]
- Analise de Sistema [7.27%]
- Cafe [2.56%]
- Retrospectiva [2.24%]
- Daily Scrum [2.16%]
- Code Review [1.83%]
- Sprint Planning 1 [1.71%]
- Sizing [1.36%]
- Ginastica Laboral [1.29%]
- Sprint Planning 2 [1.28%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.26%]
- Compilacao de sistemas [0.97%]
- Atraso / Saida antecipada [0.87%]
- Reuniao [0.67%]
- Correção de Erros Interno [0.65%]
- Planejamento de Projeto [0.56%]
- Verificando apontamento [0.53%]
- Ausencia [0.46%]
- Clean Code [0.21%]
- Outros [0.16%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos		226,67	212,95	150,3	148,35	150,3	156,48	224,17	231,27	751,44	749,05	99,7 %
REQM - Gestao de Requisitos		41	33,37	35,25	26,63	35,25	26,53	41	36,27	152,5	122,8	80,5 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto		23,25	22,55	17,62	17,58	17,62	13,83	23,25	19,45	81,74	73,41	89,8 %
DIV - Diversos*		14,92	13,5	10,67	17,58	10,67	9,62	14,92	16,03	51,18	56,73	110,8 %
CM - Gerencia de Configuracao		1,5	6,07	1,5	4,5	1,5	2,27	2	3,03	6,5	15,87	244,2 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	2,25	1,75	3	1,75	58,3 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0,0 %
	Total Geral	307,59	305,44	215,59	214,64	215,59	208,73	307,59	307,8	1.046,36	1.036,61	99,1 %

% de Horas por Área do CMMI

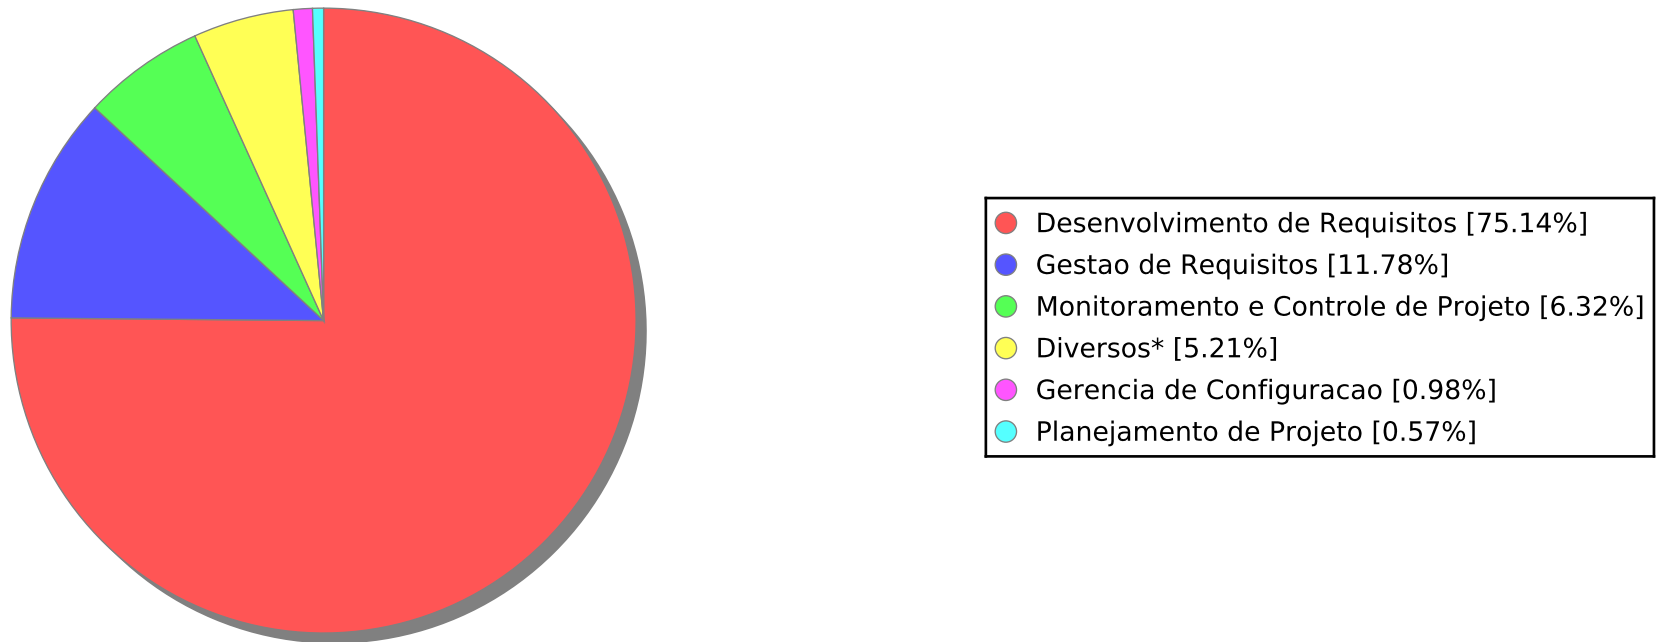


INDICADORES DO PROJETO


	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
01. Horas planejadas de todas atividades	1002h24m	1008h00m	1232h00m	1232h00m	1352h00m	1408h00m	1084h00m	1048h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	996h30m	1183h00m	1273h03m	1258h14m	1361h25m	1321h10m	1128h07m	1140h44m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	848h04m	851h40m	1051h00m	1049h00m	1146h40m	1196h00m	920h50m	890h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	752h37m	898h34m	1021h36m	991h50m	1088h53m	1008h14m	899h52m	826h05m
05. Pontos planejados para o projeto	245,0	247,0	305,0	305,0	336,0	359,0	276,0	267,0
06. Pontos planejados	192,5	209,5	296,0	290,0	316,0	320,0	309,5	289,0
07. Pontos entregues	234	294,5	321	327,5	358,5	339	312,5	263
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	170,00	194,00	235,00	259,00	275,00	262,50	234,50	216,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	64,00	100,50	86,00	68,50	83,50	76,50	78,00	47,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	6	2	4	0	0	6	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	42	51	47	50	57	69	68	57
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	34	53	40	30	45	44	40	22
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	3	1	2	0	3	3	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	1h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h40m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	2,5	1,5	0,5	3,5	0	3,5	4	2,5
16. Produtividade planejada	0,227	0,246	0,282	0,277	0,276	0,268	0,337	0,325
17. Produtividade realizada	0,311	0,328	0,315	0,331	0,330	0,337	0,348	0,319
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	95,6	119,3	105,3	107,4	106,7	94,5	113,3	98,6
19. % Pontos NP / Pontos entregues	27,4	34,2	26,8	21	23,3	22,6	25	17,9

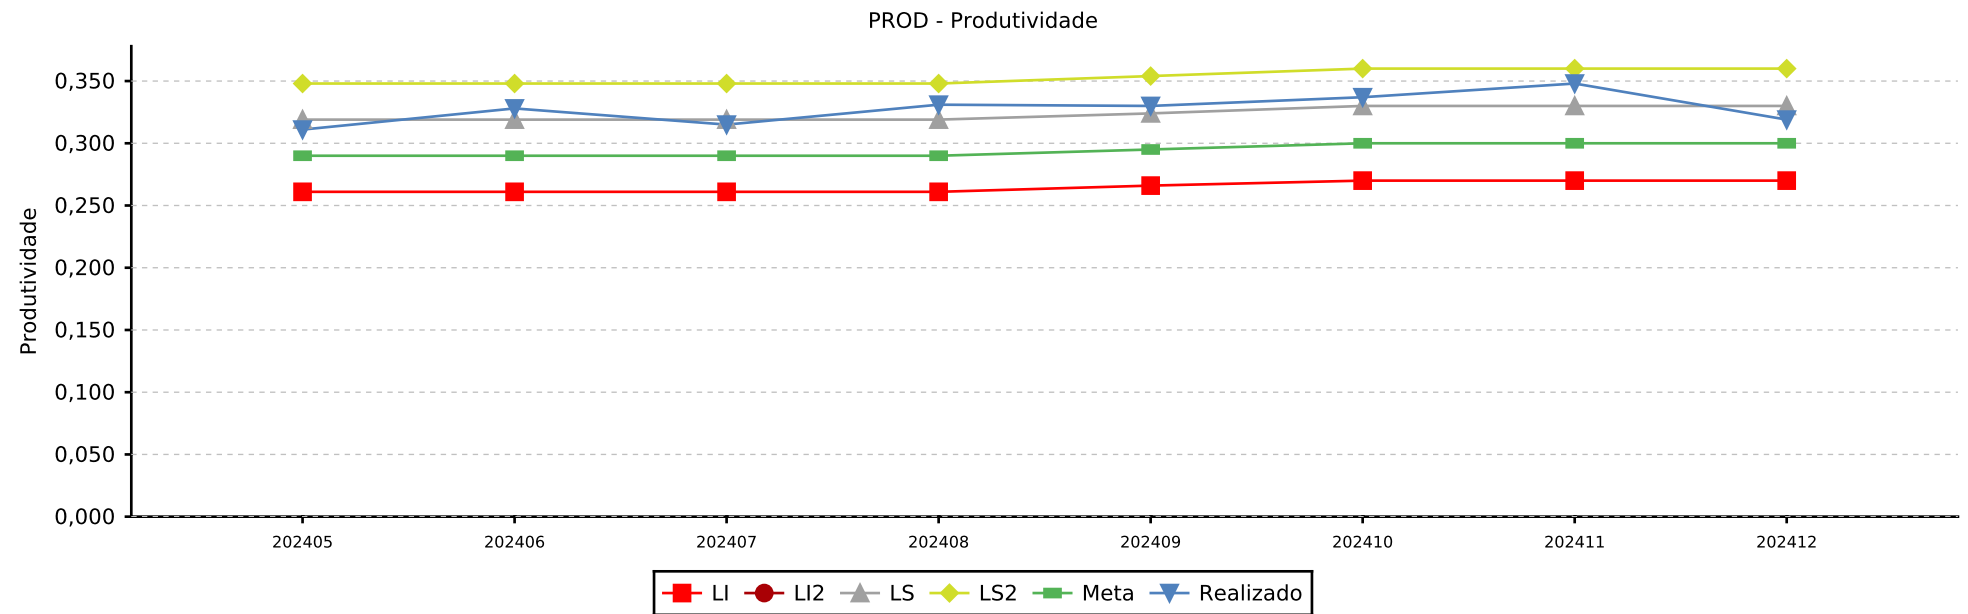


	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
Realizado	0,311	0,328	0,315	0,331	0,330	0,337	0,348	0,319
Meta	0,290	0,290	0,290	0,290	0,295	0,300	0,300	0,300
LS2	0,348	0,348	0,348	0,348	0,354	0,360	0,360	0,360
LS	0,319	0,319	0,319	0,319	0,324	0,330	0,330	0,330
LI2								
LI	0,261	0,261	0,261	0,261	0,266	0,270	0,270	0,270

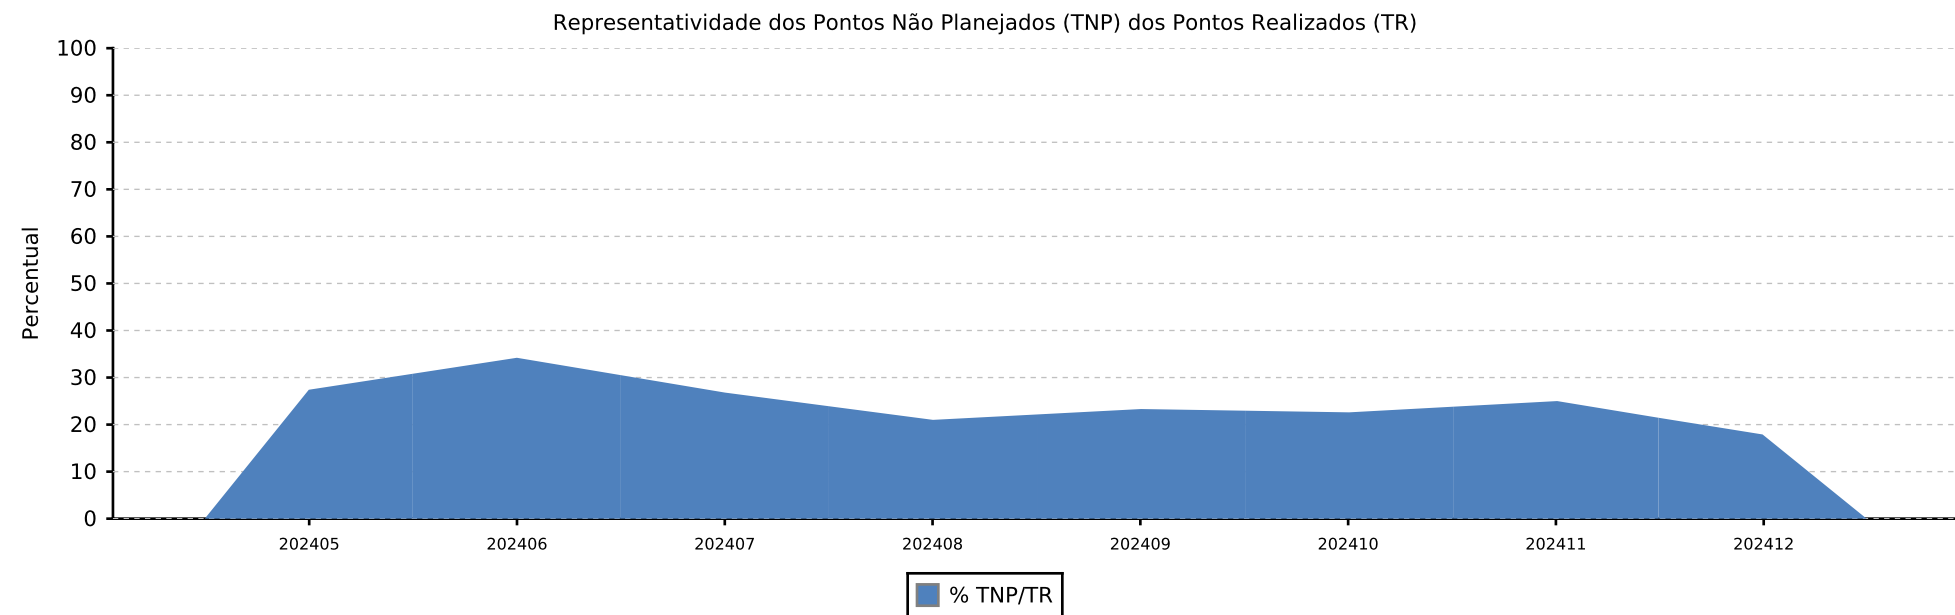


	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
TR - Pontos Realizados	234	294.5	321	327.5	358.5	339	312.5	263
TNP - Pontos Não Planejados	64	100.5	86	68.5	83.5	76.5	78	47
% TNP/TR	27,4	34,2	26,8	21,0	23,3	22,6	25,0	17,9

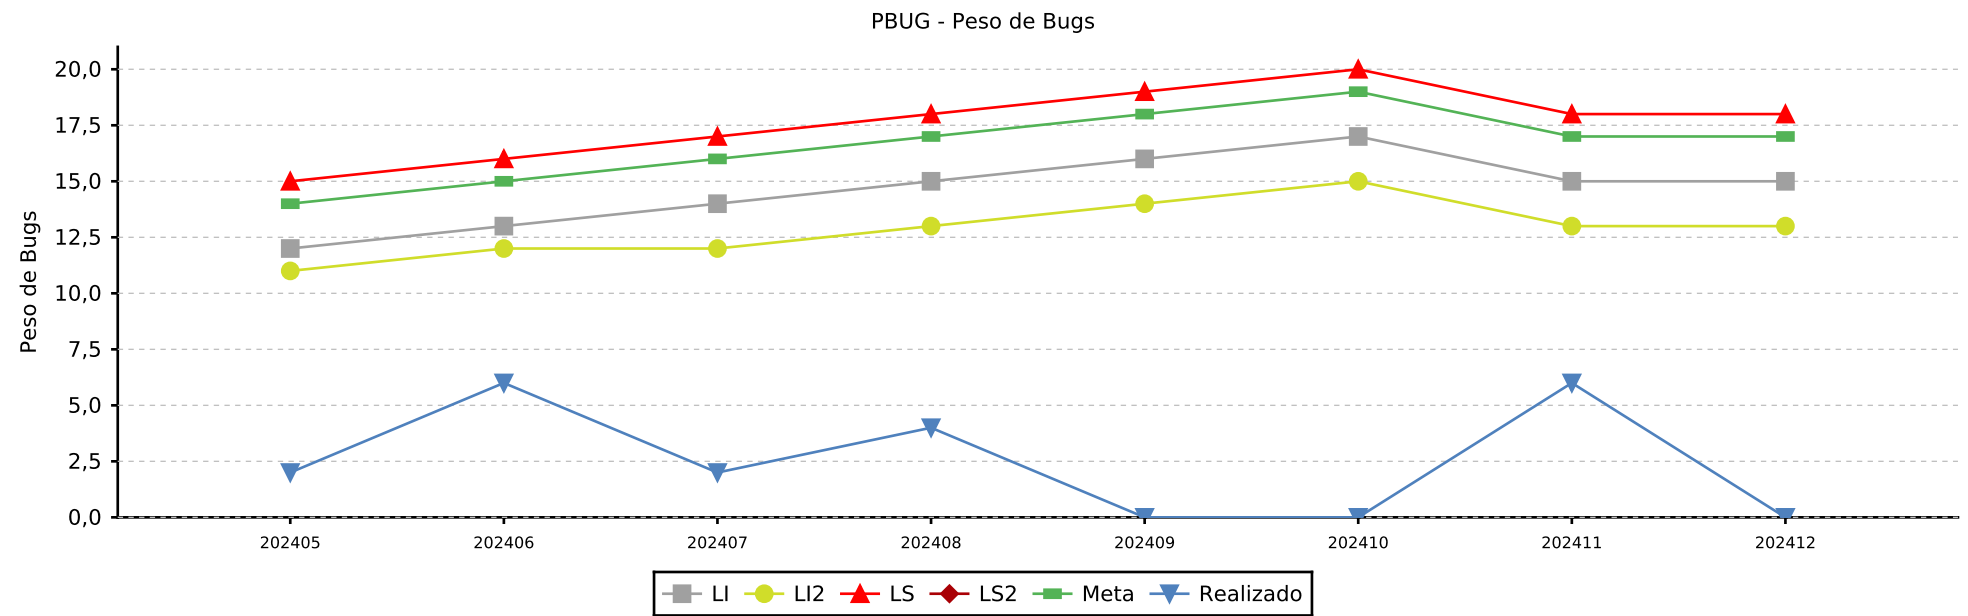


	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
Realizado	2	6	2	4	0	0	6	0
Meta	14	15	16	17	18	19	17	17
LS2								
LS	15	16	17	18	19	20	18	18
LI2	11	12	12	13	14	15	13	13
LI	12	13	14	15	16	17	15	15
Pontos Entregues	234	294.5	321	327.5	358.5	339	312.5	263
% PBUG / TR	0,86	2,04	0,63	1,23	0,00	0,00	1,92	0,00

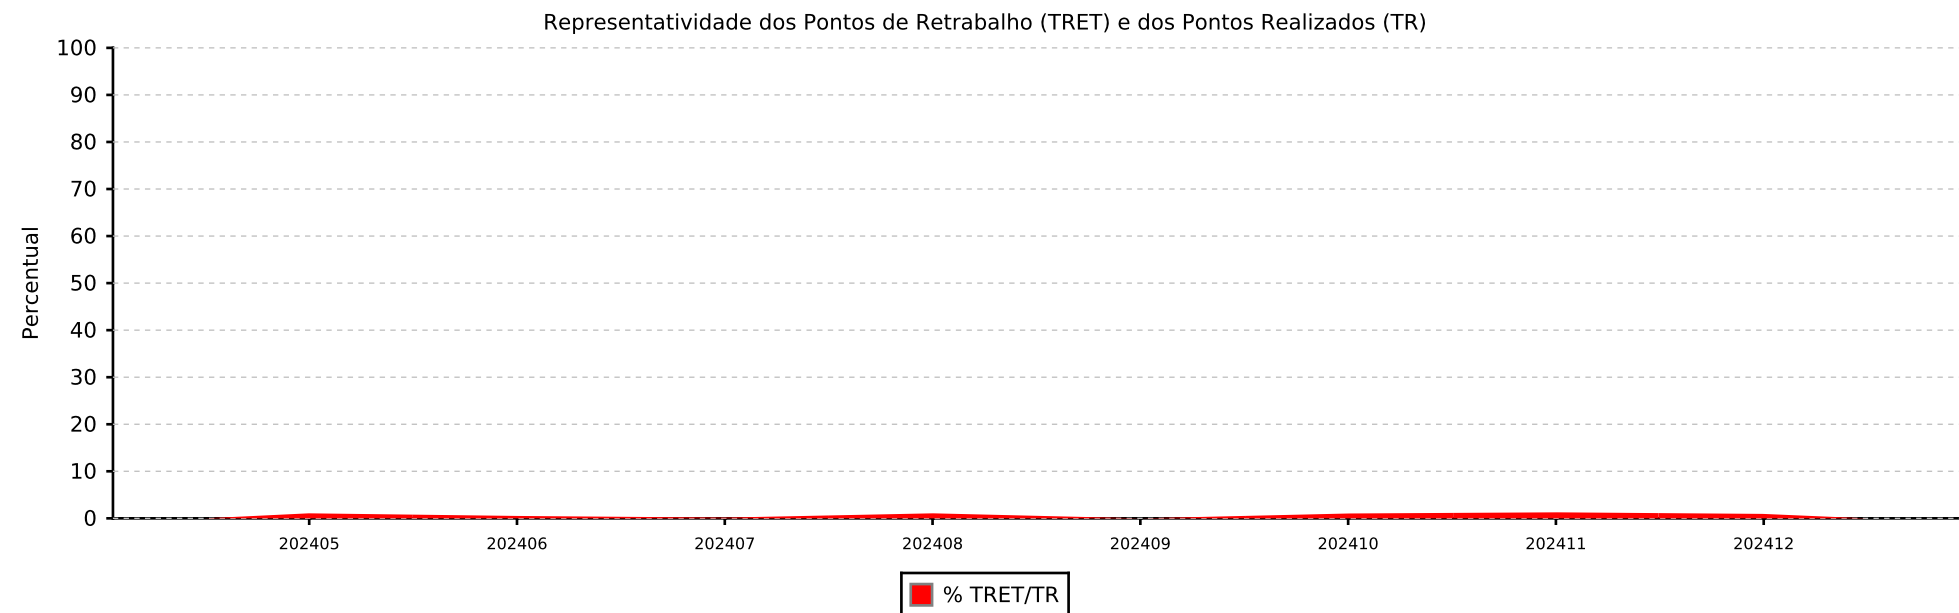

	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
TR - Pontos Realizados	234	294.5	321	327.5	358.5	339	312.5	263
TRET - Pontos de Retrabalho	2.5	1.5	0.5	3.5	0	3.5	4	2.5
% TRET/TR	1,1	0,5	0,2	1,1	0,0	1,0	1,3	1,0

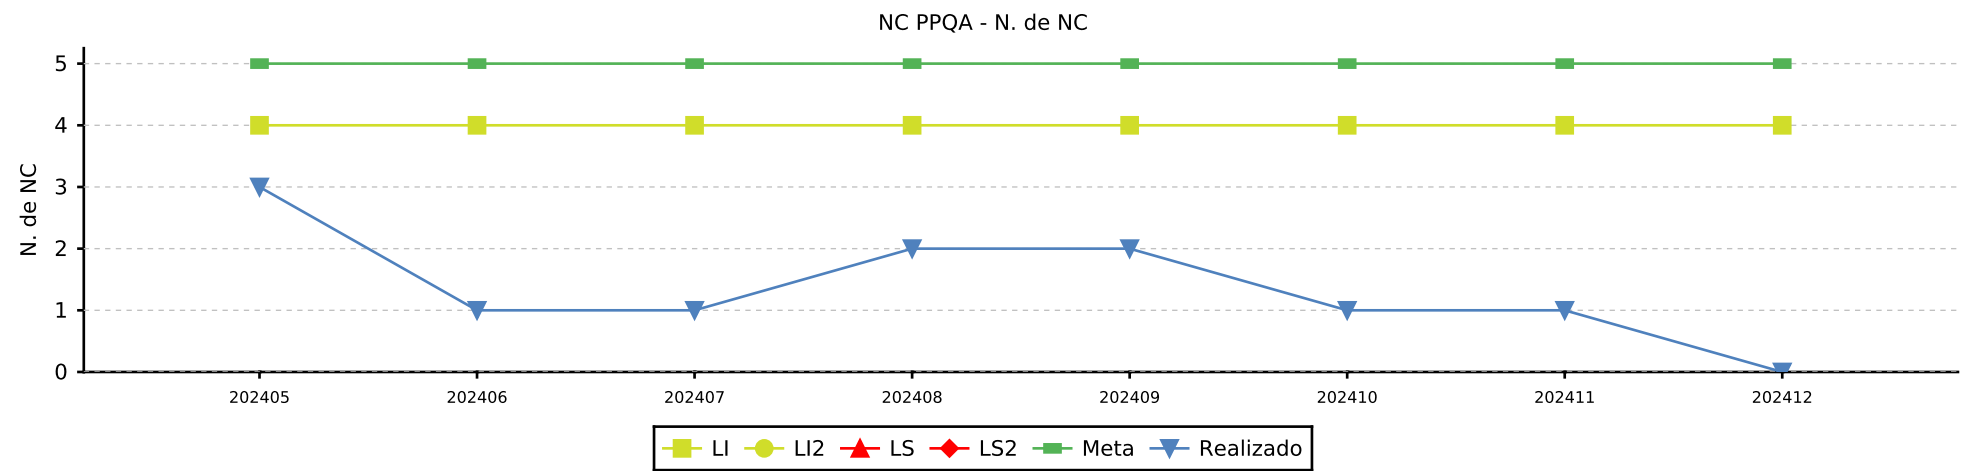


	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
Realizado	3	1	1	2	2	1	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

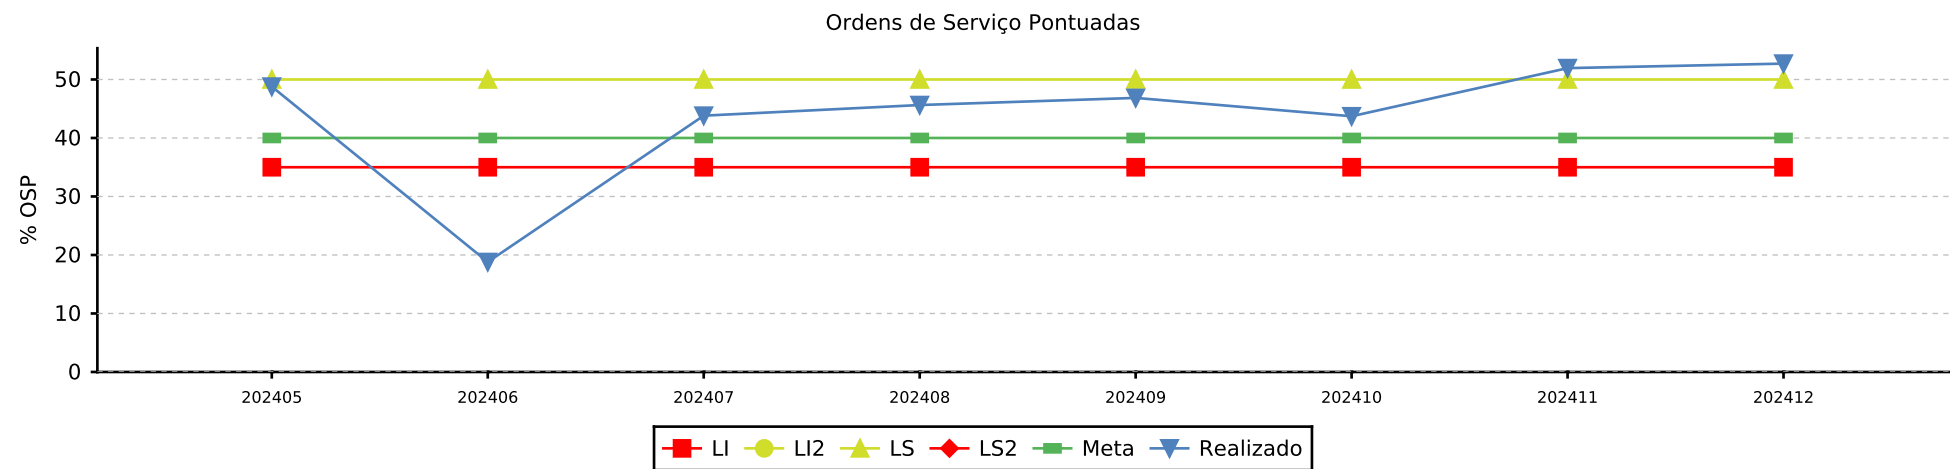

	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
Realizado	48.78	18.8	43.81	45.63	46.85	43.71	51.94	52.71
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

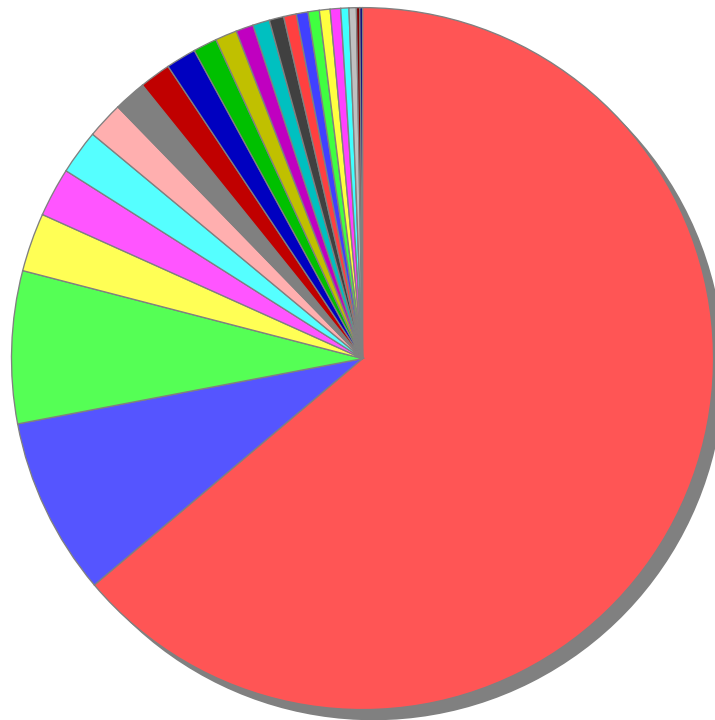

- Desenvolvimento [63.84%]
- Analise de Sistema [8.18%]
- Férias [7.01%]
- Daily Scrum [2.7%]
- Cafe [2.26%]
- Code Review [2.05%]
- Retrospectiva [1.69%]
- Curso/Palestra [1.49%]
- Sprint Planning 1 [1.44%]
- Compilacao de sistemas [1.39%]
- Ginastica Laboral [1.1%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1%]
- Atestado [0.8%]
- Sprint Planning 2 [0.77%]
- Atraso / Saida antecipada [0.67%]
- Ausencia [0.58%]
- Reuniao [0.54%]
- Verificando apontamento [0.52%]
- Outros [0.49%]
- Clean Code [0.48%]
- Sizing [0.37%]
- Correção de Erros Interno [0.34%]
- Planejamento de Projeto [0.15%]
- Particular [0.12%]

% de Horas por Área do CMMI

