
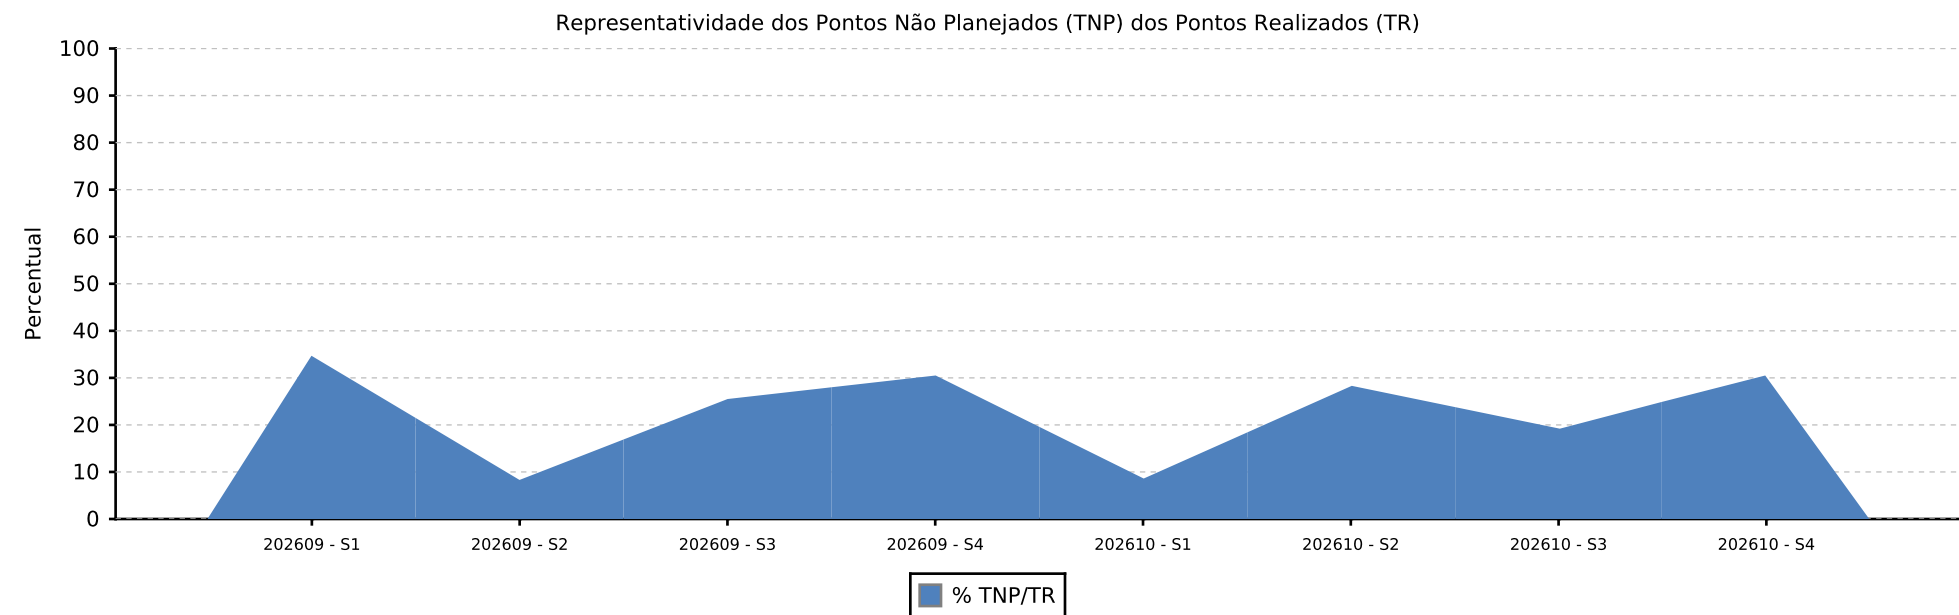


INDICADORES DA SPRINT

	202609				202610			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h50m	220h00m	220h00m	264h00m	216h00m	264h00m	264h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	228h44m	218h28m	221h26m	261h21m	209h05m	265h12m	263h42m	220h33m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	192h55m	192h05m	192h05m	227h55m	182h45m	228h15m	228h15m	190h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	157h54m	180h25m	179h06m	218h27m	143h18m	210h11m	192h37m	153h39m
05. Pontos planejados	76,5	87,0	69,5	81,0	79,0	72,5	89,0	72,0
06. Pontos entregues	52	60,5	59	74	47	69	57,5	52,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	34,00	55,50	44,00	51,50	43,00	49,50	46,50	36,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	18,00	5,00	15,00	22,50	4,00	19,50	11,00	16,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	2
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	6	12	12	8	10	13	12	11
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	9	4	5	12	2	13	5	8
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h30m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0	0	0	0,5
15. Produtividade planejada	0,397	0,453	0,362	0,356	0,433	0,318	0,390	0,379
16. Produtividade realizada	0,330	0,336	0,330	0,339	0,328	0,329	0,299	0,342
17. % Pontos NP / Pontos entregues	34,7	8,3	25,5	30,5	8,6	28,3	19,2	30,5

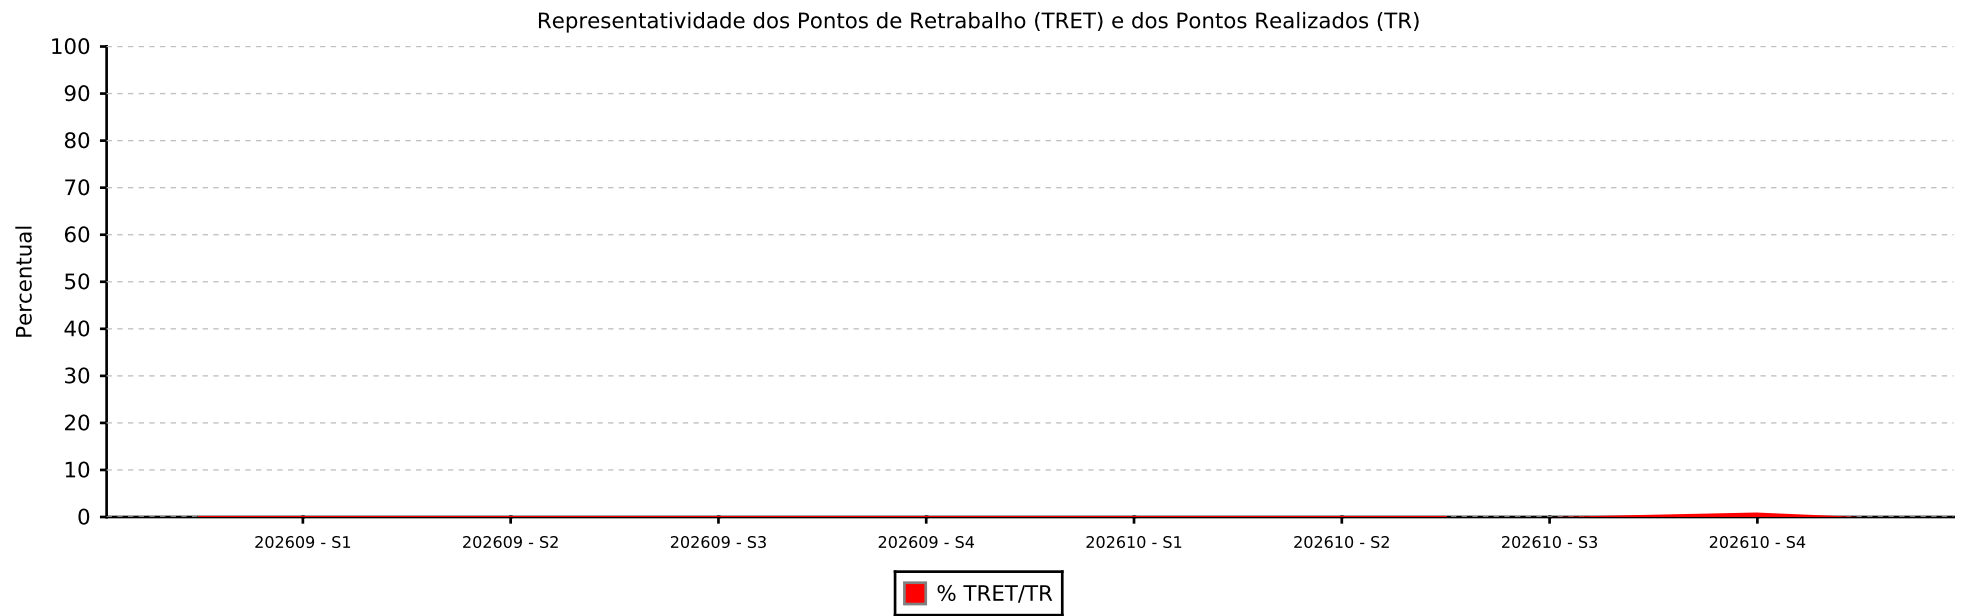

	202609				202610			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	52	60.5	59	74	47	69	57.5	52.5
TNP - Pontos Não Planejados	18	5	15	22.5	4	19.5	11	16
% TNP/TR	34,7	8,3	25,5	30,5	8,6	28,3	19,2	30,5


[illegible]

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	2,67	0	0	0	0	0	0	0	2,67	0,0 %	
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Correção do Code Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Sizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Treinamento	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0,0 %	
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Analise de O.S	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0,25	0,0 %	
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %	
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Curso/Palestra	5	5,08	5	5,92	5	4,75	5	0	20	15,75	78,8 %	
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Total Geral		216	209,1	264	265,2	264	263,71	220	220,54	964	958,55	99,4 %


% de Horas por Atividade

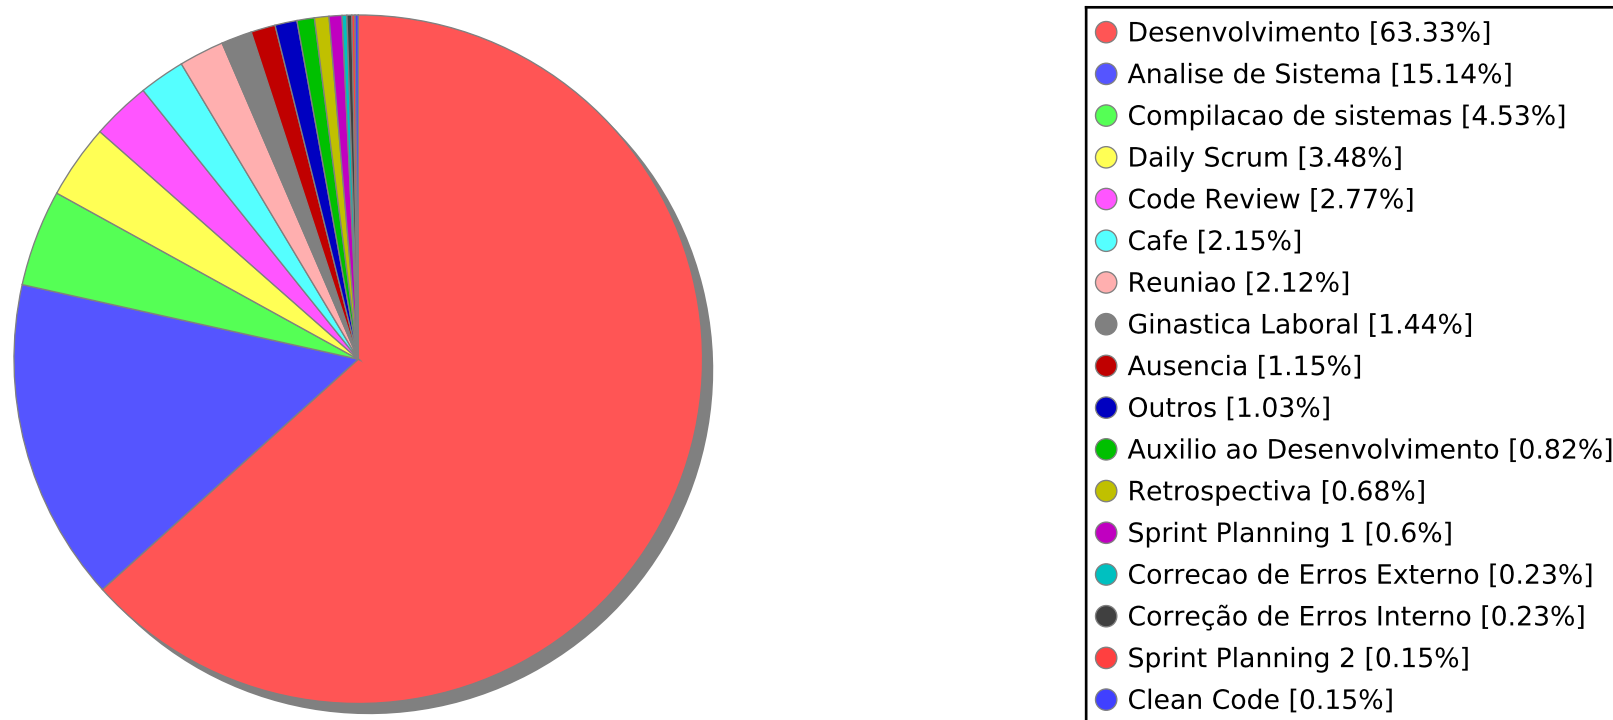

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos		152,5	121,63	194,33	189,35	194,33	171,7	160,58	142,82	701,74	625,5	89,1 %
REQM - Gestao de Requisitos		27	28,42	27	25,17	27	21,57	22,5	35,07	103,5	110,23	106,5 %
DIV - Diversos*		11	25,1	13,5	13,7	13,5	34,27	10,75	17,4	48,75	90,47	185,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto		18,25	28,85	21,92	22,93	21,92	17,25	17,92	15,27	80,01	84,3	105,4 %
CM - Gerencia de Configuracao		2	0	2	4,88	2	9,67	2,5	10	8,5	24,55	288,8 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,75	0	1,5	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		5	5,08	5	5,92	5	4,75	5	0	20	15,75	78,8 %
	Total Geral	216	209,08	264	261,95	264	259,21	220	220,56	964	950,8	98,6 %

% de Horas por Área do CMMI

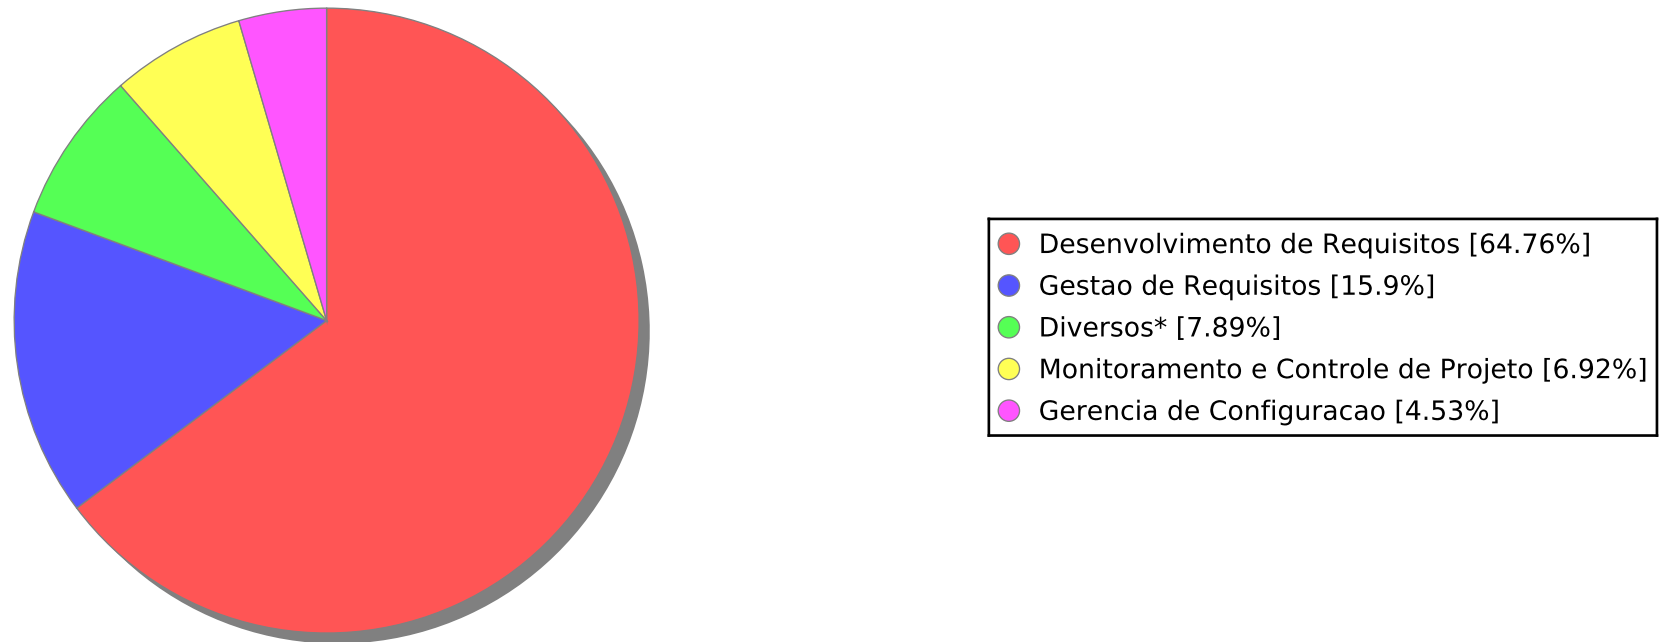


INDICADORES DO PROJETO


	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
01. Horas planejadas de todas atividades	860h00m	840h00m	876h00m	840h00m	1224h00m	1188h00m	924h50m	964h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1173h43m	940h40m	1025h23m	983h39m	1235h17m	1201h36m	929h59m	958h32m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	757h30m	738h08m	768h59m	712h20m	1053h45m	1032h45m	805h00m	829h15m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	721h53m	664h36m	688h21m	676h47m	842h16m	897h03m	735h52m	699h45m
05. Pontos planejados para o projeto	242,0	237,0	246,0	227,0	331,0	325,0	293,0	262,0
06. Pontos planejados	222,0	192,0	287,0	274,0	292,5	327,5	314,0	312,5
07. Pontos entregues	229	215,5	225,5	230	282,5	291	245,5	226
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	163,00	131,00	146,00	142,50	200,50	200,00	185,00	175,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	66,00	84,50	79,50	87,50	82,00	91,00	60,50	50,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	2	3	2	0	2	0	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	47	36	47	50	59	48	38	46
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	45	53	53	48	59	54	30	28
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	1	1	1	0	1	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h30m
15. Pontos de retrabalho	5,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5
16. Produtividade planejada	0,294	0,261	0,374	0,385	0,278	0,318	0,391	0,377
17. Produtividade realizada	0,318	0,325	0,328	0,340	0,336	0,325	0,334	0,323
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	94,7	91	91,7	101,4	85,4	89,6	83,8	86,3
19. % Pontos NP / Pontos entregues	28,9	39,3	35,3	38,1	29,1	31,3	24,7	22,4

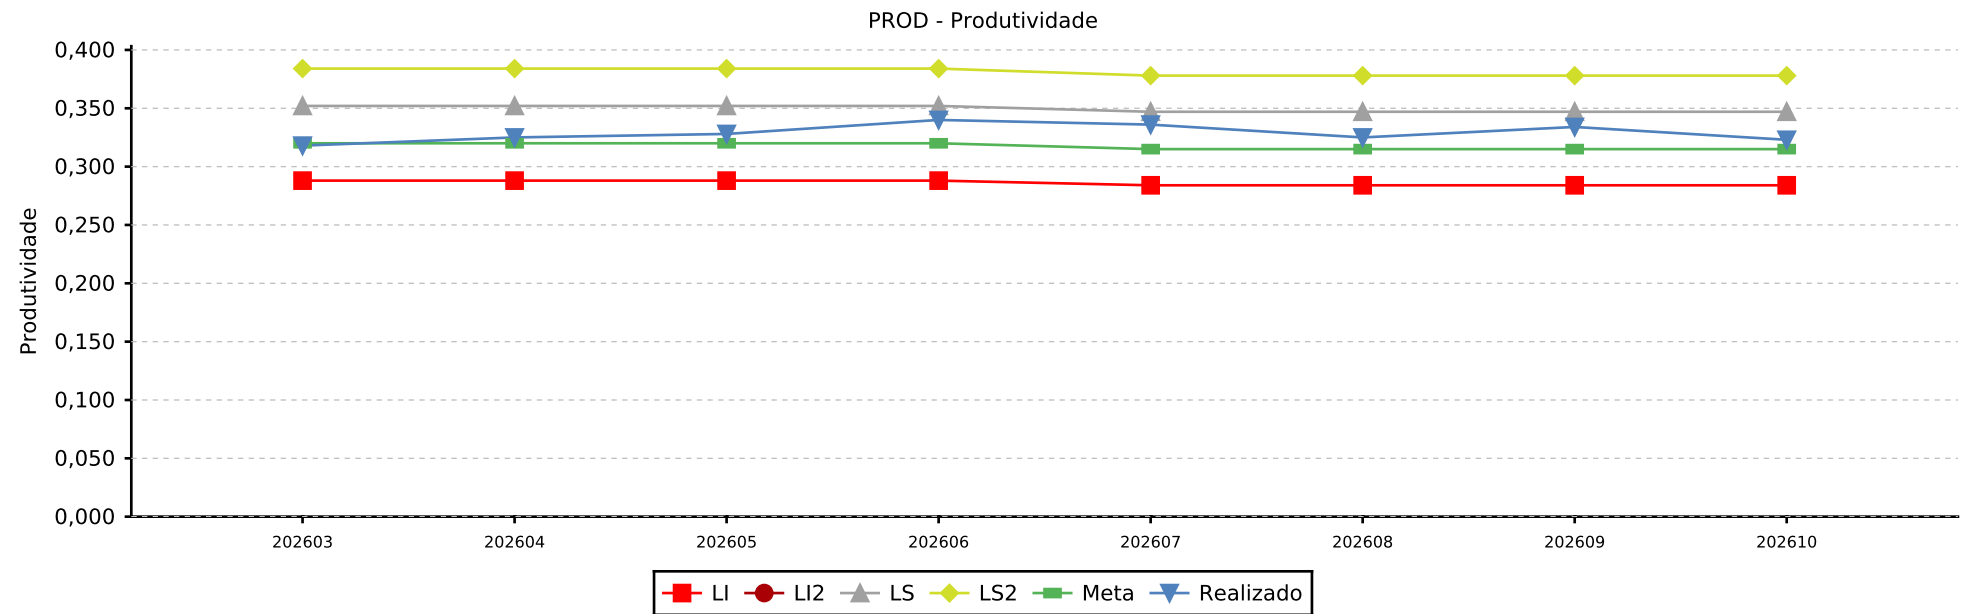


	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
Realizado	0,318	0,325	0,328	0,340	0,336	0,325	0,334	0,323
Meta	0,320	0,320	0,320	0,320	0,315	0,315	0,315	0,315
LS2	0,384	0,384	0,384	0,384	0,378	0,378	0,378	0,378
LS	0,352	0,352	0,352	0,352	0,347	0,347	0,347	0,347
LI2								
LI	0,288	0,288	0,288	0,288	0,284	0,284	0,284	0,284

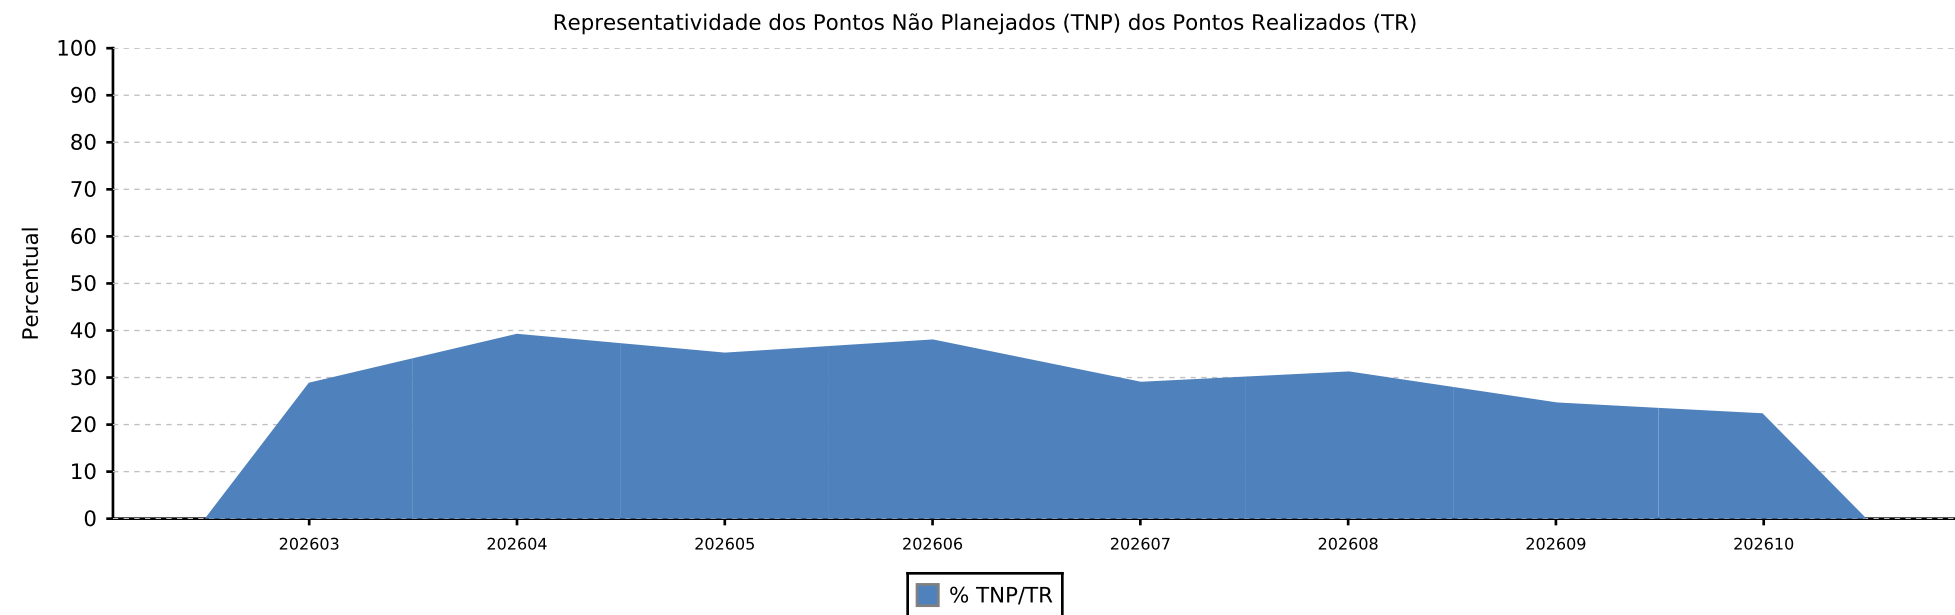


	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
TR - Pontos Realizados	229	215.5	225.5	230	282.5	291	245.5	226
TNP - Pontos Não Planejados	66	84.5	79.5	87.5	82	91	60.5	50.5
% TNP/TR	28,9	39,3	35,3	38,1	29,1	31,3	24,7	22,4

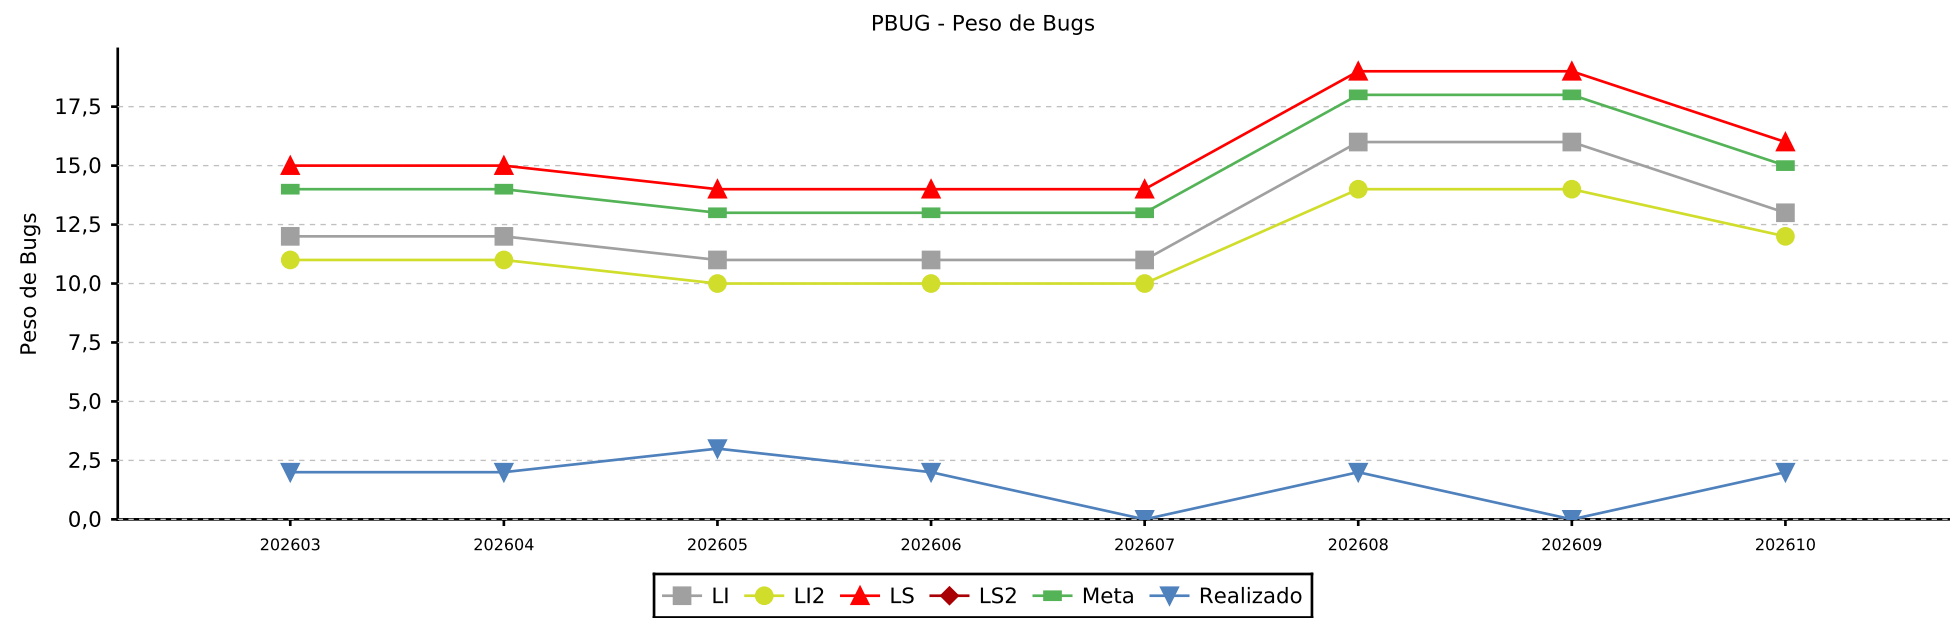


	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
Realizado	2	2	3	2	0	2	0	2
Meta	14	14	13	13	13	18	18	15
LS2								
LS	15	15	14	14	14	19	19	16
LI2	11	11	10	10	10	14	14	12
LI	12	12	11	11	11	16	16	13
Pontos Entregues	229	215.5	225.5	230	282.5	291	245.5	226
% PBUG / TR	0,88	0,93	1,34	0,87	0,00	0,69	0,00	0,89

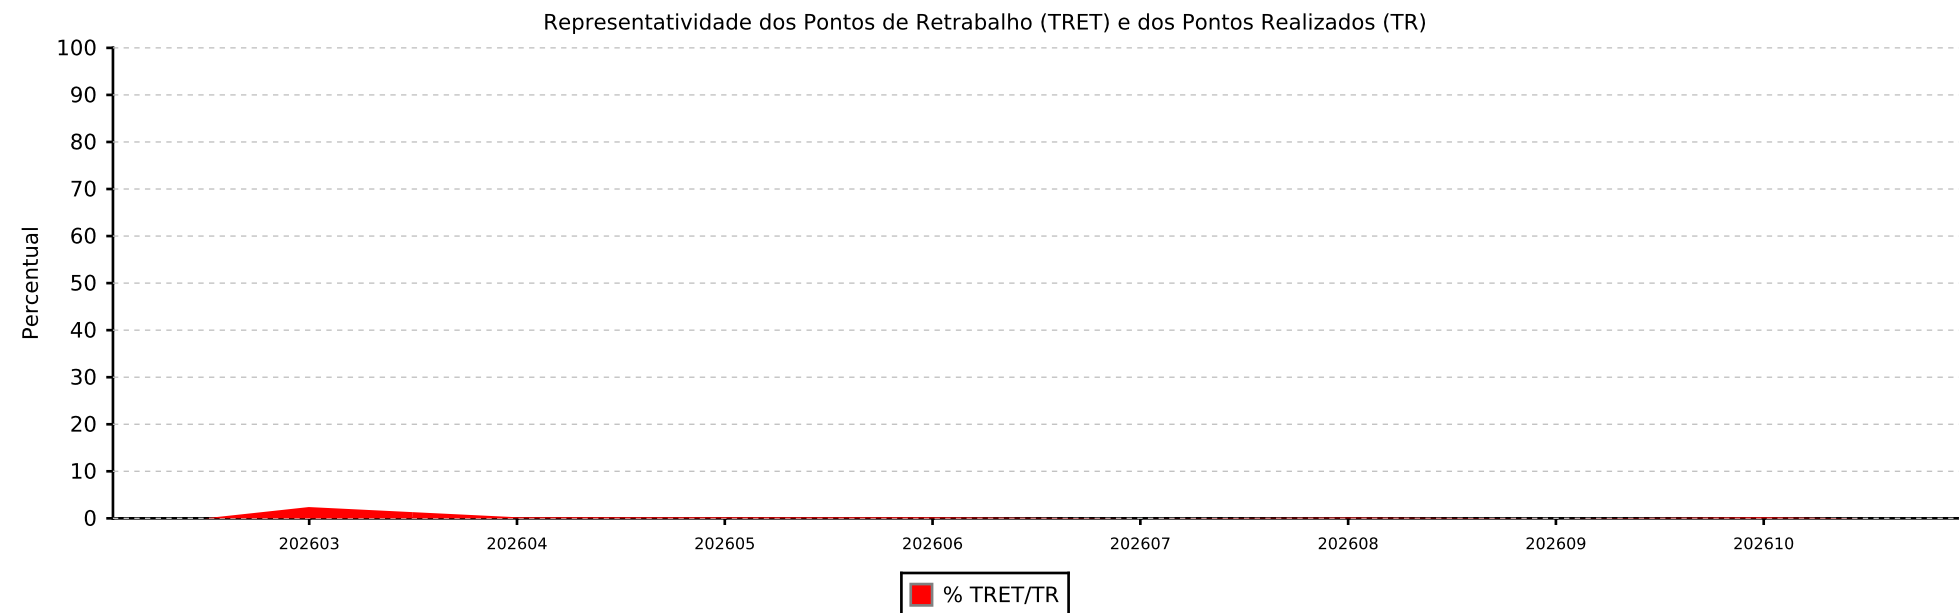

	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
TR - Pontos Realizados	229	215.5	225.5	230	282.5	291	245.5	226
TRET - Pontos de Retrabalho	5.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	0.5
% TRET/TR	2,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2

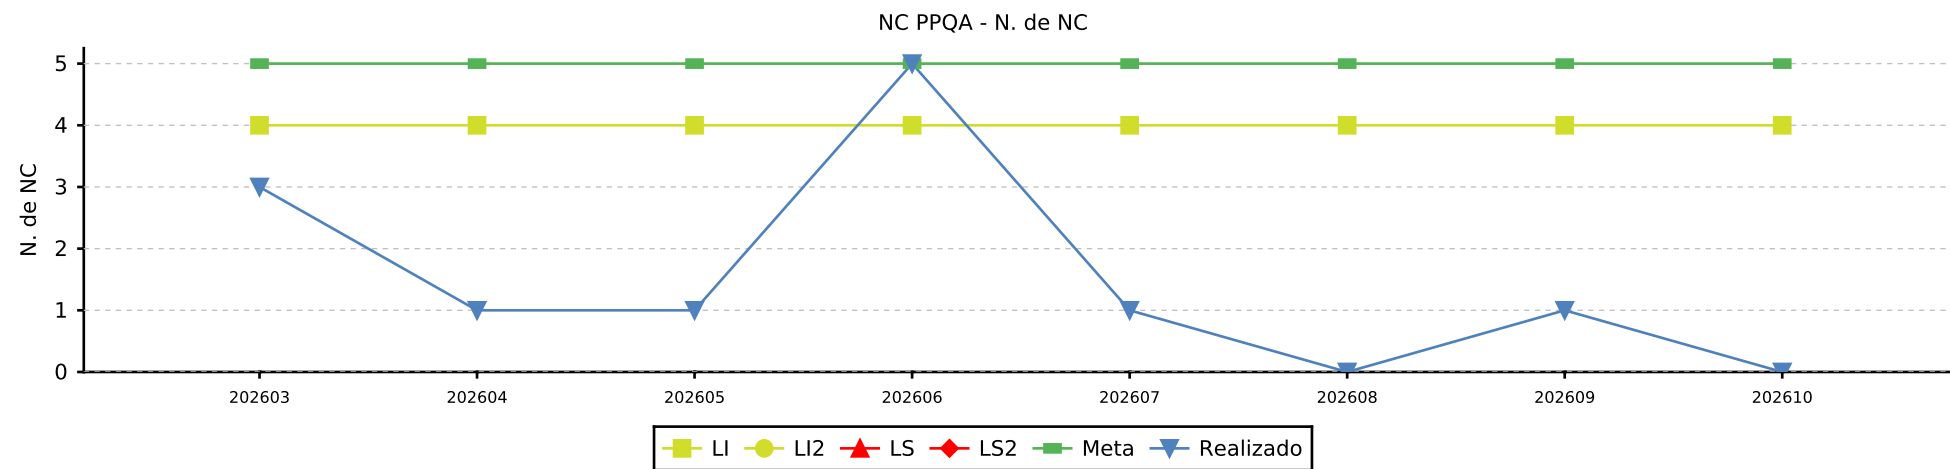


	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
Realizado	3	1	1	5	1	0	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

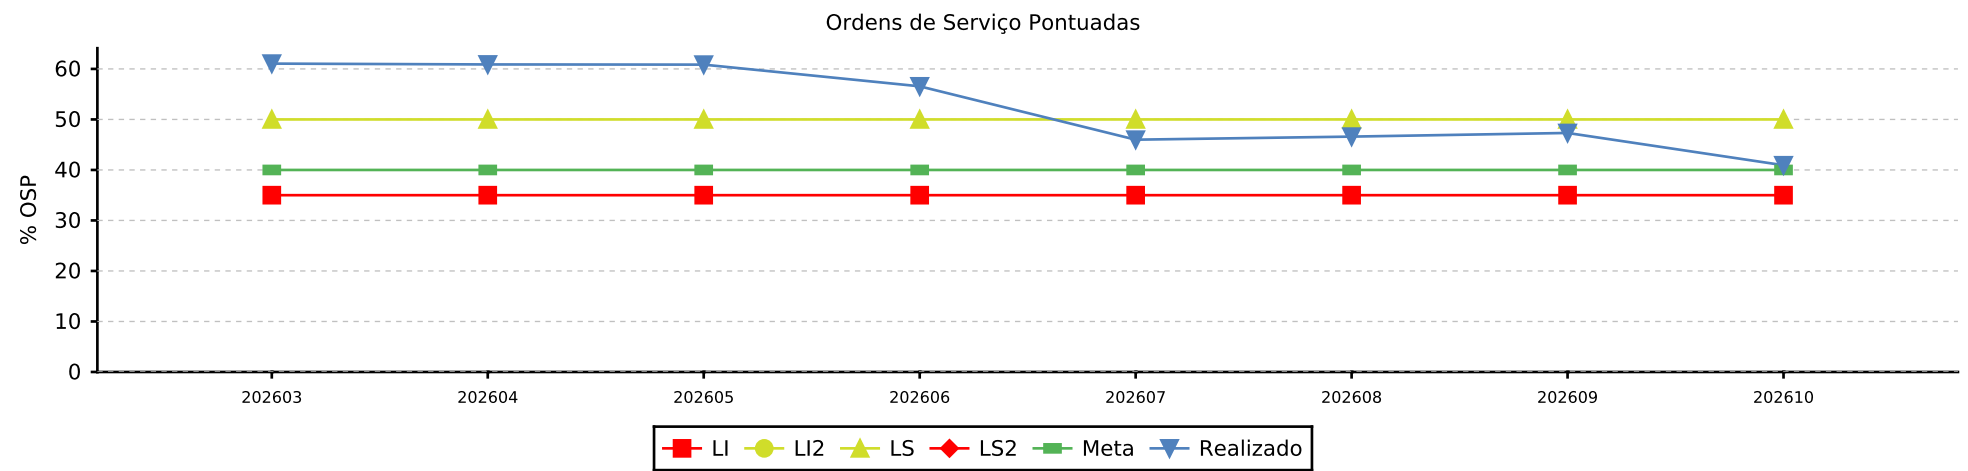

	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
Realizado	61.05	60.89	60.85	56.56	45.99	46.6	47.32	40.93
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

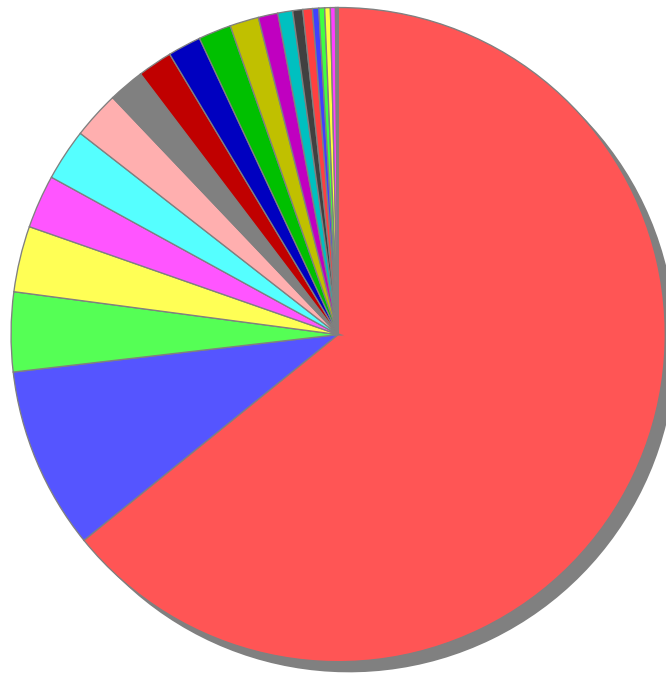

- Desenvolvimento [64.17%]
- Analise de Sistema [9%]
- Daily Scrum [3.92%]
- Code Review [3.26%]
- Ausencia [2.64%]
- Compilacao de sistemas [2.56%]
- Cafe [2.35%]
- Reuniao [1.78%]
- Sprint Planning 1 [1.71%]
- Curso/Palestra [1.64%]
- Retrospectiva [1.62%]
- Ginastica Laboral [1.43%]
- Outros [0.97%]
- Clean Code [0.73%]
- Sprint Planning 2 [0.5%]
- Particular [0.47%]
- Treinamento [0.31%]
- Preparando ambiente [0.29%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.28%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.25%]
- Correcao de Erros Externo [0.05%]
- Correção de Erros Interno [0.05%]
- Analise de O.S [0.03%]

% de Horas por Área do CMMI

