



INDICADORES DA SPRINT


	202607				202608			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	300h00m	308h00m	308h00m	308h00m	308h00m	308h00m	308h00m	264h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	317h39m	304h35m	305h49m	307h14m	308h24m	305h57m	302h43m	284h32m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	257h30m	265h15m	265h15m	265h45m	268h15m	267h25m	267h25m	229h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	216h36m	231h48m	186h42m	207h10m	233h39m	244h41m	226h24m	192h19m
05. Pontos planejados	78,5	64,5	68,0	81,5	83,0	86,0	76,5	82,0
06. Pontos entregues	72	77	63,5	70	77	82	72	60
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	56,50	52,50	39,00	52,50	63,00	62,50	38,50	36,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	15,50	24,50	24,50	17,50	14,00	19,50	33,50	24,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	2	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	18	18	10	13	14	13	11	10
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	15	17	14	13	12	9	20	13
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	1	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0,5	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,305	0,244	0,257	0,307	0,310	0,322	0,287	0,358
16. Produtividade realizada	0,333	0,333	0,341	0,338	0,330	0,336	0,319	0,312
17. % Pontos NP / Pontos entregues	21,6	31,9	38,6	25	18,2	23,8	46,6	40

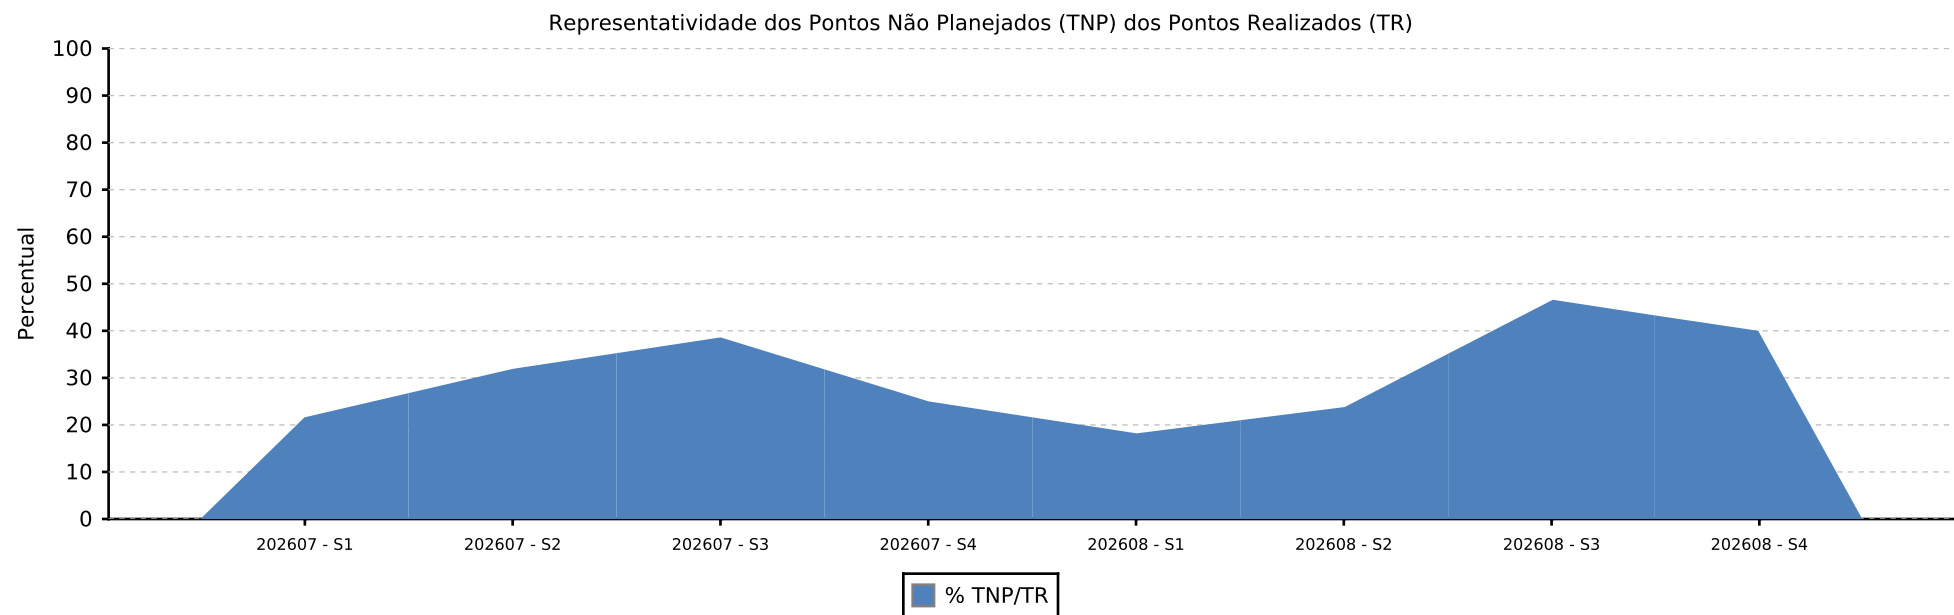

	202607				202608			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	72	77	63.5	70	77	82	72	60
TNP - Pontos Não Planejados	15.5	24.5	24.5	17.5	14	19.5	33.5	24
% TNP/TR	21,6	31,9	38,6	25,0	18,2	23,8	46,6	40,0

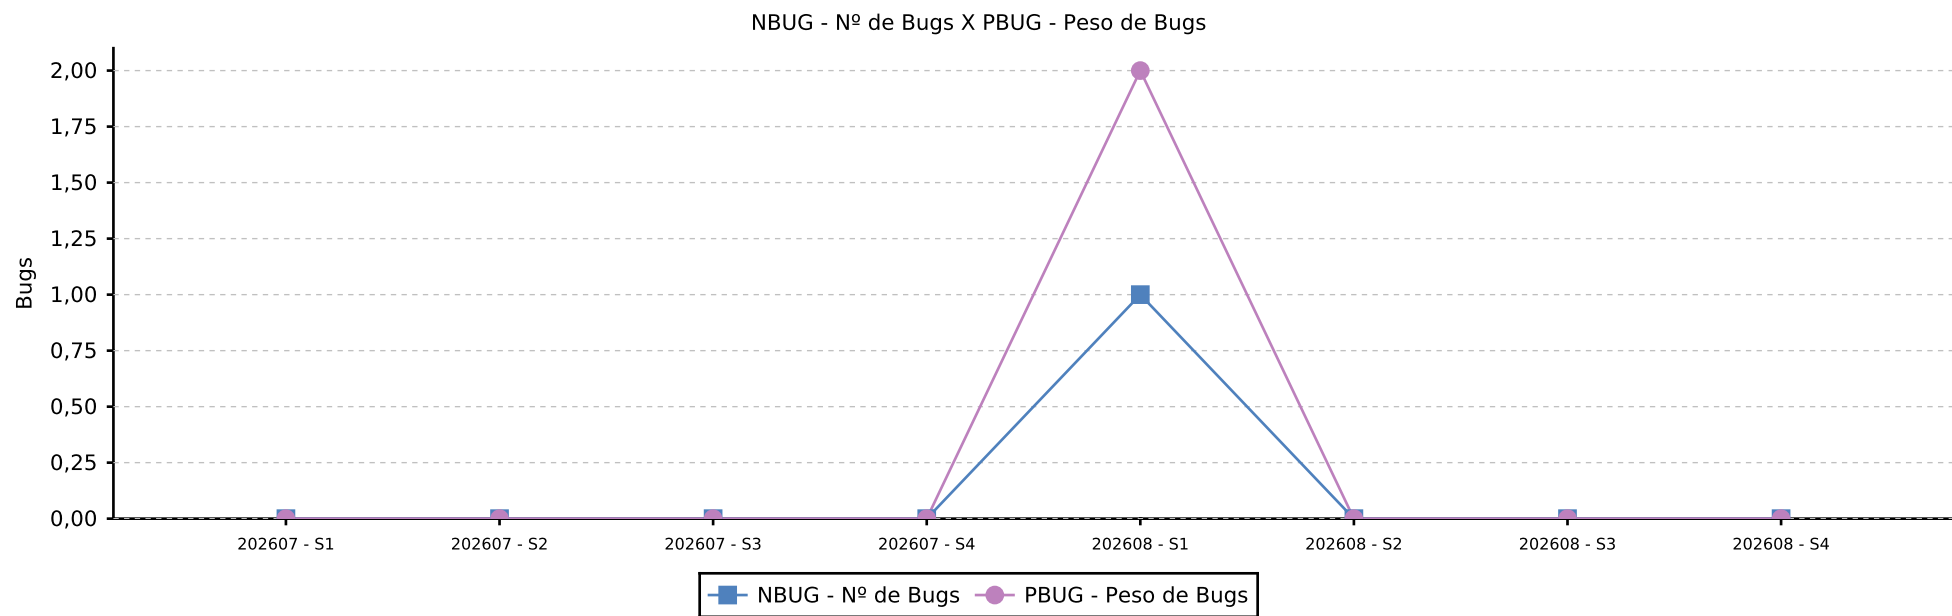

	202607				202608			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	1	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	2	0	0	0
Pontos Entregues	72	77	63.5	70	77	82	72	60
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00


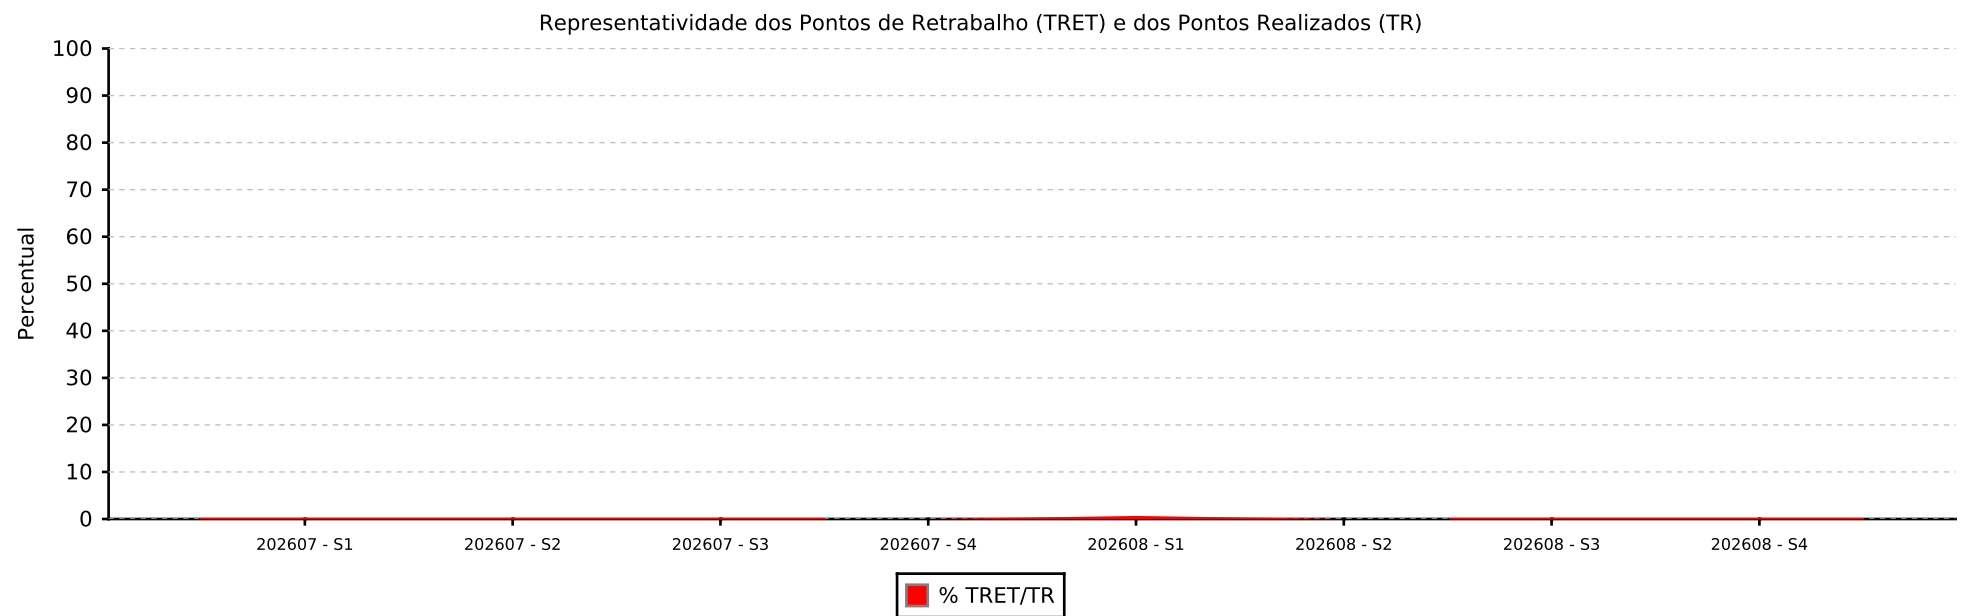


	202607				202608			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	72	77	63.5	70	77	82	72	60
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	0.5	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	2,5	0	2,5	0	2,5	2,67	2	0	9,5	2,67	28,1 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,17	1,25	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	1,25	183,8 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção do Code Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	308	308,4	307,99	305,96	307,99	302,72	264	284,53	1.187,98	1.201,61	101,1 %


% de Horas por Atividade

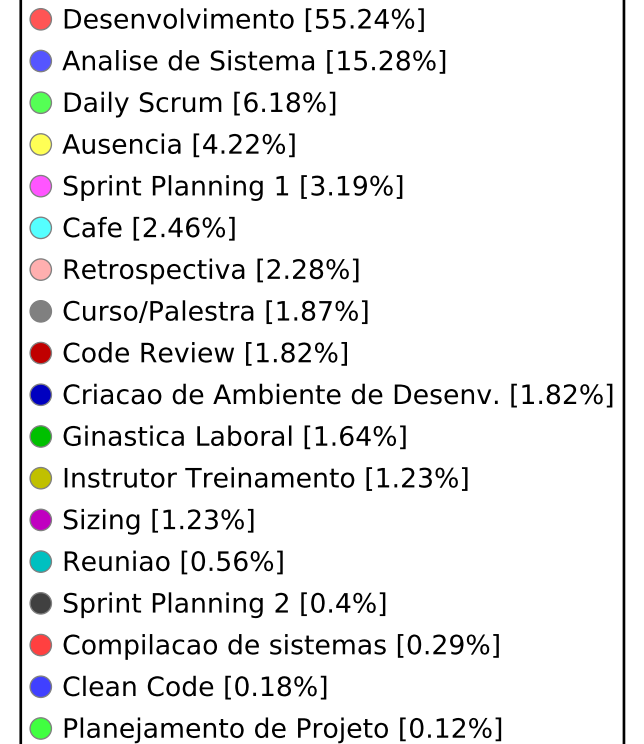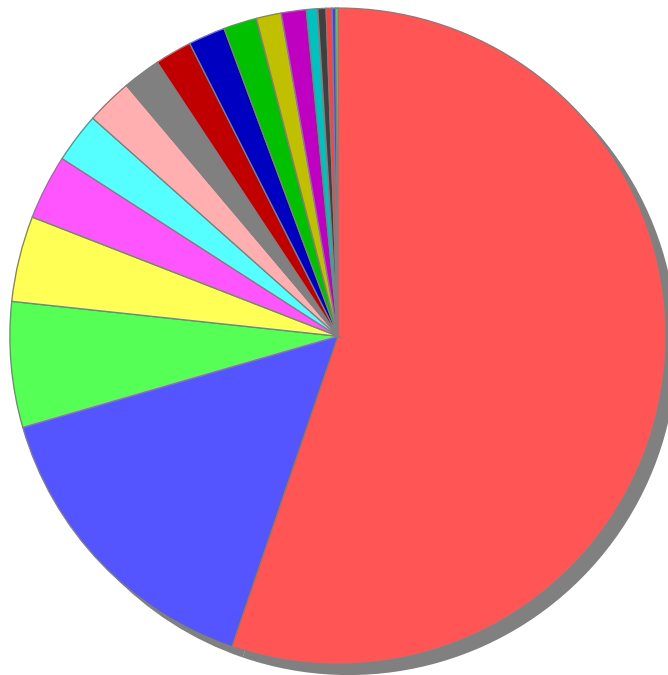

HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	231,5	203,9	230,67	210,9	230,67	200,23	196,92	162,83	889,76	777,86	87,4 %
REQM - Gestao de Requisitos	34	39,5	34	33,22	34	42,87	29	57,2	131	172,79	131,9 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	24,75	26,37	24,75	27,65	24,75	19,75	20,75	29,25	95	103,02	108,4 %
DIV - Diversos*	15	26,22	15,83	20,77	15,83	30,7	13,08	25,25	59,74	102,94	172,3 %
OT - Treinamento na Organizacao	0,5	8	0,5	7,5	0,5	5,83	0,5	5,33	2	26,66	1.333,0
CM - Gerencia de Configuracao	2	1,5	2	2,92	2	0	2,5	0,83	8,5	5,25	61,8 %
PP - Planejamento de Projeto	0,25	2,67	0,25	0	0,25	0	1,25	0,33	2	3	150,0 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	308	308,16	308	302,96	308	299,38	264	281,02	1.188	1.191,52	100,3 %

% de Horas por Área do CMMI

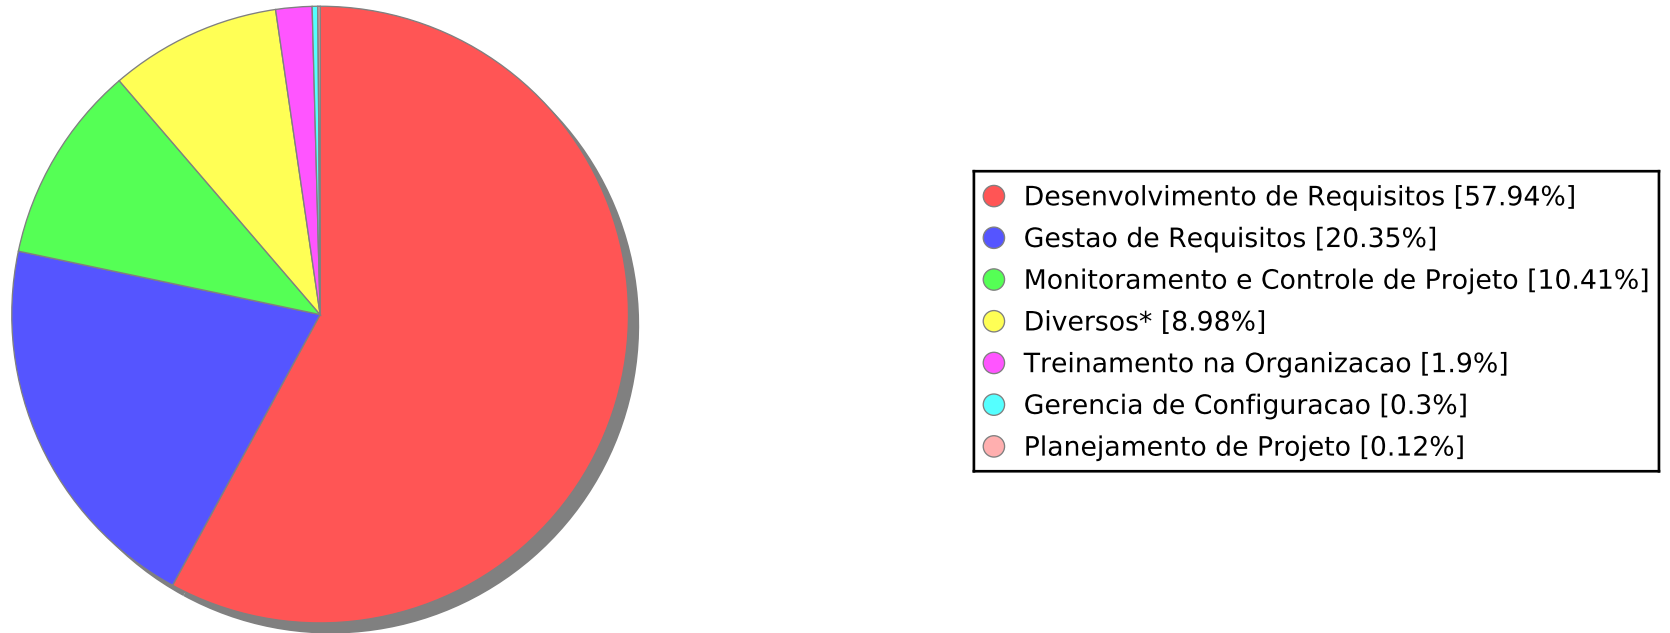


INDICADORES DO PROJETO


	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
01. Horas planejadas de todas atividades	923h12m	914h24m	860h00m	840h00m	876h00m	840h00m	1224h00m	1188h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1005h01m	1032h36m	1173h43m	940h40m	1025h23m	983h39m	1235h17m	1201h36m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	790h07m	788h39m	757h30m	738h08m	768h59m	712h20m	1053h45m	1032h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	741h36m	700h36m	721h53m	664h36m	688h21m	676h47m	842h16m	897h03m
05. Pontos planejados para o projeto	253,0	253,0	242,0	237,0	246,0	227,0	331,0	325,0
06. Pontos planejados	224,5	188,5	222,0	192,0	287,0	274,0	292,5	327,5
07. Pontos entregues	245	229	242	215,5	225,5	230	282,5	291
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	202,50	158,50	176,00	131,00	146,00	142,50	200,50	200,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	42,50	70,50	66,00	84,50	79,50	87,50	82,00	91,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	2	2	3	2	0	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	58	55	48	36	47	50	59	48
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	30	44	45	53	53	48	59	54
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	1	1	1	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1	0	5,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5
16. Produtividade planejada	0,285	0,240	0,294	0,261	0,374	0,385	0,278	0,318
17. Produtividade realizada	0,331	0,327	0,336	0,325	0,328	0,340	0,336	0,325
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	96,9	90,6	100	91	91,7	101,4	85,4	89,6
19. % Pontos NP / Pontos entregues	17,4	30,8	27,3	39,3	35,3	38,1	29,1	31,3

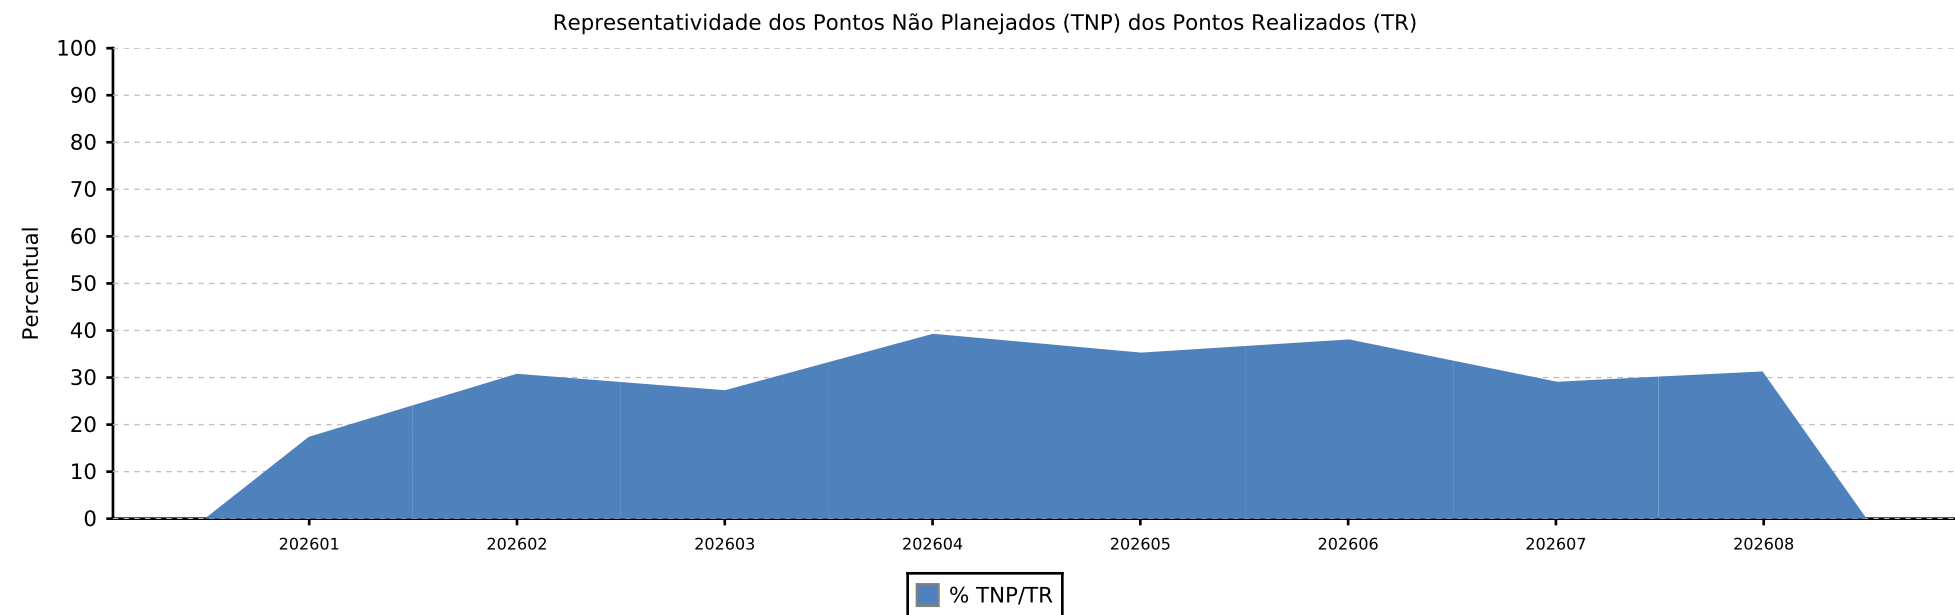


	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
TR - Pontos Realizados	245	229	242	215.5	225.5	230	282.5	291
TNP - Pontos Não Planejados	42.5	70.5	66	84.5	79.5	87.5	82	91
% TNP/TR	17,4	30,8	27,3	39,3	35,3	38,1	29,1	31,3

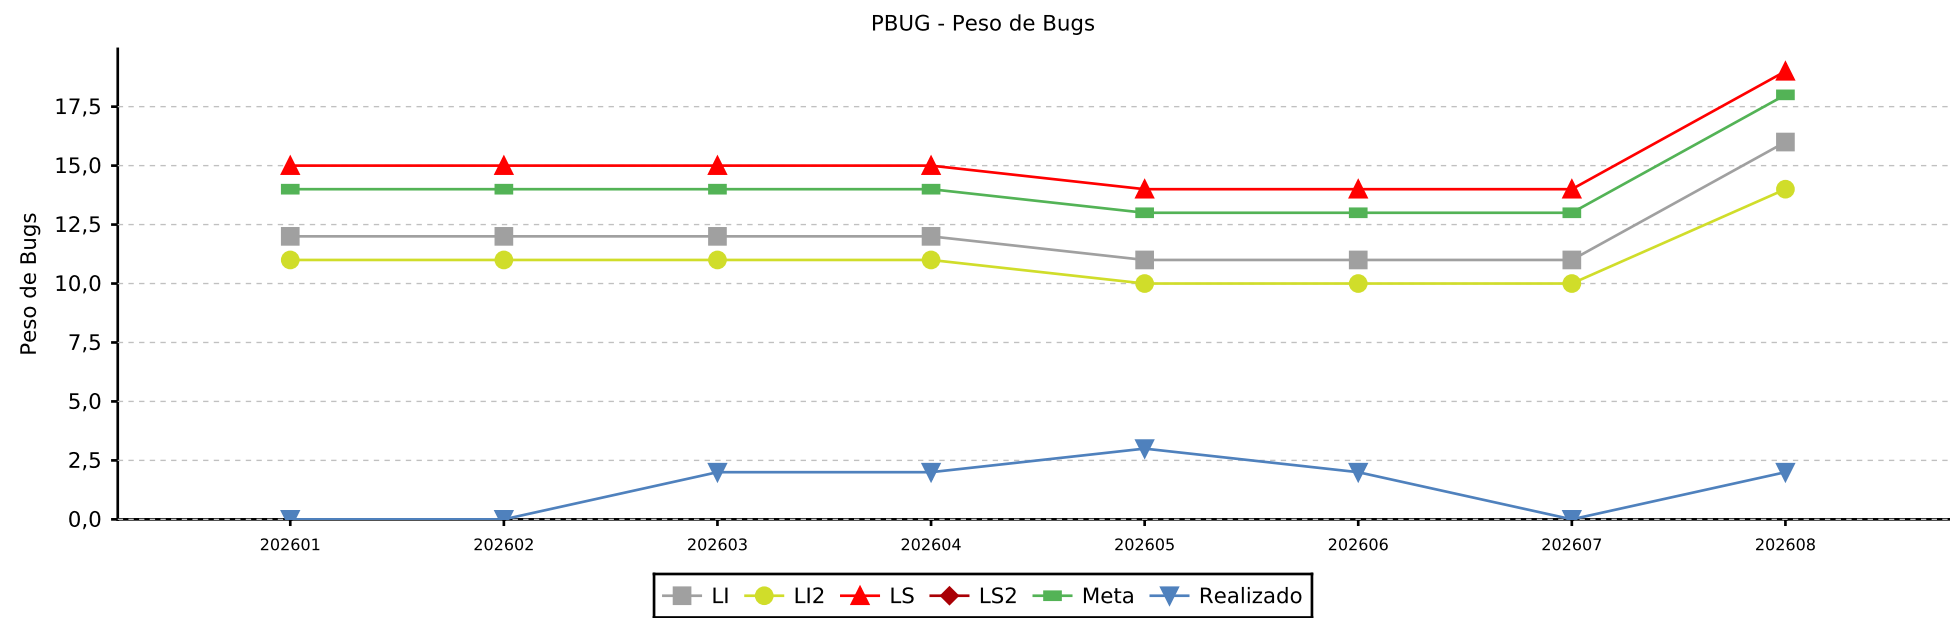


	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
Realizado	0	0	2	2	3	2	0	2
Meta	14	14	14	14	13	13	13	18
LS2								
LS	15	15	15	15	14	14	14	19
LI2	11	11	11	11	10	10	10	14
LI	12	12	12	12	11	11	11	16
Pontos Entregues	245	229	242	215.5	225.5	230	282.5	291
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,83	0,93	1,34	0,87	0,00	0,69

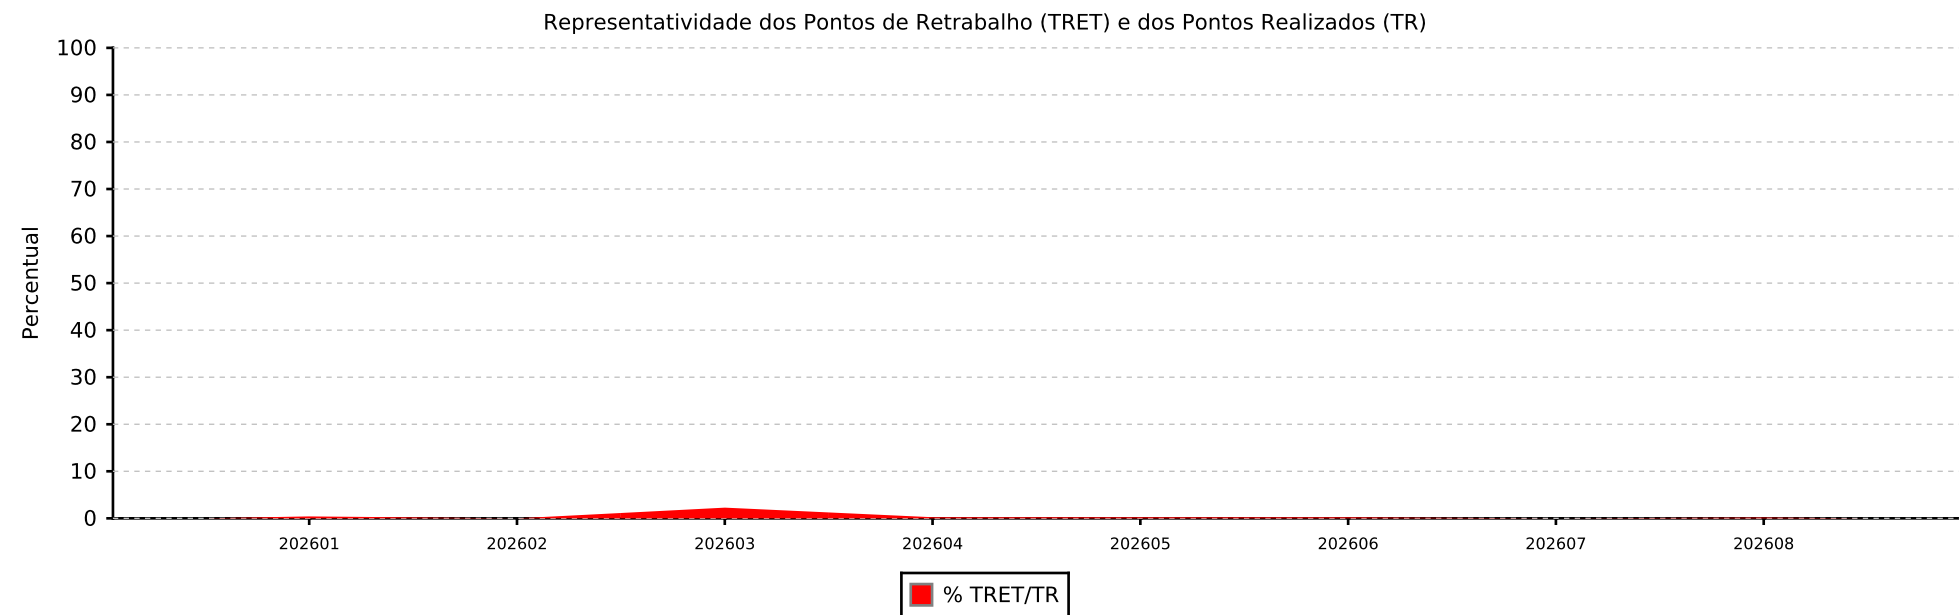

	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
TR - Pontos Realizados	245	229	242	215.5	225.5	230	282.5	291
TRET - Pontos de Retrabalho	1	0	5.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5
% TRET/TR	0,4	0,0	2,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2

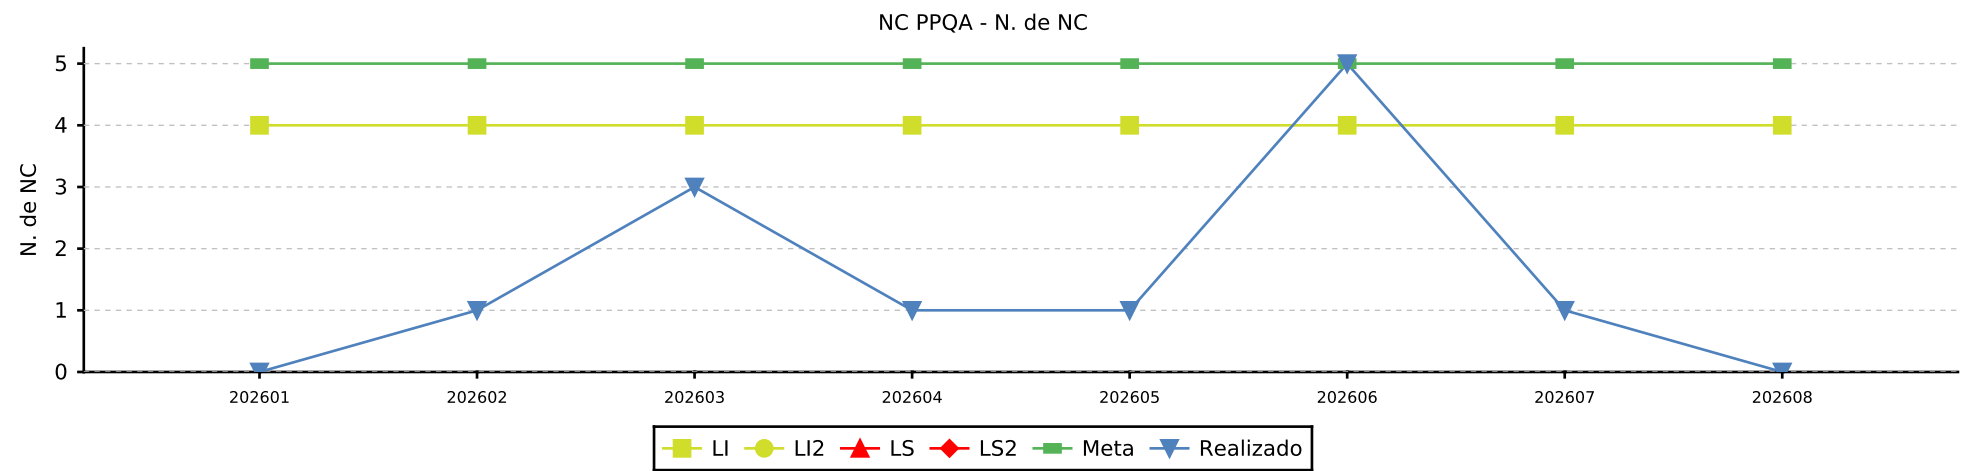


	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
Realizado	0	1	3	1	1	5	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

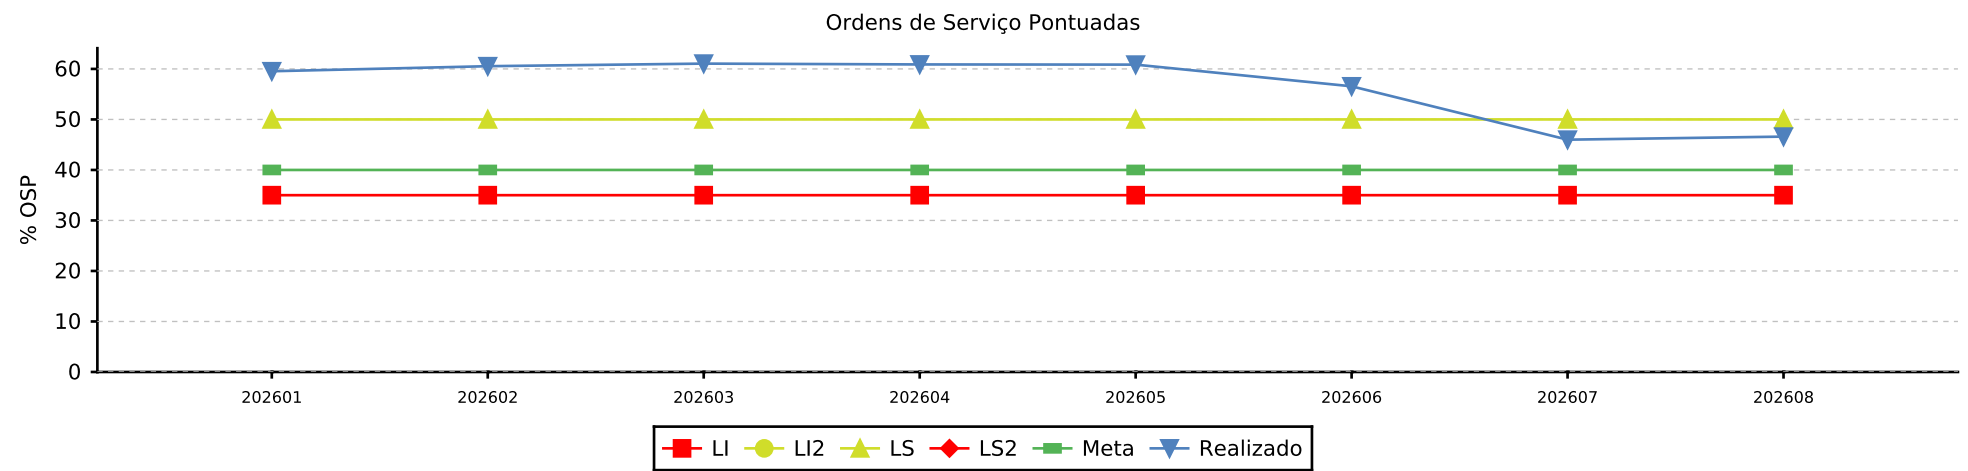

	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
Realizado	59.54	60.54	61.05	60.89	60.85	56.56	45.99	46.6
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

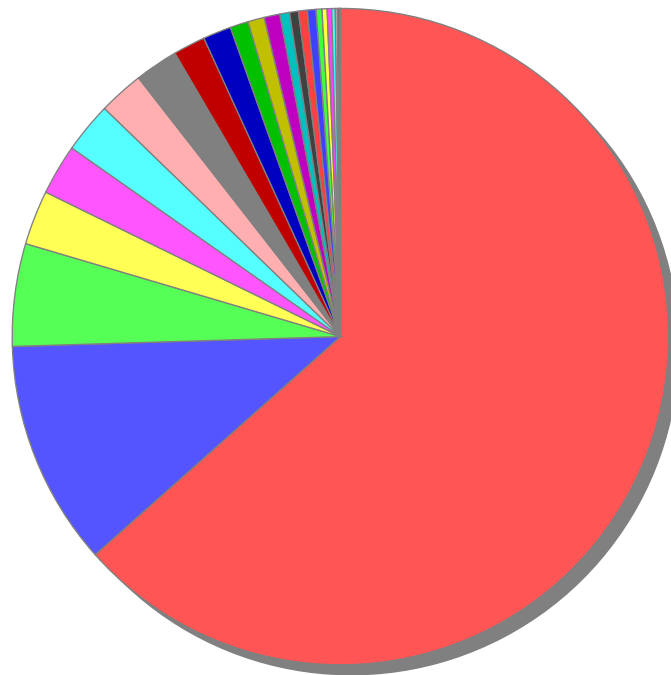

- Desenvolvimento [63.43%]
- Analise de Sistema [11.09%]
- Daily Scrum [5.05%]
- Cafe [2.68%]
- Sprint Planning 1 [2.49%]
- Ausencia [2.49%]
- Curso/Palestra [2.22%]
- Retrospectiva [2.14%]
- Ginastica Laboral [1.58%]
- Code Review [1.39%]
- Reuniao [0.9%]
- Outros [0.8%]
- Instrutor Treinamento [0.78%]
- Clean Code [0.48%]
- Compilacao de sistemas [0.44%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.43%]
- Sprint Planning 2 [0.42%]
- Sizing [0.29%]
- Planejamento de Projeto [0.25%]
- Correção de Erros Interno [0.22%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.17%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.1%]
- Preparando ambiente [0.08%]
- Atraso / Saida antecipada [0.04%]
- Auxilio suporte [0.02%]

% de Horas por Área do CMMI

