



INDICADORES DA SPRINT


	202605				202606			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	216h00m	216h00m	264h00m	180h00m	220h00m	220h00m	180h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	223h37m	258h09m	319h08m	224h29m	220h03m	223h28m	222h42m	273h26m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	188h43m	188h43m	233h35m	157h58m	187h00m	187h00m	151h05m	187h15m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	169h40m	144h52m	221h30m	152h19m	171h26m	174h58m	167h54m	159h29m
05. Pontos planejados	81,0	71,5	68,5	66,0	73,0	64,0	71,5	65,5
06. Pontos entregues	53,5	43,5	74,5	54	58,5	60	53,5	57
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	38,00	30,00	57,50	20,50	28,50	24,50	52,00	38,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	15,50	13,50	17,00	33,50	30,00	35,50	1,50	19,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	3	0	0	0	2	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	13	11	12	11	9	12	16	13
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	9	8	13	23	20	14	2	11
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	0	1	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,430	0,379	0,294	0,418	0,391	0,343	0,474	0,350
16. Produtividade realizada	0,316	0,301	0,337	0,355	0,342	0,343	0,319	0,358
17. % Pontos NP / Pontos entregues	29	31,1	22,9	62,1	51,3	59,2	2,9	33,4

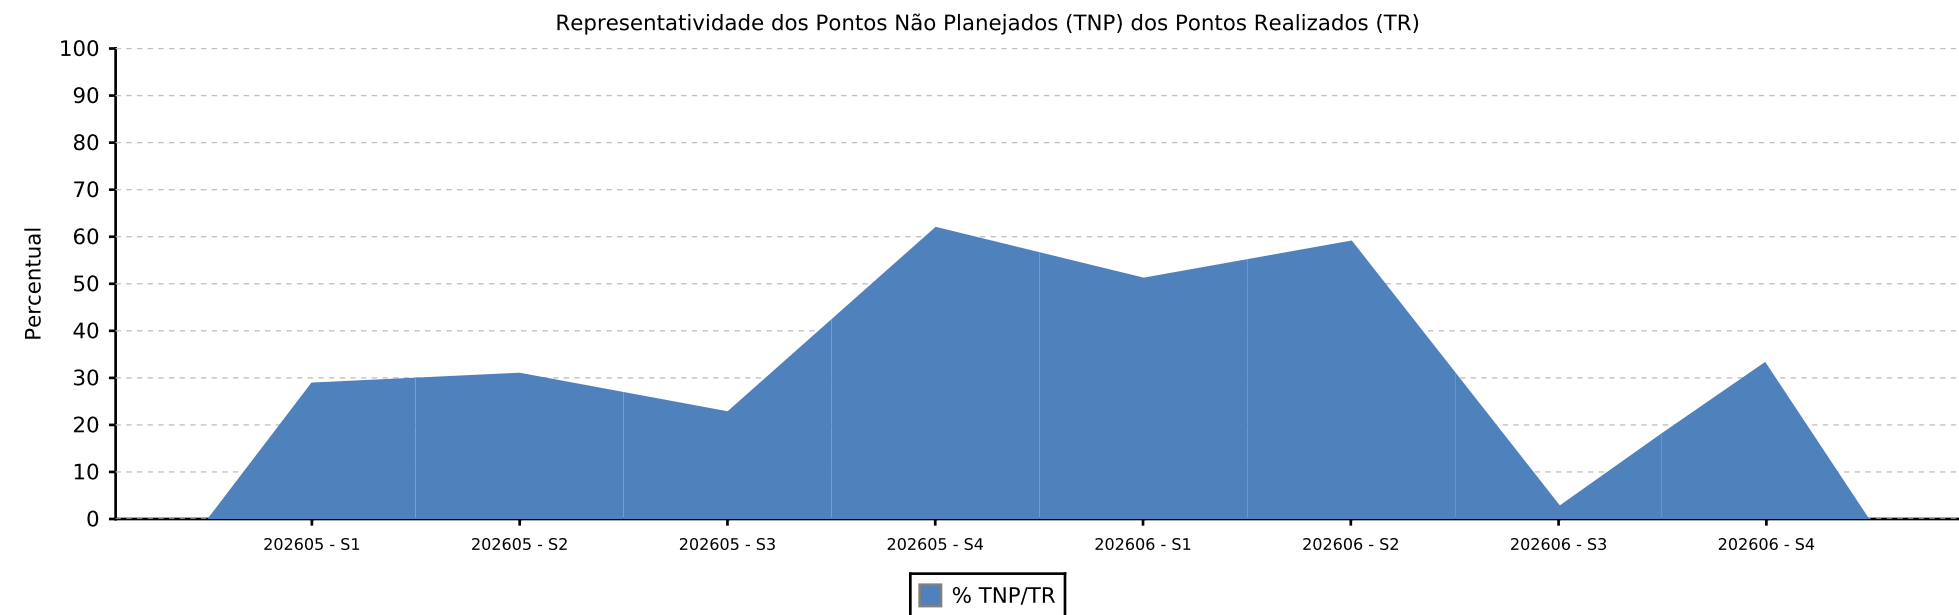

	202605				202606			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	53.5	43.5	74.5	54	58.5	60	53.5	57
TNP - Pontos Não Planejados	15.5	13.5	17	33.5	30	35.5	1.5	19
% TNP/TR	29,0	31,1	22,9	62,1	51,3	59,2	2,9	33,4

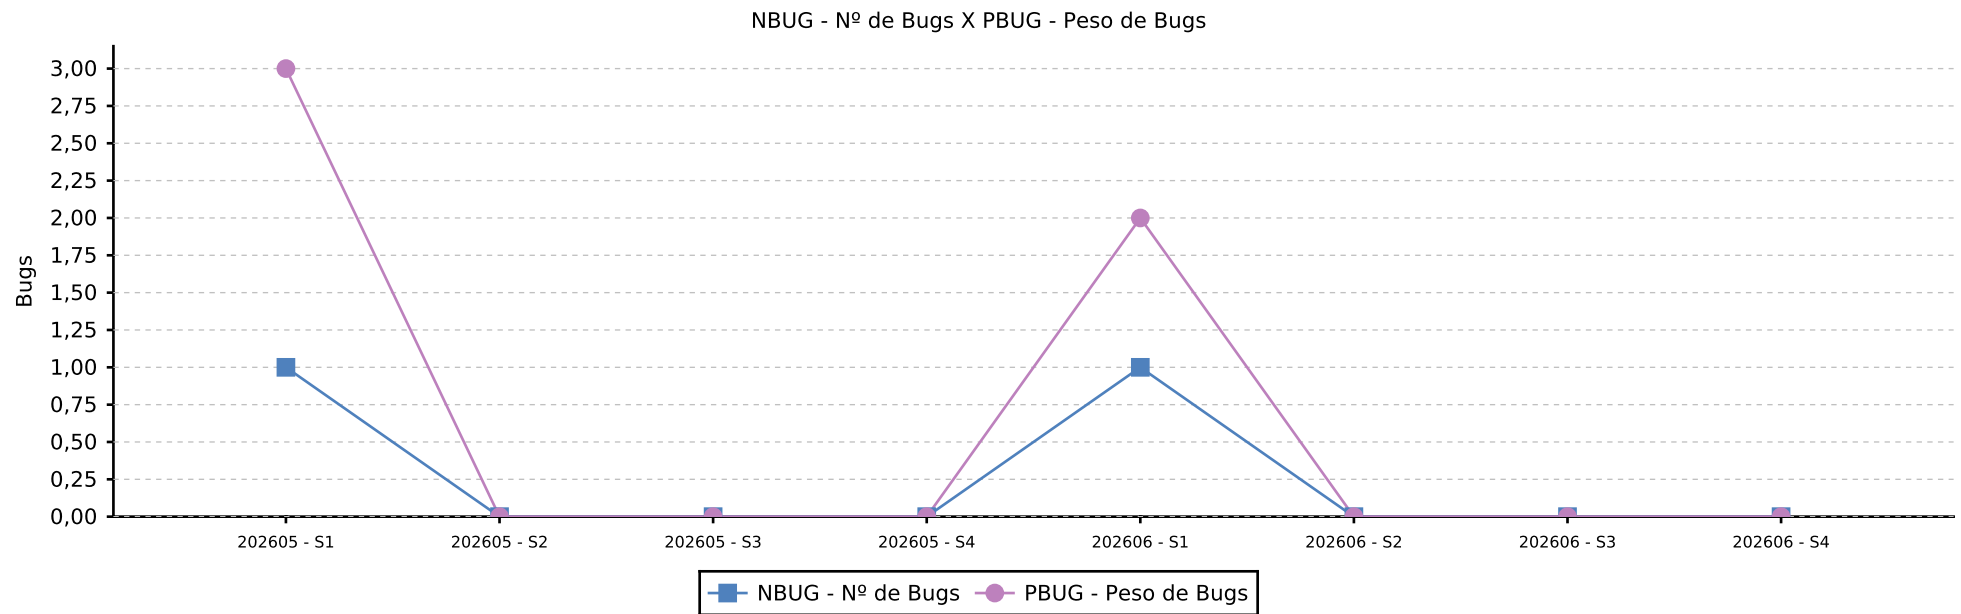

	202605				202606			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	1	0	0	0	1	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	3	0	0	0	2	0	0	0
Pontos Entregues	53.5	43.5	74.5	54	58.5	60	53.5	57
% PBUG / TR	5,61	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00

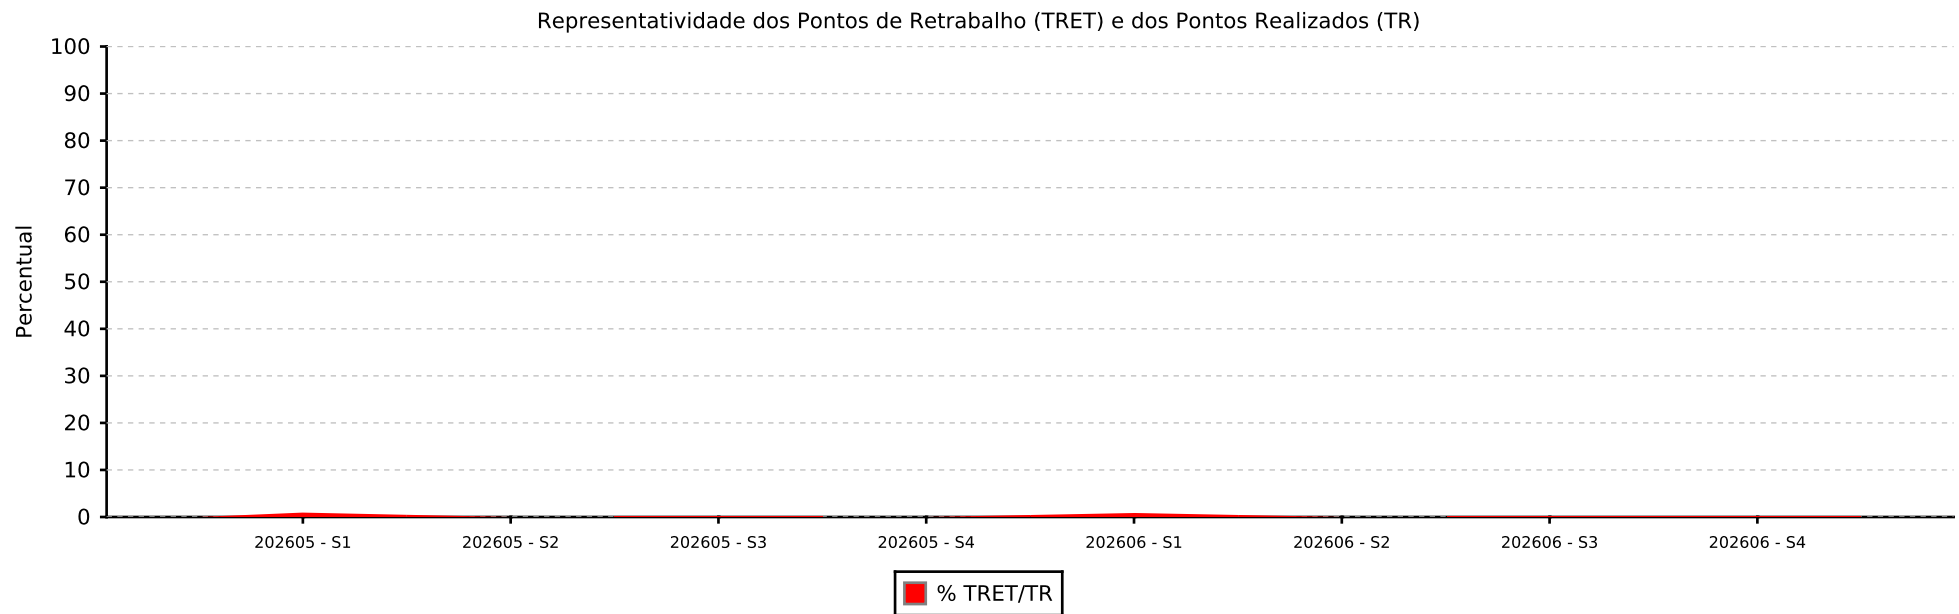



	202605				202606			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	53.5	43.5	74.5	54	58.5	60	53.5	57
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0
% TRET/TR	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	0	0	0	0	0,32	0	0	0	0,32	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220	220,04	220	223,46	180	222,72	220	273,45	840	939,67	111,9 %


% de Horas por Atividade

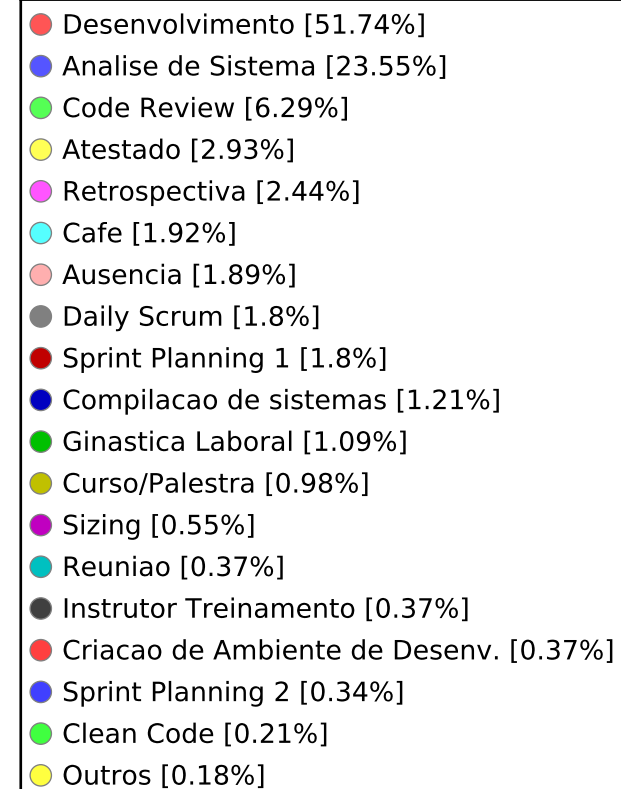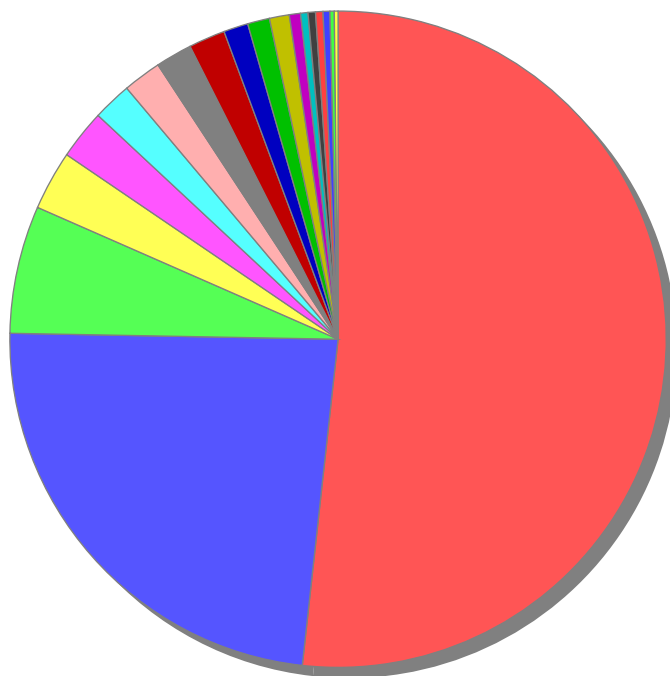

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos		159,75	150,43	159,75	156,38	126,33	138,23	158,5	143,07	604,33	588,11	97,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		26,5	22,83	26,5	9,83	25	42,08	26,25	71,73	104,25	146,47	140,5 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto		18,75	24,35	18,75	20,67	16,25	16,55	18,75	28,78	72,5	90,35	124,6 %
DIV - Diversos*		11,25	16,92	11,25	27,58	9,17	24,08	11,25	14,88	42,92	83,46	194,5 %
CM - Gerencia de Configuracao		1,5	0,5	1,5	1	1,5	1	2	3,3	6,5	5,8	89,2 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	2,67	0	2,67	0,0 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	1,33	0,25	0	0,25	0,25	1,25	0	2	1,58	79,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	218	216,36	218	215,46	178,5	222,19	218	264,43	832,5	918,44	110,3 %

% de Horas por Área do CMMI

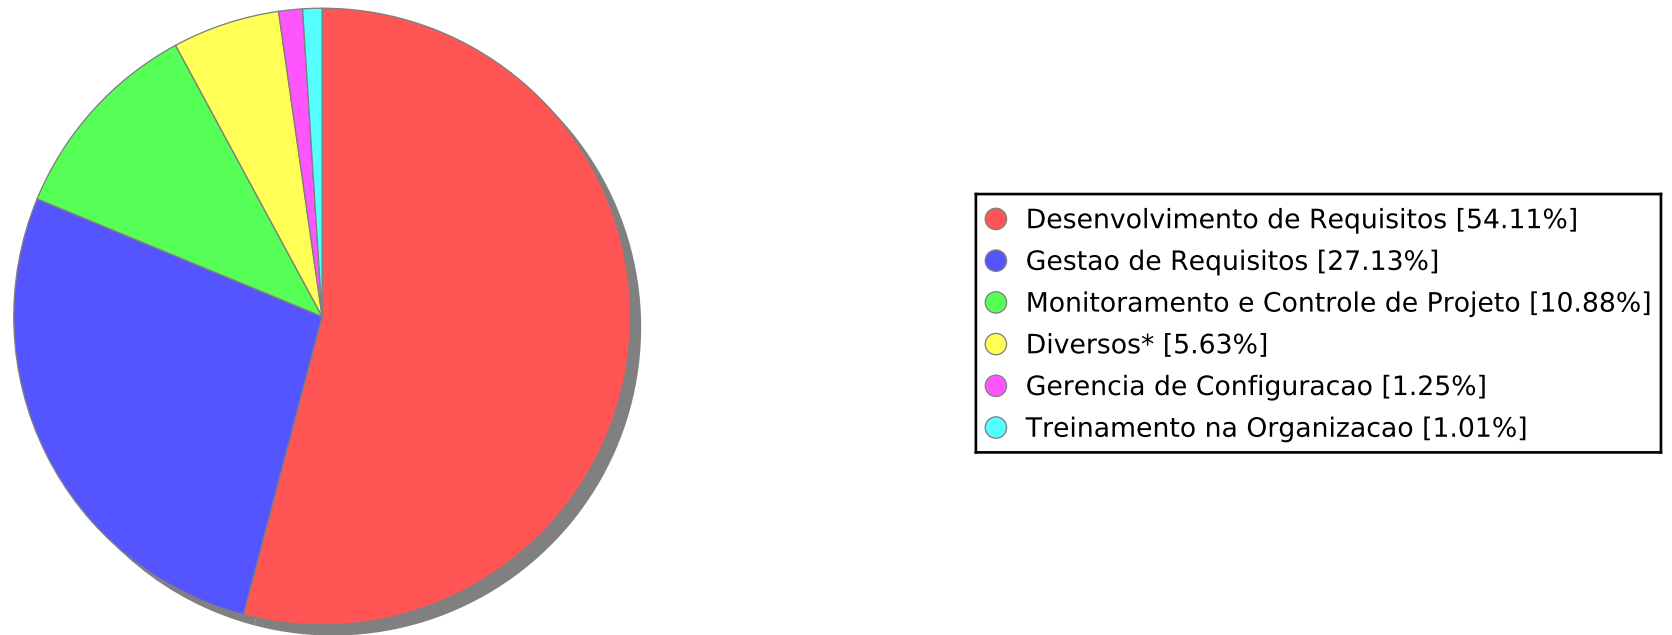


INDICADORES DO PROJETO


	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606
01. Horas planejadas de todas atividades	760h00m	816h00m	923h12m	914h24m	860h00m	840h00m	876h00m	840h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	755h22m	853h34m	1005h01m	1032h36m	1173h43m	940h40m	1025h23m	939h39m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	636h10m	686h10m	790h07m	788h39m	757h30m	738h08m	768h59m	712h20m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	549h56m	621h12m	741h36m	700h36m	721h53m	664h36m	688h21m	673h47m
05. Pontos planejados para o projeto	204,0	220,0	253,0	253,0	242,0	237,0	246,0	227,0
06. Pontos planejados	251,5	214,0	224,5	188,5	222,0	192,0	287,0	274,0
07. Pontos entregues	185	204,5	245	229	242	215,5	225,5	229
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	140,00	159,00	202,50	158,50	176,00	131,00	146,00	143,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	45,00	45,50	42,50	70,50	66,00	84,50	79,50	86,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	0	0	2	2	3	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	34	54	58	55	48	36	47	50
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	22	37	30	44	45	53	53	47
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	1	1	1	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	3	2,5	1	0	5,5	0,5	0,5	0,5
16. Produtividade planejada	0,396	0,312	0,285	0,240	0,294	0,261	0,374	0,385
17. Produtividade realizada	0,337	0,330	0,331	0,327	0,336	0,325	0,328	0,340
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	90,7	93	96,9	90,6	100	91	91,7	100,9
19. % Pontos NP / Pontos entregues	24,4	22,3	17,4	30,8	27,3	39,3	35,3	37,6

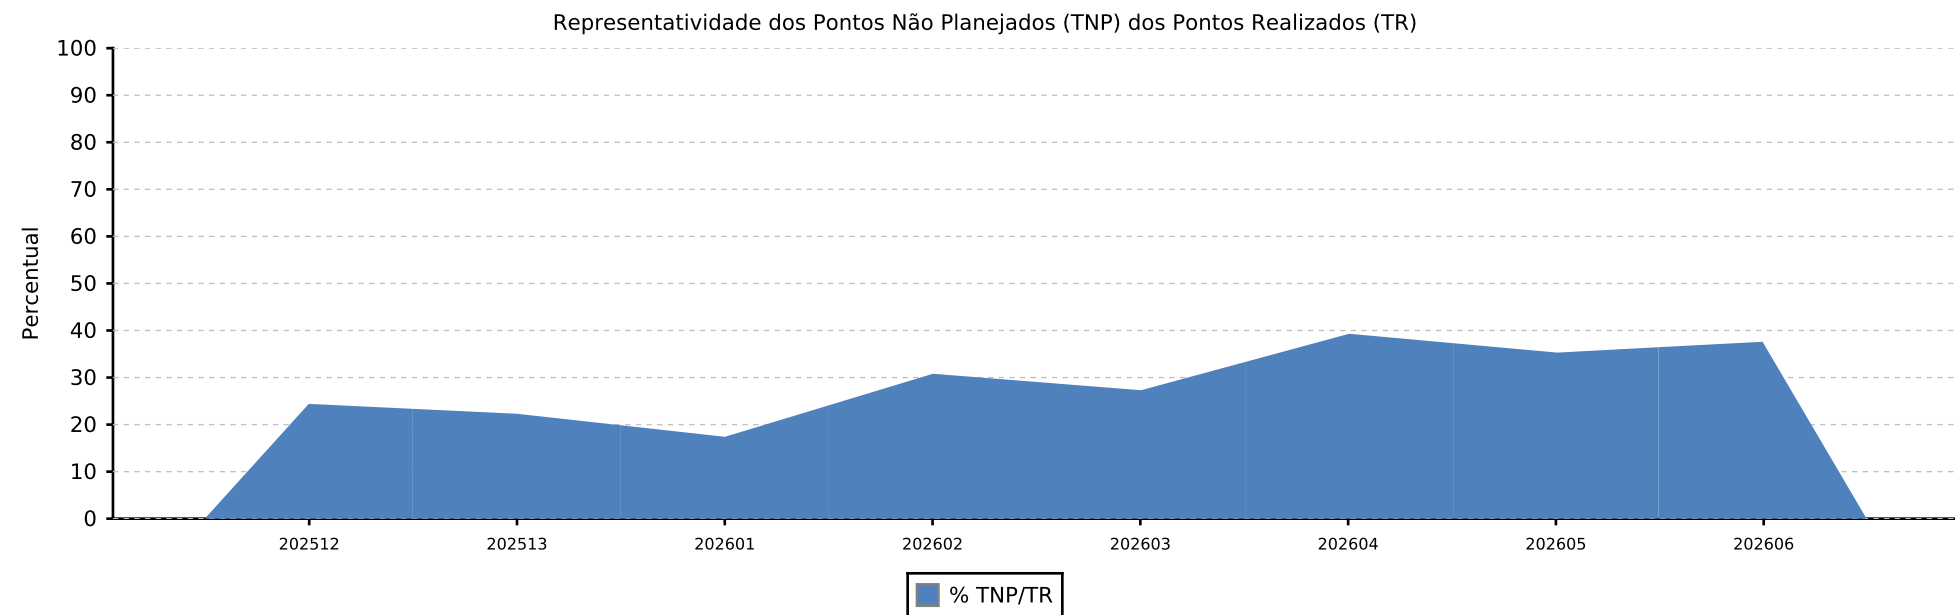


	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606
TR - Pontos Realizados	185	204.5	245	229	242	215.5	225.5	229
TNP - Pontos Não Planejados	45	45.5	42.5	70.5	66	84.5	79.5	86
% TNP/TR	24,4	22,3	17,4	30,8	27,3	39,3	35,3	37,6

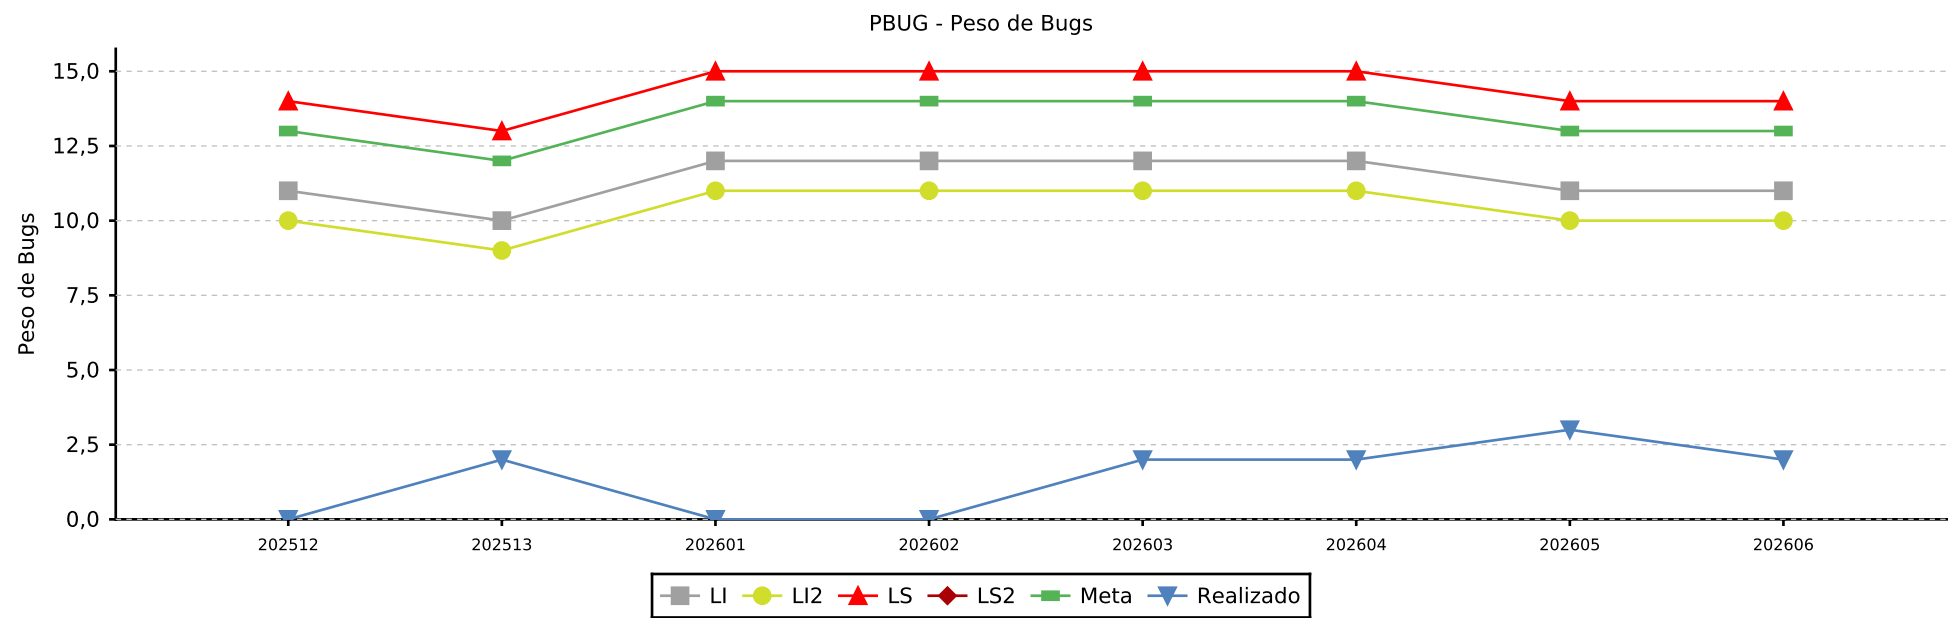


	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606
Realizado	0	2	0	0	2	2	3	2
Meta	13	12	14	14	14	14	13	13
LS2								
LS	14	13	15	15	15	15	14	14
LI2	10	9	11	11	11	11	10	10
LI	11	10	12	12	12	12	11	11
Pontos Entregues	185	204.5	245	229	242	215.5	225.5	229
% PBUG / TR	0,00	0,98	0,00	0,00	0,83	0,93	1,34	0,88

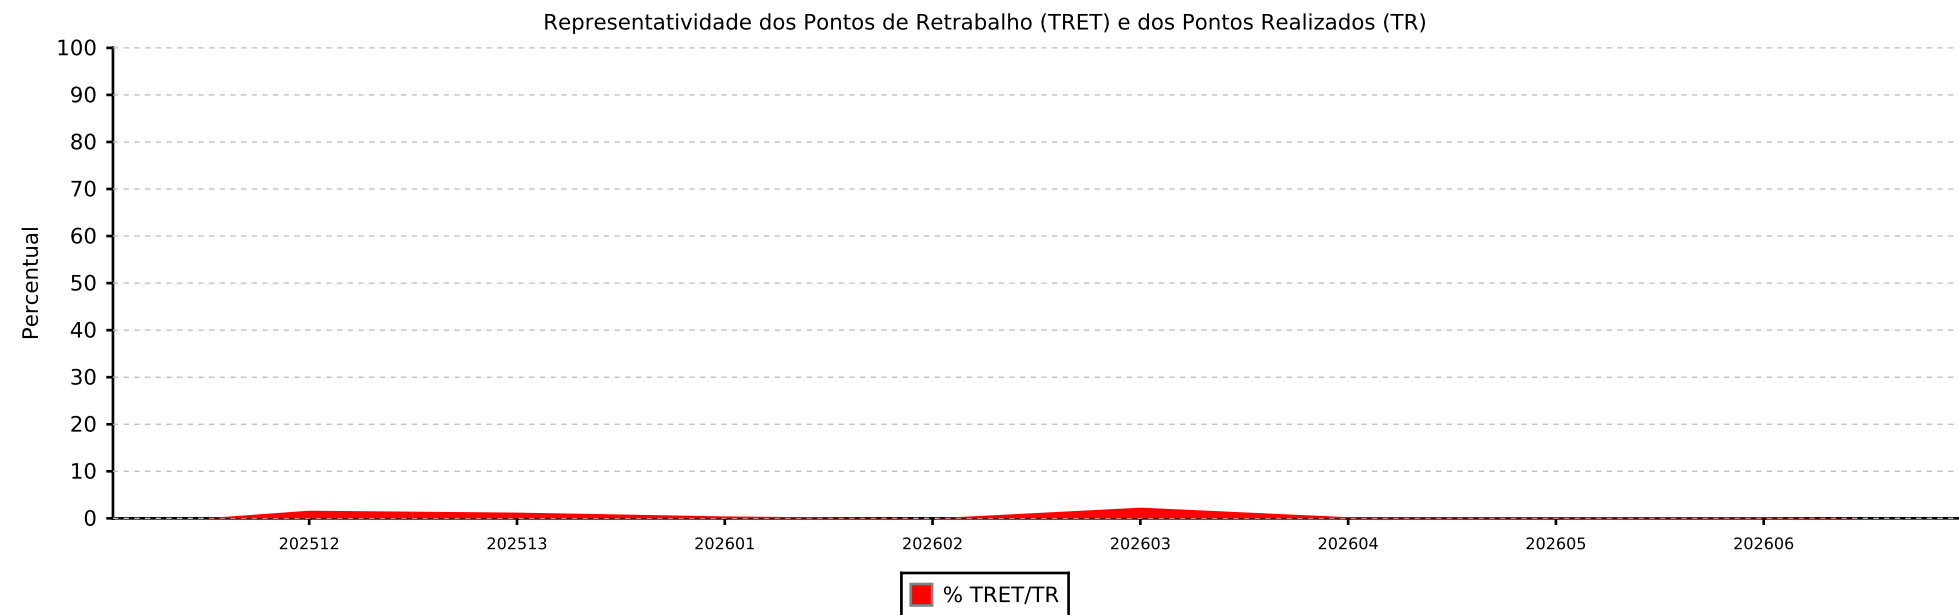

	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606
TR - Pontos Realizados	185	204.5	245	229	242	215.5	225.5	229
TRET - Pontos de Retrabalho	3	2.5	1	0	5.5	0.5	0.5	0.5
% TRET/TR	1,6	1,2	0,4	0,0	2,3	0,2	0,2	0,2

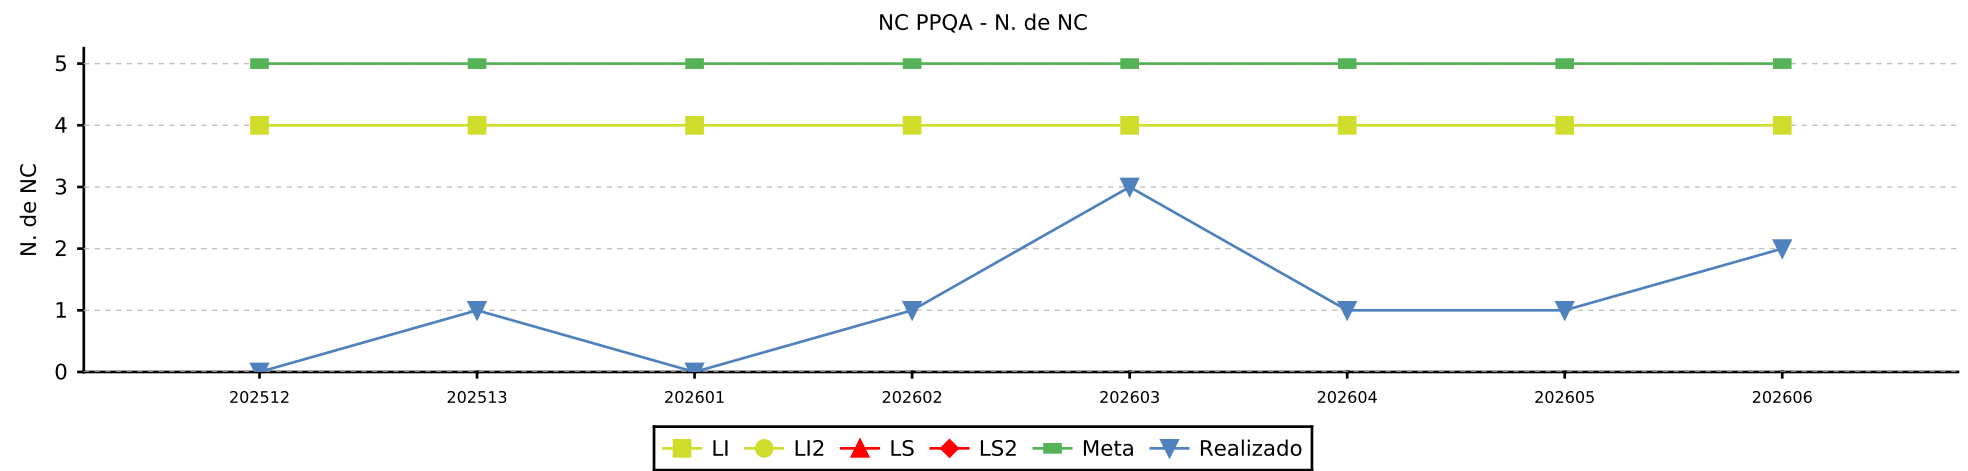


	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606
Realizado	0	1	0	1	3	1	1	2
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

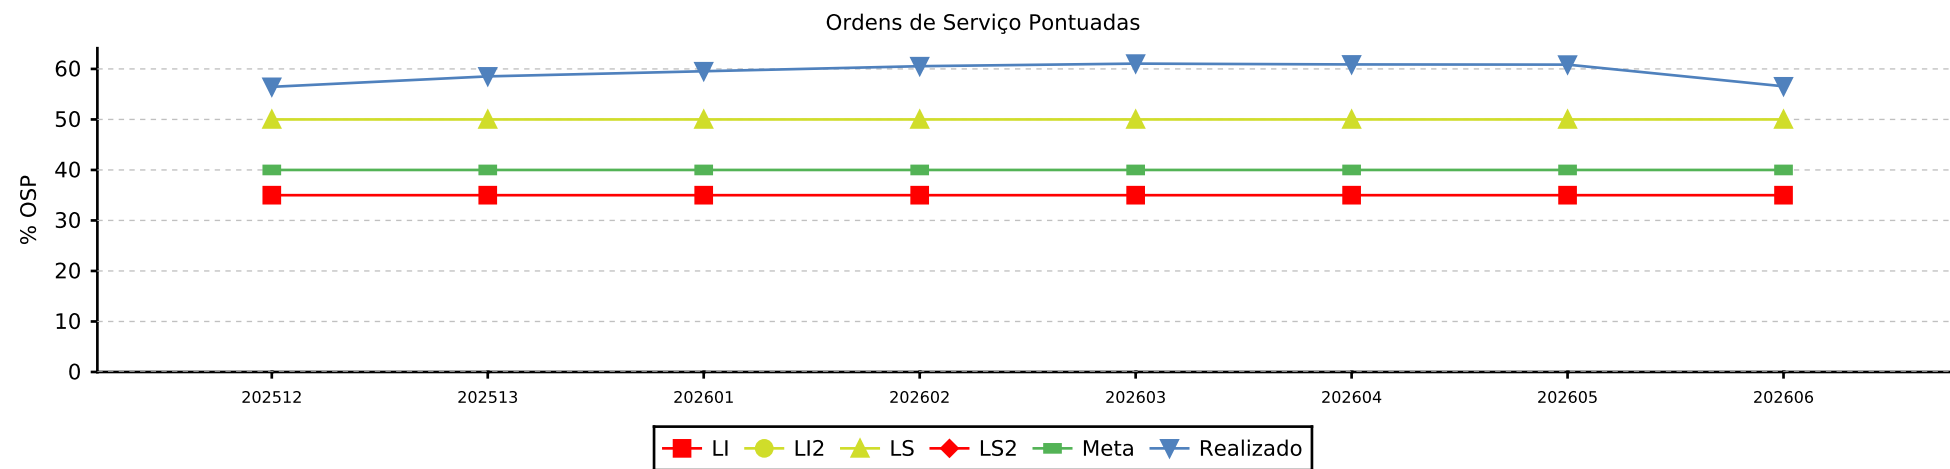

	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606
Realizado	56.45	58.52	59.54	60.54	61.05	60.89	60.85	56.56
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

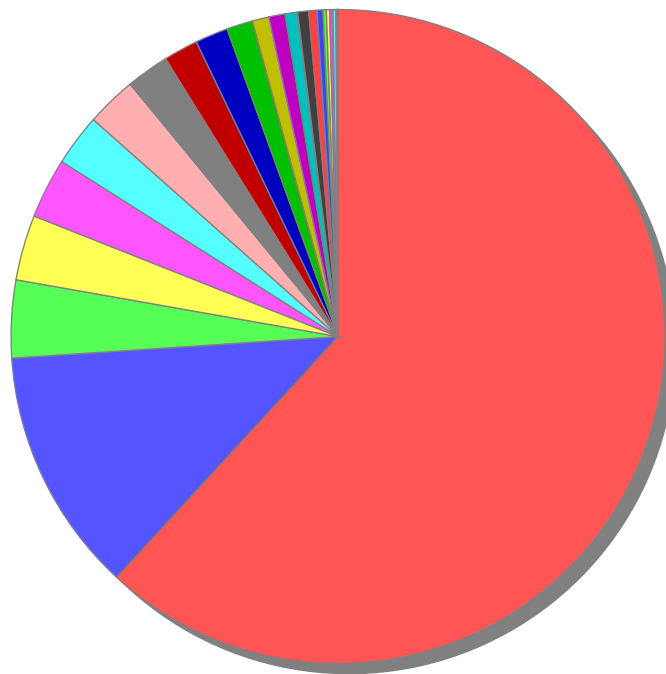

- Desenvolvimento [61.83%]
- Analise de Sistema [12.11%]
- Code Review [3.83%]
- Daily Scrum [3.23%]
- Ausencia [2.98%]
- Retrospectiva [2.55%]
- Sprint Planning 1 [2.49%]
- Cafe [2.13%]
- Atestado [1.7%]
- Reuniao [1.62%]
- Ginastica Laboral [1.29%]
- Sprint Planning 2 [0.82%]
- Outros [0.8%]
- Compilacao de sistemas [0.62%]
- Instrutor Treinamento [0.54%]
- Clean Code [0.41%]
- Curso/Palestra [0.28%]
- Planejamento de Projeto [0.17%]
- Sizing [0.16%]
- Correção de Erros Interno [0.16%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.15%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.06%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.03%]
- Verificando apontamento [0.01%]

% de Horas por Área do CMMI

