



INDICADORES DA SPRINT


	202606				202607			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	220h00m	180h00m	220h00m	300h00m	308h00m	308h00m	308h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	220h33m	223h28m	222h42m	316h56m	317h39m	304h35m	305h49m	307h24m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	187h00m	187h00m	151h05m	187h15m	257h30m	265h15m	265h15m	265h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	171h56m	174h58m	167h54m	161h59m	216h36m	231h48m	186h42m	207h20m
05. Pontos planejados	73,0	64,0	71,5	65,5	78,5	64,5	68,0	81,5
06. Pontos entregues	59	60	53,5	57,5	72	77	63,5	70
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	28,50	23,50	52,00	38,50	57,00	52,50	39,00	55,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	30,50	36,50	1,50	19,00	15,00	24,50	24,50	14,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	9	11	16	14	19	18	10	14
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	20	15	2	11	14	17	14	12
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	0	0	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,391	0,343	0,474	0,350	0,305	0,244	0,257	0,307
16. Produtividade realizada	0,344	0,343	0,319	0,355	0,333	0,333	0,341	0,338
17. % Pontos NP / Pontos entregues	51,7	60,9	2,9	33,1	20,9	31,9	38,6	20,8

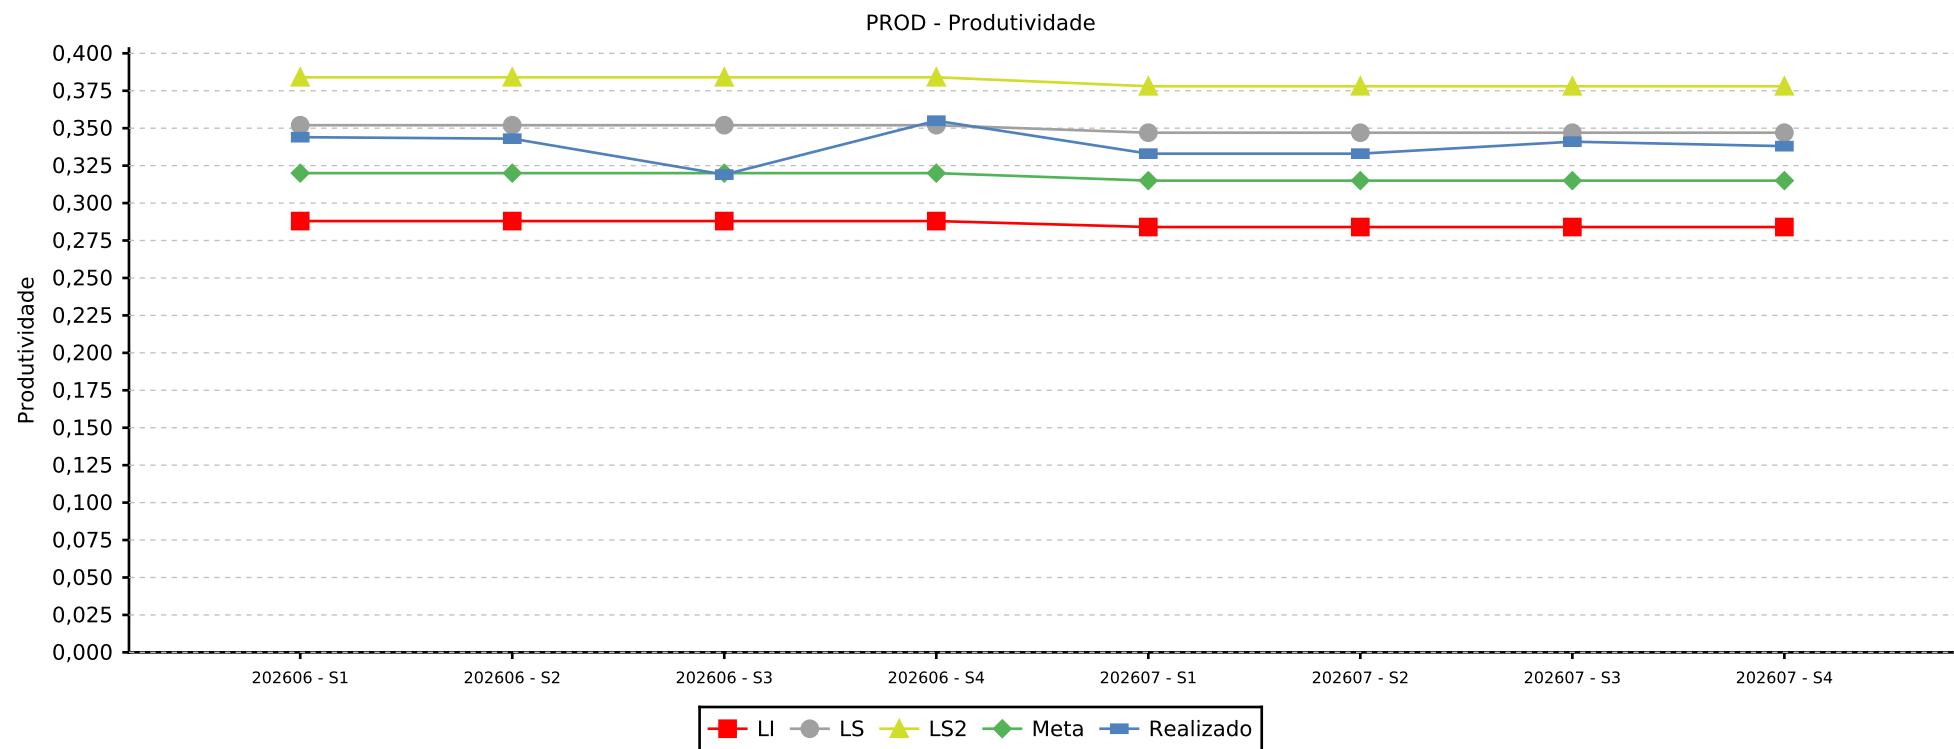

	202606				202607			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,344	0,343	0,319	0,355	0,333	0,333	0,341	0,338
Meta	0,320	0,320	0,320	0,320	0,315	0,315	0,315	0,315
LS2	0,384	0,384	0,384	0,384	0,378	0,378	0,378	0,378
LS	0,352	0,352	0,352	0,352	0,347	0,347	0,347	0,347
LI	0,288	0,288	0,288	0,288	0,284	0,284	0,284	0,284

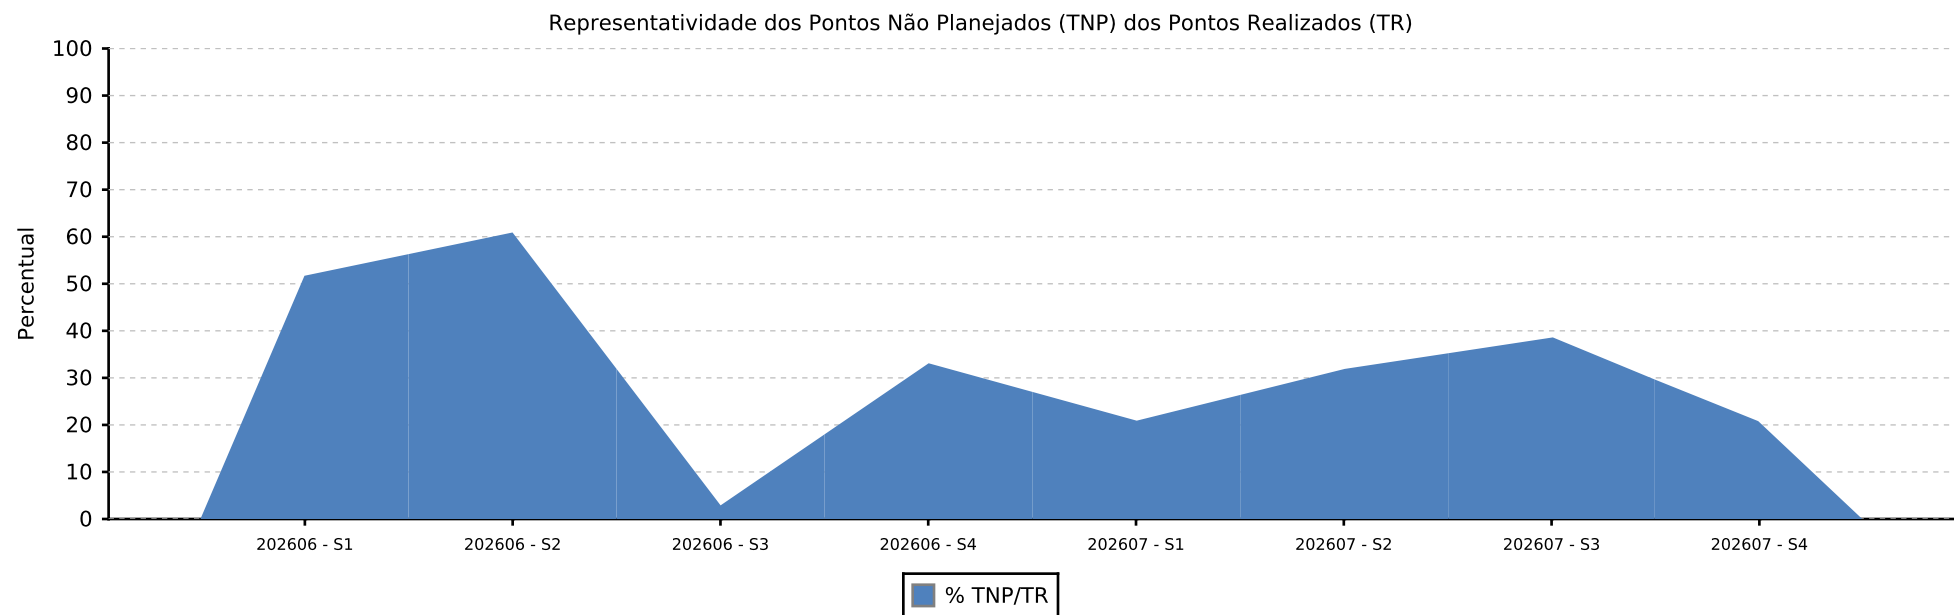

	202606				202607			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	59	60	53.5	57.5	72	77	63.5	70
TNP - Pontos Não Planejados	30.5	36.5	1.5	19	15	24.5	24.5	14.5
% TNP/TR	51,7	60,9	2,9	33,1	20,9	31,9	38,6	20,8

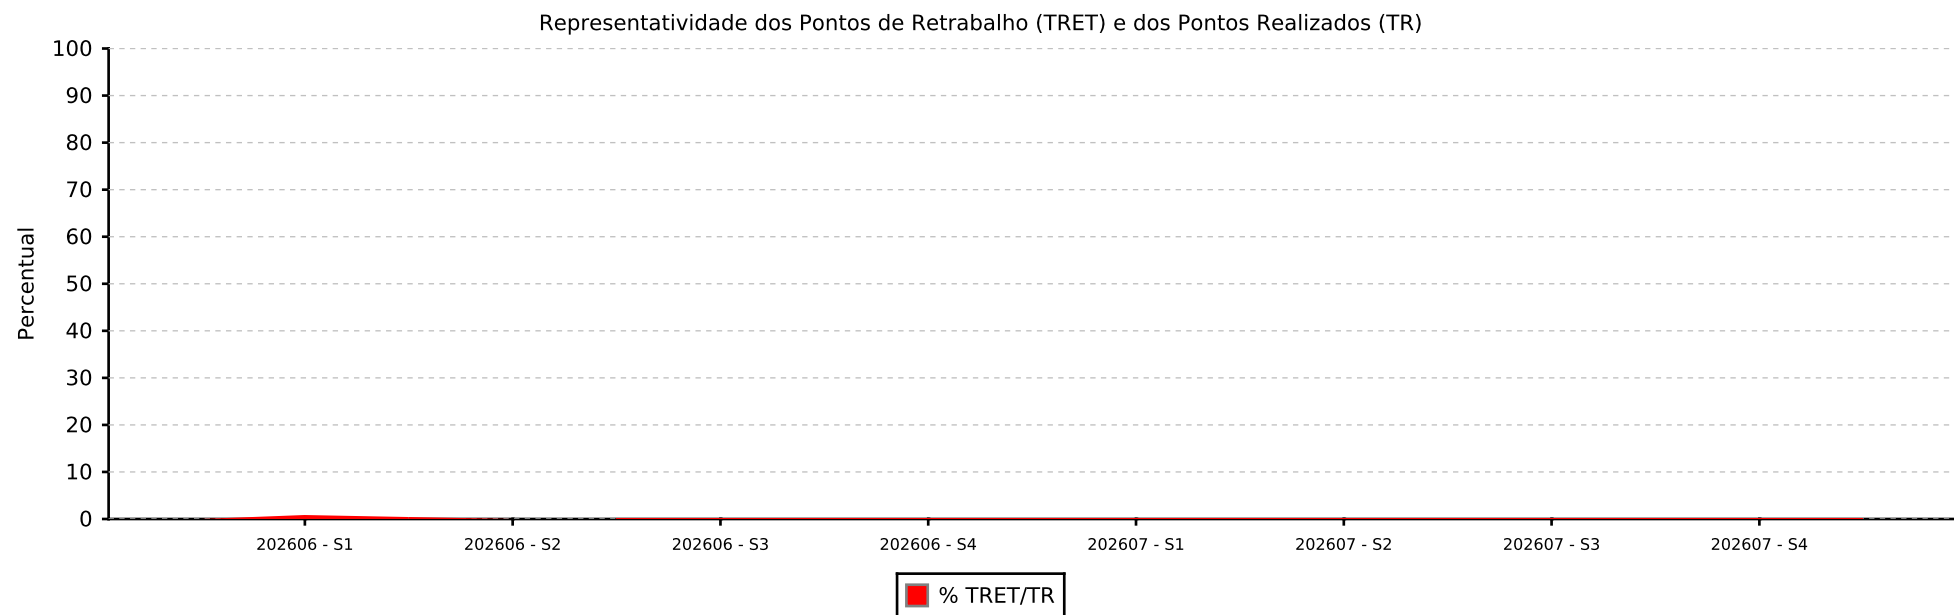



	202606				202607			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	59	60	53.5	57.5	72	77	63.5	70
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	0	0	0	0	0	0
% TRET/TR	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de O.S	0	0	0	1,33	0	0	0	0	0	1,33	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	1	0	1	1,08	1	0	1	0	4	1,08	27,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,58	0	0,58	0	0,58	0	0,58	0	2,32	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	3,25	1	2,47	1	1,83	1	0	4	7,55	188,8 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	300	317,64	308	304,57	308	305,81	308	307,39	1.224	1.235,41	100,9 %


% de Horas por Atividade

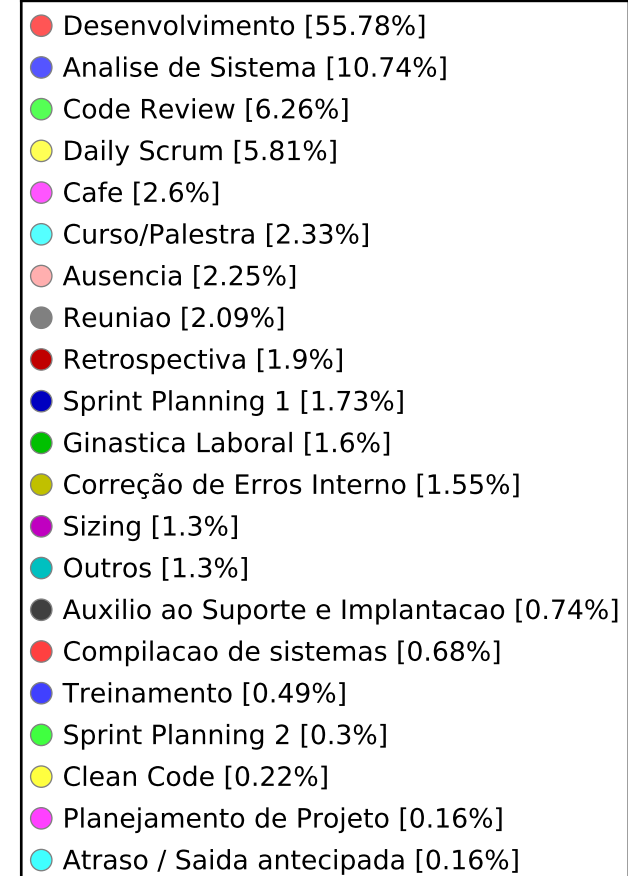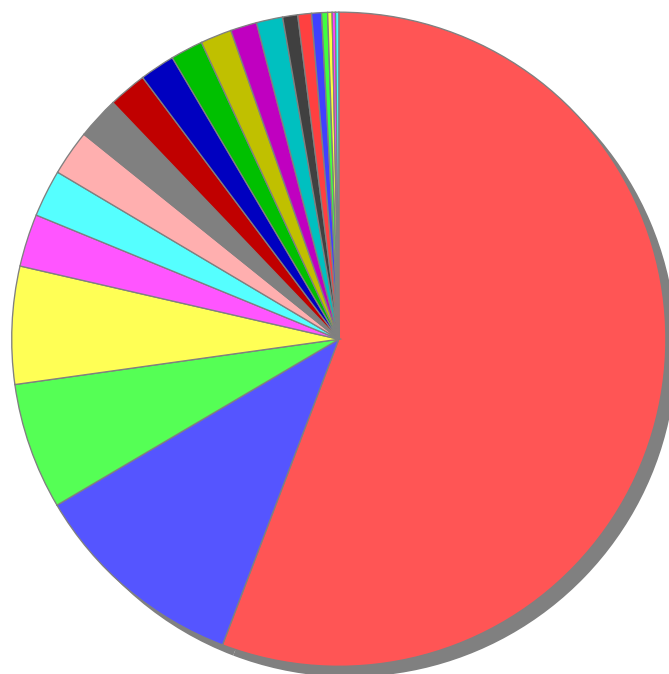

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos		224,25	196,62	228,5	195,68	228,5	160,72	227,25	176,9	908,5	729,92	80,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		31,5	32,83	34	43,28	34	57,03	33,5	43,28	133	176,42	132,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto		25,25	18,37	26,25	22,1	26,25	24,98	26,25	42,92	104	108,37	104,2 %
DIV - Diversos*		14,75	37,77	15	30,1	15	52,08	15	32,55	59,75	152,5	255,2 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	4,17	0	5,08	0	7,08	0	7,17	0	23,5	0,0 %
CM - Gerencia de Configuracao		2	1,17	2	4,25	2	2,17	2,5	2,08	8,5	9,67	113,8 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,5	0,5	2,25	0,5	22,2 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	298	290,93	306	300,49	306	304,06	306	305,4	1.216	1.200,88	98,8 %

% de Horas por Área do CMMI

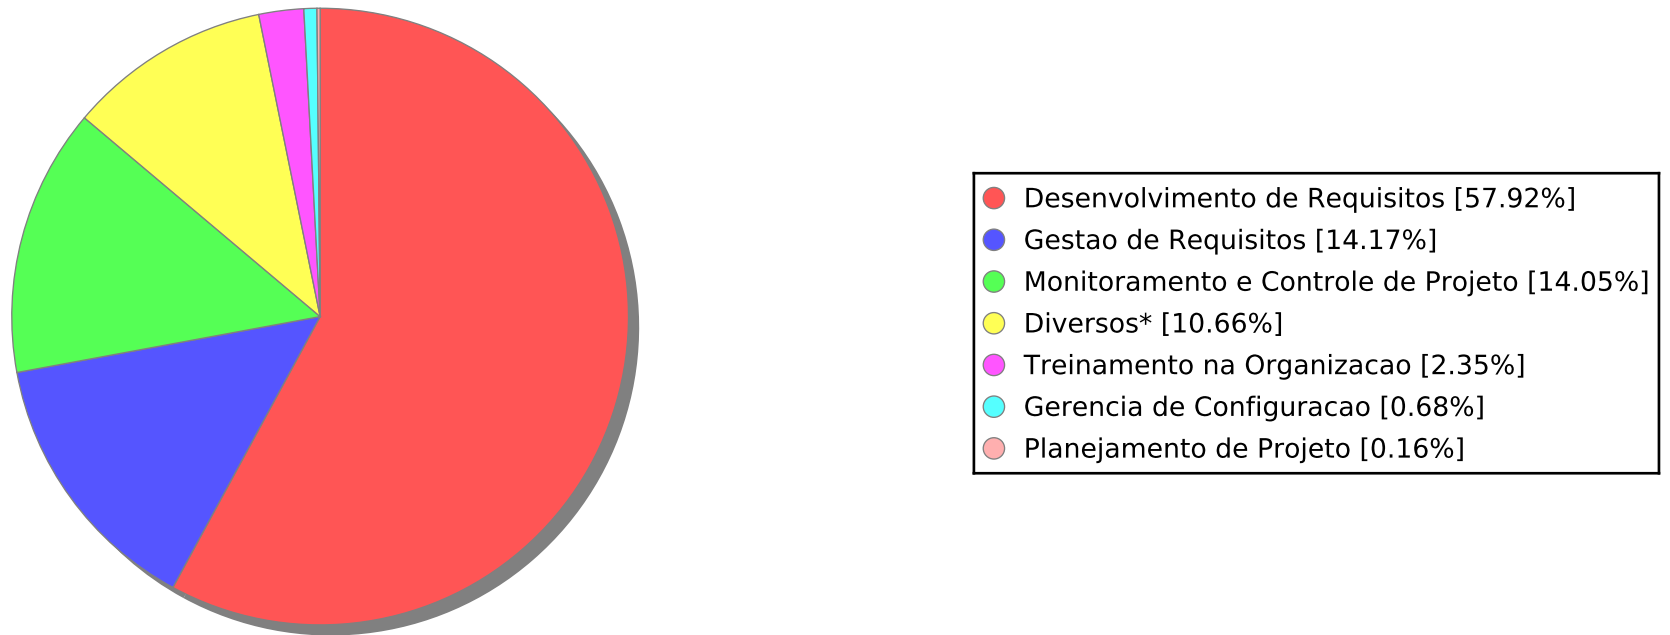


INDICADORES DO PROJETO


	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
01. Horas planejadas de todas atividades	816h00m	923h12m	914h24m	860h00m	840h00m	876h00m	840h00m	1224h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	853h34m	1005h01m	1032h36m	1173h43m	940h40m	1025h23m	983h39m	1235h27m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	686h10m	790h07m	788h39m	757h30m	738h08m	768h59m	712h20m	1053h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	621h12m	741h36m	700h36m	721h53m	664h36m	688h21m	676h47m	842h26m
05. Pontos planejados para o projeto	220,0	253,0	253,0	242,0	237,0	246,0	227,0	331,0
06. Pontos planejados	214,0	224,5	188,5	222,0	192,0	287,0	274,0	292,5
07. Pontos entregues	204,5	245	229	242	215,5	225,5	230	282,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	159,00	202,50	158,50	176,00	131,00	146,00	142,50	204,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	45,50	42,50	70,50	66,00	84,50	79,50	87,50	78,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	0	2	2	3	2	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	54	58	55	48	36	47	50	61
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	37	30	44	45	53	53	48	57
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	1	1	1	1	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	2,5	1	0	5,5	0,5	0,5	0,5	0
16. Produtividade planejada	0,312	0,285	0,240	0,294	0,261	0,374	0,385	0,278
17. Produtividade realizada	0,330	0,331	0,327	0,336	0,325	0,328	0,340	0,336
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	93	96,9	90,6	100	91	91,7	101,4	85,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	22,3	17,4	30,8	27,3	39,3	35,3	38,1	27,8

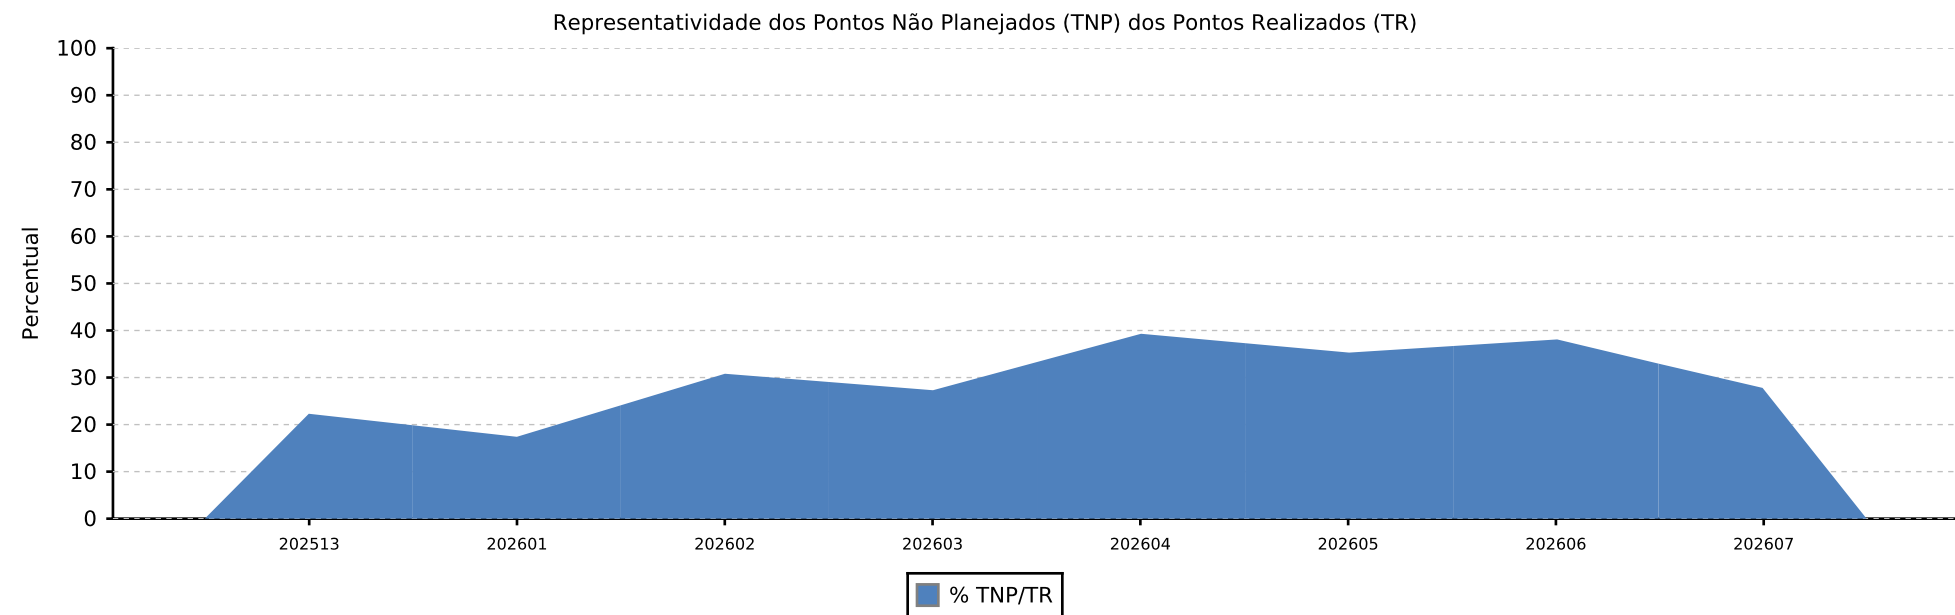


	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
TR - Pontos Realizados	204.5	245	229	242	215.5	225.5	230	282.5
TNP - Pontos Não Planejados	45.5	42.5	70.5	66	84.5	79.5	87.5	78.5
% TNP/TR	22,3	17,4	30,8	27,3	39,3	35,3	38,1	27,8

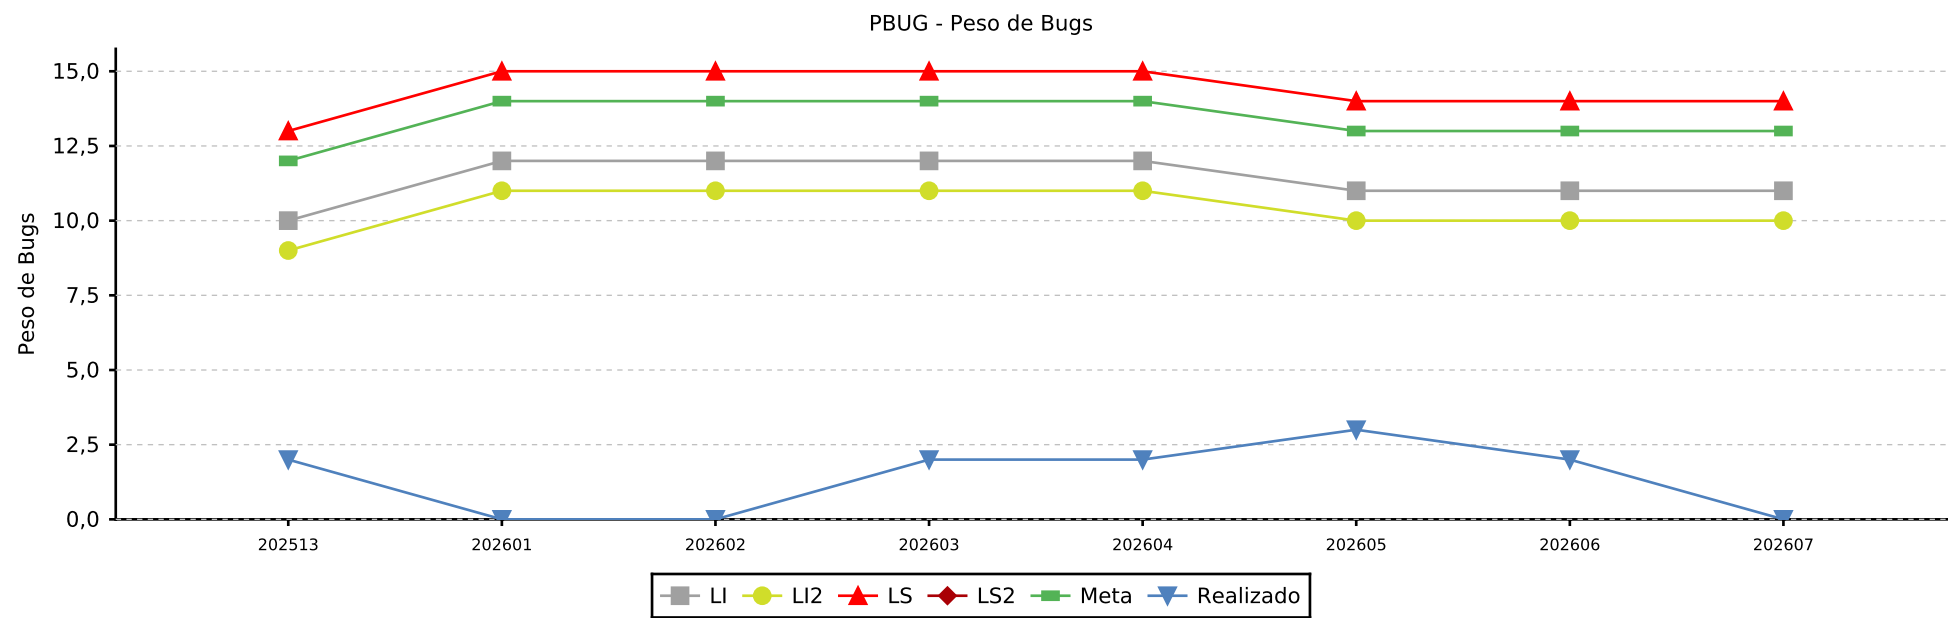


	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
Realizado	2	0	0	2	2	3	2	0
Meta	12	14	14	14	14	13	13	13
LS2								
LS	13	15	15	15	15	14	14	14
LI2	9	11	11	11	11	10	10	10
LI	10	12	12	12	12	11	11	11
Pontos Entregues	204.5	245	229	242	215.5	225.5	230	282.5
% PBUG / TR	0,98	0,00	0,00	0,83	0,93	1,34	0,87	0,00

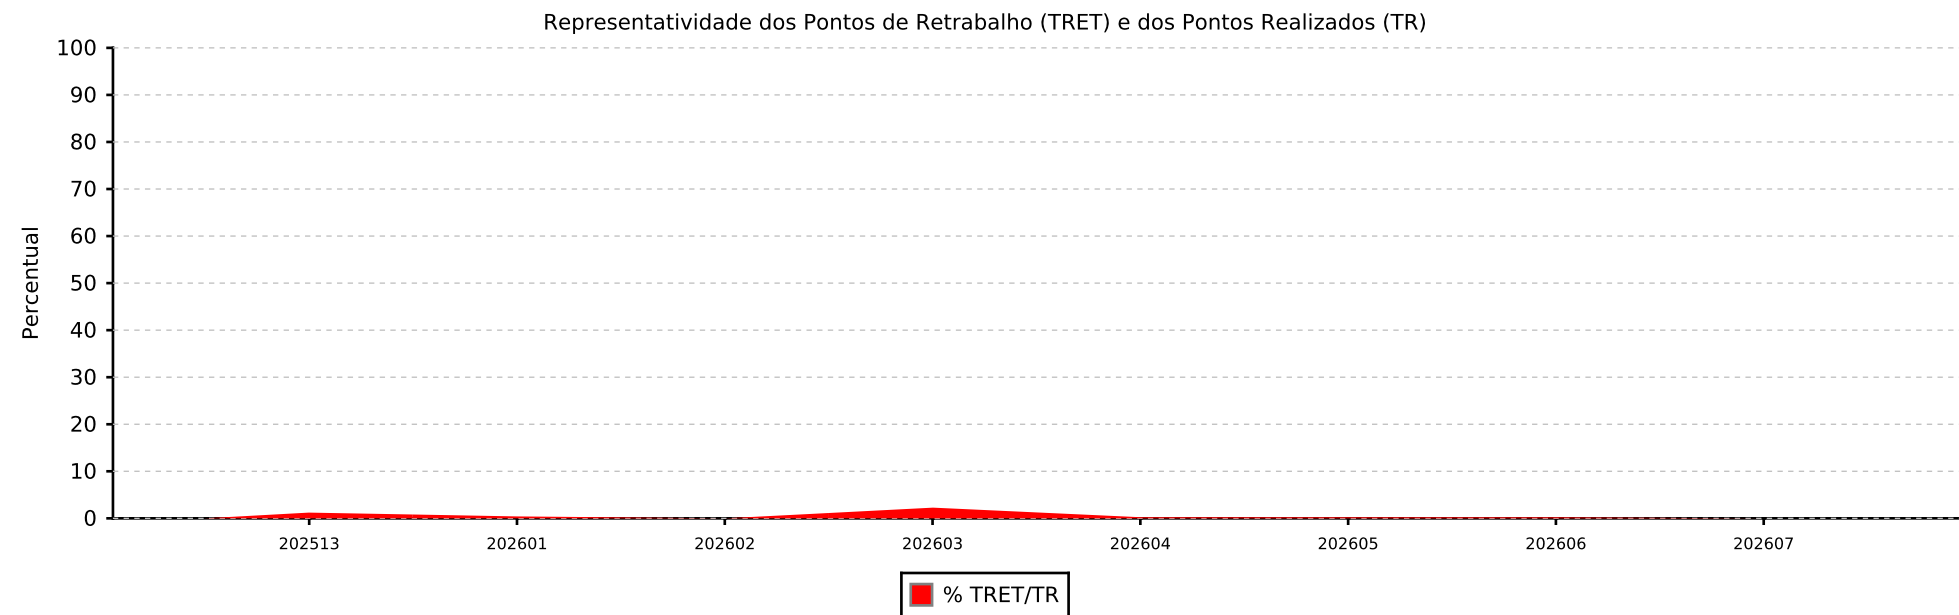

	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
TR - Pontos Realizados	204.5	245	229	242	215.5	225.5	230	282.5
TRET - Pontos de Retrabalho	2.5	1	0	5.5	0.5	0.5	0.5	0
% TRET/TR	1,2	0,4	0,0	2,3	0,2	0,2	0,2	0,0

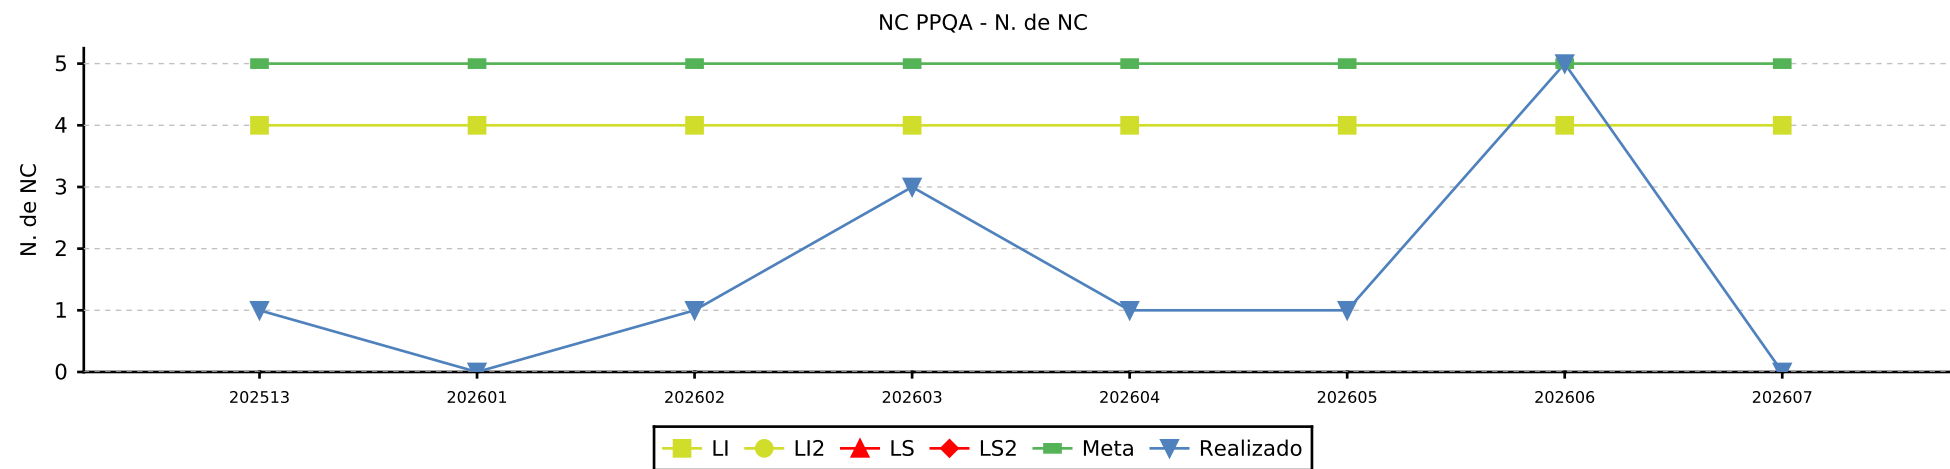


	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
Realizado	1	0	1	3	1	1	5	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

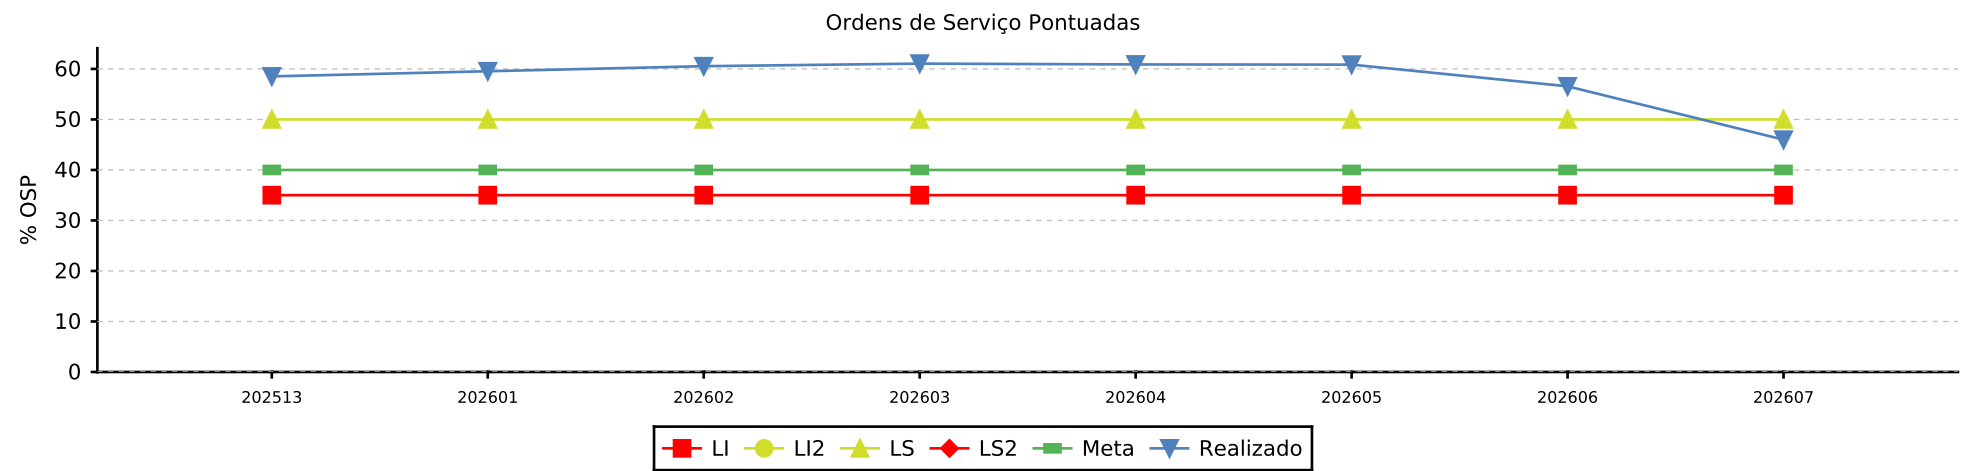

	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
Realizado	58.52	59.54	60.54	61.05	60.89	60.85	56.56	45.99
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

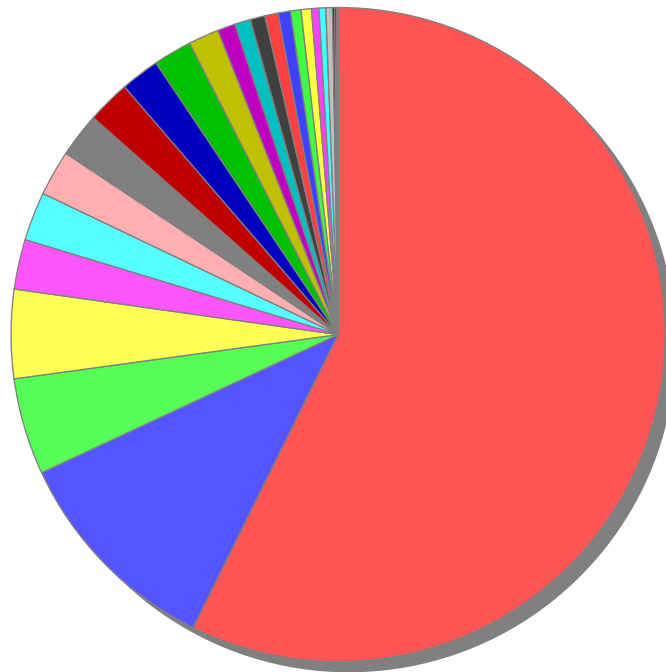

- Desenvolvimento [57.31%]
- Analise de Sistema [10.75%]
- Ausencia [4.78%]
- Daily Scrum [4.39%]
- Code Review [2.46%]
- Cafe [2.41%]
- Reuniao [2.25%]
- Sprint Planning 1 [2.19%]
- Atestado [2.14%]
- Retrospectiva [1.92%]
- Curso/Palestra [1.9%]
- Ginastica Laboral [1.51%]
- Outros [0.88%]
- Compilacao de sistemas [0.78%]
- Correção de Erros Interno [0.73%]
- Sprint Planning 2 [0.65%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.61%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.52%]
- Treinamento [0.51%]
- Preparando ambiente [0.36%]
- Clean Code [0.34%]
- Sizing [0.32%]
- Analise de O.S [0.11%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.09%]
- Atraso / Saida antecipada [0.04%]
- Planejamento de Projeto [0.04%]

% de Horas por Área do CMMI

