



INDICADORES DA SPRINT

	202608				202609			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	308h00m	308h00m	308h00m	264h00m	220h50m	220h00m	220h00m	264h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	308h24m	305h57m	302h43m	284h32m	228h44m	218h28m	221h26m	261h21m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	268h15m	267h25m	267h25m	229h40m	192h55m	192h05m	192h05m	227h55m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	233h39m	244h41m	226h24m	192h19m	157h54m	180h25m	179h06m	218h27m
05. Pontos planejados	83,0	86,0	76,5	82,0	76,5	87,0	69,5	81,0
06. Pontos entregues	77	82	72	60	52	60,5	59	74
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	63,00	62,50	38,50	36,00	34,00	55,50	44,00	51,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	14,00	19,50	33,50	24,00	18,00	5,00	15,00	22,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	14	13	11	10	6	12	12	8
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	9	20	13	9	4	5	12
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	0	0	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,310	0,322	0,287	0,358	0,397	0,453	0,362	0,356
16. Produtividade realizada	0,330	0,336	0,319	0,312	0,330	0,336	0,330	0,339
17. % Pontos NP / Pontos entregues	18,2	23,8	46,6	40	34,7	8,3	25,5	30,5

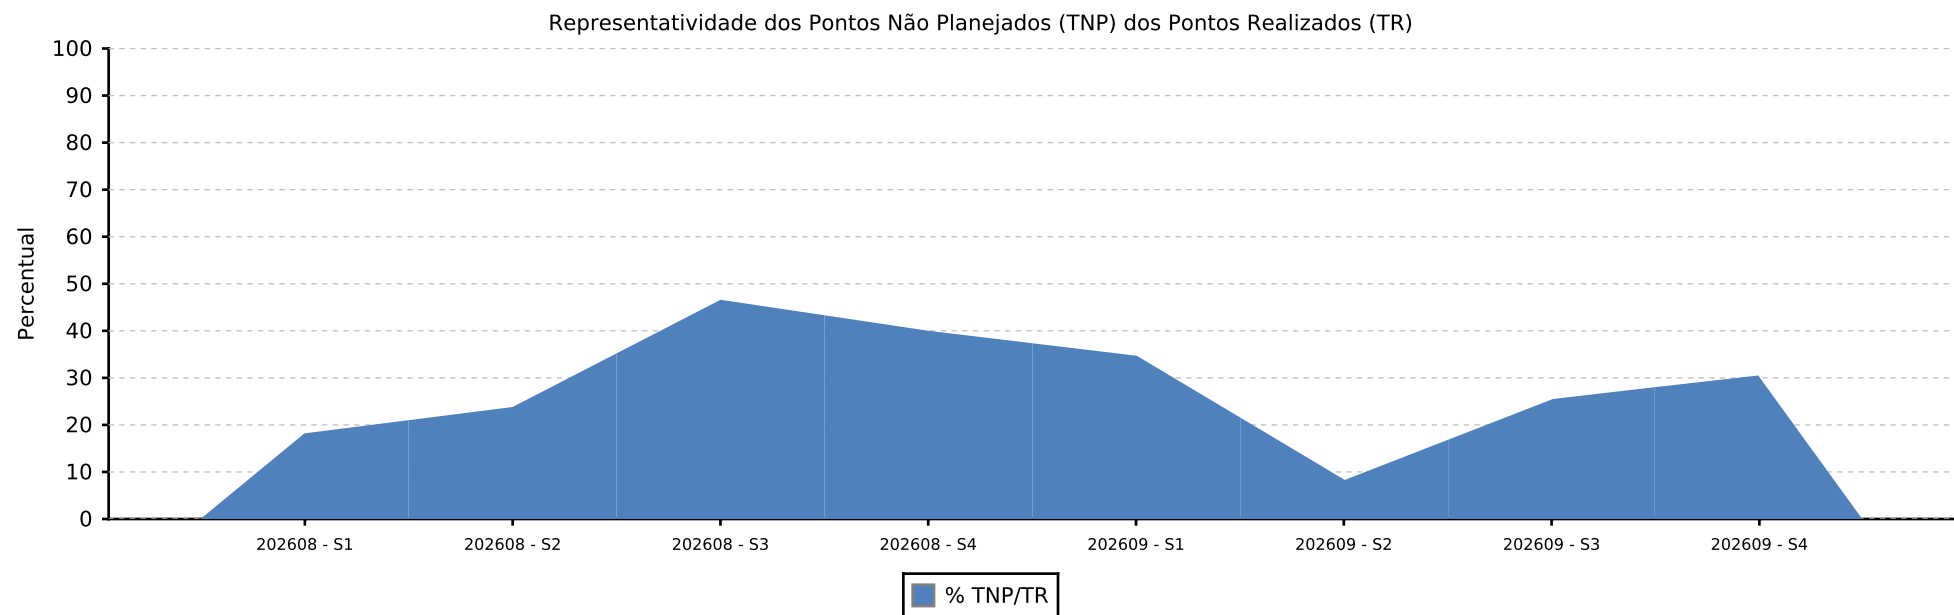

	202608				202609			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	77	82	72	60	52	60.5	59	74
TNP - Pontos Não Planejados	14	19.5	33.5	24	18	5	15	22.5
% TNP/TR	18,2	23,8	46,6	40,0	34,7	8,3	25,5	30,5

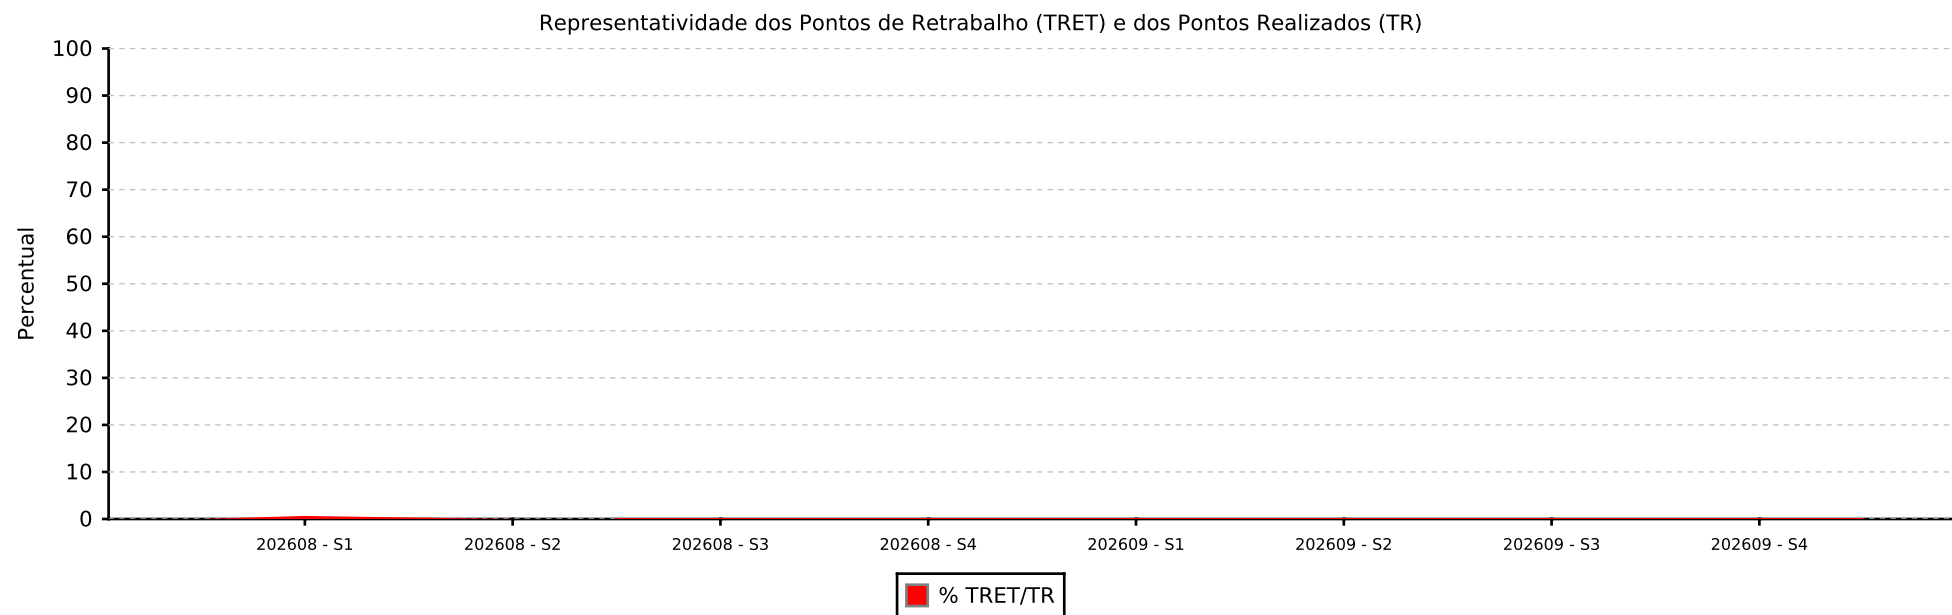


	202608				202609			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	77	82	72	60	52	60.5	59	74
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	0	0	0	0	0	0
% TRET/TR	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,58	0	1,33	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0,0 %
Correção de Erros Interno	1,5	0	1,5	0	1,5	0	2	0	6,5	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220,84	228,72	220,01	218,47	220,01	221,44	263,99	261,35	924,85	929,98	100,6 %


% de Horas por Atividade

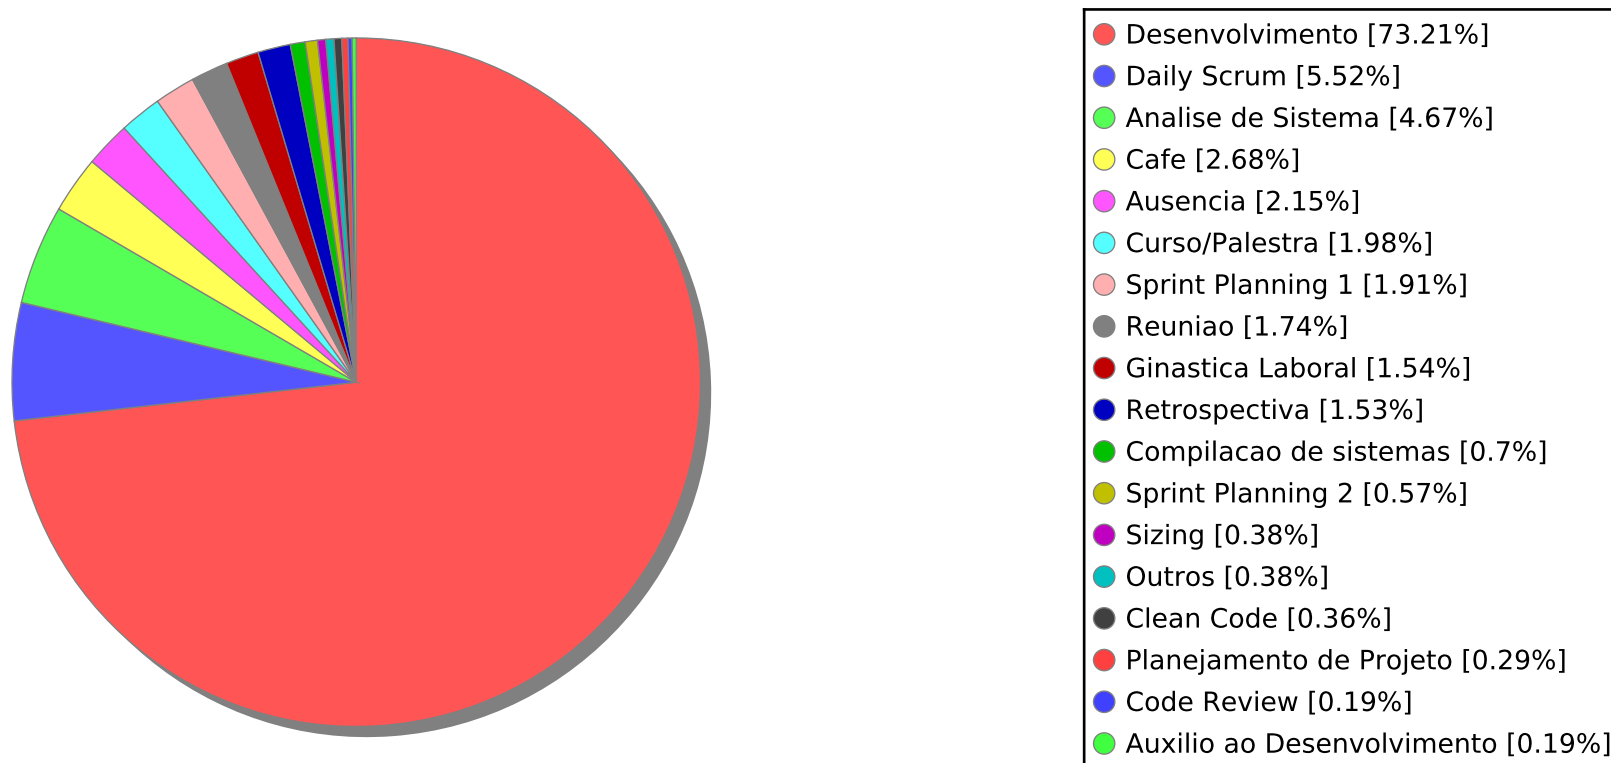

HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	162,5	136,92	161,67	165,75	161,67	157,93	190,08	192,78	675,92	653,38	96,7 %
DIV - Diversos*	11,5	17,13	11,5	11,37	11,5	22,07	13,58	22,2	48,08	72,77	151,4 %
REQM - Gestao de Requisitos	21	32,83	21	13,53	21	16,65	27,25	19,7	90,25	82,71	91,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	20,58	35,02	20,58	21,88	20,58	19,53	24,58	18,92	86,32	95,35	110,5 %
OT - Treinamento na Organizacao	4	4,08	4	4,07	4	4,67	5	5,17	17	17,99	105,8 %
CM - Gerencia de Configuracao	1	0	1	1,5	1	0,58	2,5	1,83	5,5	3,91	71,1 %
PP - Planejamento de Projeto	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	1	0,75	1,75	1	57,1 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220,83	226,23	220	218,1	220	221,43	263,99	261,35	924,82	927,11	100,2 %

% de Horas por Área do CMMI

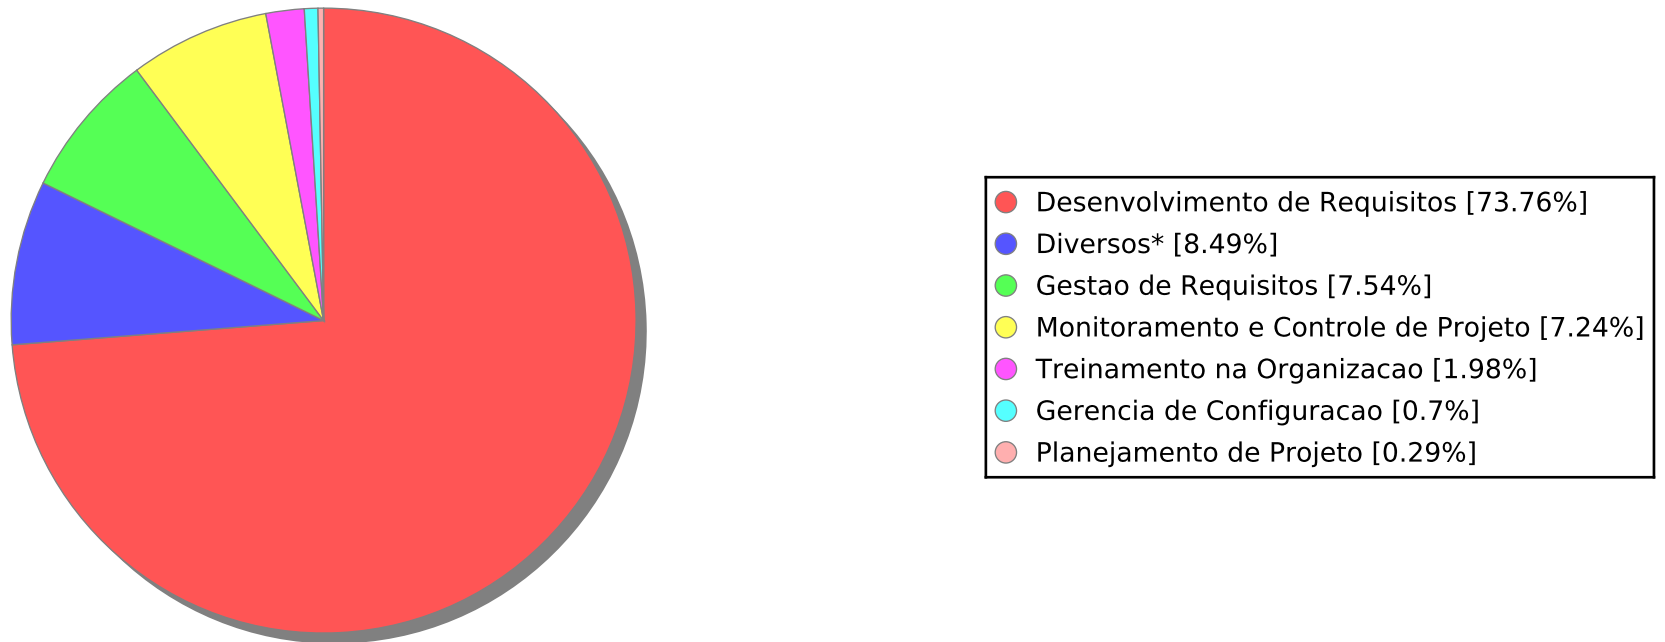


INDICADORES DO PROJETO


	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
01. Horas planejadas de todas atividades	914h24m	860h00m	840h00m	876h00m	840h00m	1224h00m	1188h00m	924h50m
02. Horas realizadas de todas atividades	1032h36m	1173h43m	940h40m	1025h23m	983h39m	1235h17m	1201h36m	929h59m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	788h39m	757h30m	738h08m	768h59m	712h20m	1053h45m	1032h45m	805h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	700h36m	721h53m	664h36m	688h21m	676h47m	842h16m	897h03m	735h52m
05. Pontos planejados para o projeto	253,0	242,0	237,0	246,0	227,0	331,0	325,0	293,0
06. Pontos planejados	188,5	222,0	192,0	287,0	274,0	292,5	327,5	314,0
07. Pontos entregues	229	242	215,5	225,5	230	282,5	291	245,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	158,50	176,00	131,00	146,00	142,50	200,50	200,00	185,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	70,50	66,00	84,50	79,50	87,50	82,00	91,00	60,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	2	3	2	0	2	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	55	48	36	47	50	59	48	38
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	44	45	53	53	48	59	54	30
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	1	1	1	0	1	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	5,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0
16. Produtividade planejada	0,240	0,294	0,261	0,374	0,385	0,278	0,318	0,391
17. Produtividade realizada	0,327	0,336	0,325	0,328	0,340	0,336	0,325	0,334
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	90,6	100	91	91,7	101,4	85,4	89,6	83,8
19. % Pontos NP / Pontos entregues	30,8	27,3	39,3	35,3	38,1	29,1	31,3	24,7

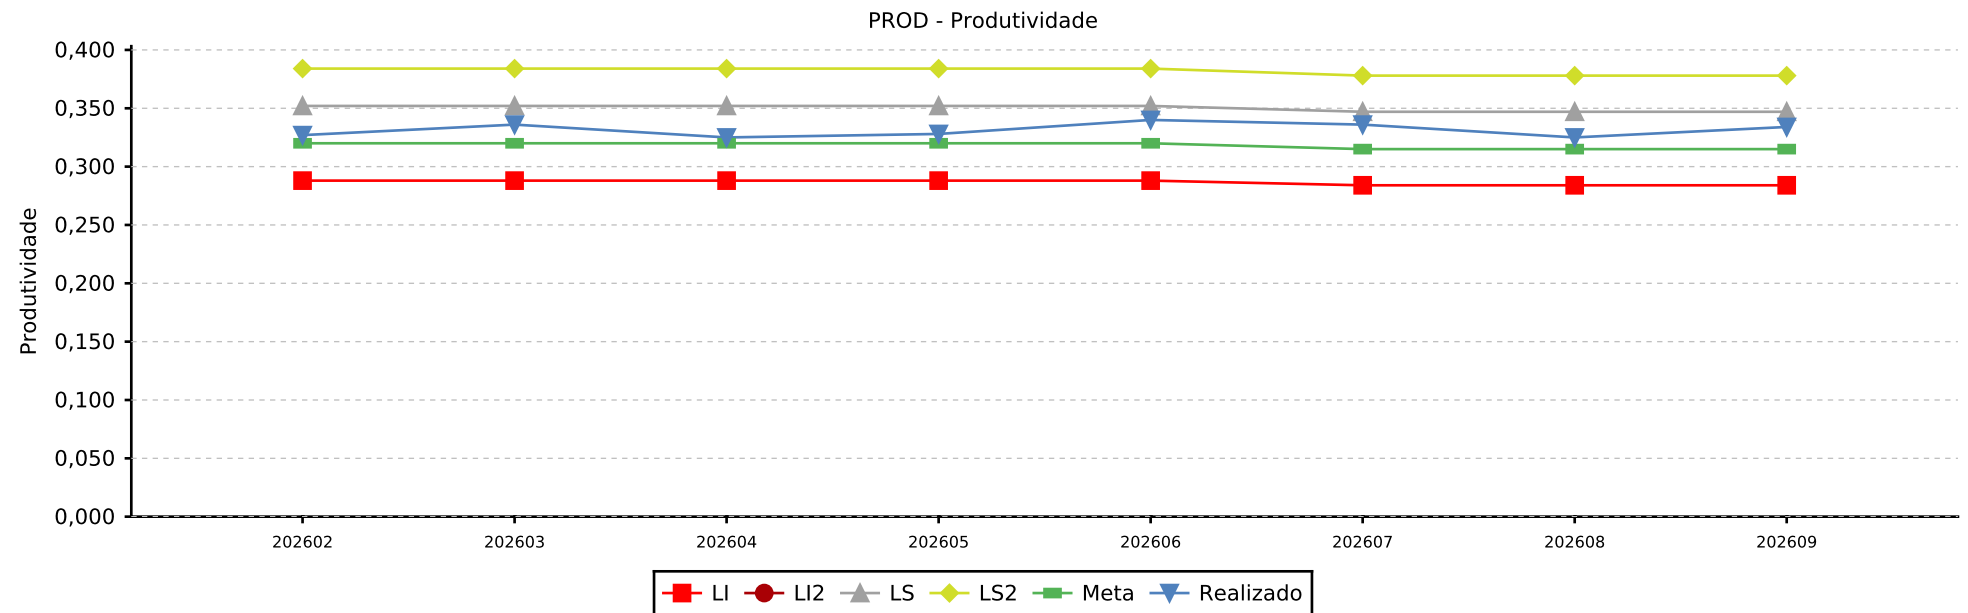


	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
Realizado	0,327	0,336	0,325	0,328	0,340	0,336	0,325	0,334
Meta	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,315	0,315	0,315
LS2	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,378	0,378	0,378
LS	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,347	0,347	0,347
LI2								
LI	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,284	0,284	0,284

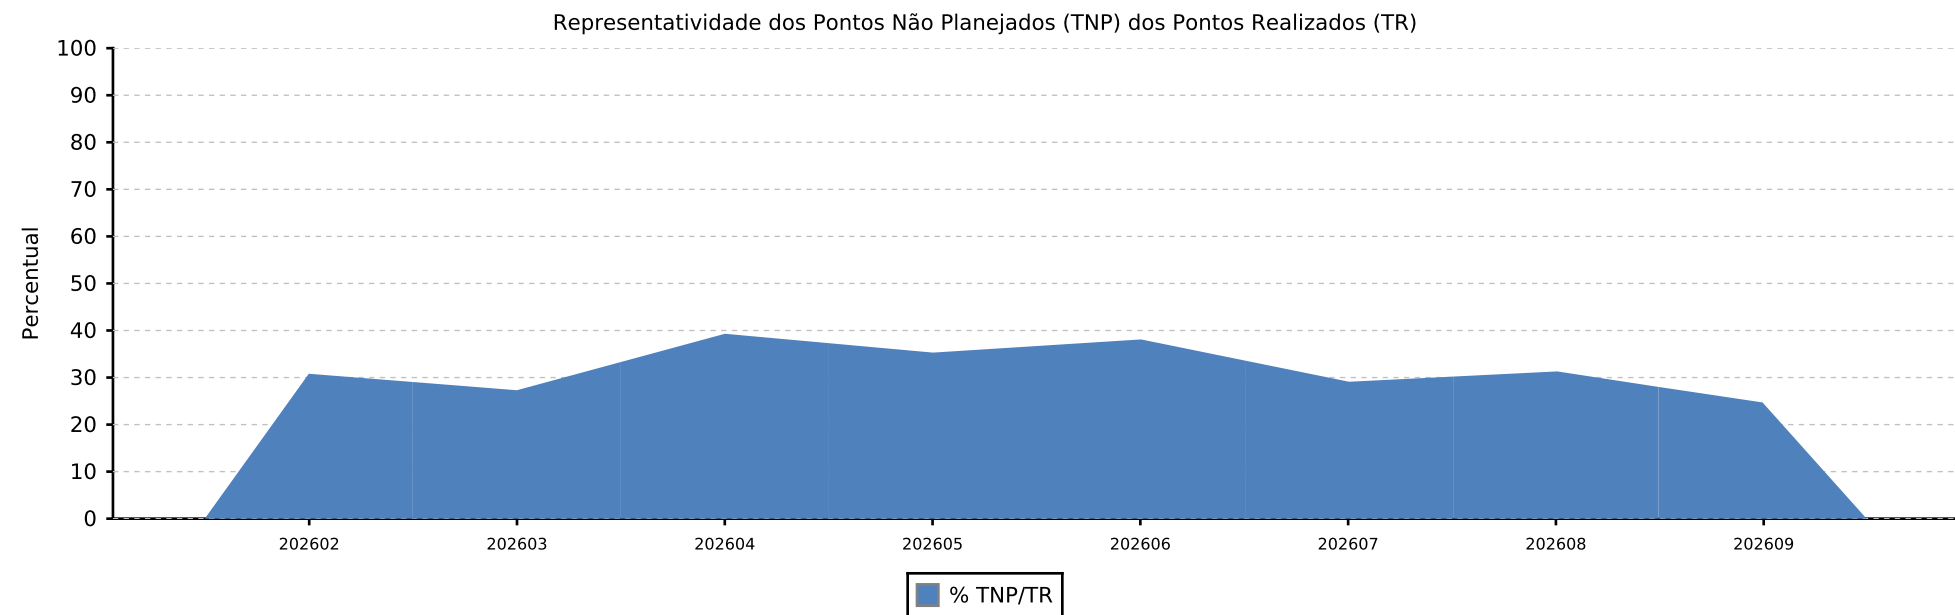


	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
TR - Pontos Realizados	229	242	215.5	225.5	230	282.5	291	245.5
TNP - Pontos Não Planejados	70.5	66	84.5	79.5	87.5	82	91	60.5
% TNP/TR	30,8	27,3	39,3	35,3	38,1	29,1	31,3	24,7

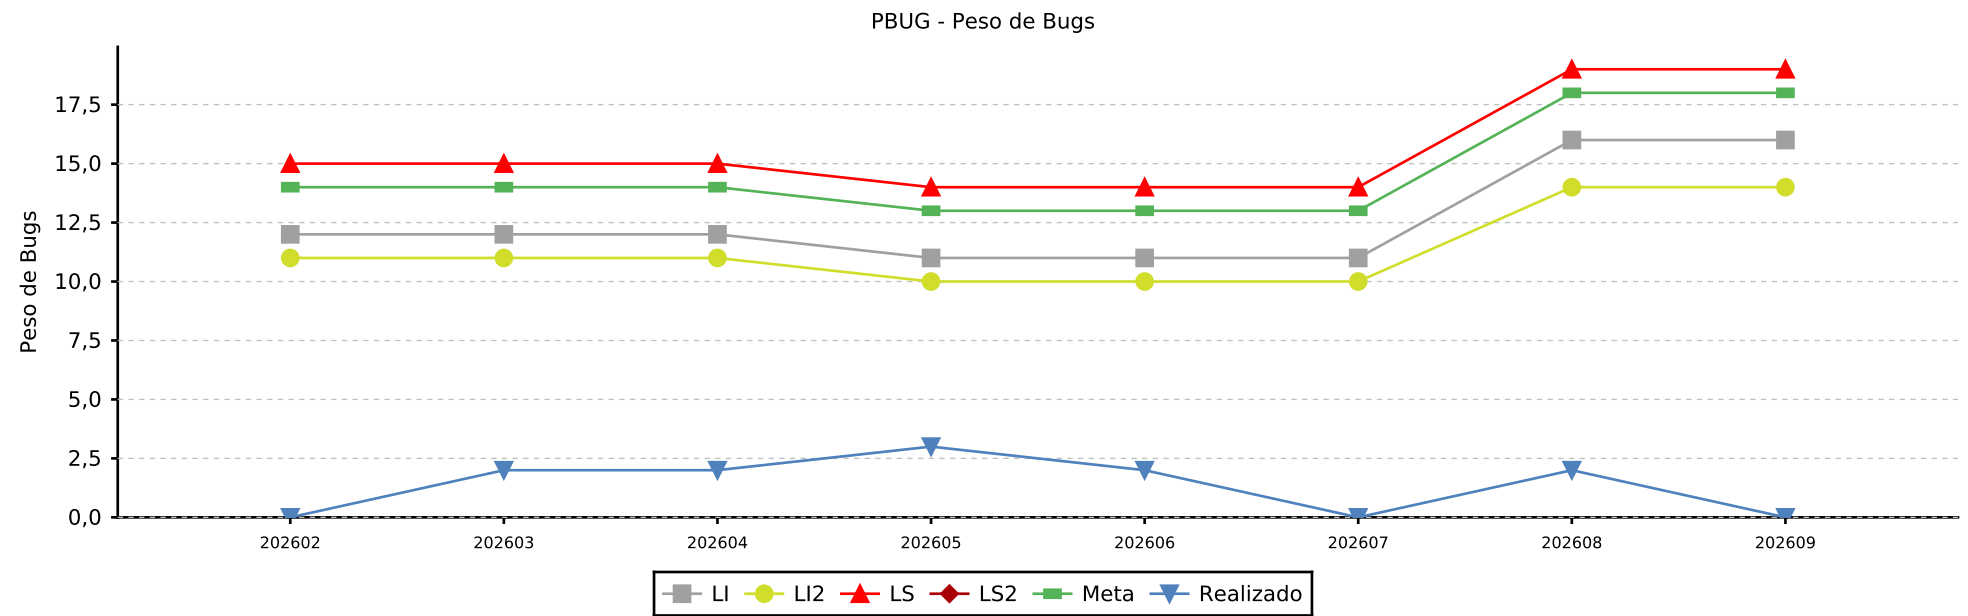


	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
Realizado	0	2	2	3	2	0	2	0
Meta	14	14	14	13	13	13	18	18
LS2								
LS	15	15	15	14	14	14	19	19
LI2	11	11	11	10	10	10	14	14
LI	12	12	12	11	11	11	16	16
Pontos Entregues	229	242	215.5	225.5	230	282.5	291	245.5
% PBUG / TR	0,00	0,83	0,93	1,34	0,87	0,00	0,69	0,00

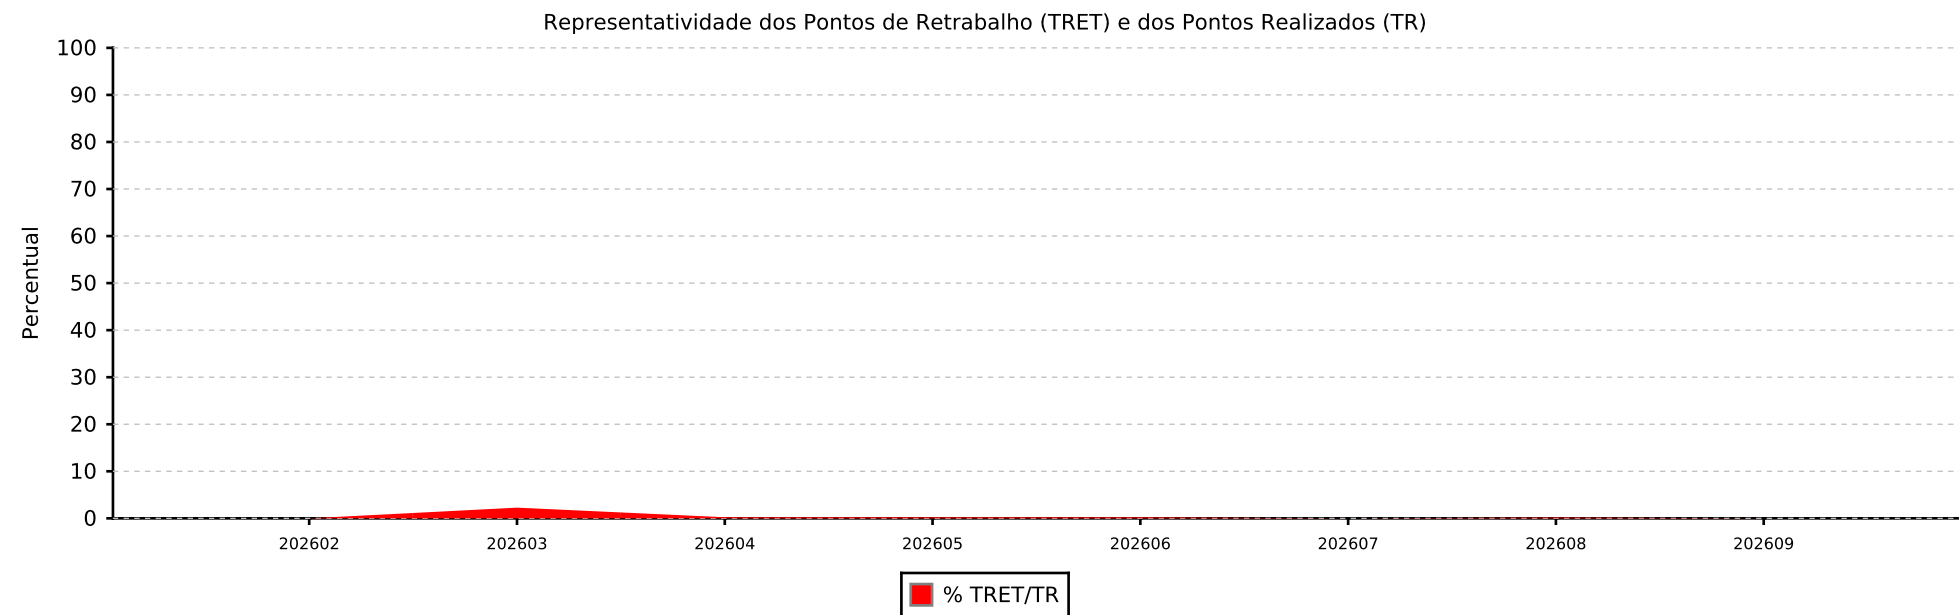

	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
TR - Pontos Realizados	229	242	215.5	225.5	230	282.5	291	245.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	5.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0
% TRET/TR	0,0	2,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0


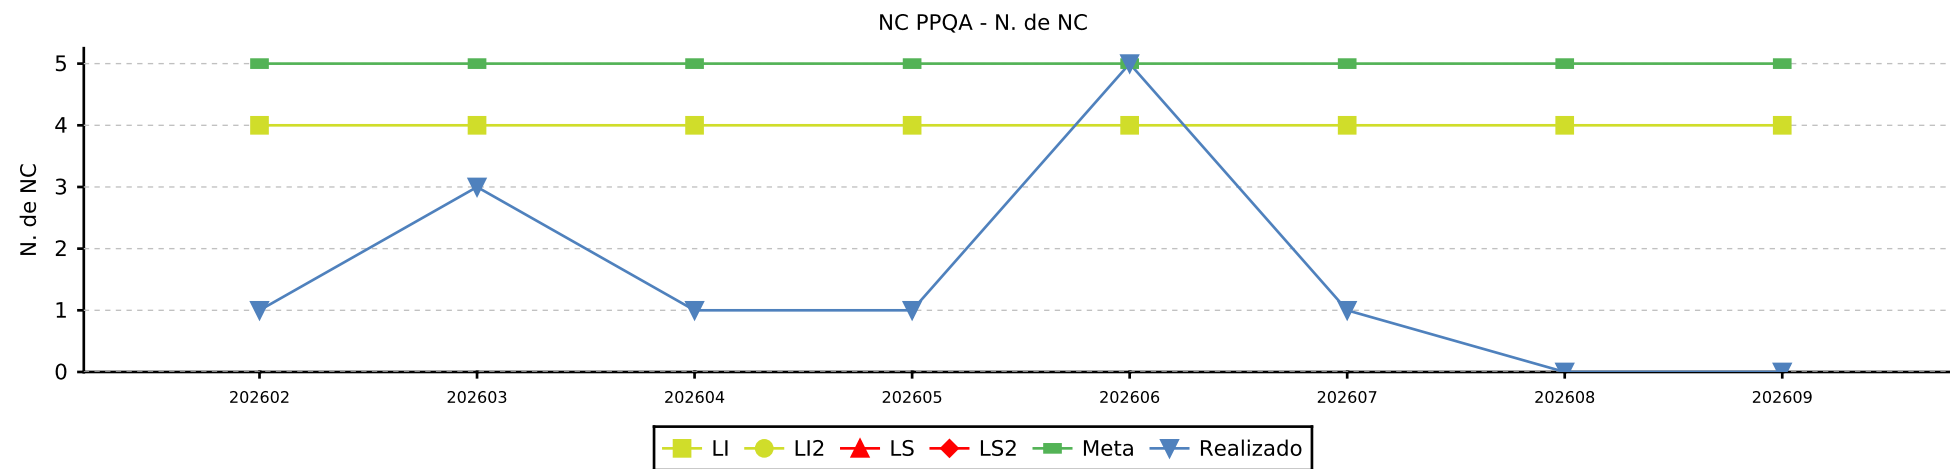


	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
Realizado	1	3	1	1	5	1	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

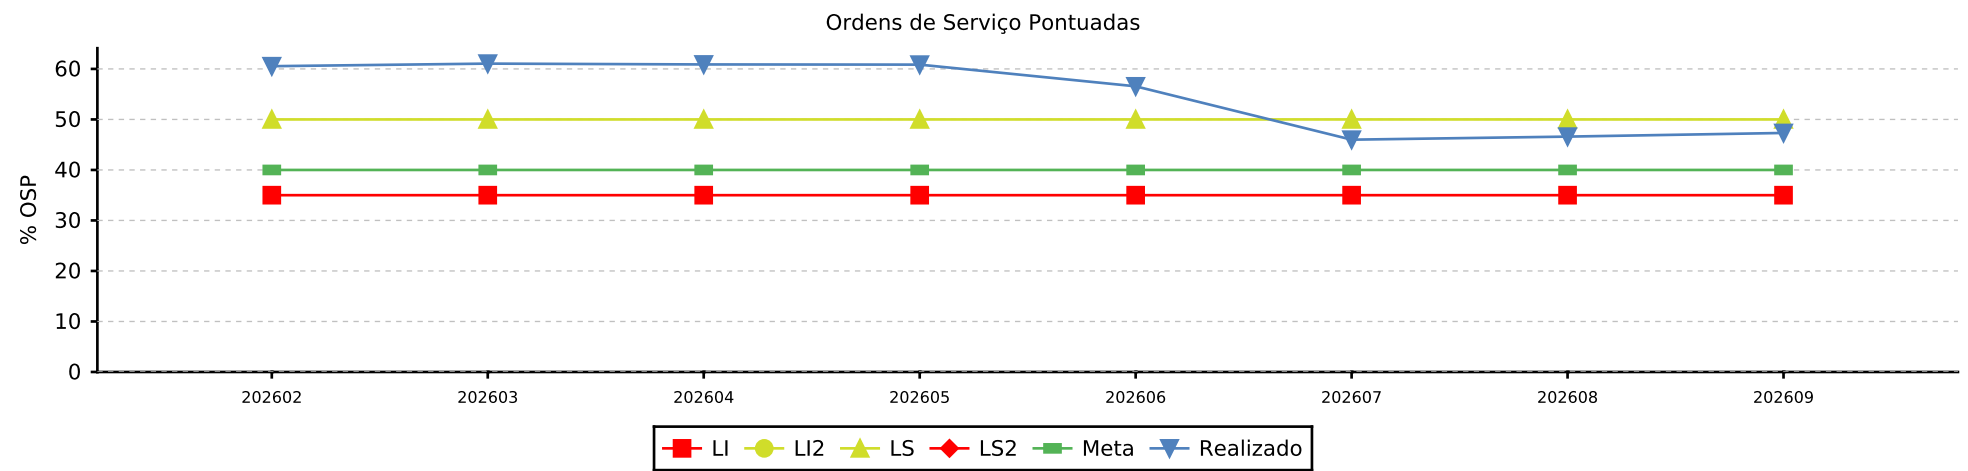

	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
Realizado	60.54	61.05	60.89	60.85	56.56	45.99	46.6	47.32
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

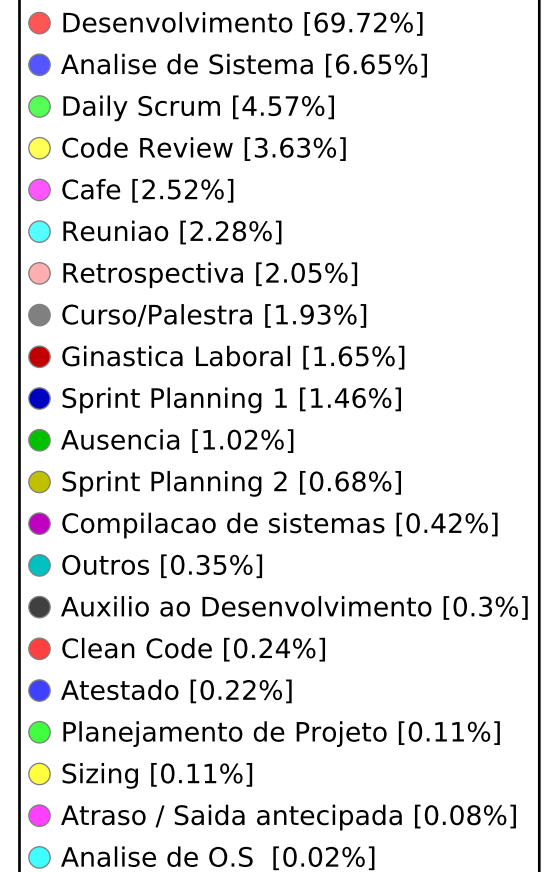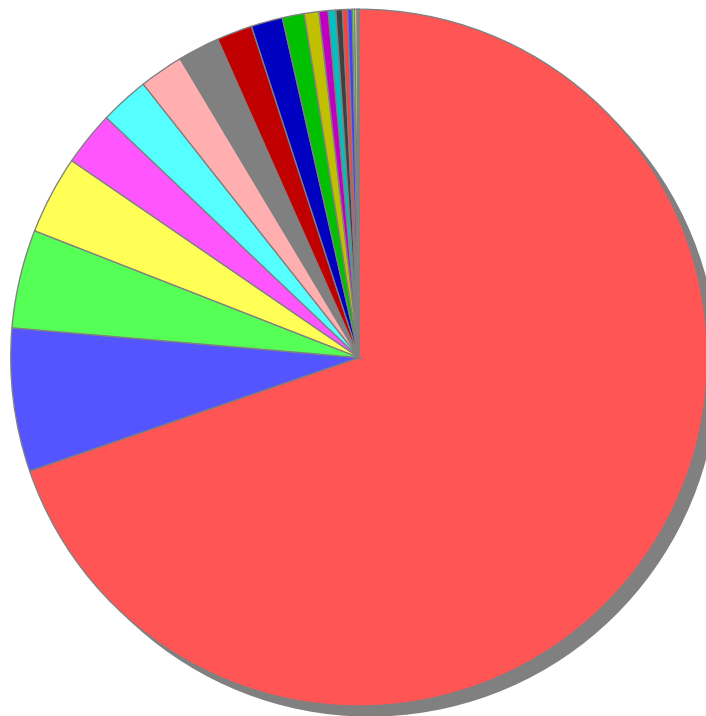

% de Horas por Área do CMMI

