Filtros do Relatório: Equipe: 16 | Projeto: 887 | Sprint: 4

INDICADORES DA SPRINT

	202602				202603			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	264h00m	264h00m	166h24m	220h00m	220h00m	220h00m	200h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	231h57m	268h52m	262h11m	269h36m	258h55m	312h37m	309h46m	314h00m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	190h25m	227h50m	227h50m	142h34m	194h10m	194h10m	194h10m	175h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	168h49m	206h17m	201h24m	124h06m	153h21m	149h21m	200h27m	218h44m
05. Pontos planejados	44,5	53,5	48,5	42,0	49,0	53,0	60,0	60,0
06. Pontos entregues	51	68	70	40	49,5	49,5	69	74
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	42,00	51,00	38,00	27,50	32,50	41,00	49,50	53,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	9,00	17,00	32,00	12,50	17,00	8,50	19,50	21,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	2	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	9	20	15	11	13	16	11	8
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	7	14	15	8	7	9	15	14
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	1	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	5	0	0,5	0
15. Produtividade planejada	0,234	0,235	0,213	0,295	0,253	0,273	0,310	0,343
16. Produtividade realizada	0,303	0,330	0,348	0,323	0,323	0,332	0,345	0,339
17. % Pontos NP / Pontos entregues	17,7	25	45,8	31,3	34,4	17,2	28,3	28,4

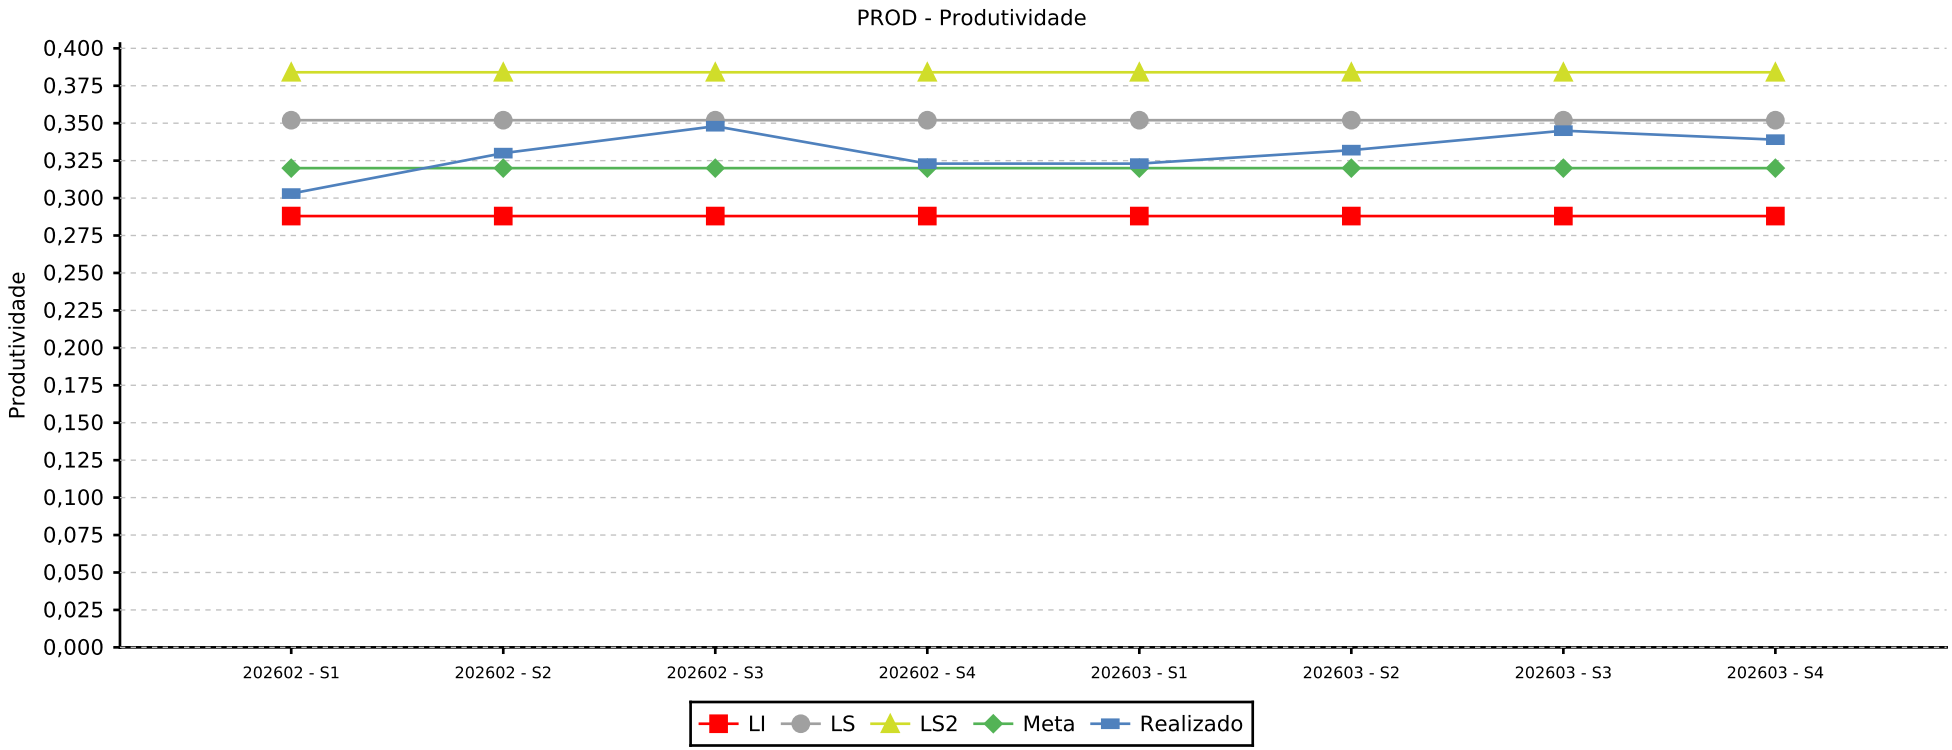

	202602				202603			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,303	0,330	0,348	0,323	0,323	0,332	0,345	0,339
Meta	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
LS2	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384
LS	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352
LI	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288

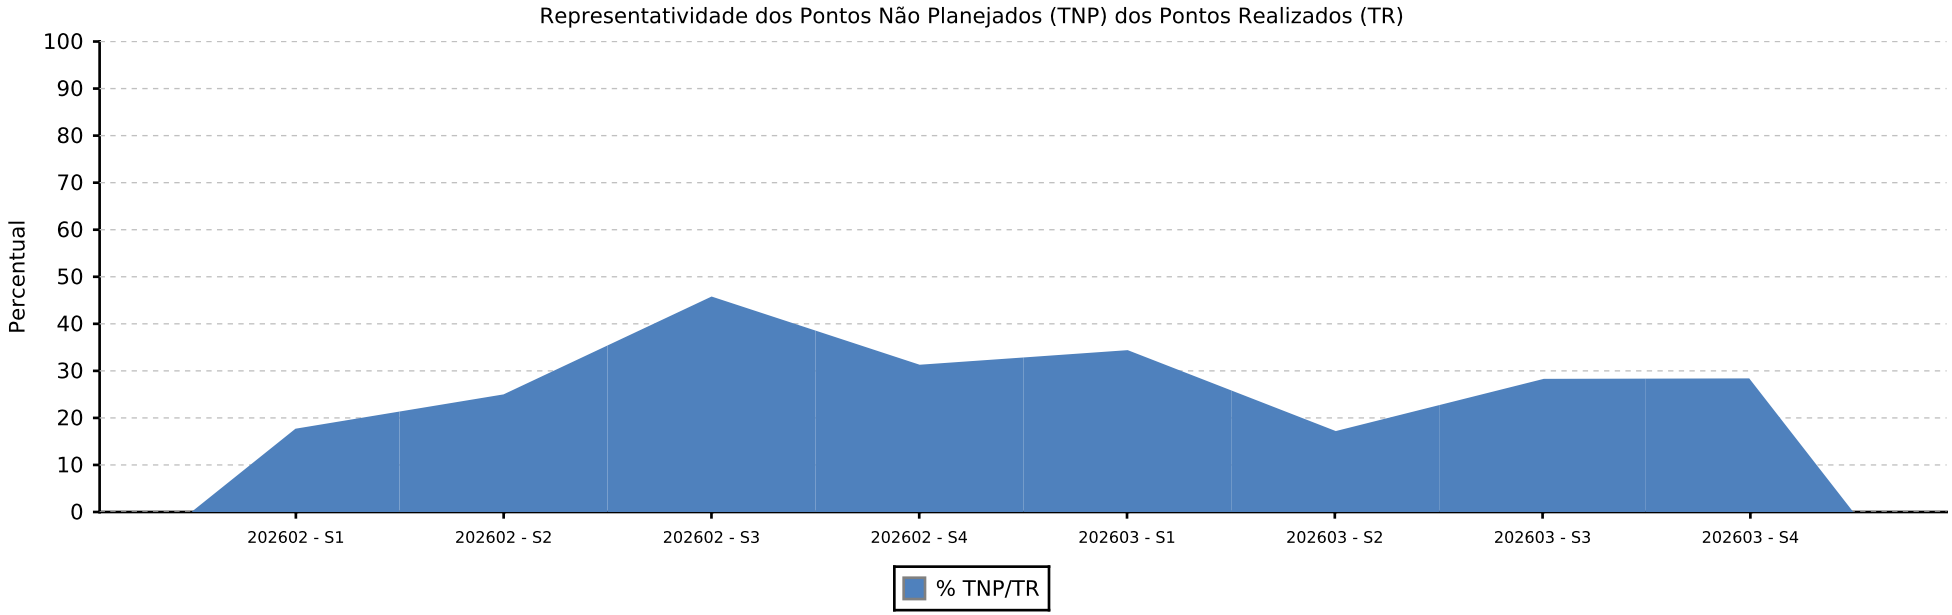

	202602				202603			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	51	68	70	40	49.5	49.5	69	74
TNP - Pontos Não Planejados	9	17	32	12.5	17	8.5	19.5	21
% TNP/TR	17,7	25,0	45,8	31,3	34,4	17,2	28,3	28,4

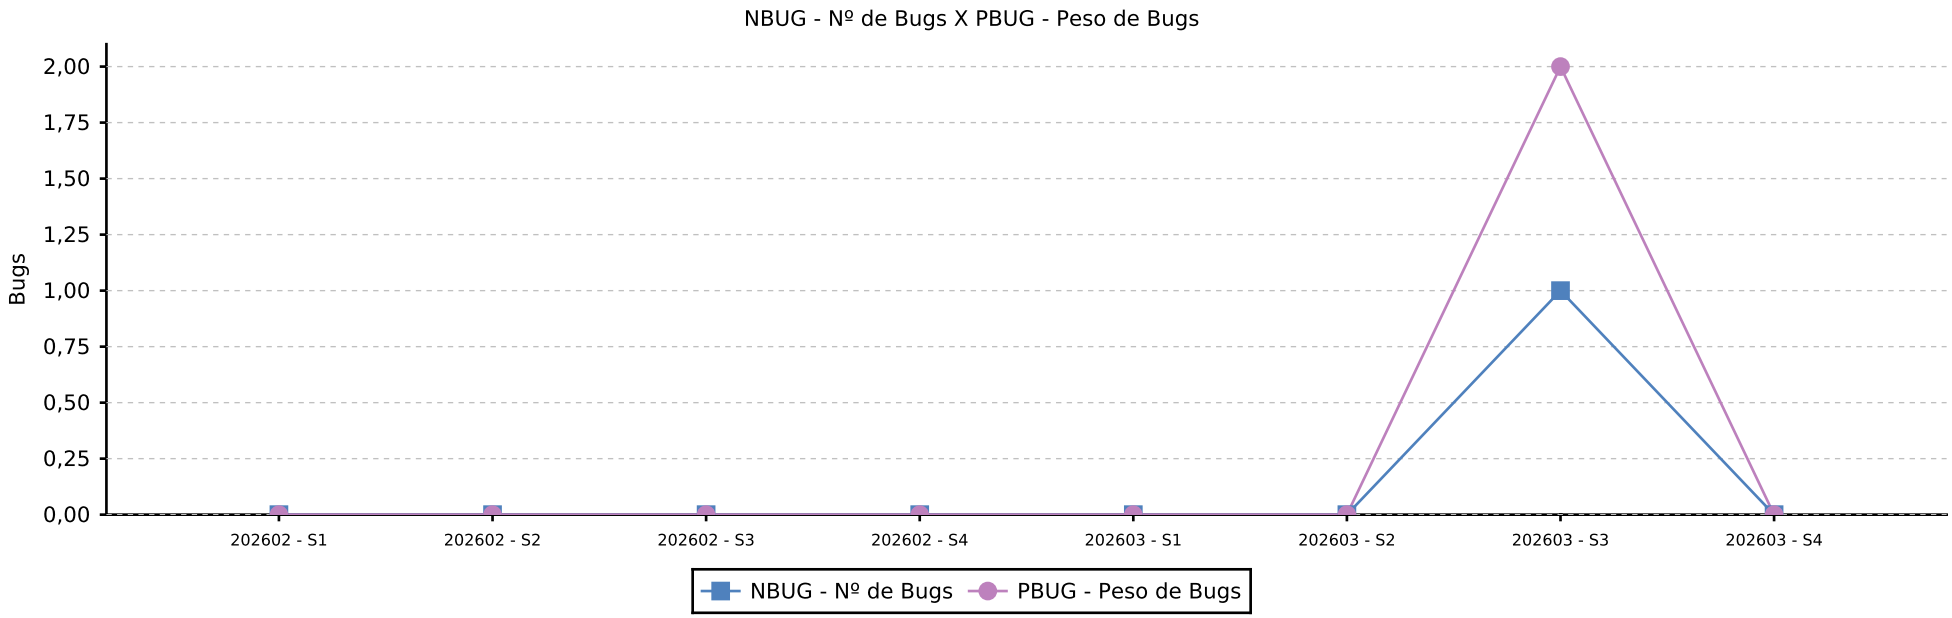

	202602				202603			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	0	1	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	2	0
Pontos Entregues	51	68	70	40	49.5	49.5	69	74
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00

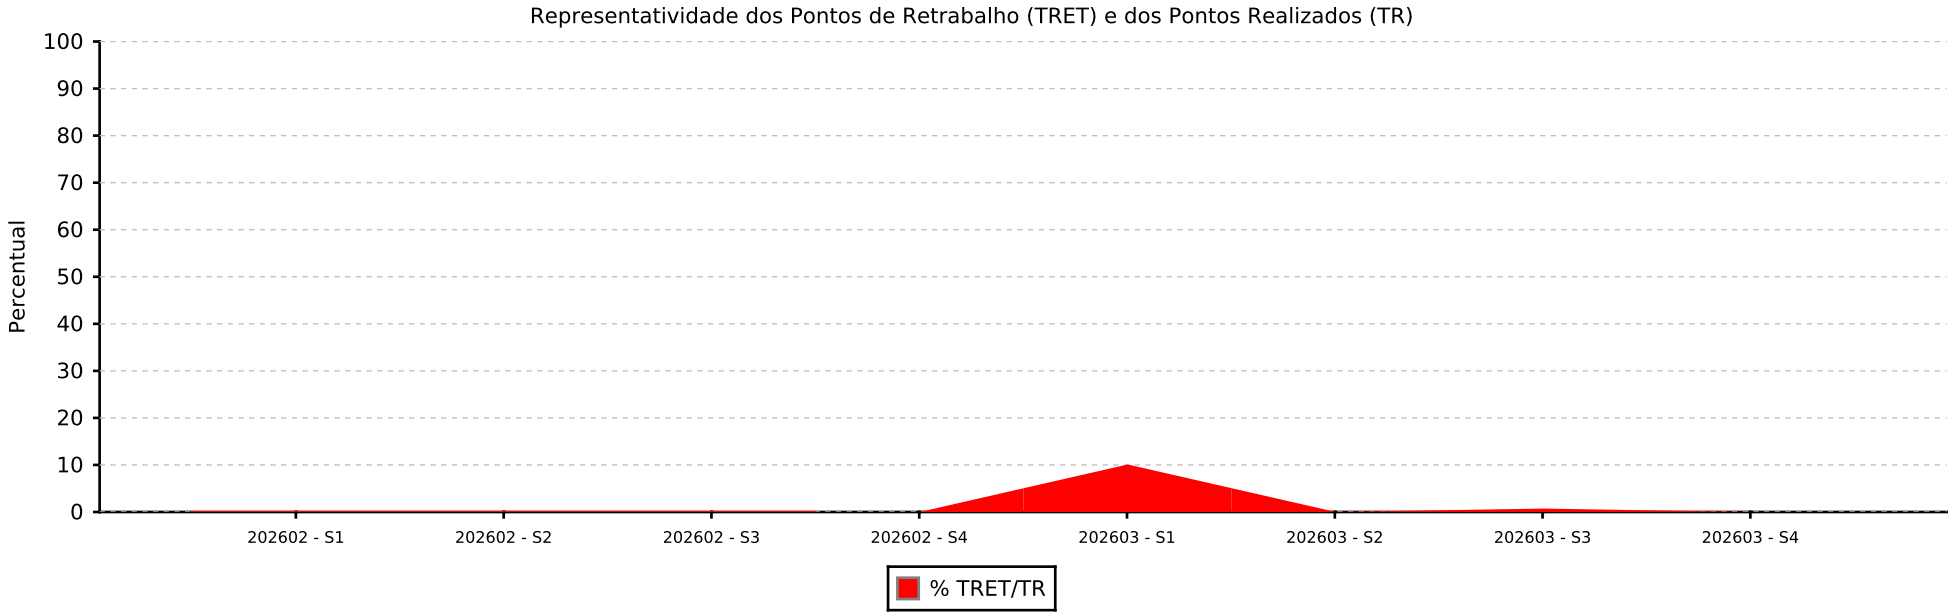

	202602				202603			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	51	68	70	40	49.5	49.5	69	74
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	5	0	0.5	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,7	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
Desenvolvimento	162,08	135,35	162,08	131,43	162,08	181,57	143,67	188,07	629,91	636,42	101,0 %
Instrutor Treinamento	0	45	0	43,17	0	38,08	0	45	0	171,25	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0,0 %
Daily Scrum	10,5	5,67	10,5	7,42	10,5	9,8	8,5	10,75	40	33,64	84,1 %
Analise de Sistema	11	6,58	11	38,93	11	19,92	11	8,17	44	73,6	167,3 %
Code Review	1,75	3,9	1,75	2,07	1,75	2,25	1,75	7,05	7	15,27	218,1 %
Retrospectiva	5	3,08	5	4,17	5	4,58	5	7	20	18,83	94,1 %
Cafe	6,25	5	6,25	5	6,25	6,75	5,75	6,5	24,5	23,25	94,9 %
Sprint Planning 1	7	6	7	4	7	2,92	7	6	28	18,92	67,6 %
Ginastica Laboral	3,67	2,75	3,67	3,17	3,67	3,83	3,33	4	14,34	13,75	95,9 %
Compilacao de sistemas	2	1	2	4,83	2	4,05	2	2,2	8	12,08	151,0 %
Clean Code	1,25	0,58	1,25	1	1,25	0,75	1,25	2,08	5	4,41	88,2 %
Sprint Planning 2	5	1	5	1,33	5	0,83	5	2	20	5,16	25,8 %
Correção de Erros Interno	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	1,67	6	1,67	27,8 %
Planejamento de Projeto	0,25	1,67	0,25	0	0,25	0	1	1,17	1,75	2,84	162,3 %
Ausencia	0	0	0	3,83	0	10,68	0	1,13	0	15,64	0,0 %
Outros	0	0,67	0	6,85	0	7,5	0	0,83	0	15,85	0,0 %
Verificando apontamento	0	0,17	0	0	0	0	0	0,38	0	0,55	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	40	0	50	0	10	0	0	0	100	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,17	0	0,17	0,5	0,17	1,25	0,17	0	0,68	1,75	257,4 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,5	0	1,25	0	0	0	0	0	1,75	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %

Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Reuniao	1	0	1	3,67	1	0	1	0	4	3,67	91,8 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,58	0	0,58	0	0,58	0	0,58	0	2,32	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220	258,92	220	312,62	220	309,76	200	314	860	1.195,3	139,0 %

% de Horas por Atividade

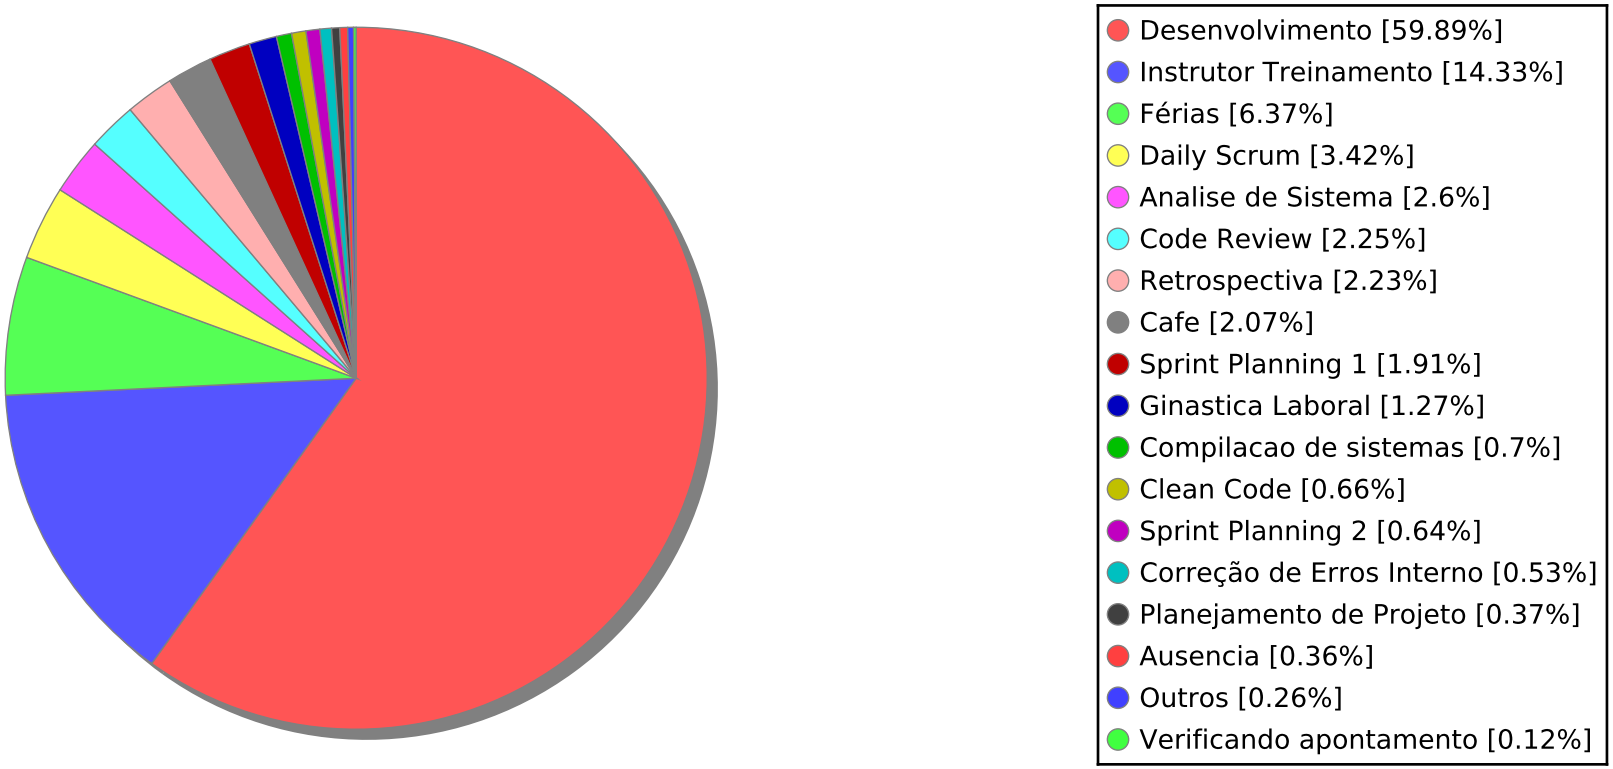

HORAS POR ÁREA DO CMMI

	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos	166,42	135,93	166,42	132,43	166,42	182,32	148	191,82	647,26	642,5	99,3 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	17,25	12,65	17,25	13,65	17,25	16,63	15,25	24,8	67	67,73	101,1 %
REQM - Gestao de Requisitos	23	13,58	23	44,27	23	23,67	23	16,17	92	97,69	106,2 %
DIV - Diversos*	11,08	8,42	11,08	23,02	11,08	30,02	10,25	12,47	43,49	73,93	170,0 %
CM - Gerencia de Configuracao	2	1	2	4,83	2	4,05	2,5	2,2	8,5	12,08	142,1 %
PP - Planejamento de Projeto	0,25	1,67	0,25	0	0,25	0	1	1,17	1,75	2,84	162,3 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220	173,25	220	218,2	220	256,69	200	248,63	860	896,77	104,3 %

% de Horas por Área do CMMI

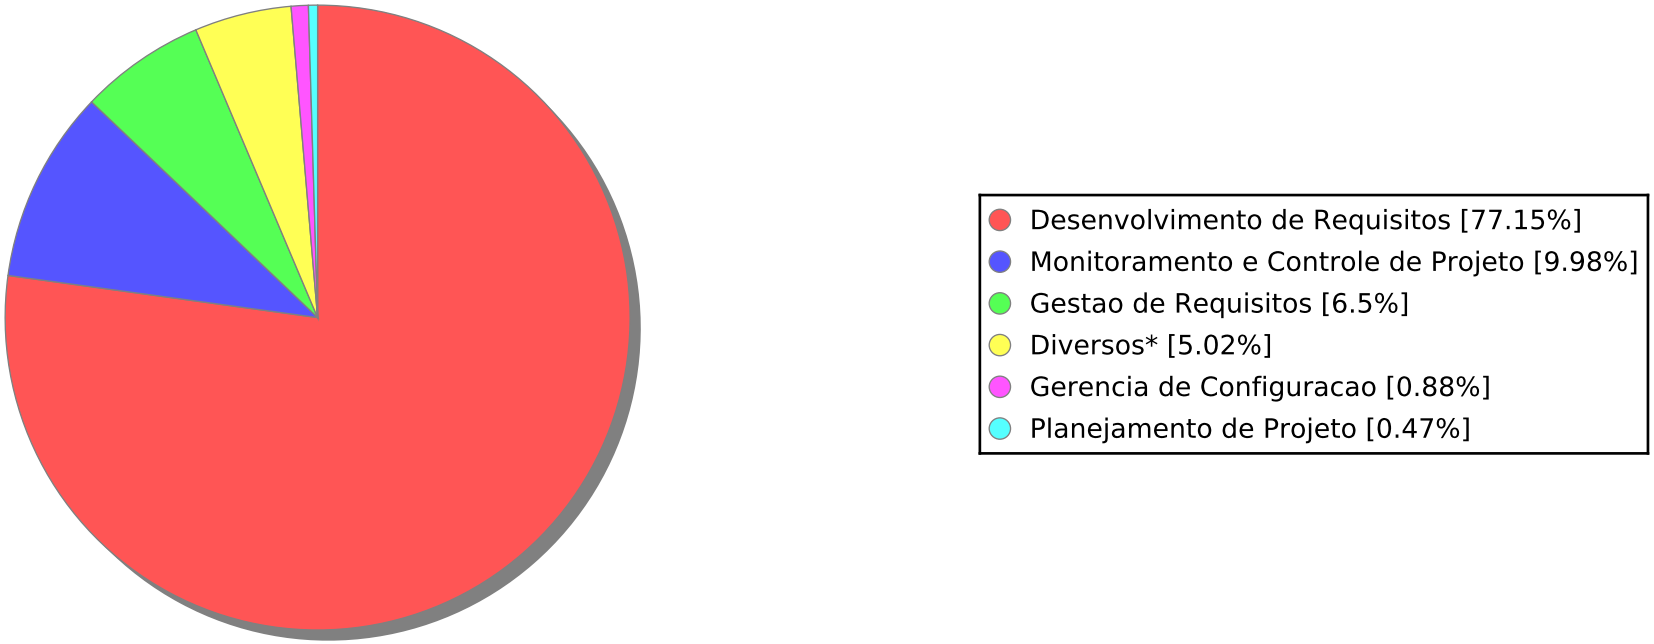

INDICADORES DO PROJETO

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
01. Horas planejadas de todas atividades	1008h04m	896h00m	880h00m	760h00m	816h00m	923h12m	914h24m	860h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1031h42m	1019h12m	929h52m	755h22m	853h34m	1005h01m	1032h36m	1195h18m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	834h25m	764h55m	750h20m	636h10m	686h10m	790h07m	788h39m	757h30m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	859h55m	760h44m	742h31m	549h56m	621h12m	741h36m	700h36m	721h53m
05. Pontos planejados para o projeto	0,0	240,0	240,0	204,0	220,0	253,0	253,0	242,0
06. Pontos planejados	286,0	244,0	199,5	251,5	214,0	224,5	188,5	222,0
07. Pontos entregues	283	257	256	185	204,5	245	229	242
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	244,00	205,00	209,00	140,00	159,00	202,50	158,50	176,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	39,00	52,00	47,00	45,00	45,50	42,50	70,50	66,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	2	0	0	2	0	0	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	48	45	55	34	54	58	55	48
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	34	33	36	22	37	30	44	45
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	1	0	0	1	0	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1,5	0,5	0	3	2,5	1	0	5,5
16. Produtividade planejada	0,343	0,319	0,266	0,396	0,312	0,285	0,240	0,294
17. Produtividade realizada	0,330	0,338	0,345	0,337	0,330	0,331	0,327	0,336
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	0	107,1	106,7	90,7	93	96,9	90,6	100
19. % Pontos NP / Pontos entregues	13,8	20,3	18,4	24,4	22,3	17,4	30,8	27,3

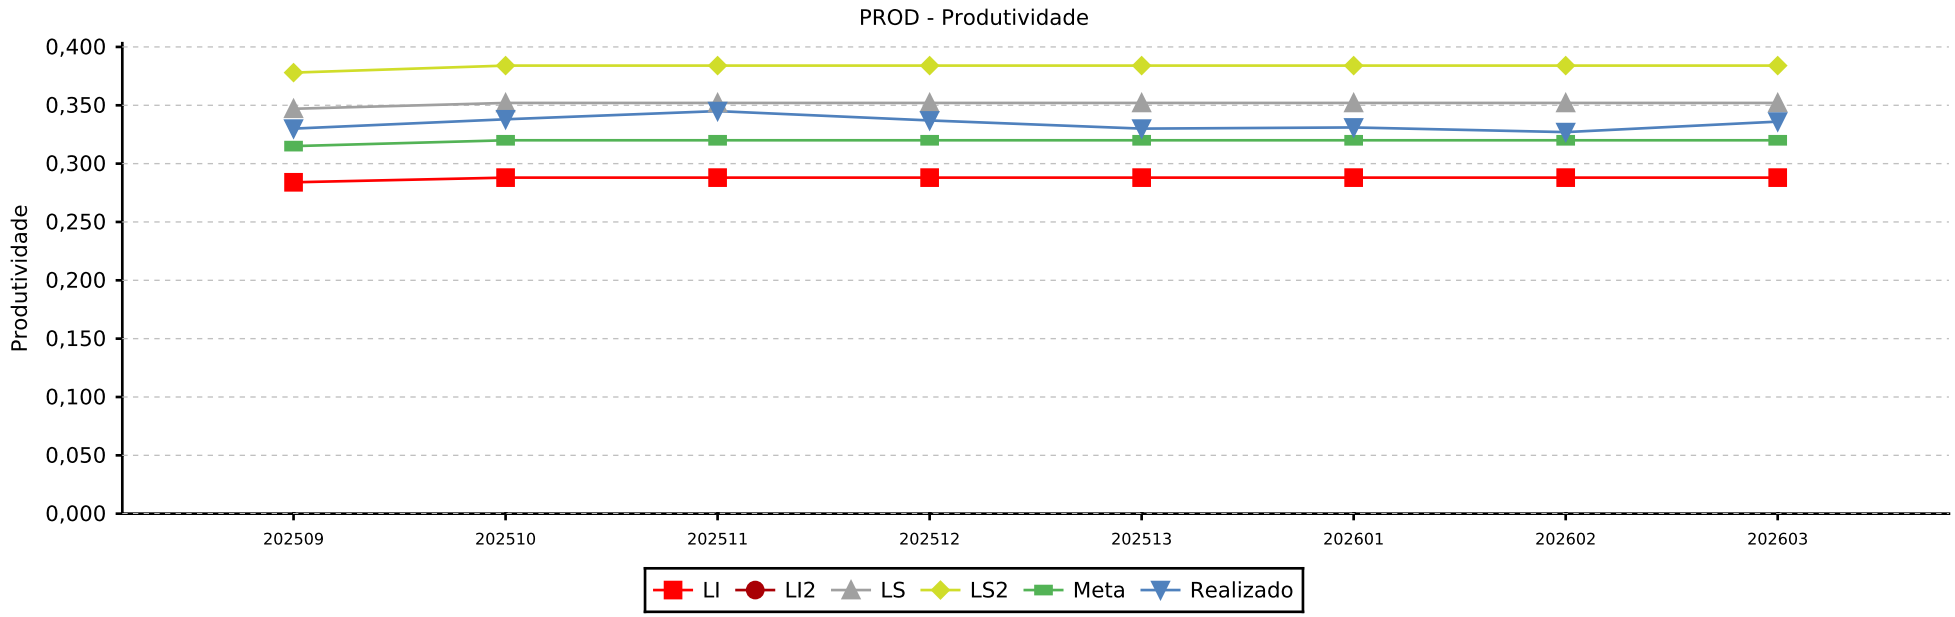

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
Realizado	0,330	0,338	0,345	0,337	0,330	0,331	0,327	0,336
Meta	0,315	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
LS2	0,378	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384
LS	0,347	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352
LI2								
LI	0,284	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288

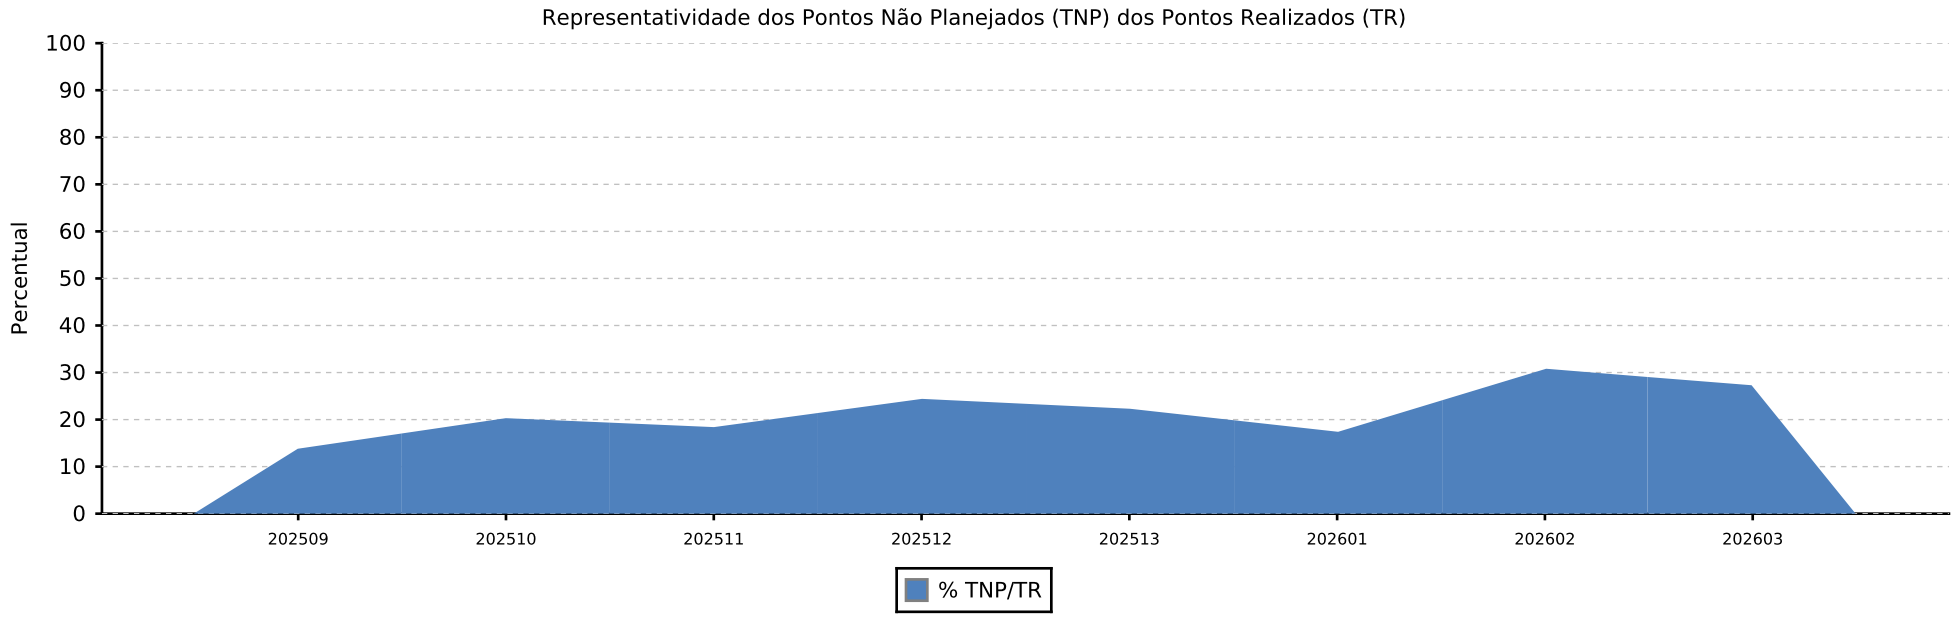

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
TR - Pontos Realizados	283	257	256	185	204.5	245	229	242
TNP - Pontos Não Planejados	39	52	47	45	45.5	42.5	70.5	66
% TNP/TR	13,8	20,3	18,4	24,4	22,3	17,4	30,8	27,3

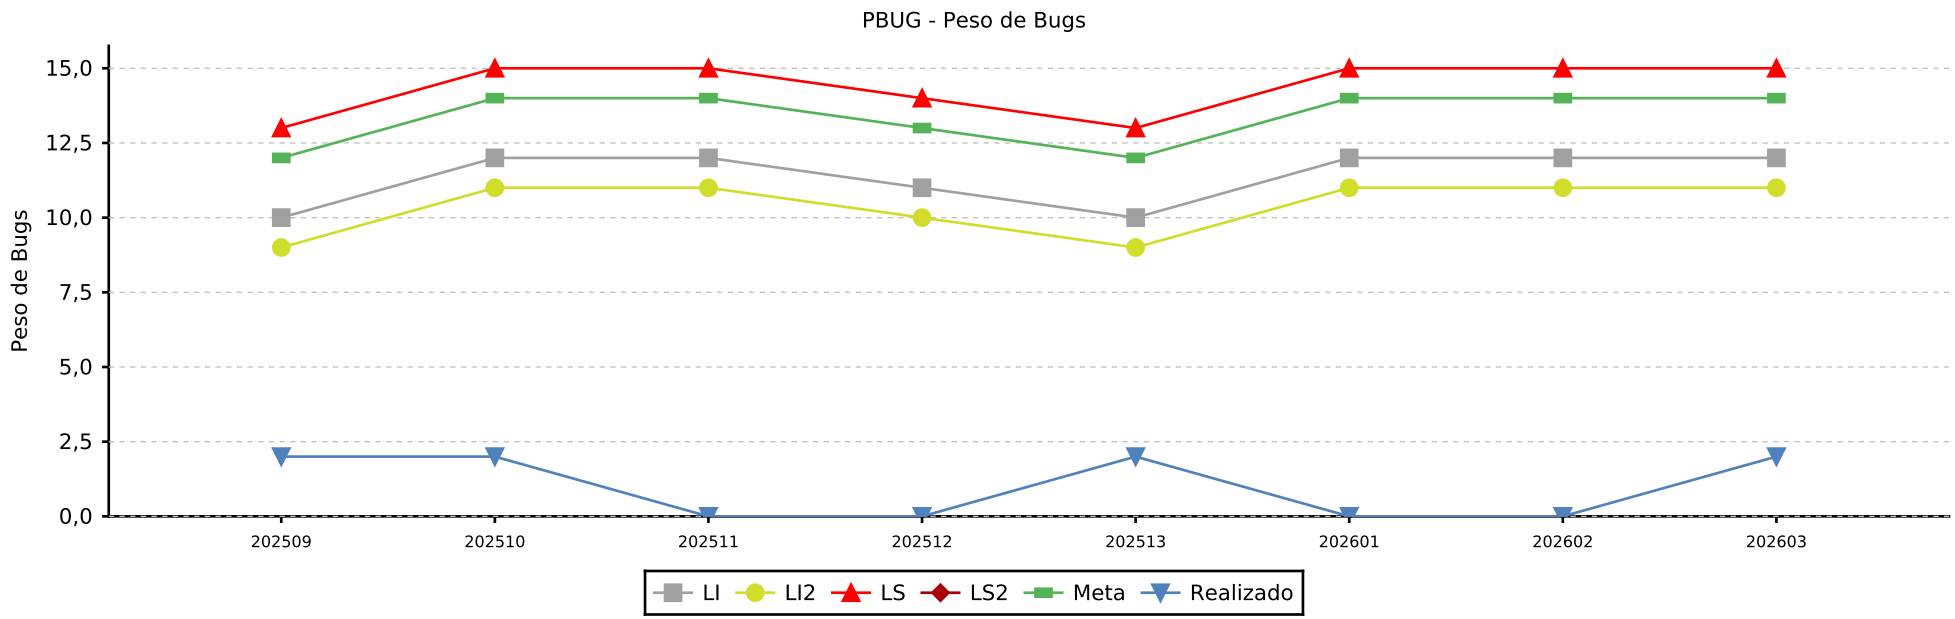

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
Realizado	2	2	0	0	2	0	0	2
Meta	12	14	14	13	12	14	14	14
LS2								
LS	13	15	15	14	13	15	15	15
LI2	9	11	11	10	9	11	11	11
LI	10	12	12	11	10	12	12	12
Pontos Entregues	283	257	256	185	204.5	245	229	242
% PBUG / TR	0,71	0,78	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,83

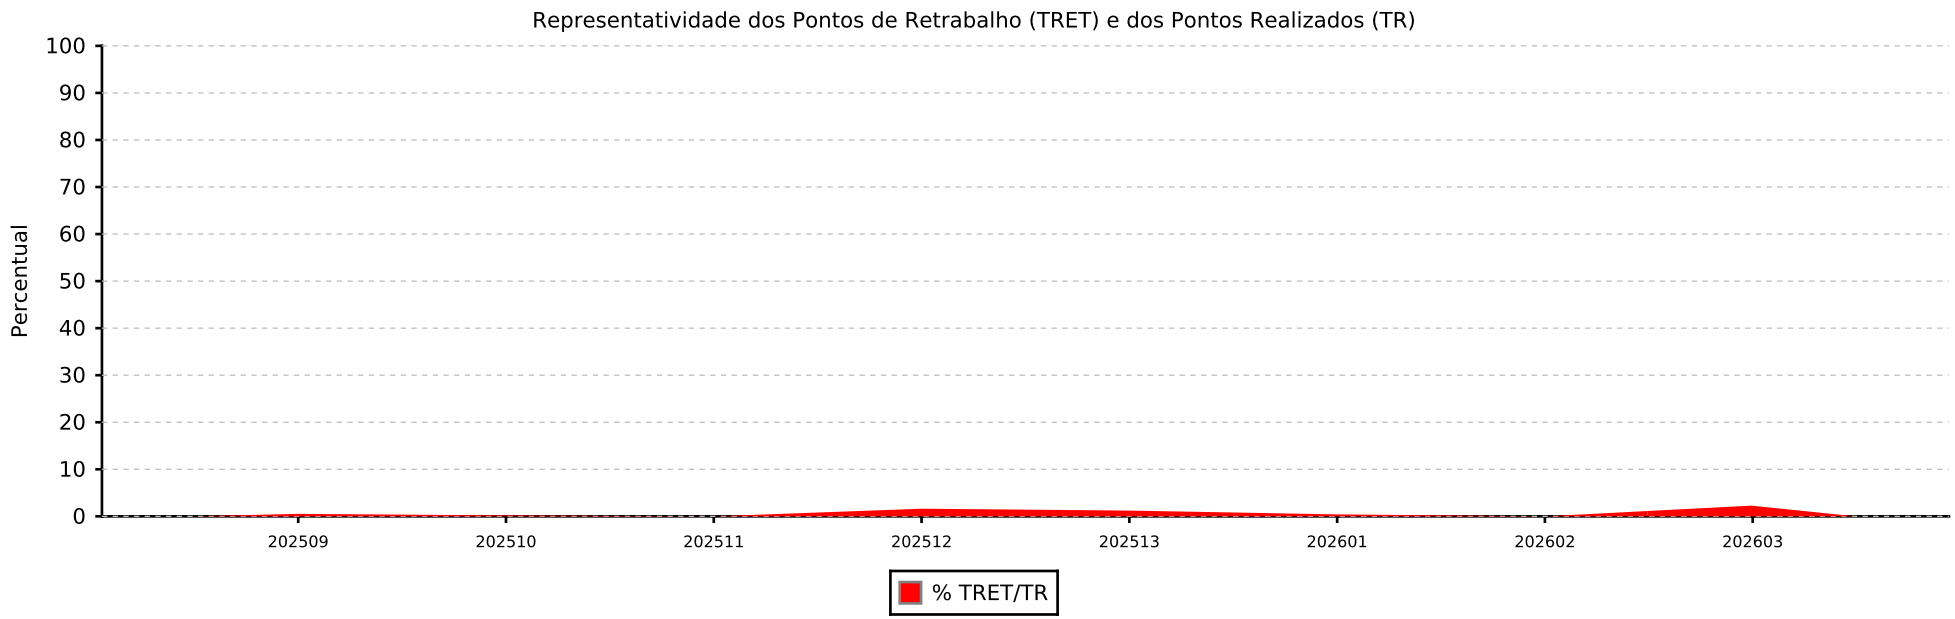

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
TR - Pontos Realizados	283	257	256	185	204.5	245	229	242
TRET - Pontos de Retrabalho	1.5	0.5	0	3	2.5	1	0	5.5
% TRET/TR	0,5	0,2	0,0	1,6	1,2	0,4	0,0	2,3

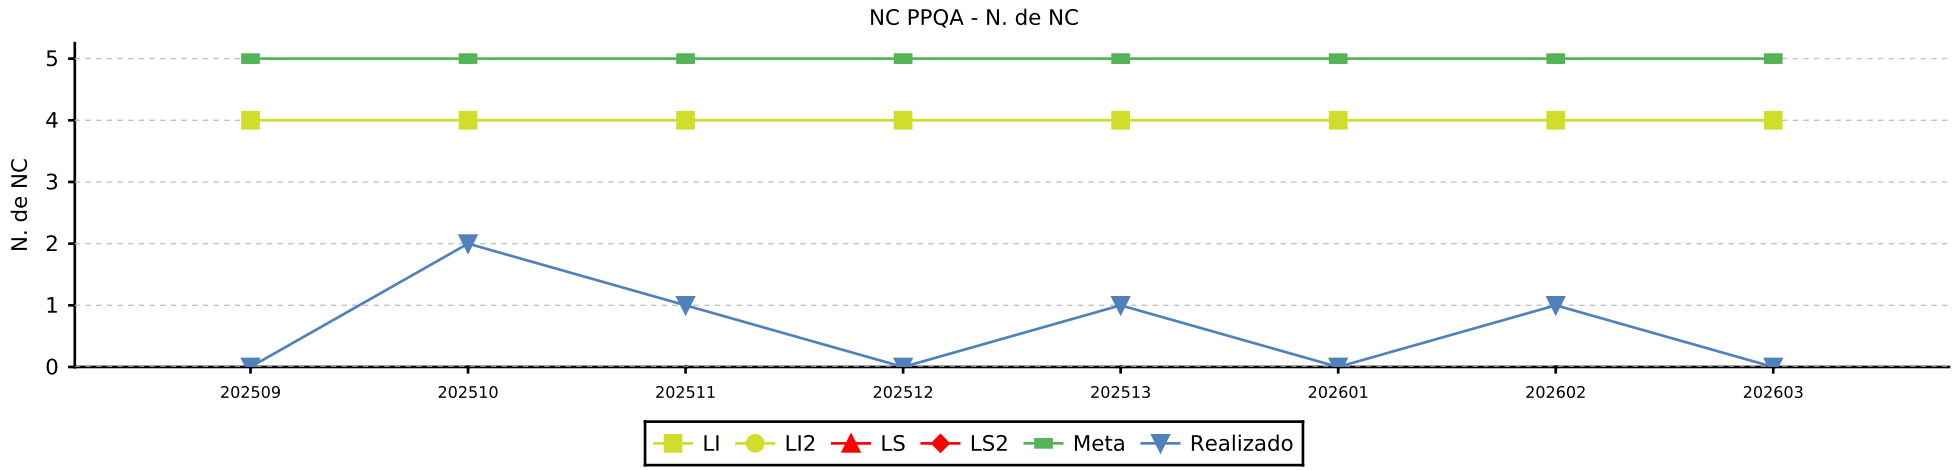

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
Realizado	0	2	1	0	1	0	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

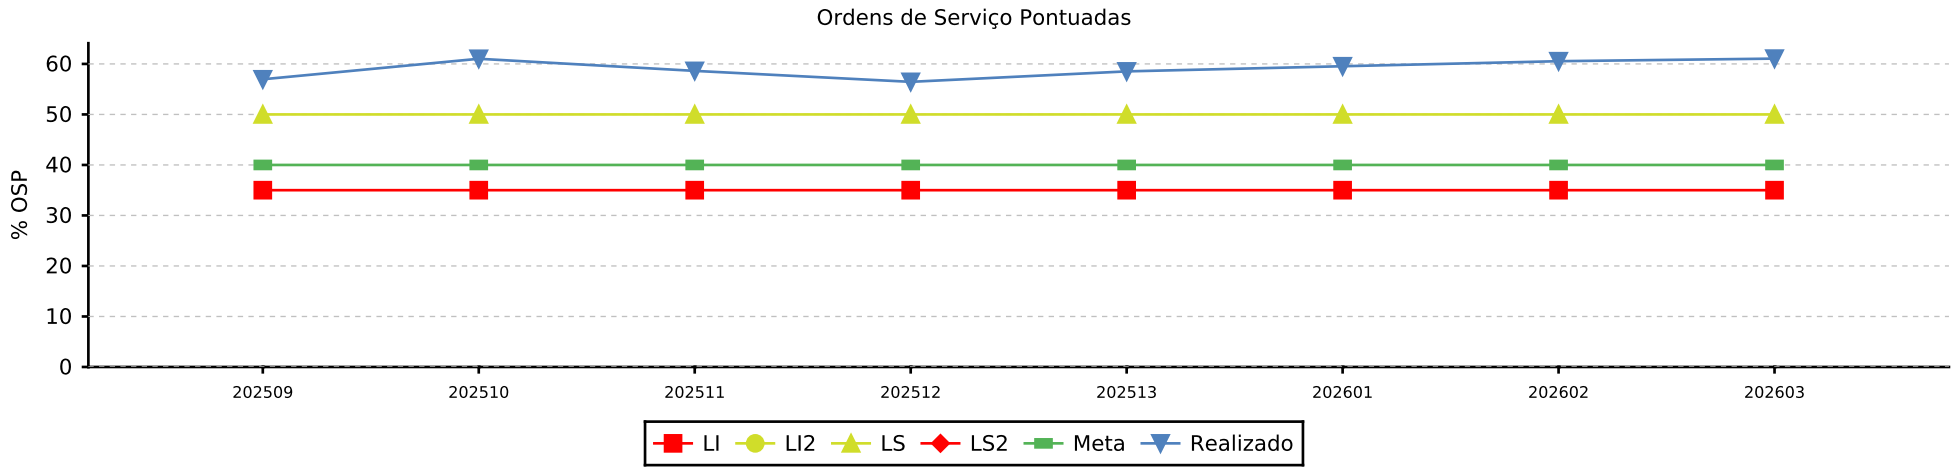

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
Realizado	56.96	61.02	58.62	56.45	58.52	59.54	60.54	61.05
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

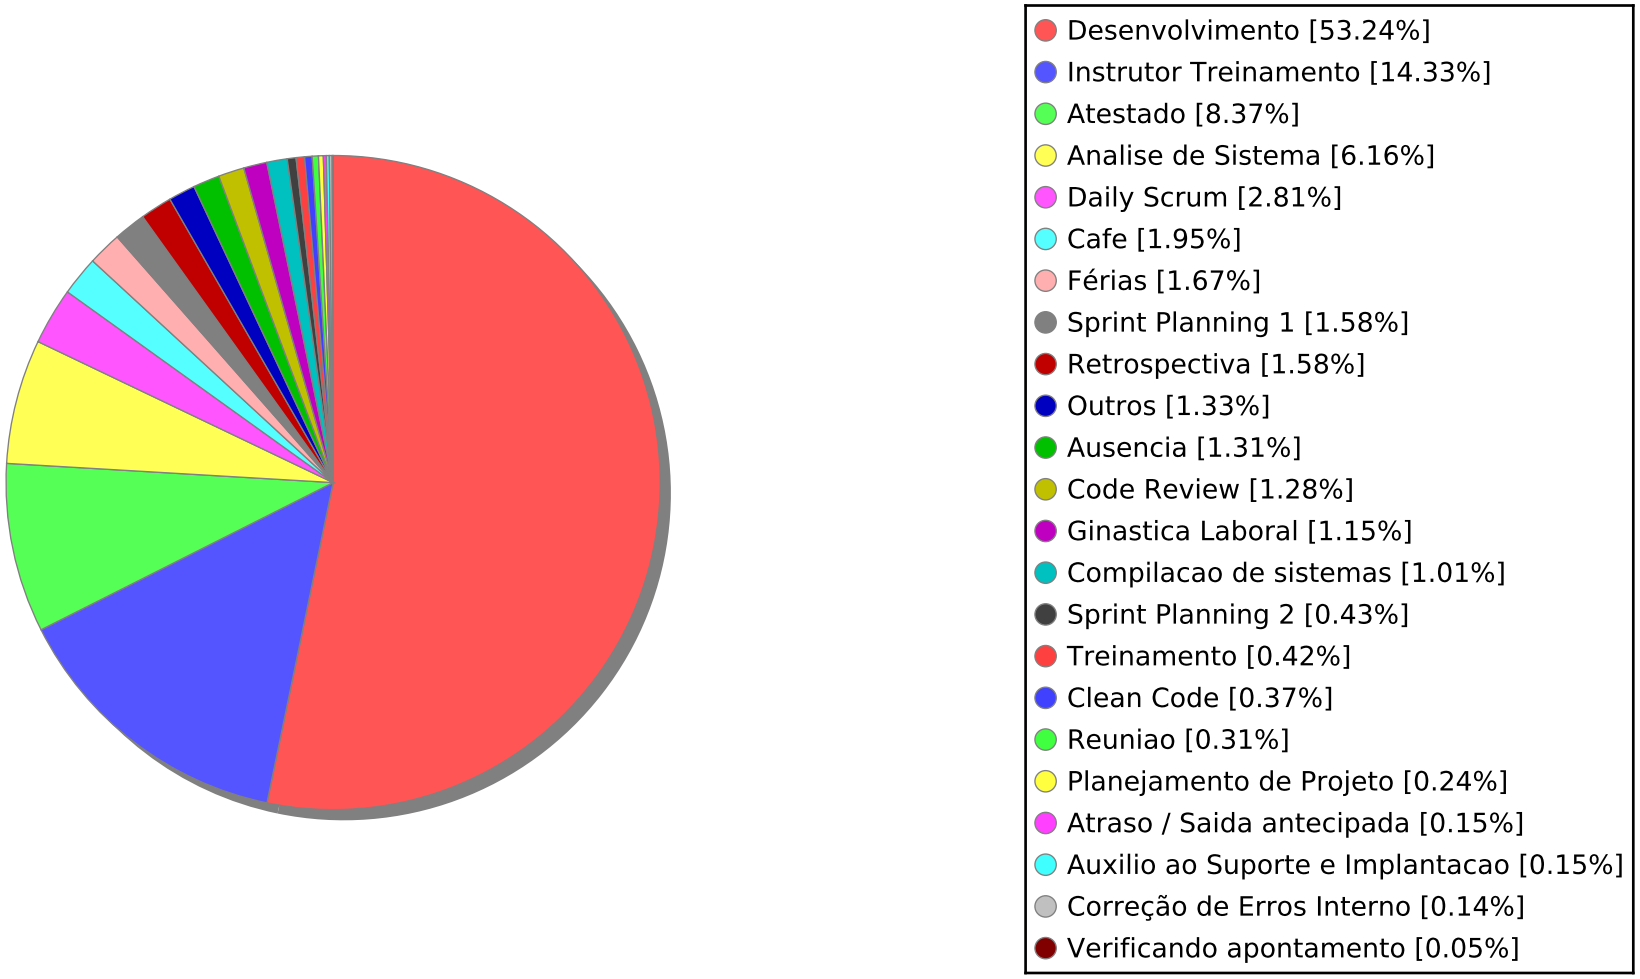
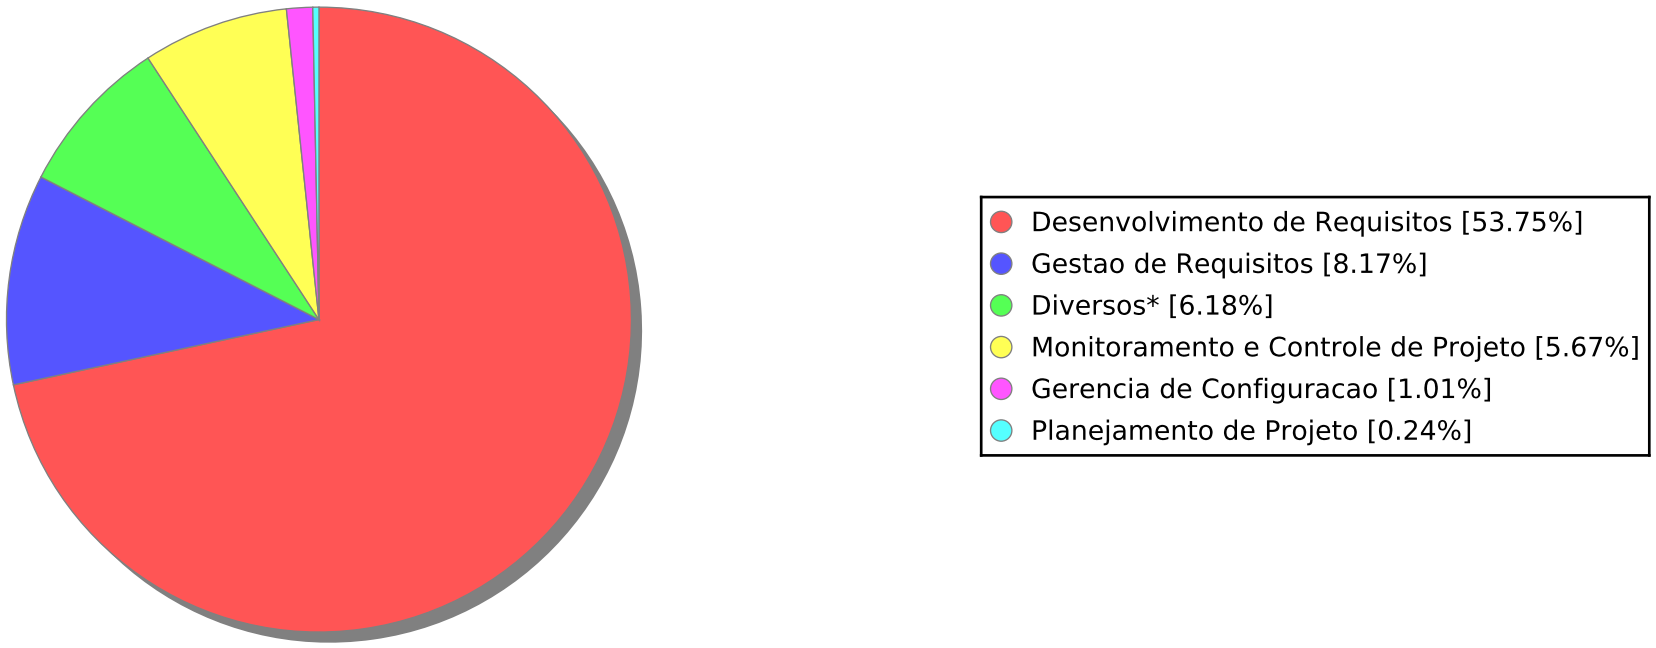
% de Horas por Área do CMMI
